	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Nombre del Contratista: CONSTRUCTORA M Y S S.A.S. **NIT: 900361854-6**	**VALOR INICIAL: $ 386.677.921,38** **VALOR TOTAL: $ 386.677.921,38**
Certificado de Disponibilidad No. 2303 de 2019 y 2301 de 2019 **Registro Presupuestal Nro. 4307– 2019** **Fuente 1010** **Forma de Pago: Según Cláusula Sexta Forma de Pago:** La entidad cancelara la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas, aprobadas, y certificada por el supervisor de acuerdo al avance hasta 90% y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibido a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del supervisor.	**Periodo de Ejecución:** **Treinta (30) de septiembre de 2019 al** **Catorce (14) de Noviembre de 2019.**

Objeto: ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE EL CENTRO, PLATANILLAL, FLORA GAITA, LOS CAUCHOS, EL VERGEL, SANTA HELENA, PUEBLO NUEVO, LAS NUBES, Y ALTO MOTILON EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES, ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS Y VARIOS Y AREAS RECREATIVAS Y CANCHA DEPORTIVA.

FECHA DEL SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **treinta (30) de septiembre de 2019**.

FECHA DE ACTA DE INICIO: **treinta (30) de septiembre de 2019**

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: **veinticuatro (24) de septiembre de 2019**

PLAZO DE EJECUCIÓNÓN: **TRES (3) MESES, PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 2019**

FECHA DE TERMINACIÓN: **30 DE DICIEMBRE DE 2019**
PAZ Y SALVO PARA CONTRATACIÓN: **2019902000002524 del 24 de Septiembre del 2018**
REGISTRO BANCO DE PROYECTOS: **0122 del 24 enero 2019**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

1. RESUMEN

1.1 Información sobre contrato de Obra No 1096 de 2019


Durante el período del 30 de Septiembre de 2019 al 14 de Noviembre de 2019, fecha del primer mes, se tiene un avance de obra del 33.02% de las actividades del Contrato de obra No 1096 de 2019 que corresponde cuatro (4) escuelas intervenidas como son los cauchos, el vergel, santa helena y pueblo nuevo. Inicialmente se realizó socialización en cada una de las instituciones y se nombró tres (3) veedor para el proyecto quedando esta acta registrada.

En la primera semana se realizó socializaciones a las escuelas anteriormente mencionadas, el contratista a su vez saco cuantifico las áreas que se intervenir a continuación relaciono los sitios ejecutar en cada una de los establecimientos educativos.

Los cauchos: se realizara la intervención del cambio de cubierta con el suministro de estructura metálica del salón principal, la cocina y el baños, reparación y mantenimiento de baterías sanitaria, totalmente enchapada y cambio de los sanitarios, enchape de la cocina para muros, instalación de cerámica en piso de salón principal y cocina, cambio de la parte eléctrica general, pintura general de muros, ventanera y puertas, instalación de malla eslabonada para cerramiento, de iguanera se realizara la instalación de una reja tipo bancaria para las ventanas del salón principal por tema de seguridad de los materiales que reposan en esta institución a petición de la comunidad. Se deberá realizar el cambio de la tubería acueducto y revisión de la tubería sanitaria.



Batería sanitaria

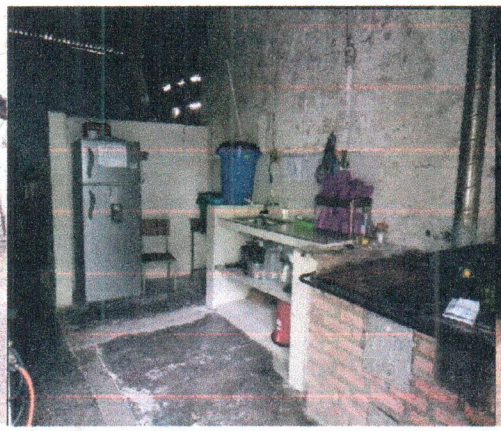


cocina




escuela exterior

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


El vergel: cambio de cubierta del salón principal y cocina, mantenimiento de la cubierta del comedor, enchape de muro para cocina, enchape de pisos en la cocina y los dos salones. Cambio de la instalación eléctrica general, pintura de muro para interior. Pintura a base de aceite para ventana, puerta y cerchas.

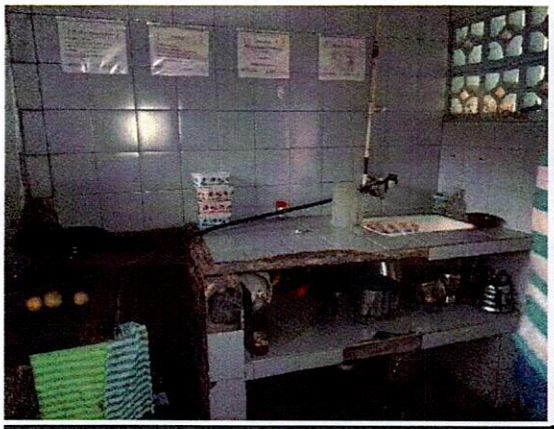



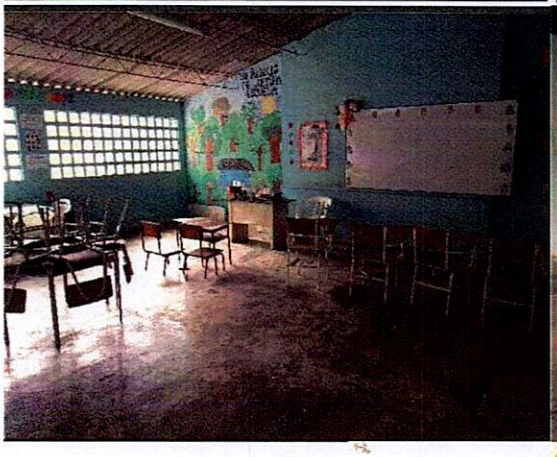





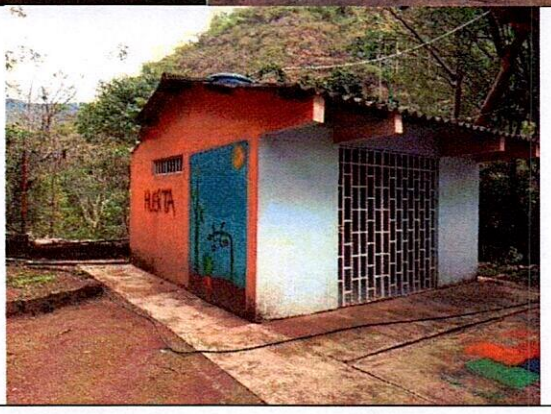


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Santa helena: cambio de cubierta, cerámica de pisos de toda la institución, enchape de muro de cocina y baños, pintura en general de muros, ventana y puerta, cambio parte eléctrica.

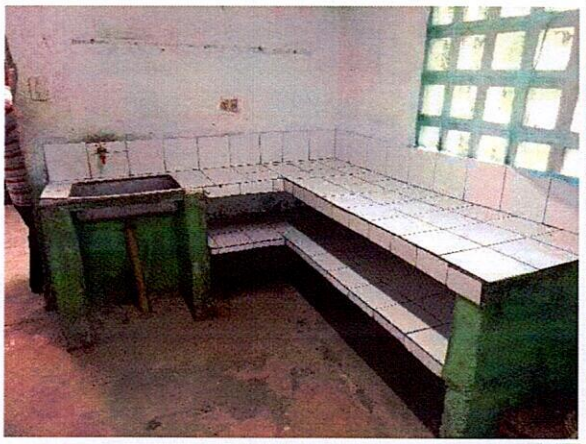

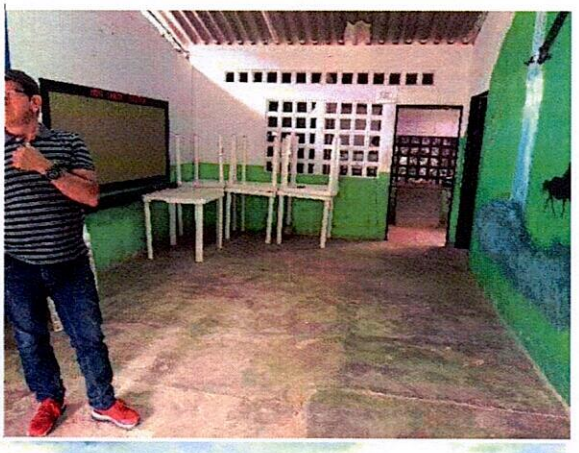




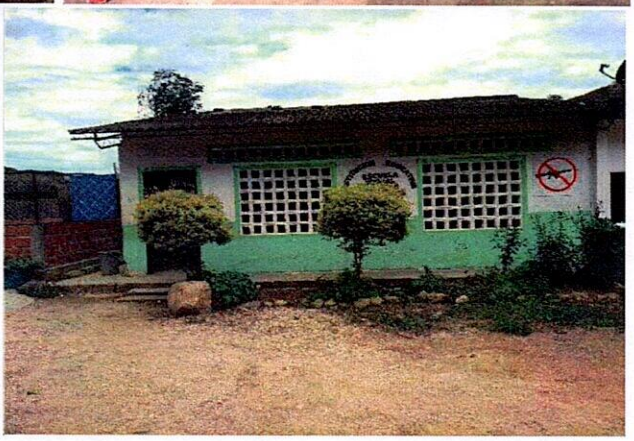






La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Pueblo nuevo: cambio de cubierta con estructura metálica, pintura para muro interior y exterior, enchape de muros de cocina y baños, cambio de la parte eléctrica. Parque infantil

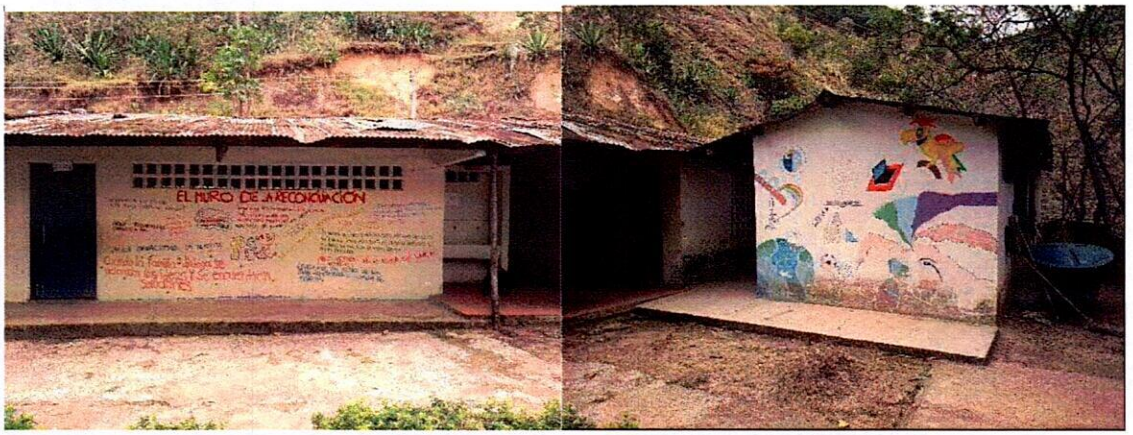

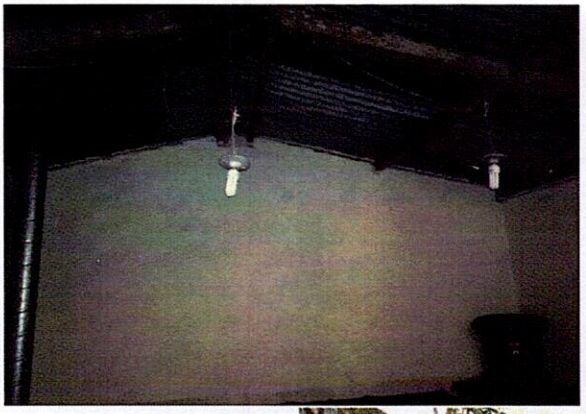

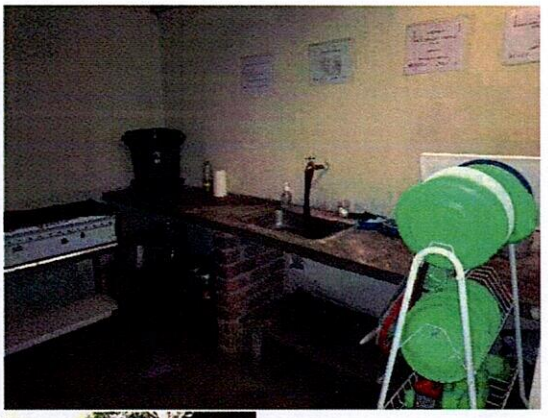

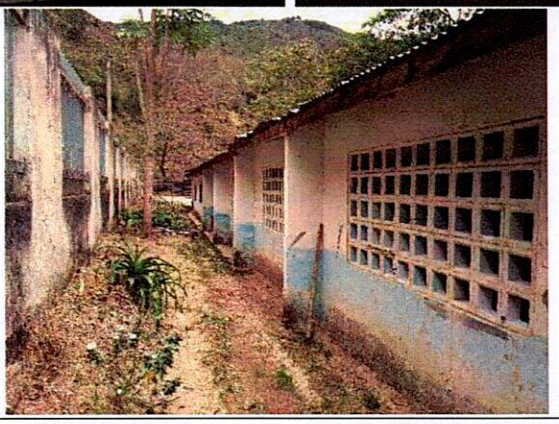


ITEM 1.1. Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, sanitarios, lavamanos, orinales.



Se desmontaro 3 sanitarios en la institución educativa pueblo nuevo, 2 baños en la vereda los cauchos, 3 sanitario y 1 lavamano en la vereda santa helena

Ítem 1.2 Desmonte de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.

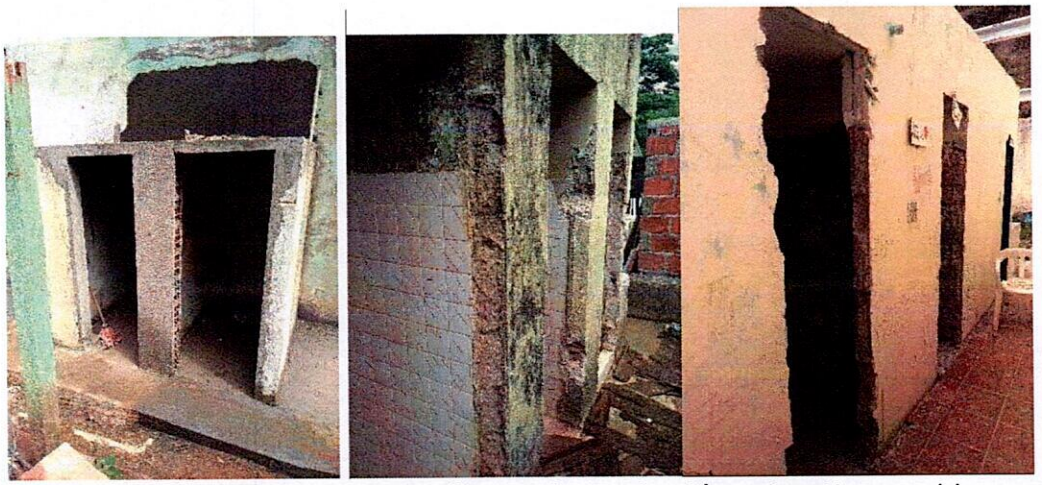

Se desmontaro 2 puerta de baños en la institución educativa pueblo nuevo, 2 baños en la vereda los cauchos, 3 puerta de baños en la vereda santa helena


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Ítem 1.6 Demolición de pisos existentes sin alistado, baldosín, gres, enchape, incluye retiro



Se realizó demolición de piso en las tres instituciones.
Santa helena área intervenida: piso baños profesor y baño general
Pueblo nuevo área intervenida: piso baños
Los cauchos área intervenida: piso baños, anden de alberca, y cocina

Ítem 1.7 Demolición de enchape y revoque sobre muro, Incluye retiro de escombros.

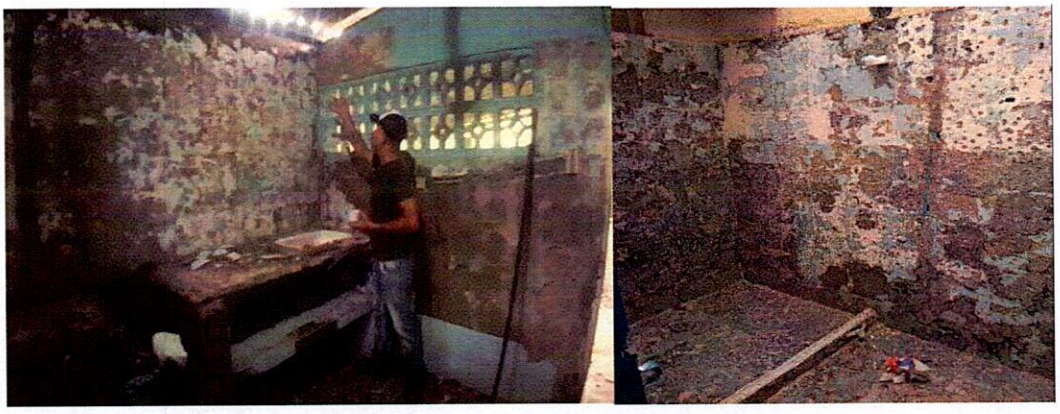

REGISTRO FOTOGRAFICO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Se realizó demolición de enchape y revoque sobre muro tres instituciones.


Santa helena área intervenida: muro de batería sanitaria general y profesores enchape de mesón de cocina


Pueblo nuevo área intervenida: muro de baterías sanitarias


Los cauchos área intervenida: muro de cocina y mesón

El vergel área intervenida: muro de cocina y mesón

Ítem 1.8 Desmonte de cubierta existente sin estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera

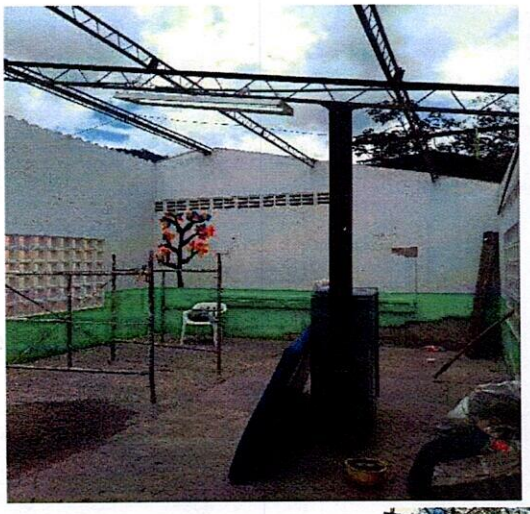

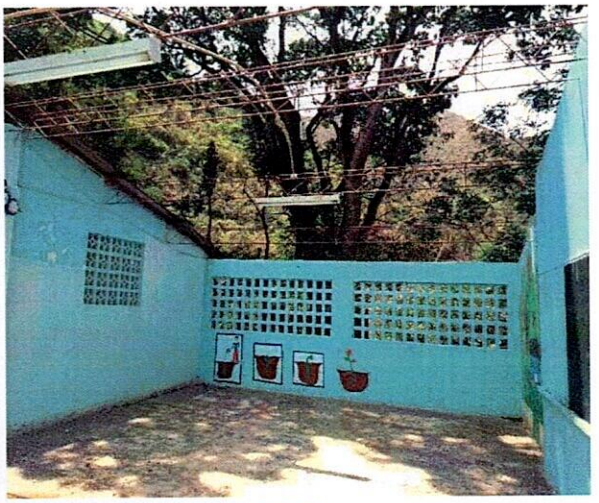

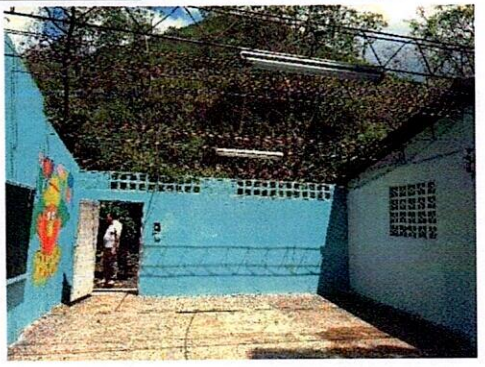

Las escuelas intervenir son el vergel salón 1 y cocina y santa helena toda la escuela


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Ítem 1.16 TRANSPORTE EN VOLQUETA DE MATERIALES DE FERRETERIA A SITIO OBRA, VOLQUETA 5 M3. INCLUYE CARGUE.






Ítem 1.27 Demolición de pisos existentes con alistado, incluye retiro a sitio autorizado

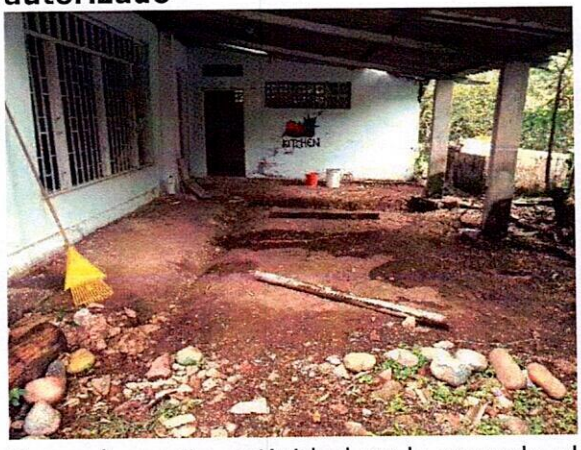





Se realizo esta actividad en la escuela el vergel en la area del comedor, parte del salon, de igualmanera en algunas zonas de la vereda los caucho con el animo de economizar recurso.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

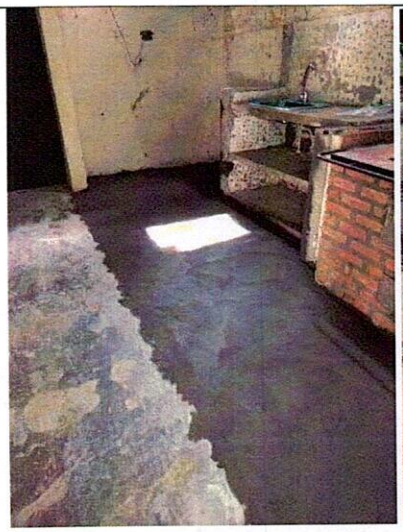




Ítem 1.45 Desmonte de cubierta existente con estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera

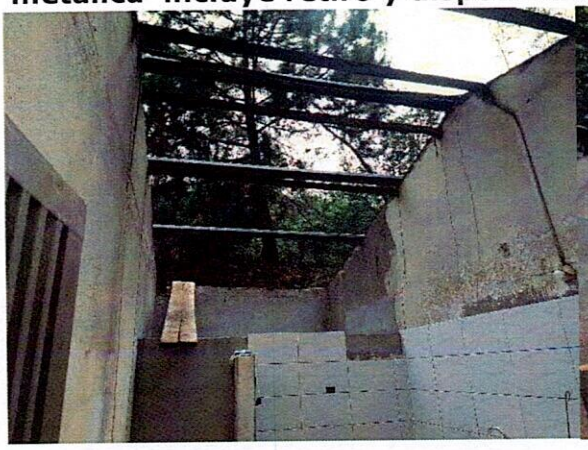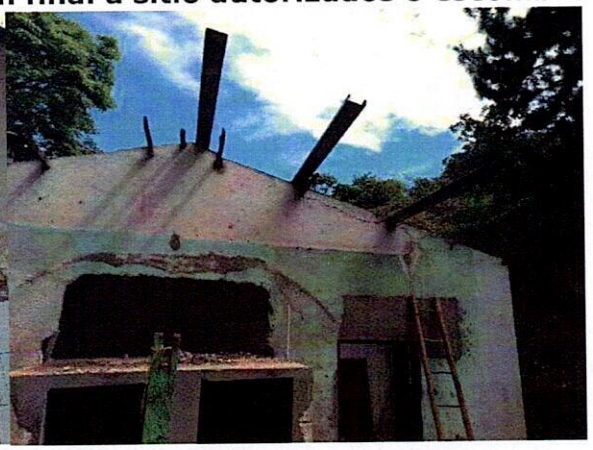
Se realoizo actividad en la vereda pueblo nuevo su estructura es cercha en madera a punto de colapsar y en los caucho una parte en madera y otra en estructura metálica con problema de deflexión producto del peso mismo de la teja.


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva



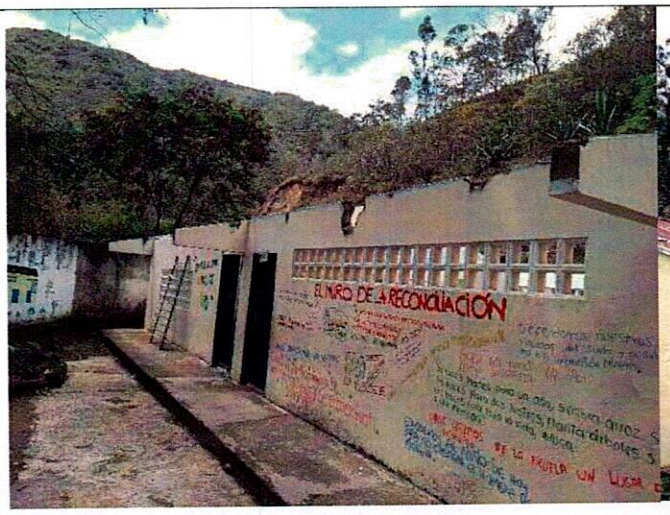

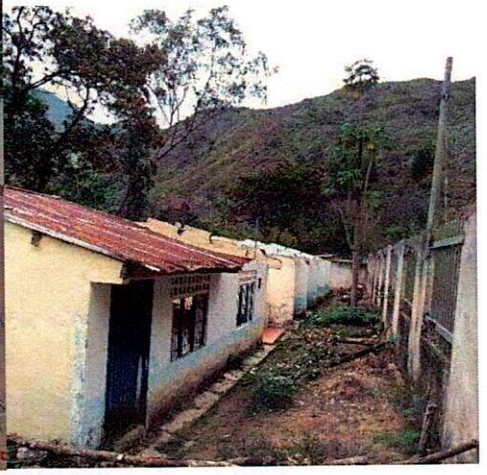Ítem 4.10 Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.

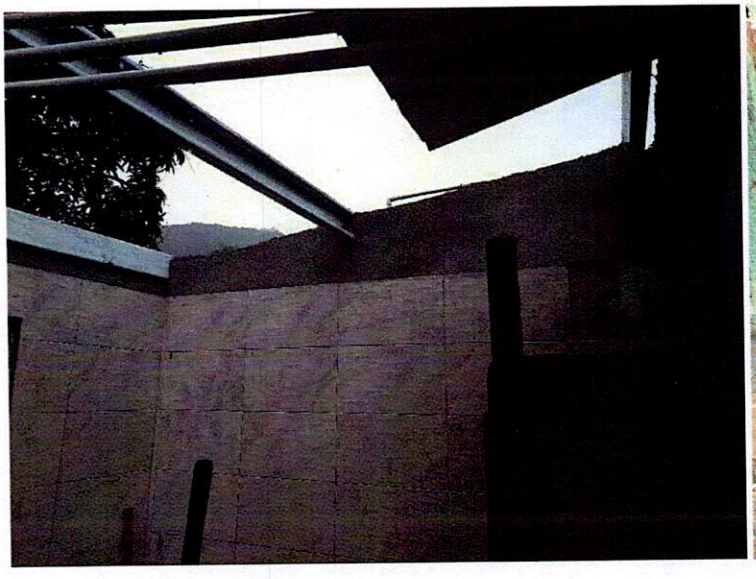


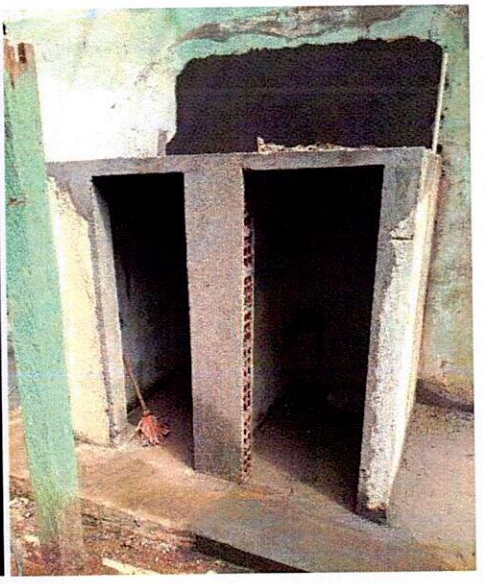


Se realizó actividad de pañete en la vereda los cauchos, en la demolición de un tanque para mitigar el impacto negativo, en la división del muro entre la cocina y la alcoba del profesor, en el arreglo de una luceta, y en los baños. En santa helena en las cuchillas de la cocina, comedor y alcoba del profesor de igual manera arreglo de carrera de la cocina y alacena,

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Ítem 8.5 Suministro e instalación de correa en C PHR de 160x60mm de 2.5 mm. Incluye pintura y anticorrosivo.

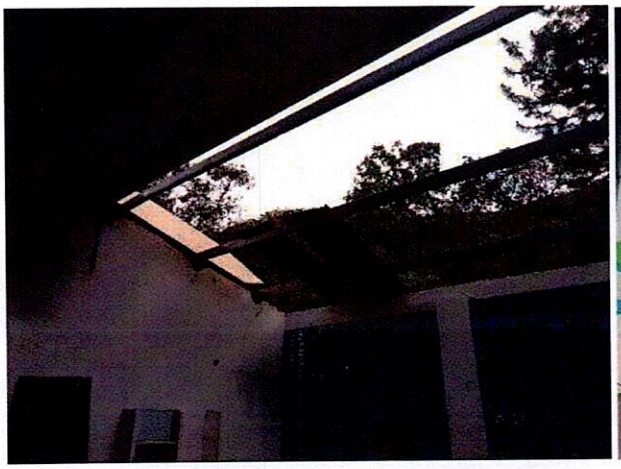

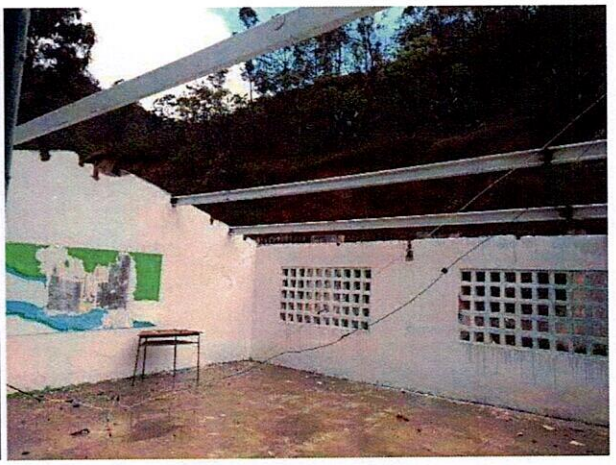

Se realizó esta actividad en las cuatro instituciones educativas
En santa helena, zona posterior entre la cocina, el comedor y la alcoba del profesor se instalaron tres correas.
En los cauchos en todo el plantel educativo cuatro por caída de agua para un total de 8 cerchas metálicas, de esta misma manera se tiene en pueblo nuevo más en la cocina y comedor que solo presenta 3 cercha por caída de agua.
En el vergel se realizó montaje de tres (3) cerchas en la cocina

Ítem 8.11 Mantenimiento de cubierta existente, incluye limpieza de teja, tapa gotera, m.o. cambio de teja no 6 rotas.






La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Se realizó esta actividad en la institución educativa el vergel en la zona del comedor y el salón denominado 2.

Ítem 8.21 Suministro e instalación de caballete en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.

Ítem 8.26 Suministro e instalación cubierta metálica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.

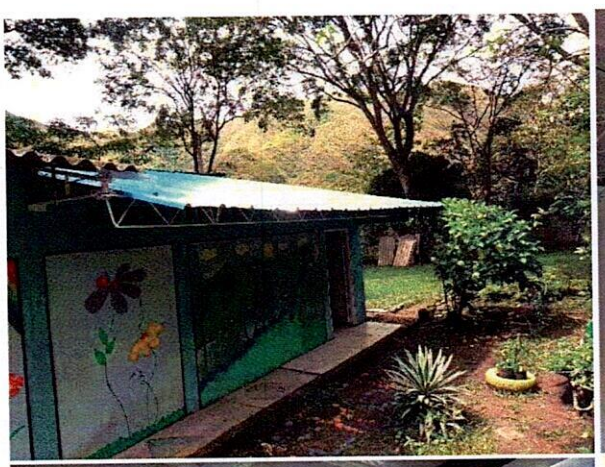




Se realizó el cambio de cubierta a las cuatros instituciones en la totalidad esta son santa helena, los cauchos y pueblo nuevo y en el vergel en las áreas de la cocina y el salón principal.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


Ítem 11.12 Suministro e instalación de Piso Cerámica Baños 33,8x33,8 piso color.







Se instaló el enchape cumpliendo las especificaciones técnicas exigida en el presupuesto oficial, las baterías sanitaria de las instituciones educativa de pueblo nuevo, santa helena y los cauchos.

Ítem 11.13 Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04.

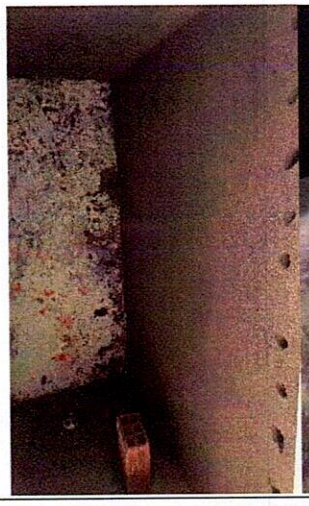

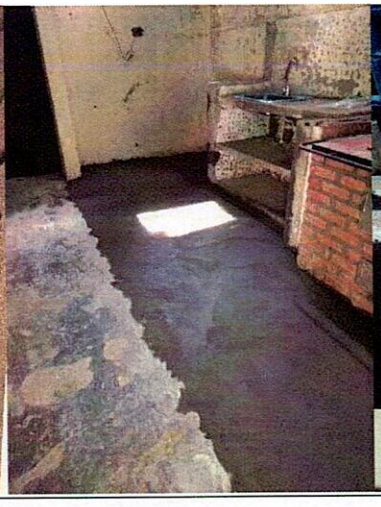


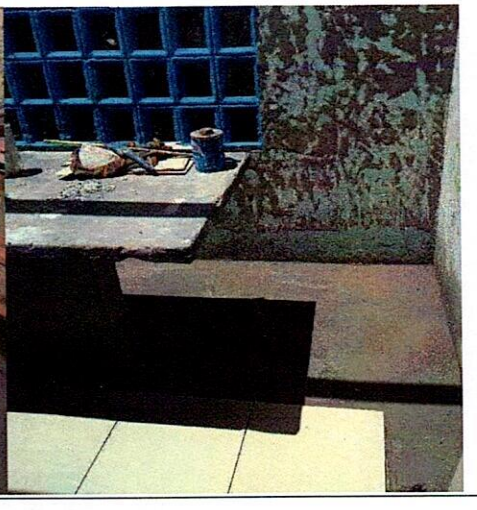


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La actividad de alistado hasta la fecha se ha realizado en la vereda el vergel en zonas comedor y una parte del salón 2, los cauchos en los espacios del salón principal, en el andén y zona húmedas y santa helena en área de cocina, comedor y alcoba de profesor.


Ítem 12.2 suministro e instalación de Enchape cerámica color en pared sobre mesón de lavaplatos, Cocina y lavadero.

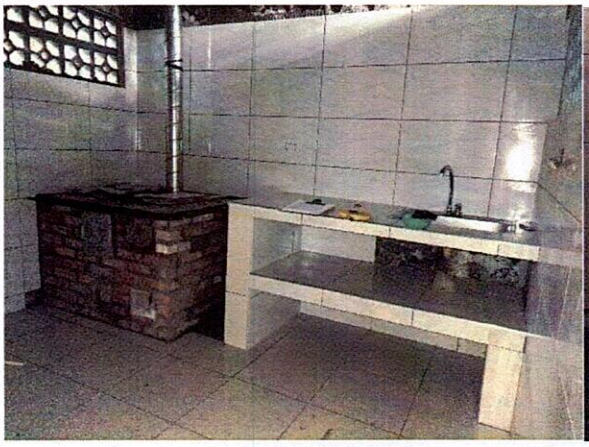

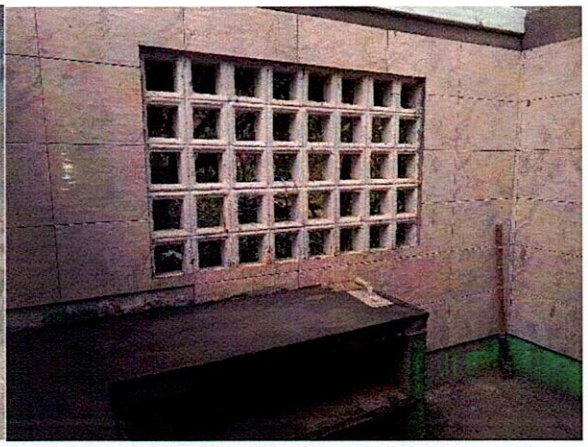

Con el ánimo de embellecer las cocinas se pido enchape para los mesones de las cuatro instituciones

Ítem 12.5 Suministro e instalación de enchape para Piso color Cerámica antideslizante trafico 5.incluye bocel

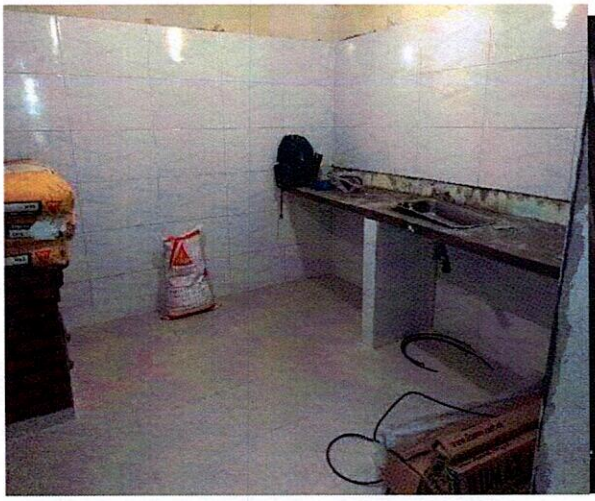



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Se realizó instalación de cerámica en las cuatro instituciones educativas.
Santa helena: en toda la institución (salón principal, salón de informática, cocina, comedor y alcoba de profesor).
Pueblo nuevo: cocina, comedor, salón 1 y 2.
El vergel: los dos salones y comedor.
Los cauchos: salón principal, cocina y pasillo.

Ítem 12.6 suministro e instalación de cerámica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. Incluye bocel y fragüe.



Se instaló dos tipos de color del mismo formato una para la cocina y el otro para los baños.

Santa helena: se intervino la cocina y el baño
Pueblo nuevo: se intervino la cocina y el baño
El vergel: solo la cocina
Los cauchos: se intervino la cocina y el baño


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Ítem 15.1 Suministro y aplicación de estuco sobre muros, Incluye resane pañetes.



Se realiza estuco en la vereda pueblo nuevo y santa helena en toda la institución


Ítem 15.5 Graniplast Esgrafiado con una mano de acronal. Incluye Filos, dilataciones y carteras. y retiro de pintura mal estado.

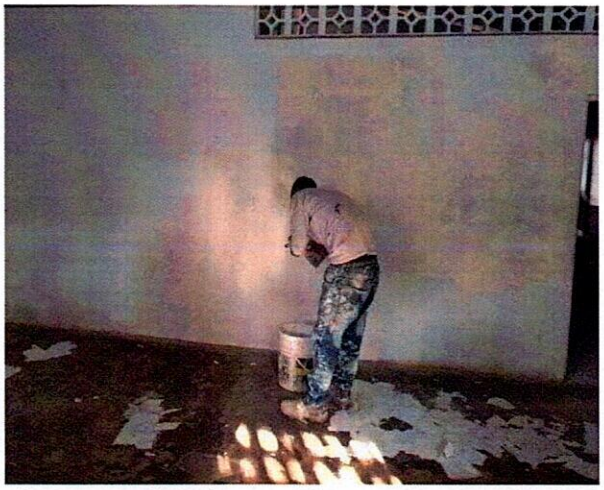


Se aplicó graniplast en las escuelas de pueblo nuevo y santa helena para las fachadas fachas


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Ítem 15.24 Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros interiores y cielo rasos incluye. Resane Masilla acrílica.

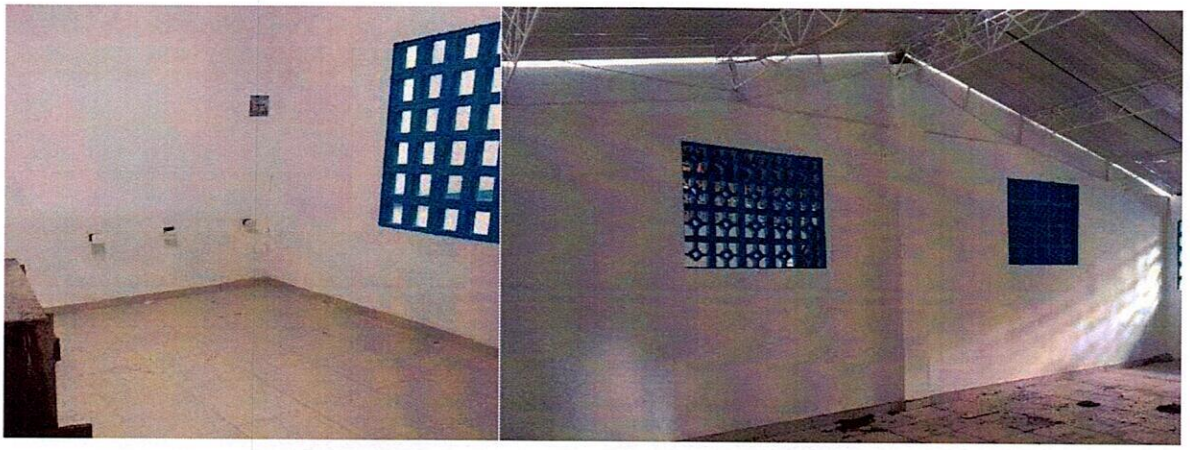



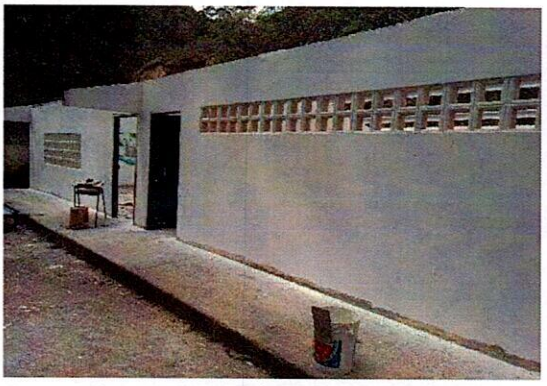

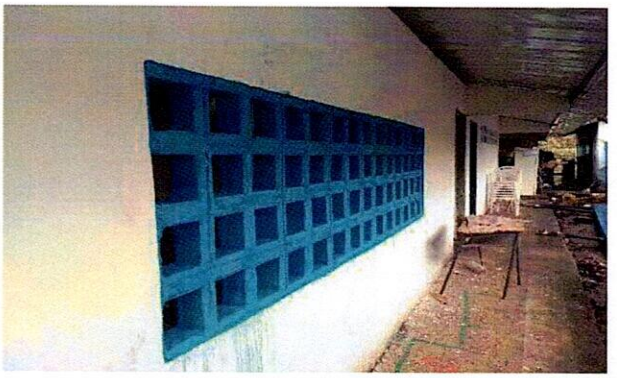


Se realiza aplicación de pintura en área interiores para la vereda pueblo nuevo y santa helena


Se realizó retiro de pintura, resane , aplicación de estuco


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Ítem 15.25 suministro y aplicación de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas, ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.

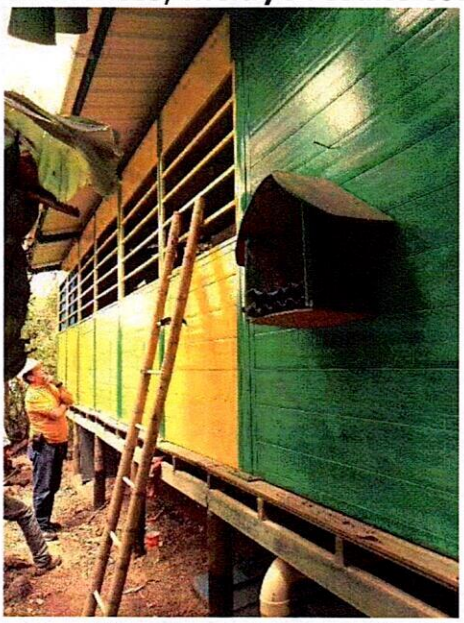

Ítem 15.26 Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrílica o plástica.

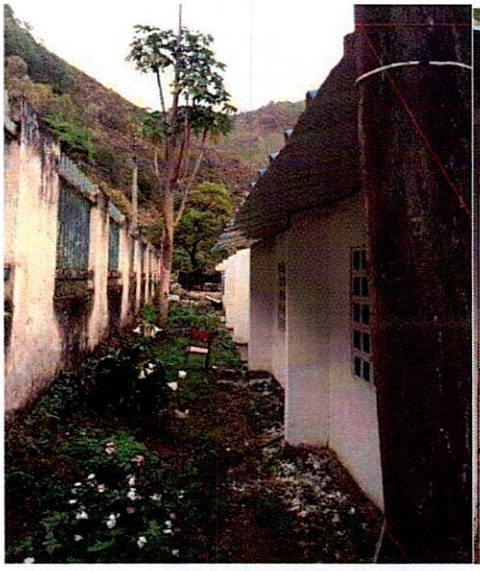

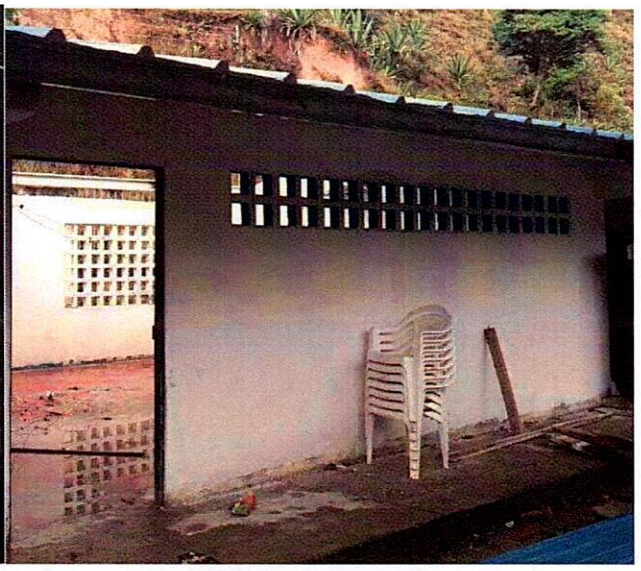

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Ítem 16.1 Suministro e instalación de Lavaplatos línea económica en acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios.






Ítem 16.13 suministro e instalación de Sanitarios blanco. Incluye accesorios.

Ítem 16.14 Suministro e instalación de Lavamanos normal sobreponer. Incluye grifería y accesorios de instalación.




Ítem 26.1 Suministro e instalación de Tablero de cuatro circuitos, incluye accesorios.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

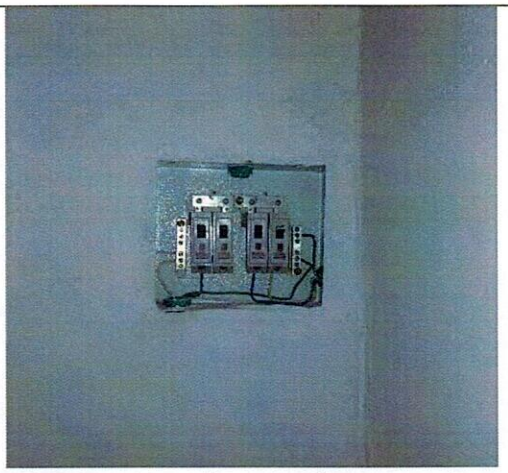


Ítem 26.86 Suministro e instalación de línea a tierra con varilla de cobre 70micras 5/8"x2.44m con alambre de cobre

Ítem 26.102 Punto eléctrico para toma doble Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.

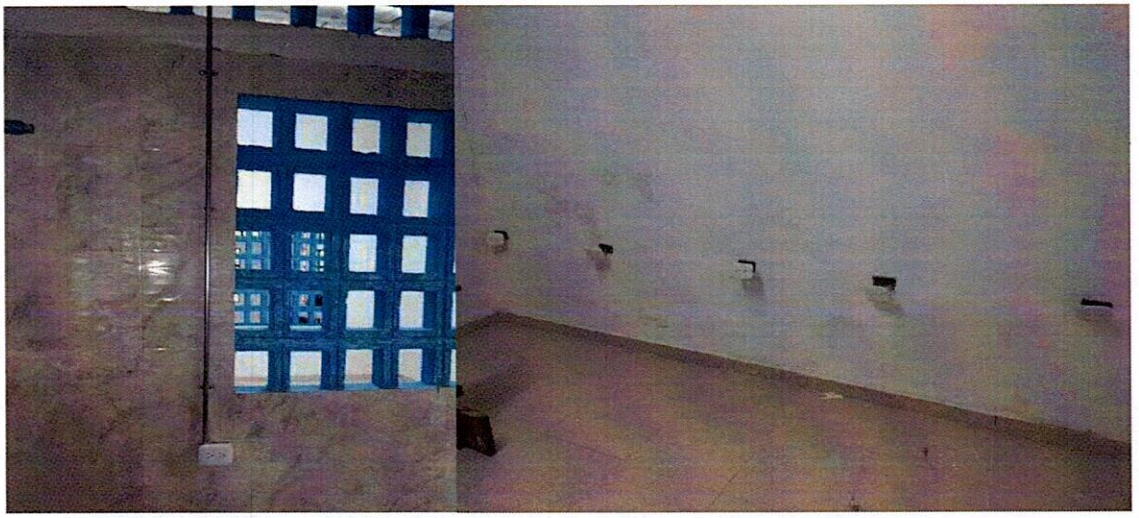

Ítem 26.110 Suministro e instalación breaker enchufable 2x20A.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

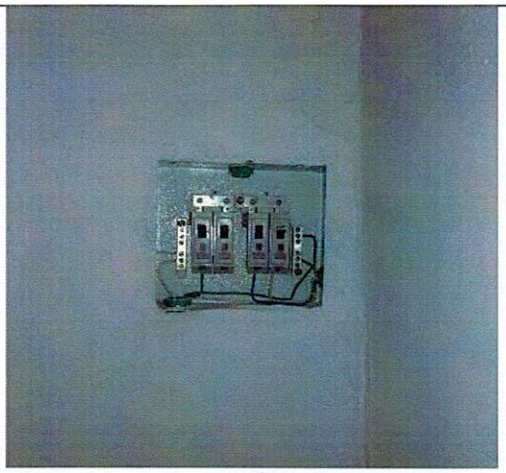

Ítem 26.116 suministro e instalación lámpara hermética 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65, incluye cable encauchetado 3x12 AWG



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

4 - EVALUCION DE LA PROGRAMACION DE OBRA, FLUJOS DE INVERSION Y PRESUPUESTOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
Se realizó visitas periódicas a las primeras cuatros escuelas teniendo por avances de obra un 33.02 % y dando con visto bueno las obras anterior mente ejecutadas
Con base en todos los datos anteriores se procede a realizar el ACTA PARCIAL 1, de conformidad con los datos y medidas realizadas en campo. cantidades que reposan en el mismo documento y donde se corrobora un cumplimiento del TRENTA TRES PUNTO CERO DOS (33.02 %).
Por lo anterior manifiesto que el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1096 DE 2019 se ejecuta y cumple satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo y sus condiciones contractuales, durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de septiembre del Año DOS MIL DIECINUEVE (2019) al catorce (14) Noviembre del mismo año (2019), fecha en la cual se presenta la primer acta parcial.

4. INFORME FINANCIERO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Acta parcial 1	-	$ 127.669.515,29	$127.669.515,29	$259.008.406,09
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

$386.677.921,38	-	$ 386.677.921,38	$127.669.515,29	$259.008.406,09

6. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales

En cumplimiento de la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS del contrato, se verifica que la Póliza de cumplimiento GU032688 con certificado GU054702 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° RE001827, con certificado RE005772 fueron aprobadas el día 24 de septiembre de 2019 por la administración municipal.

CLÁUSULA
DECIMA SEPTIMA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN - se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal N° 2019902000002524 del 24 de Septiembre del 2018

☐ ☐

En cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al **mes de octubre según planilla 8499064675** del personal que laboró, SISO Yeraldin Jaimes Acevedo, ing. residente Rico Mahecha Luis Eduardo, Charry Garzon Lino Alcides, Carrillo Vizcaino Juan Diego, Carvajal Jesus Orlando Bajo afiliación ARL N° 80105146, Rojas Diaz Juan Pablo, Hernandez Mayerly Paola.

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	**10/2018**	**$3.965.300.00**
PENSIÓN	**10/2018**	**$16.072.600.00**
RIESGOS PROFESIONALES	**10/2018**	**$6.104.600,00**
TOTAL		**$26.142.500.00**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

3.2 Verificación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil y extracontractual

Durante el desarrollo del Contrato 1096 de-2019 no se presentaron adiciones en valor ni tiempo, tampoco se realizaron suspensiones en la ejecución del mismo.

POLIZAS A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO				
AMPARO	**NUMERO**	**ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	GU032688	Confianza	16/09/2019	30/06/2020
Pago de salarios y prestaciones	GU032688	Confianza	16/09/2019	31/12/2022
Estabilidad de las obras	GU032688	Confianza	30/06/2020	30/06/2025
Responsabilidad civil y extracontractual	RE001827	Confianza	16/09/2019	30/06/2020

3.3. Cumplimiento Contractual

Por lo anterior el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1096 DE 2019 se ejecuta y cumple satisfactoriamente según como dice el objeto " ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE EL CENTRO, PLATANILLAL, FLORA GAITA, LOS CAUCHOS, EL VERGEL, SANTA HELENA, PUEBLO NUEVO, LAS NUBES, Y ALTO MOTILON EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES, ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS Y VARIOS Y AREAS RECREATIVAS Y CANCHA DEPORTIVA." y sus condiciones contractuales, durante el periodo comprendido el treinta (30) de septiembre del Año DOS MIL DIECINUEVE (2019) al catorce (14) Noviembre del mismo año (2019), fecha en la cual se recibe la primera acta parcial a satisfacción.

CUADRO RESUMEN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO			
C.D.P	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	**FUENTE**	**VALOR A CANCELAR**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS - Gobierno Transparente -	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

2301-2303	4307	1110	**$127.669.515,29**
~~Valor a Pagar.~~			**~~$127.669.515,29~~**

El presente informe se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del ACTA PARCIAL NÚMERO 1 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1096 DE 2019 de fecha 16 de septiembre del presente año (2019)

Se presenta en Neiva, a los (15) días del mes de noviembre de 2019

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Público
Secretario de Educación
Supervisor

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la Supervisión
Ingeniero Civil

ELKIN TRUJILLO ROA
Asesor de infraestructura

JUAN DAVID CASTILLO
Abogado SEEM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva
