PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA SUPERVISION EN INFRAESTRUCTURA

CONTRATO 077 DE 2023

INFORME 10 NOVIEMBRE 8 a DICIEMBRE 7

el 8 de febrero de 2023 se inició el contrato No 077 de 2023, el cual tiene por objeto: Acompañamiento a la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los convenios interadministrativos y contratos de obras públicas de la secretaria de infraestructura física en: pavimentos urbanos y rurales, programa de pavimentación por autoconstrucción, construcción y mantenimiento escenarios deportivos y edificaciones en general.

En este periodo del contrato 077 de 2023 se ha realizado apoyo permanente a todos los procesos encomendados, este apoyo a consistido en visitas física a las obras, revisión documental de las carpetas de los contratos y convenios, proyección de documentos y oficios, ajustes y acompañamientos que le han permitido al secretario de infraestructura tomar decisiones expeditas y prudentes, todas lo más acordes posible a la legislación y situación pertinente.

También se ha realizado el seguimiento y liquidación de contratos y convenios

Me permito describir los acompañamientos realizados durante el periodo 10 comprendido entre el 8 de noviembre y el 7 de Diciembre 2023.

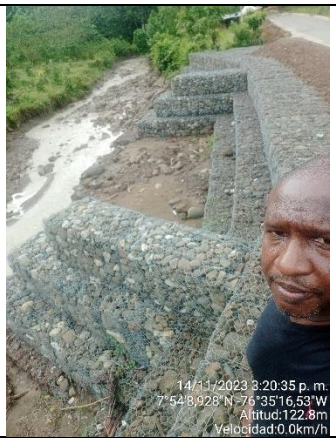
1. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 287 DEL 2021**, cuyo objeto es: contrato interadministrativo de mandato sin representación para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia.
2. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 301 DE 2021,** cuyo objeto es: aunar esfuerzos para realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia

Este contrato el 287 se firmó el 20 de agosto de 2021 y fue aprobado en el secop 2 por las partes (municipio de apartado y la empresa para el desarrollo urbano y hábitat del municipio apartado EDUH), e1 acta de inició se firmó el 30 de agosto de 2021, el 9 de septiembre se realiza otro si al contrato en el cual se reduce en tres (3) meses el plazo inicial de doce (12) meses a nueve (9) meses, quedando como fecha de terminación el 30 de mayo de 2022, se realizó adición de 4 meses quedando como fecha de terminación 30 de septiembre de 2022, este contrato cuenta con una interventoría 301 de 2021 firmado con la asociación de municipios del Urabá antioqueño ASOMURA, el 14 de septiembre de 2021 con un plazo de nueve (9) meses, fecha de inicio el 27 de septiembre y fecha de terminación actual el 30 de septiembre de 2022.

Estos contratos se encuentran en ejecución, en este periodo reportado de SEPTIEMBRE A OCTUBRE ya se han ejecutado actividades contractuales y de interventoría. En el frente del guineo llevan ejecutados aproximadamente 2.800 ml de pavimento y en el frente del reposo se han ejecutado los otros 2.000 ml.

La interventoría envió los informes de reporte mensual por correo electrónico y luego presentaron el cuadro de cantidades ejecutadas físicamente ya que se requirieron para soportar la información que se subió al gesproy, las cantidades reportadas requieren de una verificación exhaustiva ya que se han tomado como avance parcial la supervisión en visitas de campo constato la ejecución de obras a la fecha.
Durante este periodo se tramitaron actas parciales por el 90% tanto a la ejecución de la obra como a la interventoría de la misma.
Se presentó para tramite una solicitud de adición por cerca de 450 millones de pesos para ejecución de unas obras adicionales con su respectiva interventoría, estas obras adicionales y extras son para la construcción de un muro de contención en gaviones que defenderá la obra construida la cual queda expuesta por socavación de base producto de las fuertes crecientes con la ola invernal que nos aqueja.
Durante este periodo de Noviembre – Diciembre se terminó la ejecución del tramo el reposo – San Martin el cual es de 2km y se avanzó sustancialmente en la terminación del tramo vía principal – el guineo del cual se han construido aproximadamente 3.5 de los 4km que se deben terminar.
Para este mes de abril periodo del 8 de abril al 7 de mayo de 2023, el contratista e interventoría solicitaron adición de tiempo toda vez que se hizo imposible la culminación de las actividades, la administración municipal concedió dicho plazo en adición de 2 meses a partir del 30 de abril quedando como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2023.
Durante este periodo de mayo 8 a junio 7 de 2023 se han ejecutado los 2000 ml de placa huella desde el reposo hacia tres esquinas y 4000ml de los 4200ml a ejecutar en el tramo vía principal hacia el guineo. Se avanza con la construcción del muro en gaviones para el control del cauce del rio que estaba socavando la placa huella en el tramo final de la escuela del guineo.
Durante este periodo agosto 8 a septiembre 7 de 2023, la placa huella del tramo del reposo tres esquinas se encuentran terminado y funcionando bien, el tramo del guineo ya se encuentra terminado en su totalidad, construidos hay 4150 ml, el muro en gavión se encuentra en un 100% de avance.
Durante el periodo comprendido del 8 de septiembre a octubre 7 se terminaron en su totalidad las obras y se ha estado realizando las revisiones a la ejecución y a los datos suministrados por la interventoría y el contratista de la obra y que sean plasmados en los planos y memorias.

Durante este periodo octubre 8 a noviembre 7 de 2023 la obra en mención se terminó en su totalidad y se procedió a la verificación de la información y los planos, una vez verificado todo esto se siguió con el recibo de la obra, terminación de la misma y se proyecto la liquidación para revisión y aprobación de jurídica.
Durante este periodo Noviembre 8 a Diciembre 7 de 2023 la obra se termino en su totalidad y se dio tramite final y aprobación al pago final de la obra.
Se realizo la revisión de memorias de cálculos, planos finales y ensayos de laboratorios, así como otra documentación pertinente para legalizar el recibo final y poder tramitar la liquidación.

		
Se aprecia la terminación de la obra en el tramo el guineo, protección en gaviones	Tramo de calzada terminada en el guineo 4.2 km en el final del tramo	Se aprecia el manejo de agua mediante gaviones para ayudar a evitar erosión.

2. Se continuo con la asignación para el apoyo a la supervisión de los temas inherentes a la ejecución del hospital, se dio inicio a las labores de construcción del hospital.

		
Comités de obra del hospital, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura.	Acompañamiento a la administración para el desalojo de parte del predio a construir el hospital.	

Cronograma semanal del mes de noviembre de 2023 programado

APOYO A LA SUPERVISION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANAS

	1					2					3					4				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO
	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO
	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU

Convensión

RD	Revisión Documental	Comprende la revisión de oficios, actas, apu, modificaciones, planos
VO	Visitas a Obras	Consiste en llegar hasta los lugares de las obras bajo encargo y constatar los avances fisicos y tecnicos
EO	Elaboración Oficios	Consiste en la proyección de oficios de respuestas, peticiones, informes y aprobaciones
CO	Comites	Reuniones técnicas de obras bajo encargo, con contratistas, interventores y personal de infraestructura
JU	Juntas	Reuniones internas de la SIF o con otras dependencias de orden administrativos
DN	Disponible alguna Necesidad	

ING. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
Contratista OPS 077 de 2023
Apoyo a la Supervisión

Anexos

Comités administrativos SIF y otros acompañamientos







FIRMA DEL CONTRATISTA
Ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
C.C.79´599.713
Calle 101 # 109-74 apartado
Teléfono 3104143540
Email: sgmi12@gmail.com
