Corporación Autonoma y Regional de Boyaca

CORPOBOYACA

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CORPOBOYACÁ

Informe mensual de supervisión Nº	3		**Periodo reportado**	01 al 30 de noviembre		**Fecha de informe**	12 de diciembre de 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO			
No. Contrato/Convenio:	**CNV2023-020**		
Objeto Contrato/Convenio:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, el Municipio de Gámeza para garantizar los recursos necesarios que permitan la ejecución del proyecto denominado "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL QUEBRADA LA CARBONERA EN LA CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA" en marco de la línea del plan de acción "Conservación, Respeto y Aprovechamiento del Agua" en el Programa "Gestión Integral de cuencas hidrográficas" en el proyecto Aprovechamiento Sostenible del agua" de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental		
integrantes Contrato/Convenio:	Municipio de Gámeza CORPOBOYACÁ		
Ejecutor Contrato/Convenio:	Municipio de Gameza		
Supervisor 1 :	Danilo Alexander Vianchá Valderrama	**Entidad:**	CORPOBOYACÁ
Supervisor 2 :	Rosalba Pérez Torres	**Entidad:**	MUNICIPIO DE GÁMEZA
Supervisor 3 :		**Entidad:**	

2. DATOS CRONOLÓGICOS DEL CONTRATO/CONVENIO									
Plazo inicial (Meses):	**5**		**Fecha de inicio**	28/08/2023		**Fecha terminación según Plazo inicial:**	27/01/2024	**Plazo (días)**	**153,00**
Suspensión 1:					**Reinicio 1:**			**Tiempo suspendido 1**	0
Suspensión 2:					**Reinicio 2:**			**Tiempo suspendido 2**	0
Suspensión 3:					**Reinicio 3:**			**Tiempo suspendido 3**	0
Suspensión 4:					**Reinicio 4:**			**Tiempo suspendido 4**	0
Suspensión 5:					**Reinicio 5:**			**Tiempo suspendido 5**	0
								Total días suspendidos	**0**
Prórroga 1 (Meses):	-		**Fecha prórroga 1**					**Prórroga 1 (días)**	-
Prórroga 2 (Meses):	-		**Fecha prórroga 2**					**Prórroga 2 (días)**	-
Prórroga 3 (Meses):	-		**Fecha prórroga 3**					**Prórroga 3 (días)**	-
Prórroga 4 (Meses):	-		**Fecha prórroga 4**					**Prórroga 4 (días)**	-
Prórroga 5 (Meses):	-		**Fecha prórroga 5**					**Prórroga 5 (días)**	-
Total meses prórrogados	-							**Total días prórrogados**	-
								Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual	**27/01/2024**

3. DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO/CONVENIO								
Valor inicial:	**$ 299.960.780,00**	**Aporte Municipio**	**$ 59.992.156,00**	**Aporte CORPOBOYACÁ**	**$ 239.968.624,00**	**Aporte otro (Quien)**		
Valor Adición 1: Fecha:		**Aporte Municipio**		**Aporte CORPOBOYACÁ**		**Aporte otro (Quien)**		
Valor Adición 2: Fecha:		**Aporte Municipio**		**Aporte CORPOBOYACÁ**		**Aporte otro (Quien)**		
Valor Adición 3: Fecha		**Aporte Municipio**		**Aporte CORPOBOYACÁ**		**Aporte otro (Quien)**		
Valor Adición 4: Fecha:		**Aporte Municipio**		**Aporte CORPOBOYACÁ**		**Aporte otro (Quien)**		
Valor Adición 5: Fecha:		**Aporte Municipio**		**Aporte CORPOBOYACÁ**		**Aporte otro (Quien)**		
Totales :	**$ 299.960.780,00**	**Total Municipio**	**$ 59.992.156,00**	**Total CORPOBOYACÁ**	**$ 239.968.624,00**	**Total otro (Quien)**	**$**	-

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO (Insertar 1 fila por actividad realizada)		
Fecha:	**Responsable:**	**Actividad realizada:**
9/11/2023	Comité Técnico	Visita al sitio de obra y comité técnico No. 4
14/11/2023	Corpoboyacá	Gestión y formalización de modificatorio No. 1, ajustes a plazo contractual
17/11/2023	Comité Técnico	Comité técnico No. 5 (Ver acta de comité en expediente contractual)
20/11/2023	Comité Técnico	Comité técnico No. 6 (Ver acta de comité en expediente contractual)
22/11/2023	Municipio de Gámeza	Informe de avance
27/11/2023	Supervisión Corpoboyacá	Email a oficina jurídica. Solicitud aprobación de pólizas previa revisión de vigencias realizada por supervisión.
27/11/2023	Comité Técnico	Comité técnico No. 7 (Ver acta de comité en expediente contractual)
30/11/2023	Comité Técnico	Comité técnico No. 8 y visita de verificación de actividades en el sitio de obra (Ver acta de comité en expediente contractual)

Corporación Autonoma y Regional de Boyaca

CORPOBOYACA

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CORPOBOYACÁ

Informe mensual de supervisión Nº	3		Periodo reportado	01 al 30 de noviembre		Fecha de informe	12 de diciembre de 2023

5, DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO

PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA		OBSERVACIONES	
60,01%	75,25%	15,24%			A la fecha se ha adelantado las siguientes acciones de parte del municipio: •Proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía, No MG-SAMC-COP-003-2023, contrato de obra pública El reporte de avance con corte al 30 de noviembre, presentado por el municipio es: % programado: 60,01% % ejecutado: 75,25% Se tiene un avance en la ejecución de las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre con respecto al programado. Los porcentajes de ejecución se calculan ponderando el peso de cada una de las actividades expuestas en el cronograma del convenio. Fuente %: Ficha de seguimiento cronograma convenio, que se relaciona a continuación

DESCRIPCIÓN	Valor:	Peso Ponderado Convenio	Peso Ponderado especifico	Peso ponderado general	Programado especifico	% Programado real	% Ejecutado especifico	% Ejecutado real
ETAPA PRECONTRACTUAL								
Etapa precontractual del proceso hasta formalizacion de acta de inicio		4%	100,00%	4,00%	100,00%	4,00%	100,00%	4,00%
ETAPA CONTRACTUAL					0,00%			
Limpieza de canalización quebrada en tierra y concreto, incluye retiro de tronco, rocas, raices y vegetación superficial (hierba, maleza), sobrantes, así como reconformación de la margen de la quebrada y retiro de estos sedimentos a la via	$ 221.026.690,00	95%	95,79%	91,00%	60,00%	54,60%	75,00%	68,25%
Rocería a cada la lado de la via y/0 zonas necesarias para buena visibilidad	$ 2.404.872,21		1,04%	0,99%	42,00%	0,42%	75,00%	0,74%
Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (transporte hasta 5 km)	$ 7.307.500,00		3,17%	3,01%	33,00%	0,99%	75,00%	2,26%
REVISIÓN Y TERMINACIÓN		1%	100%	1%	0,00%	0%	0%	0,00%
Totales	**$ 230.739.062,21**	**100%**		**100%**	**60,01%**		**75,25%**	
					% programado		**% ejecutado**	

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS POLIZAS DEL PROYECTO (Insertar pantallazo relación de pólizas actualizadas)

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A Modif. 1 - PÓLIZA No. 51-44-101023866 - Fecha 23 de noviembre de 2023	
Fecha de contrato	28/06/2023
Fecha de inicio	28/08/2023
Fecha de terminación actualizada	27/12/2023
Valor actualizado	$ 299.960.780,00

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A Modif. 1 - PÓLIZA No. 51-44-101023866 - Fecha 23 de noviembre de 2023				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
REQUISITO	VALOR 40%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	NOTAS
REQUERIMIENTO	$ 119.984.312,00	28/08/2023	27/04/2024	* 40% valor del CNV *Termino de duración del convenio y 4 meses más fecha de inicio: 28-08-2023 Fecha terminación: 27-12-2023 +4 meses: 27-04-2024
PÓLIZA	$ 119.984.312,00	28/08/2023	28/04/2024	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A Modif. 1 - PÓLIZA No. 51-44-101023866 - Fecha 23 de noviembre de 2023				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
REQUISITO	VALOR 200 SMMLV	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	NOTAS
REQUERIMIENTO	$ 232.000.000,00	28/08/2023	27/12/2023	* 200 smmlv *Término de ejecución del convenio Fecha de inicio: 28-08-2023 Fecha terminación: 27-12-2023 27-12-2023
PÓLIZA	$ 232.000.000,00	28/08/2023	28/12/2023	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

Página 1

PÓLIZA ACTUALIZADA CON MODIFICACIÓN NO: 1, Pendiente aprobación por parte de oficina jurídica de Corpoboyacá.

6. ANEXOS

6,1 Informe de ejecución No. 3 de parte del municipio.

Nombre supervisor	**DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA**	
Nombre Apoyo supervisión	**SOFÍA MORENO PRIETO**	
Nombre Apoyo supervisión		**ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ**

Corporación Autonoma y Regional de Boyaca

CORPOBOYACA

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CORPOBOYACÁ

Informe mensual de supervisión Nº	3		**Periodo reportado**	01 al 30 de noviembre		**Fecha de informe**	12 de diciembre de 2023

6, ARCHIVO FOTOGRÁFICO (Cuando aplique)

Foto 1	 Descripción: Avances de limpieza	Foto 2	 Descripción: Avances de limpieza
Foto 3	 Descripción: Avances de limpieza	Foto 4	 Descripción: Avances de limpieza
Foto 5	 Descripción: Avances de limpieza	Foto 6	 Descripción: Avances de limpieza
Foto 7	Descripción: Avances de limpieza	Foto 8	Descripción: Avances de limpieza

PARCIAL No. 03
INFORME DE avance de corte 30 noviembre 2023
DEL CONVENIO N° CVN 2023-020

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01**	**11**	**2023**	**A**	**30**	**11**	**2023**

Datos del supervisor del municipio

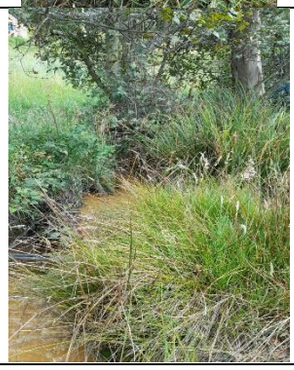
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROSALBA PEREZ TORRES
DEPENDENCIA	Servicios públicos
CARGO	Jefe de la unidad de servicios públicos

Datos del contrato

NUMERO DE CONTRATO	CVN 2023-02
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28 agosto 2023
TIPO DE CONTRATO	Convenio
OBJETO	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA QUEBRADA LA CARBONERA EN LA CUENCA DEL RÍO CHICAMOCHA.
NIT	891857764-1
PLAZO DE EJCUCION	120 días
VALOR	El valor total del convenio será por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 299.960.780)., los cuales se discriminan así: CORPOBOYACÁ: Aportará en efectivo la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS ($ 239.968.624) M/CTE, MUNICIPIO DE GÁMEZA: Aporta al presente convenio la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($59.992.156) M/CTE
PLAZO	120 días
FECHA ACTA DE INICIO	28 de agosto 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	25-12-2023
SUPERVISOR:	Por parte del Municipio de Gámeza: ROSALBA PEREZ TORRES –jefe unidad de servicios públicos domiciliarios. Por parte de Corpoboyacá Ingeniero DANILO ALEXANDER VIANCHA VALDERRAMA
PERIODO REPORTADO:	Del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023.
Fecha de elaboración y presentación del Informe	01 de diciembre de 2023
Porcentaje (%) programado	60.01%
Porcentaje (%) ejecutado	75.3%

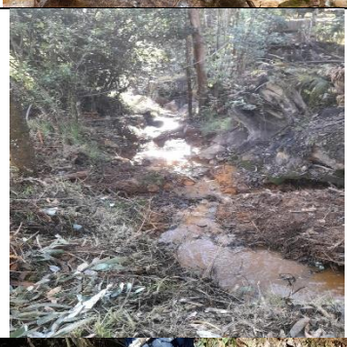
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

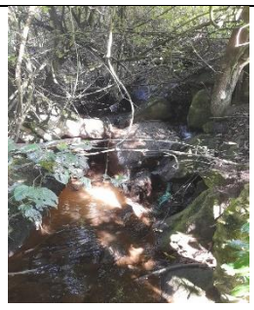
Actividad	Tramo	Soporte	
		Antes	Después
Limpieza de canalización quebrada en tierra y concreto, incluye retiro de tronco, rocas, raíces y vegetación superficial (hierba, maleza), sobrantes, así como reconformación de la margen de la quebrada y retiro de estos sedimentos a la vía Rocería a cada la lado de la vía y/0 zonas necesarias para buena visibilidad	**Tramo 1. 0 a 17 metros**		
	Tramo 2 17 a 35 metros		
	Tramo 3 35 a 80 metros .		
	Tramo 4 80 a 125 metros		
	Tramo 5 125 a 175 metros .		

	Tramo 5 125 a 175 metros .		
	Tramo 6 175 a 231 metros .		
	Tramo 6 175 a 231 metros .		
	Tramo 7 231 a 281 metros .		
	Tramo 8 281 a 331 metros		

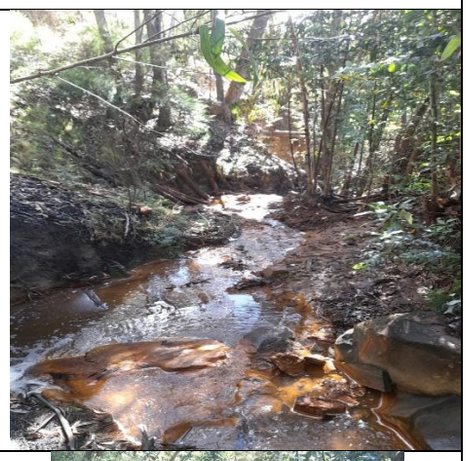
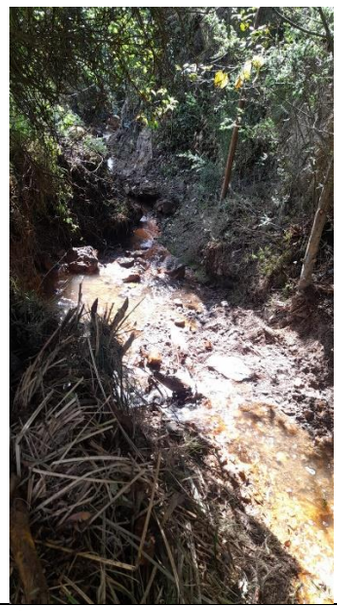
	Tramo 9 331 a 381 metros		
	Tramo 9 331 a 381 metros		
	Tramo 10 381 a 431 metros .		
	Tramo 11 431 a 481 metros		
	Tramo 12 481 a 531 metros .		

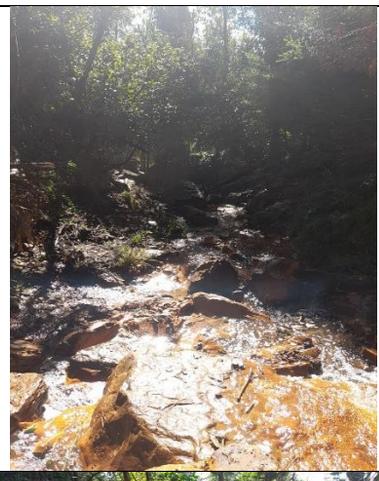
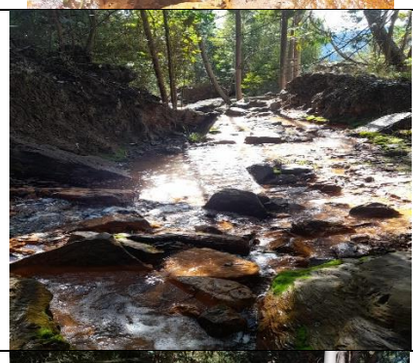
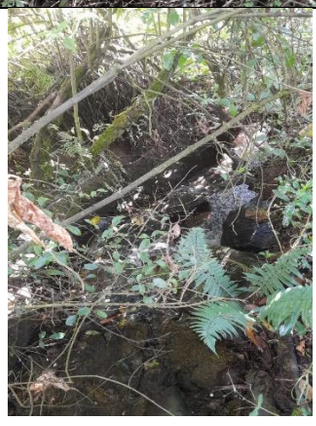
	Tramo 13 531 a 581 metros		
	Tramo 14 581 a 631 metros .		
	Tramo 15 631 a 681 metros		
	Tramo 16 681 a 731 metros .		
	Tramo 17 731 a 781 metros		

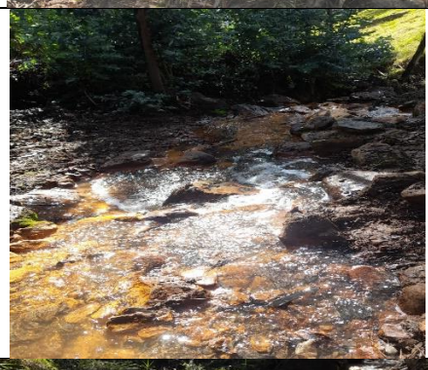
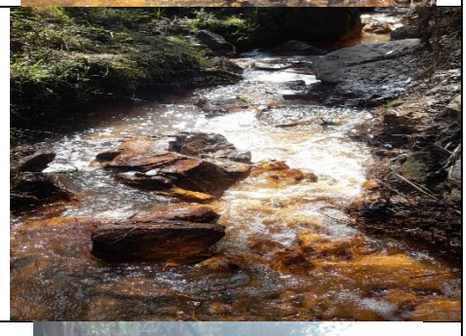
Limpieza de canalización quebrada en tierra y concreto, incluye retiro de tronco, rocas, raíces y vegetación superficial (hierba, maleza), sobrantes, así como reconformación de la margen de la quebrada y retiro de estos sedimentos a la vía	**Tramo 18 781 a 831 metros .**		
	Tramo 19 831 a 881 metros .		
	Tramo 20 881 a 931 metros .		
Rocería a cada la lado de la vía y/0 zonas necesarias para buena visibilidad	**Tramo 21 931 a 981 metros**		
	Tramo 22 981 a 1031 metros		

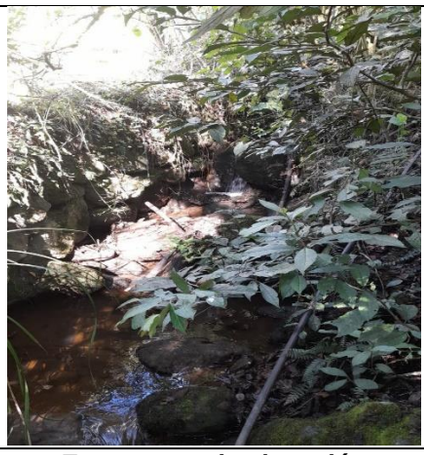
	Tramo 23 1031 a 1081 metros .		
	Tramo 24 1081 a 1131 metros		
	Tramo 25 1131 a 1181 metros		
	Tramo 26 1181 a 1231 metros		

	Tramo 27 1231 a 1281 metros		
	Tramo 28 1281 a 1331 metros		
	Tramo 29 1331 a 1381 metros		
	Tramo 30 1381 a 1431 metros .		
	Tramo 31 1431 a 1481 metros		

	Tramo 32 1481 a 1531		
	Tramo 33 1531 a 1581		
	Tramo 34 1581 a 1631		
	Tramo 35 1631 a 1681		

	Tramo 36 1681 a 1731		
	Tramo 37 1731 a 1781		
	Tramo 38 1781 a 1831		
	Tramo 39 1831 a 1881		

	Tramo 40 1881 a 1931		
	Tramo 41 1931 a 1981		
	Tramo 42 1981 a 2031		
	Tramo 43 2031 a 2081		

	Tramo 44 2081 a 2131		
Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o derrumbes (transporte hasta 5 km)		**En proceso de ejecución**	

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 de diciembre 2023

ROSALBA PEREZ TORRES
Supervisora convenio por el municipio de Gámeza
Jefe Unidad de Servicios
Públicos Domiciliarios
