Asociacion de Trabajadores Independientes
Sol Guajiro
NIT: 900336801-0

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 370 DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO VILLA CAMPO ALEGRE, EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 4

RIOHACHA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5
1.1 INTRODUCCION 5
1.2 OBJETIVOS 5
1.3 INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE ADJUDICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 6
1.3.1 ANTECEDENTES 6
1.4 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO 7
1.5 PRESUPUESTO CONTRATO DE ADICION No. 01 DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 370 DEL 2023 8
2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 10
2.1 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO 10
2.2 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 11
2.3 INFORME FINANCIERO 12
2.3.1 AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO 12
2.3.2 FLUJO DE INVERSIÓN 12
2.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 13
2.5 CORTE DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA 14
2.6 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS AVANCE DE OBRA EJECUTADO GENERAL DE LA OBRA 16
2.7 AVANCE FISICO GENERAL POR ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 17
2.7.1 AVANCE DE OBRA 21
3. SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA 21
3.1 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 21
4. EQUIPOS EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 22
5. PERSONAL EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 22
6. ANEXOS 23
6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 23
6.2 POLIZA ACTUALIZADA SEGUN ACTA FINAL DE OBRA 24
6.3 CONTRATO DE ARRENNDAMIENTO VIVIENDA 25
6.4 FICHA TECNICA - LED SOLAR INTEGRADA S60 PRO NW 26

6.5 ENSAYO DE ROTURA DE CILINDROS Y CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS 27
6.6 INFORME, PLANIMETRIA Y CARTERAS TOPOGRAFICAS RECORD 28
6.7 PLANO ELECTRICO RECORD 29
6.8 MEMORIAS DE CANTIDADES RECORD 30
6.9 BITACORA 31
6.10 INFORME DE CALIDAD Y GESTIÓN DE AGUAS PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS 32
6.11 COTIZACION ESTUDIO DE CONTROL DE RUIDOS 33
6.12 INFORME DE CONTROL DE RUIDOS 34
6.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CONTRATO No. 370 DE 2023 35
6.14 INFORME PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA PGIO AGOSTO 36
6.15 INFORME PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA PGIO SEPTIEMBRE 37
6.16 INFORME PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA PGIO OCTUBRE - NOVIEMBRE 38
6.17 FACTURA PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA 39
6.18 INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA AGOSTO 40
6.19 INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA SEPTIEMBRE 41
6.20 INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA OCTUBRE - NOVIEMBRE 42
6.21 FACTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 43
6.22 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL 44
6.23 CERTIFICADOS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE PARAFISCALES DE ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO 45
6.24 CERTIFICADOS DE PAGO SENA DE ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO 46
6.25 ACTA DE RECIBO FINAL POR PARTE DE LA COMUNIDAD 47

Asociacion de Trabajadores Independientes
Sol Guajiro
NIT: 900336801-0

CUARTO INFORME MENSUAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 370 DE 2023	
CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
CONTRATISTA	ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO
NIT	900336801-0
REPRESENTANTE LEGAL	BIANKA MILEIDIS FORERO CARRILLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.124.484.211
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO VILLA CAMPO ALEGRE, EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
VALOR	$1.524.181.478,00 M.L. MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES, CIENTO OCHENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C
PLAZO	NUEVE (9) MESES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE JULIO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE ADICIÓN NO. 01 DE 2023	03 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL	$ 63.133.245
VALOR CONTRATO INICIAL + CONTRATO DE ADICIÓN NO. 01 DE 2023	$ 1.587.314.723,00
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DEL INFORME:	20/10/2023 A 15/11/2023
AVANCE EN TIEMPO	3 MESES Y 15 DIAS
AVANCE EN ACTIVIDADES	100%

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCION

la Alcaldía Distrital de Riohacha, en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicho Distrito, elaboró el proyecto que tiene por objeto "MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO VILLA CAMPO ALEGRE, EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA", con la ejecución de este proyecto se quiere suplir, en gran parte, la necesidad que presentan los habitantes del Barrio Villa Campo Alegre, del Distrito de Riohacha por un espacio óptimo para jugar y de sano esparcimiento.

por lo anterior el Distrito en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicho Barrio elaboró y contrató la ejecución del proyecto que beneficia a los habitantes colindantes a ellos.

1.2 OBJETIVOS

- Realizar el seguimiento de las de las diferentes actividades que se están ejecutando para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente contrato.
- Mostrar el avance que presenta la obra en las diferentes actividades a ejecutar.
- Informar la gestión del contratista a la Interventoría.

1.3 INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE ADJUDICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA

El Distrito de Riohacha, realizo proceso de licitación pública No. 017 de 2022, el cual se adjudicó mediante resolución No. 0_680 del 6 de julio de 2023, al Sr. ROBERTO TRASLAVIÑA ORDUÑA, Representante Legal de CONNAR CONSTRUCCIONES & ARQUITECTURA S.A.S. por valor de $ 1.524.181.478,00 M.L. MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.


1.3.1 ANTECEDENTES

En el distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los cuatro (04) días del mes de agosto (08) de 2023, se reunieron en las oficinas de la Alcaldía Distrital, **KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, como supervisor del contrato, actuando como representante de la ALCALDIA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA; **ROBERTO TRASLAVIÑA ORDUÑA** representante Legal de CONNAR CONSTRUCCIONES & ARQUITECTURA S.A.S., y **JHORVIS DAVID PINTO MAGDANIEL representante** legal de JHORVIS DAVID PINTO MAGDANIEL, con el fin de suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra pública No. 370 de 2023.

Bajo resolución 1-012 de 2023, el día cuatro (04) de agosto de 2023, se firma y autoriza **CESIÓN TOTAL DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 370 DE 2023**, entre los suscritos a saber, **LEANDRO JOSÉ MEJIA DÍAZ** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.030.469 expedida en la ciudad de Riohacha - La Guajira, Secretario de Gobierno Seguridad y Convivencia Ciudadana, con funciones de Alcalde Distrital Según el art. 106 de la ley 136 de 1994, quien para efectos de la presente cesión se denominará DISTRITO DE RIOHACHA y por la otra, CONNAR CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S., identificado con el NIT. 900.763.708-4, representado legalmente por el señor **ROBERTO TRASLAVIÑA ORDUÑA,** identificado con cédula de ciudadanía No. No. 1.096.619.243 expedida en La Paz y quien para efectos del presente documento se denominará **EL CEDENTE**, de una parte, y por la otra, ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO identificado con el NIT 900336801-0 representado legalmente por la señora **BIANKA MILEIDIS FORERO CARRILLO,** identificada con cédula de ciudadanía No 1,124,484,211, quien en adelante se denominará EL **CESIONARIO.**

1.4 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la carrera 40 entre las calles 14J y 14K, en el barrio villa campo alegre, del Distrito de Riohacha, Departamento de la Guajira, como se muestra a continuación:

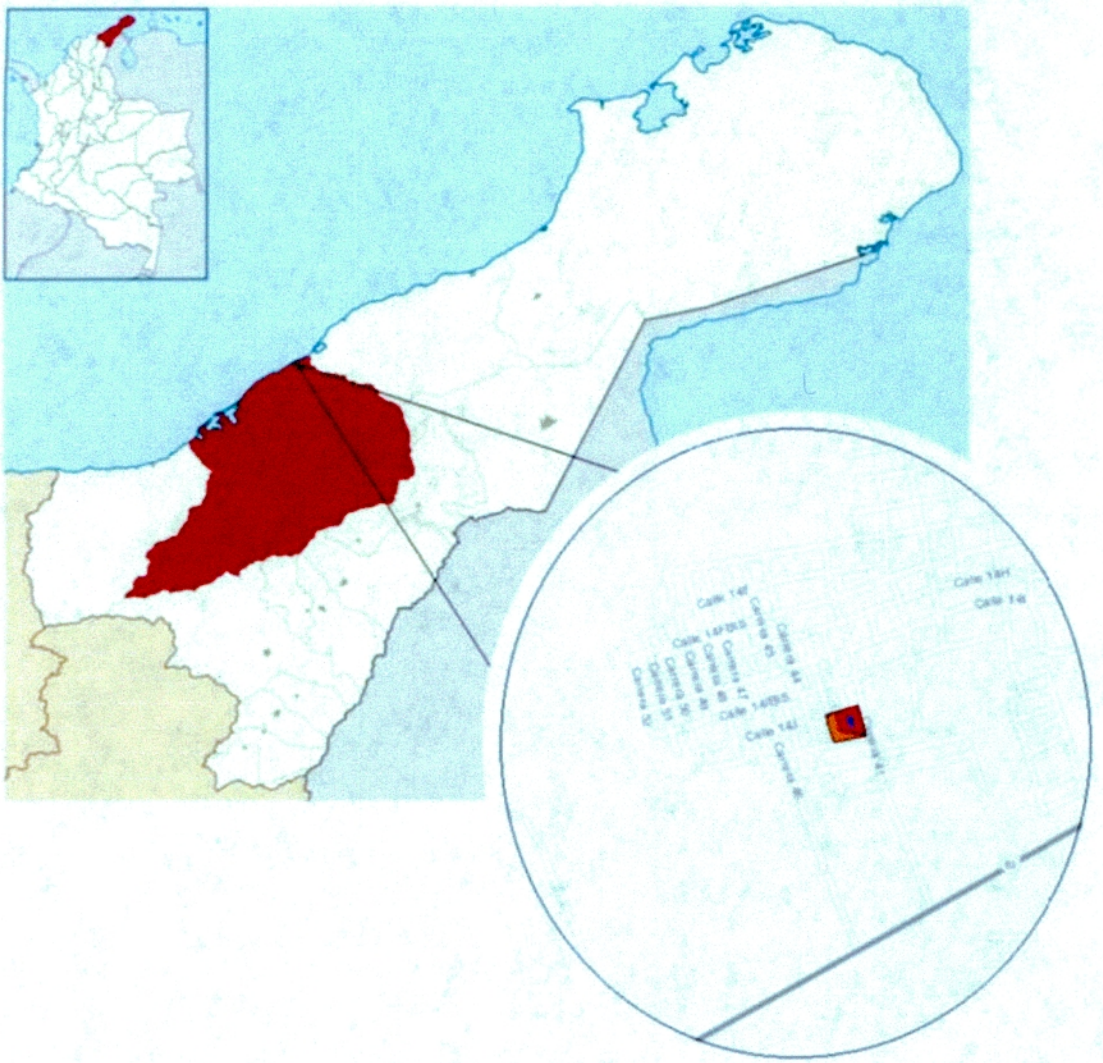

1.5 PRESUPUESTO CONTRATO DE ADICION No. 01 DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 370 DEL 2023

PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN CONTRATO ADICION No. 001 DE 2023					
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	3.854,18	$ 7.672,00	$ 29.569.268,96
1.1	CERRAMIENTO EN MADERA LISTON DE 4 X 2 " Y ZINC	M2	464,51	$ 74.946,00	$ 34.813.166,46
2	**DEMOLICION**				
2.1	DEMOLICION DE CONCRETO RIGIDO (INCLUYE RETIRO)	M3	40,50	$ 168.105,00	$ 6.807.677,46
2.2	DESMONTE DE EQUIPOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE (incluye retiro)	UND	10,00	$ 60.069,00	$ 600.690,00
2.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE MANUAL	M3	44,32	$ 56.120,00	$ 2.487.098,10
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA CON MALLA ESLABONADA CONTRA IMPACTOS	M2	144,32	$ 23.935,00	$ 3.454.299,20
2.5	DESMONTE DE ARCOS	UND	2,00	$ 257.634,00	$ 515.268,00
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
3.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0 - 2 M MANUAL	M3	45,25	$ 45.052,00	$ 2.038.603,00
3.2	RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL (SALTARIN/RANA)	M3	919,14	$ 209.745,00	$ 192.785.684,69
4	**OBRAS EN CONCRETO**				
4.1	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (15X25) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4", NO INCLUYE PREPARACIÓN DEL TERRENO	ML	669,15	$ 65.458,00	$ 43.801.220,70
4.2	BORDILLO EN CONCRETO IN SITU (0,40X0,15 m INCLUYE ACERO DE REF.)	ML	239,16	$ 186.550,00	$ 44.615.298,00
4.3	CONCRETO CICLOPEO (0,30X0,30m - 60%concreto - 40% canto rodado)	M3	16,47	$ 807.237,00	$ 13.295.193,39
4.4	RAMPA PARA DISCAPACITADOS E=10 CMS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, INC MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 CMS 4MM	M2	18,00	$ 119.135,00	$ 2.144.430,00
4.5	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	KG	1.189,84	$ 15.493,00	$ 18.434.191,12
4.6	PLACAS DE CONTRAPISO E=0.15 (3000PSI) (NO INCLUYE REF.)	M2	404,76	$ 177.703,00	$ 71.927.066,28
4.7	ANDENES EN CONCRETO DE 3.000 PSI E= 0.10 MTS, NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	148,23	$ 99.509,00	$ 14.750.219,07
4.8	CICLORUTA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= ,15 CM	M2	417,09	$ 177.703,00	$ 74.118.144,27
5	**ACABADO PARA PISOS**				
5.1	PISO EN LOSETA DE COLORES SEGÚN DISEÑO, PREFABRICADA DE CEMENTO TIPO IDU A50.	M2	662,43	$ 164.212,00	$ 108.778.955,16
5.2	PISO EN LOSETA TACTIL SEGÚN DISEÑO, PREFABRICADA DE CEMENTO TIPO IDU A50.	M2	53,90	$ 166.914,00	$ 8.996.998,428
5.3	MANTENIMIENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EXISTENTE	M2	855,73	$ 66.428,00	$ 56.844.432,44
5.4	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO SOLIDO	ML	599,30	$ 22.714,00	$ 13.612.500,20
6	**ACABADOS**				
6.1	PINTURA ANTIDESLIZANTE, ALTO TRAFICO, PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y CICLORUTA	M2	1.163,56	$ 54.365,00	$ 63.256.939,40
7	**SISTEMA ELECTRICO**				
7.1	SYLVANIA P25441-LED SOLAR INTEGRADA S40 6K	UND	36,00	$ 5.227.691,00	$ 188.196.876,00
7.2	SYLVANIA 0047716 FLOODLED 48 4500K WIDE 83.0 W 5329 lm 64.2 lm/W	UND	8,00	$ 2.549.448,00	$ 20.395.584,00
7.3	VARILLA DE COBRE COPER W 5/8" 2X44M	UND	5,00	$ 574.585,00	$ 2.872.925,00
7.4	POSTE DE 5,5M EN ACERO GALVANIZADO PINTADO-DOBLE BRAZO INCLUYE CIMENTACIÓN EN COCRETO DE 3000 PSI.	UND	18,00	$ 4.651.777,00	$ 83.731.986,00
7.5	Tablero Trifásico 12 Circuitos Totalizador	UND	1,00	$ 1.383.067,00	$ 1.383.067,00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB ALIMENTADOR EN 2N.10(F)+N.10(T) EN TUBERIA PVC DE 1).	ML	130,00	$ 80.405,00	$ 10.452.650,00

Asociacion de Trabajadores Independientes
Sol Guajiro
NIT: 900336801-0

8	**CARPINTERIA METALICA Y CUBIERTA**				
8.1	PORTERIA POLIFUNCIONAL 3" PINTADO EN ACEITE INCL TABLERO EN ACRILICO CON MARCO EN HIERRO AROS DE BASKET BALL CON SU MALLA	UND	2,00	$ 3.339.848,00	$ 6.679.696,00
8.2	CERRAMIENTOEN EN MALLAS ESLABONADA Y TUBOS METALICOS DE 3" MUROS PROTECTORES CANCHA. (según diseño)	M2	145,22	$ 444.644,00	$ 64.571.201,68
9	**MOBILIARIO URBANO Y VEGETACION**				
9.1	BANCAS EN CONCRETO	UND	20,00	$ 1.150.450,00	$ 23.009.000,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO RECREATIVO	UND	6,00	$ 8.362.575,00	$ 50.175.450,00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	UND	4,00	$ 3.216.375,00	$ 12.865.500,00
9.4	SUMINISTRO E INST. DE CANECA PARA BASURA EN ACEO INOXIDABLE TIPO IDU M-121	UND	8,00	$ 1.272.961,00	$ 10.183.688,00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL REF. SF010 DIM: 5,78*4,71*3,15MTS, INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 105.963.233,00	$ 105.963.233,00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL REF. 60143D DIM: 8*8*4MTS, INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 91.431.341,00	$ 91.431.341,00
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	1,00	$ 53.339.678,00	$ 53.339.678,00
9.8	ARENA PARA JUEGOS INFANTILES	M3	35,36	$ 89.775,00	$ 3.174.444,00
9.9	CAJA DE DESAGUE EN CONCRETO INCLUYE REJILLA Y TUBERIA DE 4"	UND	3,00	$ 246.813,00	$ 740.439,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA	**$ 1.536.814.103,00**
	PGIO				$ 20.573.350,00
	PMA				$ 29.927.270,00
	SUBTOTAL				$ 50.500.620,00
	SUBTOTAL OBRA (INCLUYE IVA)				$ 1.587.314.723,00
	VALOR TOTAL				**$ 1.587.314.723,00**

2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

2.1 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO

Se presenta en su orden: póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal del Contrato de Obra Pública No. 370 de 2023, amparado según pólizas No. 96-44-101183739 de Seguros Del Estado, a los cuatro (04) días de agosto del 2023. Cómo se detalla a continuación:

POLIZA	No.		FECHA DE EXPEDICÓN	VALOR ASEGURADO
	96-44-101183739		04-08-2023	$ 990,717,960.70
AMPAROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
VALOR ASEGURADO	$ 152,418,147.80	$ 76,209,073.90	$ 304,836,295.60	$ 457,254,443.40
VIGENCIA DESDE	04-08-2023	04-08-2023	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.	04-08-2023
VIGENCIA HASTA	30-06-2024	31-12-2026		30-06-2024

Se presenta en su orden: póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 370 de 2023, amparado según pólizas No. 96-40-101064713 de Seguros Del Estado, a los cuatro (04) días de agosto del 2023. Cómo se detalla a continuación:

POLIZA	No.		FECHA DE EXPEDICÓN	VALOR ASEGURADO
	96-40-101064713		04-08-2023	$ 232,000,000.00
AMPAROS	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	
VALOR ASEGURADO	$ 232,000,000.00	$ 232,000,000.00	$ 232,000,000.00	
VIGENCIA DESDE	04-08-2023	04-08-2023	04-08-2023	
VIGENCIA HASTA	31-12-2023	31-12-2023	31-12-2023	

Se presenta en su orden: póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal del Contrato de Obra Pública No. 370 de 2023, amparado según pólizas No. 96-44-101183739 de Seguros Del Estado, actualizada según Contrato de Adición No. 01 de 2023 al Contrato de Obra Pública No. 370 de 2023 a los cinco (05) días de octubre del 2023. Cómo se detalla a continuación:

POLIZA	No.		FECHA DE EXPEDICÓN	VALOR ASEGURADO
	96-44-101183739		05-10-2023	$ 1.031.754.569,95
AMPAROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
VALOR ASEGURADO	$ 158,731,472	$ 79,365,736.15	$ 317,462,944.60	$ 476,194,416.40
VIGENCIA DESDE	04-08-2023	04-08-2023	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.	04-08-2023
VIGENCIA HASTA	30-06-2024	31-12-2026		30-06-2024

2.2 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA OBRA						
NUMERO	**FECHA REGISTRO**	**UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA**	**DEPENDENCIA**	**FUENTE**	**RUBRO**	**VALOR**
86	2023-02-16	02-44001 MUNICIPIO DE RIOHACHA	02-4401 MUNICIPIO DE RIOHACHA	1.3.3.11.10 – R.R. RETIROS FONPET	2.3.2.02.02.005	$1.698.745.075,00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
NUMERO	**FECHA REGISTRO**	**UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA**	**DEPENDENCIA**	**FUENTE**	**RUBRO**	**VALOR**
2517	2023-07-26	02-44001 MUNICIPIO DE RIOHACHA	02-4401 MUNICIPIO DE RIOHACHA	1.3.3.11.10 – R.R. RETIROS FONPET	2.3.2.02.02.005	$1.698.745.075,00

2.3 INFORME FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA				
ANTICIPO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% TOTAL ANTICIPO
	23/08/2023	$1.524.181.478,00	$457.254.443	30%
ACTA PARCIAL No.	FECHA	VALOR ACTA PARCIAL	TOTAL PAGADO	% TOTAL PAGADO
1				

2.3.1 AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

INVERSIÓN PROGRAMADA	
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 332.793.044,04
INVERSIÓN EJECUTADA	$ 270.440.139,51
INVERSIÓN ACUMULADA	$ 1.587.314.723,00

2.3.2 FLUJO DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRAS
VR. CONTRATO INICIAL + ADICIÓN 01 DE 2023	$ 1.587.314.723,00
PORCENTAJE ANTICIPO (%)	30%
VR. ANTICIPO	$ 457.254.443,00
VR. ACTA 1	$ 905.400.030
VR. ACUMULADO	$ 1.587.314.723,00
VR. POR PAGAR	224.660.250,00

2.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se describen las actividades desarrolladas, semana a semana, durante la ejecución del contrato en el cuarto mes de ejecución.

MES 4	DEL 20 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.
SEMANA 1 20 – 27 de octubre de 2023	-SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO -SE REALIZA VACIADO DE BORDILLO DE 15X40 -SE REALIZA VACEADO DE RAMPAS EN CONCRETO -SE REALIZA VACEADO DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO E=0.15m -CONTINUA LA INSTALACION DE PISO EN LOSETAS
SEMANA 2 28 de octubre – 4 de noviembre de 2023	-SE REALIZA VACEADO DE RAMPAS EN CONCRETO -SE REALIZA VACEADO DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO E=0.15m -CONTINUA LA INSTALACION DE PISO EN LOSETAS -CONTINUA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO ESTAMPADO -CONTINUA ACTIVIDAD DE MALLAS ESLABONADA Y TUBOS METALICOS -CONTINUA ACTIVIDAD DE PINTURA ANTIDESLIZANTE -CONTINUA ACTIVIDAD DE JUNTAS DE DILATACION EN ASFALTO SOLIDO
SEMANA 3 5 – 12 de noviembre de 2023	-CONTINUA ACTIVIDAD DE PINTURA ANTIDESLIZANTE -CONTINUA LA INSTALACION DE PISO EN LOSETAS -CONTINUA LA INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA -CONTINUA LA INSTALACION DE POSTES PARA ILUMINACION
SEMANA 4 13 – 15 de noviembre de 2023	-SE REALIZA INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES -SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL -CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

Asociacion de Trabajadores Independientes
Sol Guajiro
NIT: 900336801-0

2.5 CORTE DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA

ACTA DE AVANCE MENSUAL


OBJETO: MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO VILLA CAMPO ALEGRE, EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

CONTRATISTA: ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO
AVANCE MES No.: AVANCE MES 4
CONTRATO DE OBRA No.: 370 de 2023
PERIODO: 20 OCTUBRE - 15 NOVIEMBRE 2023
VALOR DEL CONTRATO INICIAL + ADICION: $ 1.587.314.723 M.L.
AVANCE (%): 100%

PRESUPUESTO CONDICIONES INICIALES						PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN CONTRATO ADICION No. 001 DE 2023		ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 4			ACTIVIDADES ACUMULADAS		
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	**PRELIMINARES**												
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	4027,810	$ 7.672,00	$ 30.901.358,32	3.854,18	$ 29.569.268,96		$ 0,00	0%	3.854,18	$ 29.569.268,96	100%
1.1	CERRAMIENTO EN MADERA LISTON DE 4 X 2 " Y ZINC	M2	396,990	$ 74.946,00	$ 29.752.812,54	464,51	$ 34.813.166,46		$ 0,00	0%	464,51	$ 34.813.166,46	100%
2	**DEMOLICION**												
2.1	DEMOLICION DE CONCRETO RIGIDO (INCLUYE RETIRO)	M3	295,450	$ 168.105,00	$ 49.666.622,25	40,50	$ 6.807.677,46		$ 0,00	0%	40,50	$ 6.808.252,50	100%
2.2	DESMONTE DE EQUIPOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE (incluye retiro)	UND	10,000	$ 60.069,00	$ 600.690,00	10,00	$ 600.690,00		$ 0,00	0%	10,00	$ 600.690,00	100%
2.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE MANUAL	M3	44,318	$ 56.120,00	$ 2.487.098,10	44,32	$ 2.487.098,10		$ 0,00	0%	44,32	$ 2.487.126,16	100%
2.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA CON MALLA ESLABONADA CONTRA IMPACTOS	M2	144,320	$ 23.935,00	$ 3.454.299,20	144,32	$ 3.454.299,20		$ 0,00	0%	144,32	$ 3.454.299,20	100%
2.5	DESMONTE DE ARCOS	UND	2,000	$ 257.634,00	$ 515.268,00	2,00	$ 515.268,00		$ 0,00	0%	2,00	$ 515.268,00	100%
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
3.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0 - 2 M MANUAL	M3	49,360	$ 45.052,00	$ 2.223.766,72	45,25	$ 2.038.603,00		$ 0,00	0%	45,25	$ 2.038.603,00	100%
3.2	RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL (SALTARIN/RANA)	M3	360,643	$ 209.745,00	$ 75.643.102,19	919,14	$ 192.785.684,69		$ 0,00	0%	919,14	$ 192.785.684,69	100%
4	**OBRAS EN CONCRETO**												
4.1	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (15X25) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4", NO INCLUYE PREPARACIÓN DEL TERRENO	ML	614,050	$ 65.458,00	$ 40.194.484,90	669,15	$ 43.801.220,70		$ 0,00	0%	669,15	$ 43.801.220,70	100%
4.2	BORDILLO EN CONCRETO IN SITU (0,40X0,15 m INCLUYE ACERO DE REF.)	ML	180,080	$ 186.550,00	$ 33.593.924,00	239,16	$ 44.615.298,00	8,14	$ 1.518.517,00	3%	193,48	$ 36.093.694,00	81%
4.3	CONCRETO CICLOPEO (0,30X0,30m - 60%concreto - 40% canto rodado)	M3	16,210	$ 807.237,00	$ 13.085.311,77	16,47	$ 13.295.193,39	0,73	$ 589.283,01	4%	14,30	$ 11.543.489,10	87%
4.4	RAMPA PARA DISCAPACITADOS E=10 CMS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, INC MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 CMS 4MM	M2	36,000	$ 119.135,00	$ 4.288.860,00	18,00	$ 2.144.430,00	6,90	$ 822.031,50	38%	15,90	$ 1.894.246,50	88%
4.5	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	KG	1504,130	$ 15.493,00	$ 23.303.486,09	1.189,84	$ 18.434.191,12	282,33	$ 4.374.138,69	24%	1.382,33	$ 21.416.438,69	116%
4.6	PLACAS DE CONTRAPISO E=0.15 (3000PSI) (NO INCLUYE REF.)	M2	414,300	$ 177.703,00	$ 73.622.352,90	404,76	$ 71.927.066,28	55,27	$ 9.821.644,81	14%	450,27	$ 80.014.329,81	111%
4.7	ANDENES EN CONCRETO DE 3.000 PSI E= 0.10 MTS, NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	198,090	$ 99.509,00	$ 19.711.737,81	148,23	$ 14.750.219,07	27,98	$ 2.784.261,82	19%	157,02	$ 15.624.903,18	106%
4.8	CICLORUTA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= ,15 CM	M2	535,980	$ 177.703,00	$ 95.245.253,94	417,09	$ 74.118.144,27	18,30	$ 3.251.964,90	4%	421,98	$ 74.987.111,94	101%
5	**ACABADO PARA PISOS**												
5.1	PISO EN LOSETA DE COLORES SEGÚN DISEÑO, PREFABRICADA DE CEMENTO TIPO IDU A50.	M2	571,410	$ 164.212,00	$ 93.832.378,92	662,43	$ 108.778.955,16	25,75	$ 4.228.459,00	4%	655,75	$ 107.682.019,00	99%
5.2	PISO EN LOSETA TACTIL SEGÚN DISEÑO, PREFABRICADA DE CEMENTO TIPO IDU A50.	M2	66,032	$ 166.914,00	$ 11.021.665,248	53,90	$ 8.996.998,43	8,90	$ 1.485.534,60	17%	53,90	$ 8.996.664,60	100%
5.3	MANTENIMIENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EXISTENTE	M2	662,840	$ 66.428,00	$ 44.031.135,52	855,73	$ 56.844.432,44	194,44	$ 12.916.260,32	23%	799,44	$ 53.105.200,32	93%
5.4	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO SOLIDO	ML	148,620	$ 22.714,00	$ 3.375.754,68	599,30	$ 13.612.500,20	267,12	$ 6.067.363,68	45%	672,72	$ 15.280.162,08	112%

6	**ACABADOS**												
6.1	PINTURA ANTIDESLIZANTE, ALTO TRAFICO, PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y CICLORUTA	M2	1358,440	$ 54.365,00	$ 73.851.590,60	1.163,56	$ 63.256.939,40	189,38	$ 10.295.643,70	16%	1.195,38	$ 64.986.833,70	103%
7	**SISTEMA ELECTRICO**												
7.1	SYLVANIA P25441-LED SOLAR INTEGRADA S40 6K	UND	36,000	$ 5.227.691,00	$ 188.196.876,00	36,00	$ 188.196.876,00	36,00	$ 188.196.876,00	100%	36,00	$ 188.196.876,00	100%
7.2	SYLVANIA 0047716 FLOODLED 48 4500K WIDE 83.0 W 5329 lm 64.2 lm/W	UND	8,000	$ 2.549.448,00	$ 20.395.584,00	8,00	$ 20.395.584,00		$ 0,00	0%	8,00	$ 20.395.584,00	100%
7.3	VARILLA DE COBRE COPER W 5/8" 2X44M	UND	24,000	$ 574.585,00	$ 13.790.040,00	5,00	$ 2.872.925,00	1,00	$ 574.585,00	20%	5,00	$ 2.872.925,00	100%
7.4	POSTE DE 5,5M EN ACERO GALVANIZADO PINTADO-DOBLE BRAZO INCLUYE CIMENTACIÓN EN COCRETO DE 3000 PSI.	UND	20,000	$ 4.651.777,00	$ 93.035.540,00	18,00	$ 83.731.986,00	1,00	$ 4.651.777,00	6%	19,00	$ 88.383.763,00	106%
7.5	Tablero Trifásico 12 Circuitos Totalizador	UND	1,000	$ 1.383.067,00	$ 1.383.067,00	1,00	$ 1.383.067,00		$ 0,00	0%	1,00	$ 1.383.067,00	100%
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB ALIMENTADOR EN 2N.10(F)+N.10(T) EN TUBERIA PVC DE 1).	ML	130,000	$ 80.405,00	$ 10.452.650,00	130,00	$ 10.452.650,00		$ 0,00	0%	-	$ 0,00	0%
8	**CARPINTERIA METALICA Y CUBIERTA**												
8.1	PORTERIA POLIFUNCIONAL 3" PINTADO EN ACEITE INCL TABLERO EN ACRILICO CON MARCO EN HIERRO AROS DE BASKET BALL CON SU MALLA	UND	2,000	$ 3.339.848,00	$ 6.679.696,00	2,00	$ 6.679.696,00		$ 0,00	0%	2,00	$ 6.679.696,00	100%
8.2	CERRAMIENTOEN EN MALLAS ESLABONADA Y TUBOS METALICOS DE 3" MUROS PROTECTORES CANCHA. (según diseño)	M2	145,220	$ 444.644,00	$ 64.571.201,68	145,22	$ 64.571.201,68	42,42	$ 18.861.798,48	29%	156,42	$ 69.551.214,48	108%
9	**MOBILIARIO URBANO Y VEGETACION**												
9.1	BANCAS EN CONCRETO	UND	20,000	$ 1.150.450,00	$ 23.009.000,00	20,00	$ 23.009.000,00		$ 0,00	0%	20,00	$ 23.009.000,00	100%
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO RECREATIVO	UND	6,000	$ 8.362.575,00	$ 50.175.450,00	6,00	$ 50.175.450,00		$ 0,00	0%	6,00	$ 50.175.450,00	100%
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	UND	4,000	$ 3.216.375,00	$ 12.865.500,00	4,00	$ 12.865.500,00		$ 0,00	0%	4,00	$ 12.865.500,00	100%
9.4	SUMINISTRO E INST. DE CANECA PARA BASURA EN ACEO INOXIDABLE TIPO IDU M-121	UND	8,000	$ 1.272.961,00	$ 10.183.688,00	8,00	$ 10.183.688,00		$ 0,00	0%	8,00	$ 10.183.688,00	100%
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL REF. SF010 DIM: 5,78*4,71*3,15MTS, INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,000	$ 105.963.233,00	$ 105.963.233,00	1,00	$ 105.963.233,00		$ 0,00	0%	1,00	$ 105.963.233,00	100%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL REF. 60143D DIM: 8*8*4MTS, INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,000	$ 91.431.341,00	$ 91.431.341,00	1,00	$ 91.431.341,00		$ 0,00	0%	1,00	$ 91.431.341,00	100%
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	1,000	$ 53.339.678,00	$ 53.339.678,00	1,00	$ 53.339.678,00		$ 0,00	0%	1,00	$ 53.339.678,00	100%
9.8	ARENA PARA JUEGOS INFANTILES	M3	34,140	$ 89.775,00	$ 3.064.918,50	35,36	$ 3.174.444,00		$ 0,00	0%	35,00	$ 3.142.125,00	99%
9.9	CAJA DE DESAGUE EN CONCRETO INCLUYE REJILLA Y TUBERIA DE 4"	UND	3,000	$ 246.813,00	$ 740.439,00	3,00	$ 740.439,00		$ 0,00	0%	3,00	$ 740.439,00	100%
	PGIO	UND	1,000	$ 20.573.350,00	$ 20.573.350,00	1,00	$ 20.573.350,00			0%	-	$ 20.573.350,00	100%
	PMA	UND	1,000	$ 29.927.270,00	$ 29.927.270,00	1,00	$ 29.927.270,00			0%	-	$ 29.927.270,00	100%
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA	**$ 1.524.181.475,87**		**$ 1.587.314.723,00**		**$ 270.440.139,51**			**$ 1.587.314.723,00**	
									% EJECUTADO MES 4	**17,04%**		**% EJECUTADO ACUMULADO**	**100%**

2.6 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS AVANCE DE OBRA EJECUTADO GENERAL DE LA OBRA

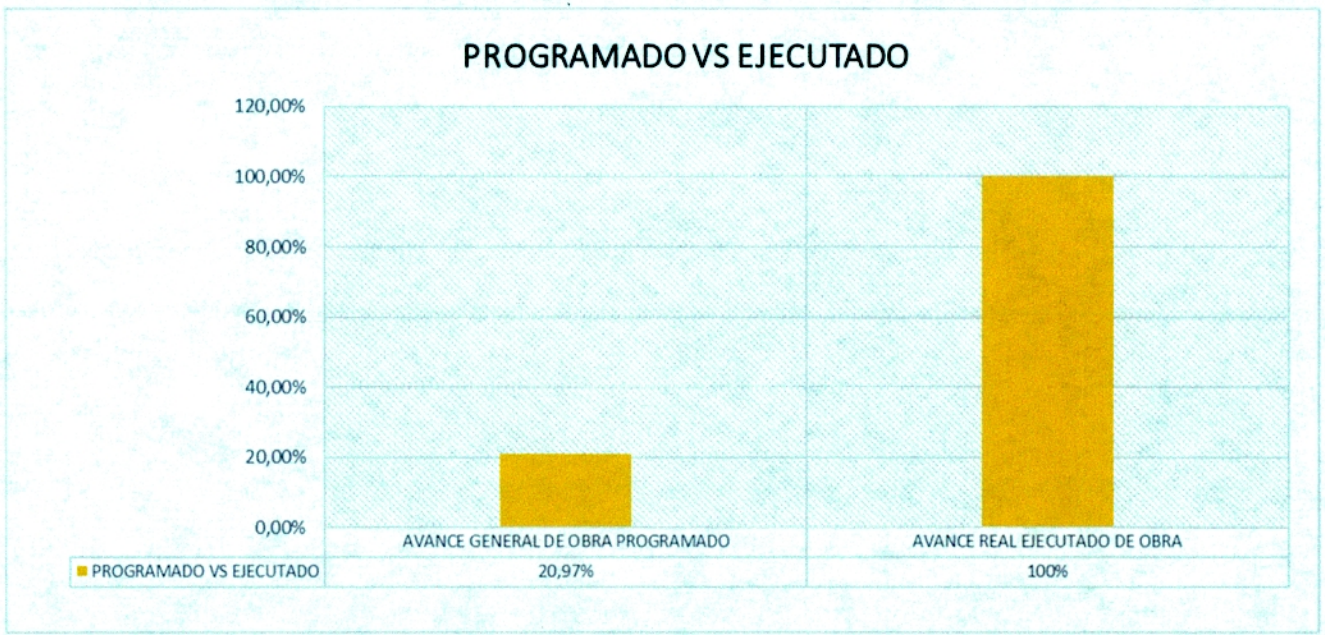


Observaciones:

Según programación actualizada según acta de inicio, el proyecto debería estar veinte coma noventa y siete por ciento (20,97%) de ejecución, luego de realizar el respectivo análisis de las actividades ejecutadas, la obra presenta un avance del cien por ciento (100%), avance con el que se culmina la ejecución de la obra a satisfacción.


2.7 AVANCE FISICO GENERAL POR ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Ejecución actividades del Capítulo del 1 al 4

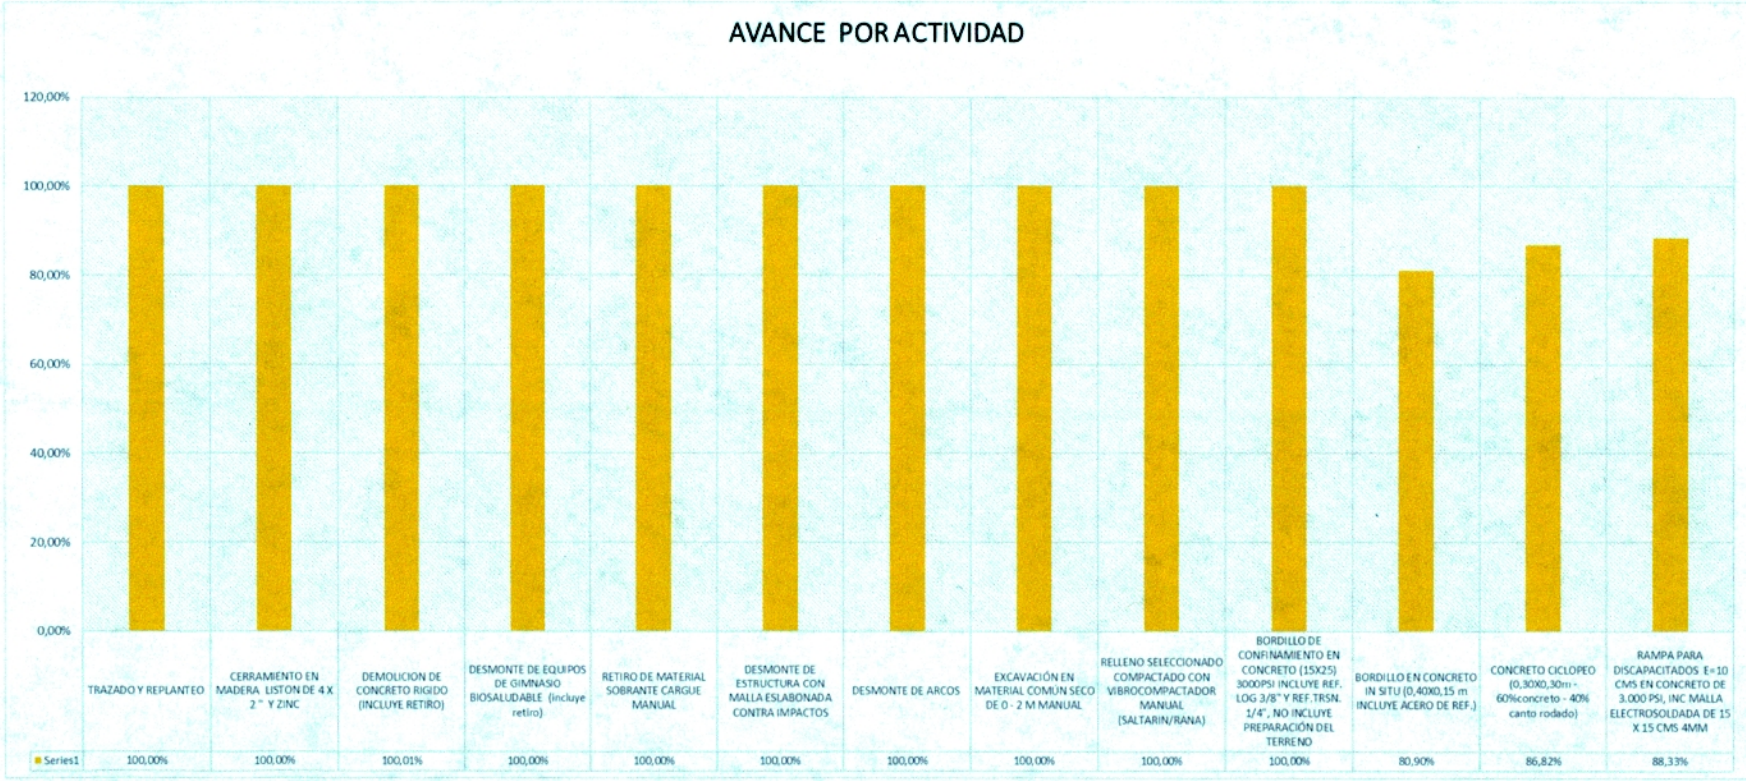


- TRAZADO Y REPLANTEO : 100,00%
- CERRAMIENTO EN MADERA LISTON DE 4 X 2 " Y ZINC: 100,00%
- DEMOLICION DE CONCRETO RIGIDO (INCLUYE RETIRO): 100,01%
- DESMONTE DE EQUIPOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE (incluye retiro): 100,00%

- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE MANUAL: 100,00%
- DESMONTE DE ESTRUCTURA CON MALLA ESLABONADA CONTRA IMPACTOS: 100,00%
- DESMONTE DE ARCOS : 100,00%
- EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0 - 2 M MANUAL: 100,00%
- RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL (SALTARIN/RANA): 100,00%
- BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (15X25) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4", NO INCLUYE PREPARACIÓN DEL TERRENO: 100,00%
- BORDILLO EN CONCRETO IN SITU (0,40X0,15 m INCLUYE ACERO DE REF.): 80,90%
- CONCRETO CICLOPEO (0,30X0,30m - 60%concreto - 40% canto rodado): 86,82%
- RAMPA PARA DISCAPACITADOS E=10 CMS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, INC MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 CMS 4MM: 88,33%
- MALLA ELECTROSOLDADA 4MM: 116,18%
- PLACAS DE CONTRAPISO E=0.15 (3000PSI) (NO INCLUYE REF.): 111,24%
- ANDENES EN CONCRETO DE 3.000 PSI E= 0.10 MTS, NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO: 105,93%
- CICLORUTA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= ,15 CM: 101,17%

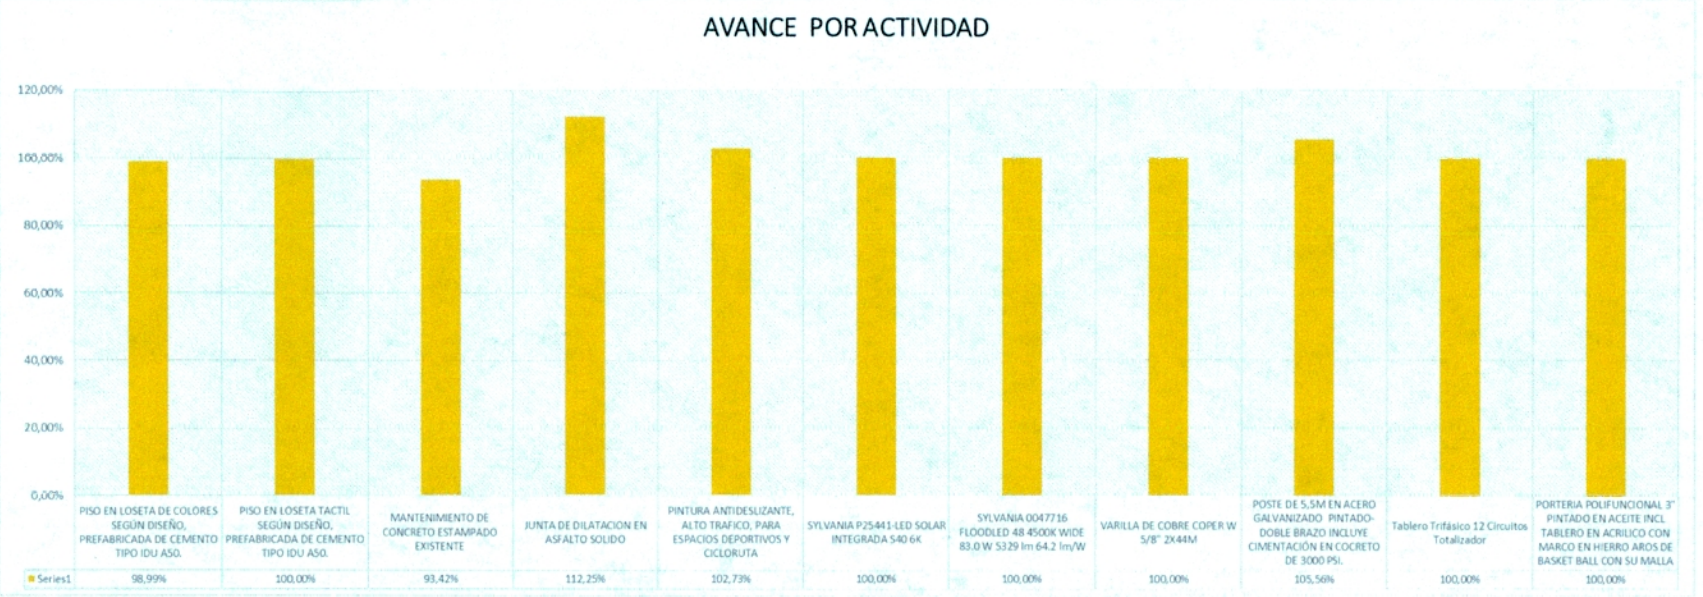

- PISO EN LOSETA DE COLORES SEGÚN DISEÑO, PREFABRICADA DE CEMENTO TIPO IDU A50.: 98,99%
- PISO EN LOSETA TACTIL SEGÚN DISEÑO, PREFABRICADA DE CEMENTO TIPO IDU A50.: 100,00%
- MANTENIMIENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EXISTENTE : 93,42%
- JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO SOLIDO: 112,25%
- PINTURA ANTIDESLIZANTE, ALTO TRAFICO, PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y CICLORUTA: 102,73%
- SYLVANIA P25441-LED SOLAR INTEGRADA S40 6K: 100,00%
- SYLVANIA 0047716 FLOODLED 48 4500K WIDE 83.0 W 5329 lm 64.2 lm/W: 100,00%
- VARILLA DE COBRE COPER W 5/8" 2X44M: 100,00%
- POSTE DE 5,5M EN ACERO GALVANIZADO PINTADO-DOBLE BRAZO INCLUYE CIMENTACIÓN EN COCRETO DE 3000 PSI.: 105,56%
- Tablero Trifásico 12 Circuitos Totalizador: 100,00%
- PORTERIA POLIFUNCIONAL 3" PINTADO EN ACEITE INCL TABLERO EN ACRILICO CON MARCO EN HIERRO AROS DE BASKET BALL CON SU MALLA: 100,00%

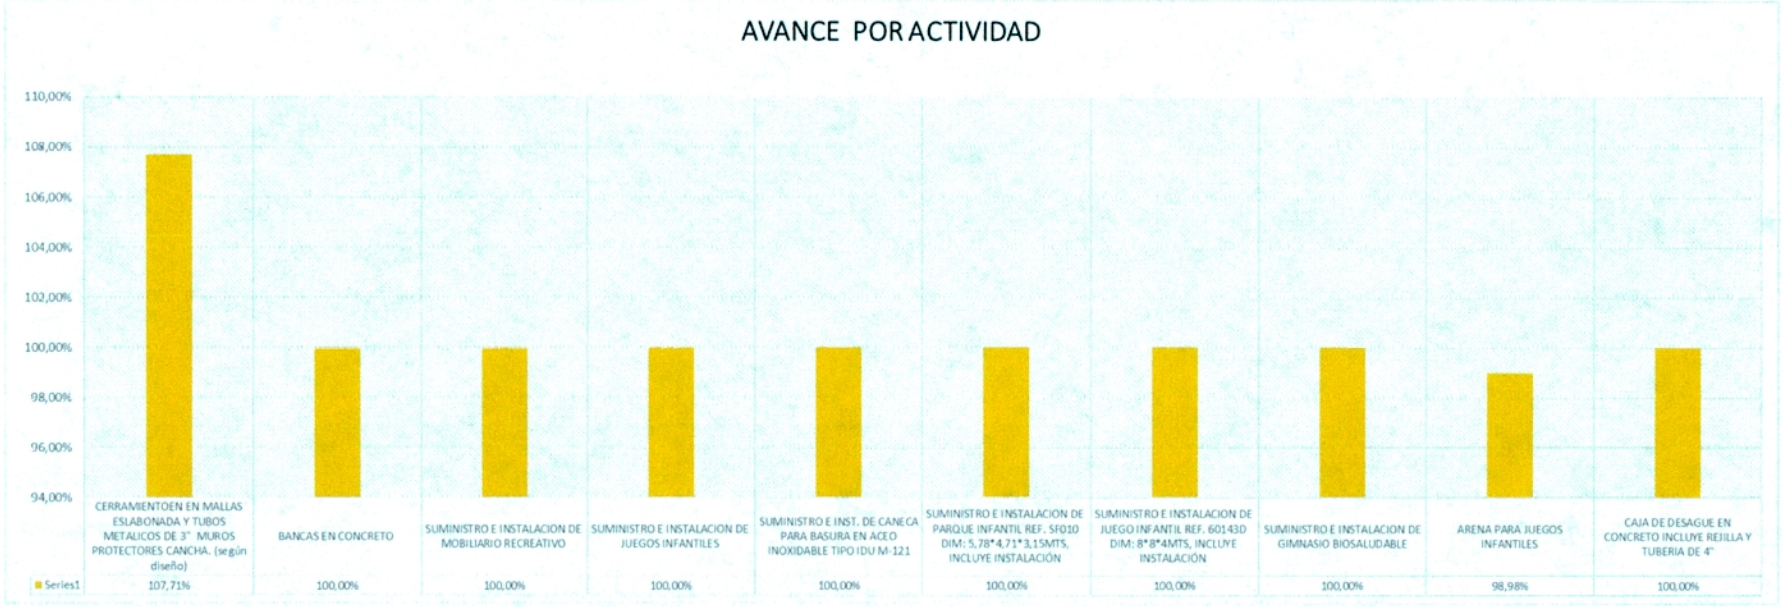

- CERRAMIENTOEN EN MALLAS ESLABONADA Y TUBOS METALICOS DE 3" MUROS PROTECTORES CANCHA. (según diseño):. 107,71%
- BANCAS EN CONCRETO: 100,00%
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO RECREATIVO : 100,00%
- SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES: 100,00%
- SUMINISTRO E INST. DE CANECA PARA BASURA EN ACEO INOXIDABLE TIPO IDU M-121: 100,00%
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL REF. SF010 DIM: 5,78*4,71*3,15MTS, INCLUYE INSTALACIÓN : 100,00%
- SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL REF. 60143D DIM: 8*8*4MTS, INCLUYE INSTALACIÓN : 100,00%
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIO BIOSALUDABLE:: 100,00%
- ARENA PARA JUEGOS INFANTILES: 98,98%
- CAJA DE DESAGUE EN CONCRETO INCLUYE REJILLA Y TUBERIA DE 4": 100,00%

2.7.1 AVANCE DE OBRA

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA				
INF. No.	FECHA		% DE AVANCE PARCIAL	% DE AVANCE ACUMULADO
	DEL	AL		
1	04-08-2023	03-09-2023	12,77%	12,77%
2	04-09-2023	03-10-2023	20,04%	32,30%
3	04-10-2023	19-10-2023	48,57%	81%
4	20-10-2023	15-11-2023	19%	100%

3. SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

3.1 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ITEM	ACTIVIDAD	DEFICIENTE	REGULAR	ACEPTABLE	BUENO
1	BOTAS				X
2	CASCOS				X
3	GUANTES				X
4	CAMISA Y PANTALON				X
5	GAFAS				X

OBSERVACIONES: El contratista está cumpliendo con lo establecido en la ley 1562 del 11 de Julio de 2012 y lo establecido en la NTC – OHSAS 18001:2007, en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional, suministrándole al personal en obra los elementos de protección personal.

4. EQUIPOS EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: Los equipos se encuentran en buen estado.

TIPO Y CARACTERISTICA DEL QUIPO	NUMERO DE EQUPOS.
VOLTEOS 15m3	2
VIBRO COMPACTADOR	1
MINI CARGADOR TIPO BOBCAT	1

5. PERSONAL EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO
NEFER FUMINAYA	1.146.438.771	Residente de obra
JAIME OROZCO GUTIERREZ	17.901.645	Director de obra
SAMIRA VANESSA RODRIGUEZ COTES	40.944.647	Residente social

OBSERVACIONES: El equipo profesional presentado por el contratista está acorde con lo requerido para la ejecución del proyecto.

Responsable,

BIANKA FORERO CARRILLO
C.C. 1.124.484.211 DE URIBIA
Rep. Legal UT INTERELECTRICA RIOBAR

6. ANEXOS

6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL



Instalación de parque recreativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL



Instalación de Gimnasio Biosaludable

REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL



Instalación de juegos infantiles




REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL



Instalación de juegos infantiles


REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL

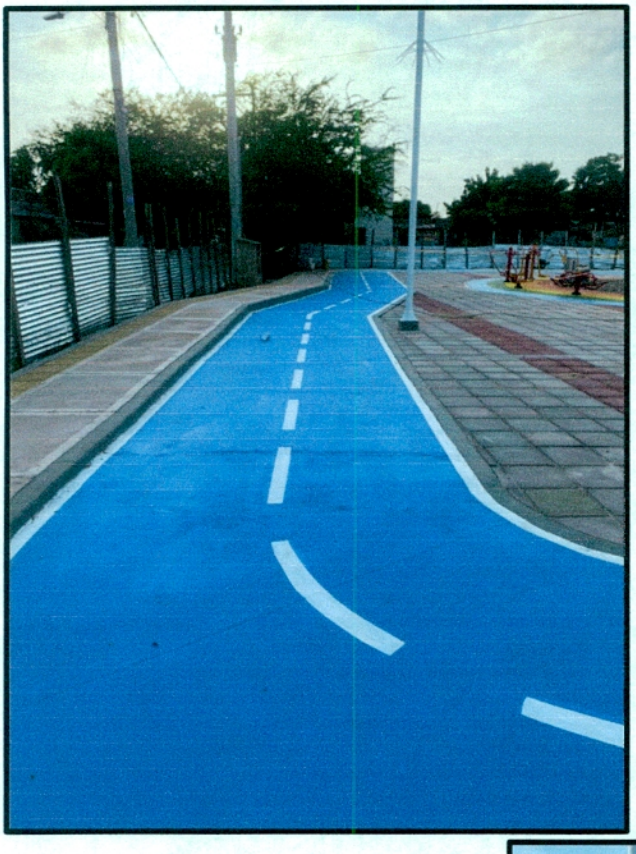

Construcción de ciclorruta



REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL

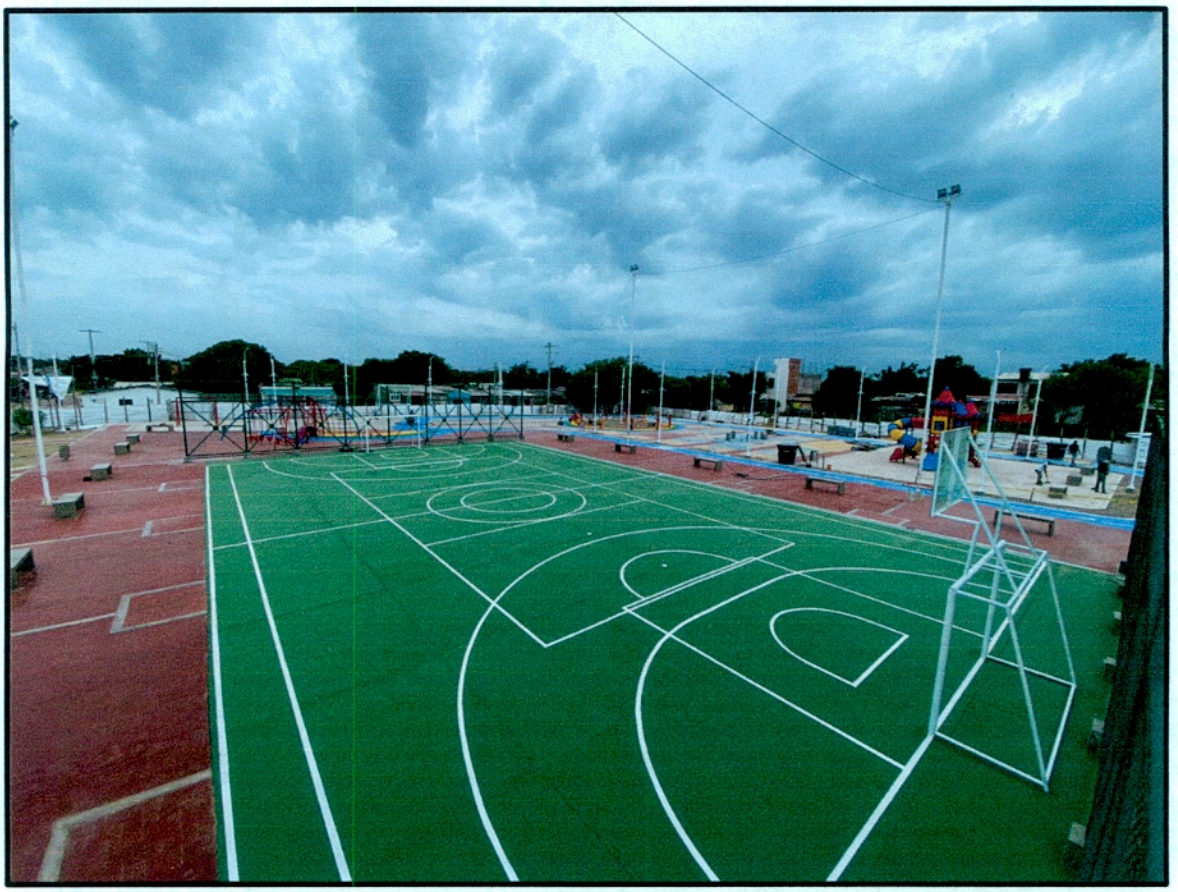

Adecuación y mejoramiento de cancha de futbol

CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS Y SERVICIOS BIBC S.A.S
NIT 901.349.121-0
CL 2 No. 8 08
Tel: (605) 3014373959
Riohacha - Colombia
seguridadsocialBIBCS.A.S@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 1

Señores	ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO		
NIT	900.336.801-0	**Teléfono**	(605) 99999999 - Ext. 000
Dirección	CL 21 9A 44	**Ciudad**	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2023, 11:37
Expedición	30/11/2023, 12:04
Vencimiento	30/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA	3.00	5,400,000.00
2	Transporte especializado de residuos peligrosos - Solidos (EPS) - VOLQUETA DE 10 M3	23.00	8,050,000.00
3	Sub programa de control de Erosion y sedimentos	3.00	900,000.00
4	Sub programa de control de Polvo y emisiones	5.00	1,500,000.00
5	Sub programa de control de ruidos	6.00	1,800,000.00
6	Señalización temporal durante la fase de construcción (Areas auxiliares	40.00	2,000,000.00
7	Señalización temporal (Preventiva en zona escolar durante fase de construcción	6.00	210,000.00
8	Residuos	6.00	150,000.00
9	UTILIDAD 3%	1.00	714,357.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Veinte millones setecientos veinticuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	20,610,300.00
IVA 19%	114,057.00
Total a Pagar	20,724,357.00

Condiciones de Pago:
Otros $ 20,724,357.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060642137 aprobado en 20231126 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Meses** - Actividad Económica 6522 Servicios de seguros sociales en riesgos laborales Tarifa
CUFE: ceb4652f14ece6572aa24f8c5b9d56b965c1408f39af02581d919985f7eb987c8547800587a48b36ef60c3c7ceb6ad5e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



BREEGSON S.A.S.
NIT 901.223.183-9
CR 4A 33 18
Tel: (605) 3008399983
Riohacha - Colombia
josegutierrezv17@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 2

Señores	ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE SOL GUAJIRO		
NIT	900.336.801-0	**Teléfono**	(605) 999999 - Ext. 000
Dirección	CL 21 9A 44	**Ciudad**	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2023, 20:42
Expedición	30/11/2023, 12:07
Vencimiento	29/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Monitoreo de la calidad del agua	40.00	200,000.00
2	Monitoreo de la calidad del aire	15.00	150,000.00
3	Monitoreo de ruidos	15.00	120,000.00
4	Al personal de obra	8.00	6,000,000.00
5	A la población local	2.00	1,500,000.00
6	Al personal profesional y tecnico	8.00	6,000,000.00
7	Fumigación cada 2 meses - Solo Campamento	3.00	360,000.00
8	Implementacion de control sanitario (Trampas y ahuyentadores de roedores)	4.00	375,000.00
9	Equipos de primeros auxilios y de socorro, incluye camilla.	5.00	1,350,000.00
10	Señalización preventiva y equipos contra incendio	5.00	750,000.00
11	Equipos para derrames de sustancia químicos	1.00	150,000.00
12	Suministro y colocación o preparación de capa superficial de suelo	13.00	455,000.00
13	Acondicionamiento del material excedente	5.00	37,270.00
14	Readecuación ambiental del campamento	8.00	480,000.00
15	Readecuación ambiental del patio de maquinas	8.00	400,000.00
16	Señal informativa ambiental	40.00	2,400,000.00
17	Estructura de soporte de señales	40.00	1,200,000.00
18	Estructura de soporte de señales Tipo E-1	40.00	1,000,000.00
19	Estructura de soporte de señales Tipo E-2	40.00	1,000,000.00
20	ESPECIALISTA AMBIENTA	3.00	4,968,423.00
21	UTILIDAD 3%	1.00	1,031,576.49

Total items: 21

Total Bruto	29,762,564.00
IVA 19%	164,705.49
Total a Pagar	29,927,269.49

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos veintisiete mil doscientos sesenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 29,927,269.49

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
