INFORME SUPERVISION N° 2

DIRECCION TECNICA EDTB

CONTRATO: 033 - 2023

FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	N° 033-2023
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	NIT 901254279-6
OBJETO DEL CONTRATO	RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.514.300.088,00 INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2023
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VALOR COBRADO EN ACTA DE COBRO No. 02	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($345.244.236,96).
SALDO DEL CONTRATO	DOS MIL QUINIENTOS VEINTISITE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($2.527.468.173,29)
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	SEIS (6) DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR A CANCELAR ($)
	$ 345.244.236,96

b) VALOR ANTICIPO: $0

VALOR A PAGAR ACTA #2: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 345.244.236,96).

CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	Dentro del plan de desarrollo 2020-2023 "EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS", se tiene como prioridad la ejecución de obras que permitan garantizar y mejorar el uso del espacio público promoviendo un ambiente sano para la población con conciencia ambiental y espacios adecuados y aptos para ser habitados.
OPORTUNIDAD	Con esta intervención se busca fortalecer las condiciones de los espacios públicos con el objetivo de fomentar y promover las prácticas recreativas y deportivas. El alcance de este proyecto consiste en la Recuperación urbanística del parque principal del barrio Las Delicias, se encontrará ubicado en el zona urbana de El Municipio de el Bagre en el Barrio Las Delicias, el cual contará con la instalación de juegos infantiles, suministro y construcción de bancas, suministro de equipamiento de, andenes, senderos, banca, luminarias, cubiertas metálica.
CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplen con el objetivo planteado en el estudio previo y las condiciones técnicas mínimas exigidas.
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, maquinaria pesada (retroexcavadora), equipos y herramienta menor.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación
Se firma el 6 de septiembre de 2023

Doiver Nisperuza

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
C.C. 8.364.481
Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

ACTA LITERAL

ACTA DE AVANCE OBRA
PUBLICA N° 2

CONTRATO	033-2023
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) (901.526.561-7)
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.
OBJETO:	RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
VALOR:	TRES MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.514.300.088,00 INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ (Director Técnico)
PLAZO	OCHO (08) MESES
ACTA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en el municipio de El Bagre **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, Director Técnico en calidad de Supervisor de la Obra, **JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA**, representando a **CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.**, calidad de contratista, **JORGE ELICER MORALES ALEMAN**, representando a **INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.**, calidad de interventora, con el propósito de suscribir ACTA DE AVANCE NUMERO DOS del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades reportadas (verificar acta de cobro numérica No. 02), el porcentaje financiero equivalente al valor del acta corresponde al 9.82% tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual que refleja las siguientes condiciones de pago:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.514.300.088,00
VALOR ANTICIPO (0,0%):	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 2:	$ 345.244.236,96
VALOR A AMORTIZAR POR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N° 2:	$ 345.244.236,96

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($345.244.236,96).

Valor que corresponde a un avance del 9.82%.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los 6 días del mes septiembre del 2023.

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN
R.L. ISC S.A.S.
Supervisor

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
R.L. CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.
Contratista

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TECNICO
Supervisor

Intervinieron en el Documento:

Firma: Doiver Nisperuza.	**Firma:** Doiver Nisperuza
Elaboró Doiver Nisperuza **Cargo**: Director Técnico	**Elaboró** Doiver Nisperuza **Cargo**: Director Técnico

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.



CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

CONTRATO NO. 033-2023, OBJETO: "RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

INFORME DE OBRA No.02

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

16 DE JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
1.1. LOCALIZACION 3
1.2. UBICACION DEL PROYECTO 4
2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 5
2.1. DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS 5
3. NOVEDADES Y ESTADO ACTUAL OBRA 6
4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES 6
5. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 6
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
7. CONDICIONES CLIMÁTICAS 8
8. USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 8
9. RELACIÓN DE PERSONAL 9
9.1. % AVANCE DE OBRA EJECUTADO 9
10. CONCLUSIONES 10
11. REGISTRO FOTOGRAFICO 11
¡Error! Marcador no definido.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**, contará con la construcción de parque adaptado para el uso de la comunidad al aire libre, sendero peatonal, construcción de estancias.

Finalmente, con el fin de implementar el cuidado del medio ambiente y la disposición adecuada de los residuos, se adaptará basurera pivotante en acero inoxidable 304, en estructura metálica según norma ASTM A536 65 45-1.

1.1. LOCALIZACION



Ilustración 1 Departamento de Antioquia



Ilustración 2 Municipio de el Bagre


El municipio del Bagre, está situado en el departamento de Antioquia, Su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital Medellín. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca. Presenta las siguientes coordenadas geográficas: 7°36'17" de latitud norte y 74°48'31" de longitud oeste, el municipio hace parte de la subregión del Bajo Cauca y presenta una temperatura media de 37°C.

Limita por el norte con el municipio de Nechí, por el sur con el municipio de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el Departamento de Bolívar y por el occidente con el municipio de Caucasia y Zaragoza. Está constituido territorialmente por dos corregimientos: Puerto Claver y Puerto López y por 53 veredas.
El municipio posee gran riqueza hídrica; por su territorio cruza el río Nechí, el cual nace en el municipio de Yarumal, tiene una longitud de 270 km hasta desembocar en el río Cauca. Sus principales cuencas son la de los ríos Tigüi y Amacerí y las quebradas Villa, Santa Isabel, El Guamo y San Pedro (PBOT, 2009).
Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, según censo de población de 2018, el municipio tiene 51.862 habitantes, en la zona urbana se encuentran 32.823, y los restantes 19.039 habitantes en zona rural.

1.2. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto de obra **"RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**, se encuentra dentro de la región Andina, ubicado en el municipio de El Bagre, el alcance de dicho contrato es construcción de un parque que se encontrará ubicado en el zona urbana, con un área de 3.928 m2 en los cuales se contempla juegos infantiles, mobiliario como bancas y mesas, equipamiento de gimnasio, cubierta metálica, andenes, zonas duras, zonas verdes, iluminación.

Ilustración 3 Localización del proyecto (fuente: google earth)

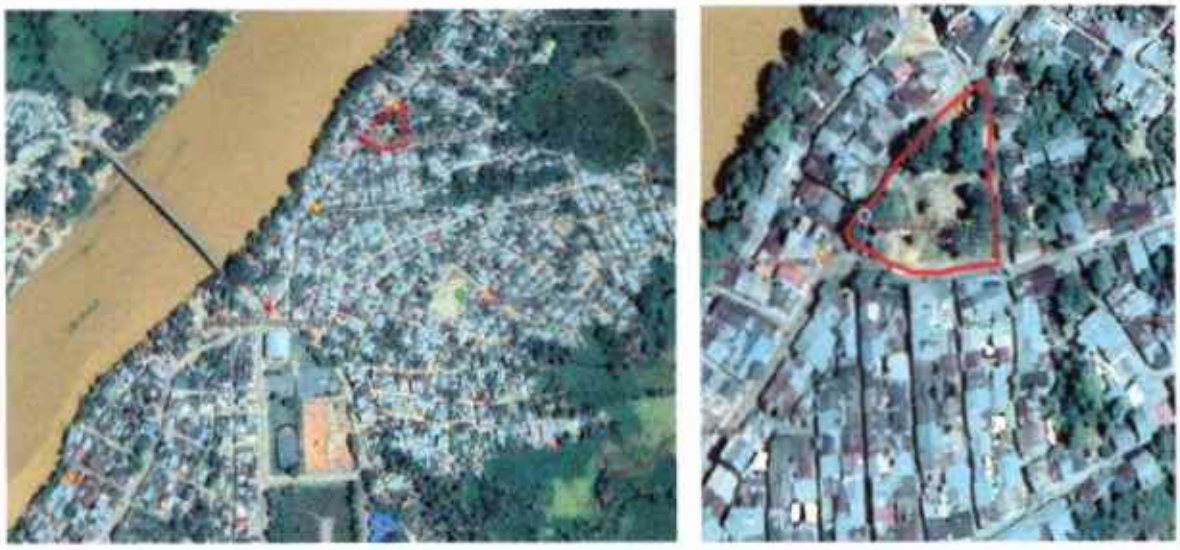

2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION CONTRATO DE OBRA	
No.	033 - 2023
Objeto del Contrato	RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
Valor del contrato de obra	TRES MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.514.300.088,00)
CDP	
RP	
RUBRO	
Fecha de Suscripción del contrato	
Empresa	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB

2.1. DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No. 53-44-101022701
ANEXO: 0 Y 1
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 63.650.449,60	19/09/2022	21/05/2023
PRESTACIONES SOCIALES	$ 31.825.244,80	19/09/2022	19/11/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 95.475.671,40	Vigencia de 5 años a partir de la fecha de entrega y recibo de la obra frutos del contrato	

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PÓLIZA No. 53-40-101007718
ANEXO: 00
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$200.000.000,00	19/09/2022	19/11/2022
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$200.000.000,00	19/09/2022	19/11/2022
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$200.000.000,00	19/09/2022	19/11/2022
PATRONAL	$200.000.000,00	19/09/2022	19/11/2022
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$200.000.000,00	19/09/2022	19/11/2022
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$200.000.000,00	19/09/2022	19/11/2022

3. NOVEDADES Y ESTADO ACTUAL OBRA

En la zona a intervenir se identifica terreno ondulado con vegetación baja, maleza y arborización y estructuras existentes.

4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES

El contratista de obra realiza recorrido en el parque a intervenir junto con la interventoría, se realiza revisión de cada uno de los ítems estipulados contractualmente en el presupuesto de obra.

5. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2023 hasta el 15 de agosto de 2023, el contratista de obra ejecutó los siguientes ensayos de laboratorio.

FECHA	ENSAYO DE LABORATORIO	
Agosto 2023	DENSIDADES	Se adjunta en PDF ensayos de laboratorio ejecutados para el periodo anteriormente mencionado.
	PROCTOR	

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Localización y Replanteo

- EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo a cualquier profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.

- LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

- SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

- Colocación de ADOQUÍN 10 x 20 x 8. Color café, Para un ancho de 0.20m. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, suministro e instalación de manto impermeabilizante de 3 mm con traslapo de 10 cm en ambos lados y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

- CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO DE 1500 PSI. Incluye el suministro y el transporte del concreto, formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo.

- CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4000 PSI. Incluye el suministro y el transporte del concreto, formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo.

- CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA de soporte de cubierta en acero estructural ASTM A36, ASTM A572, ASTM A500Gr

- CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE 3000 PSI. Incluye el suministro y el transporte del concreto, formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo.

- suministro y construcción de muro de contención en bloque de concreto 15X20X40 e=15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno.

- Se realizan charlas y/o capacitaciones al personal de obra, por parte del profesional ambiental en la zona a intervenir, tratando temas relacionados con el componente socioambiental.

7. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante el presente periodo comprendido entre el 16 de julio de 2023 hasta el 15 de agosto de 2023, se presenta clima soleado con presencia de lluvias que no generan atraso en la ejecución de las actividades de obra.

8. USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo actual comprendido entre el 16 de julio de 2023 hasta el 15 de agosto de 2023, se presenta la descripción de la maquinaria, equipo y herramienta menor, utilizada en el presente periodo en campo para la ejecución de las actividades programadas del proyecto de obra:

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTA MENOR	CANTIDAD
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL)	1
MEZCLADORA	1
RETROEXCAVADORA	1
VOLQUETAS	2
VIBROCOMPACTADOR	1
EQUIPO DE SOLDADURA	1
TALADRO	1
HERRAMIENTA MENOR (PALAS, PICAS, CARRETAS, MARTILLO, TALADRO, ETC)	1

9. RELACIÓN DE PERSONAL

Para el presente periodo, se cuenta la siguiente relación de personal en el cual se evidencia mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de las actividades de obra.

RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA	
MANO DE OBRA CALIFICADA	**MANO DE OBRA NO CALIFICADA**
ING. DIRECTOR (01)	MAESTRO (01)
ING. RESIDENTE DE OBRA (01)	OFICIAL (02)
	AYUDANTES DE OBRA (12)
SECRETARIA (01)	RECEPCIONISTA (01)
CONTADOR (01)	ALMACENISTA (01)
	VIGILANTE (01)

9.1. % AVANCE DE OBRA EJECUTADO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO	$ 3.514.300.088,00
VALOR ADICION	$00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 3.514.300.088,00

VALOR ACTA No. 01	$	641.587.677,75
TOTAL A COBRAR	$	641.587.677,75
PORCENTAJE EJECUTADO		18.26%

VALOR ACTA No. 02	$	345.244.236,96
TOTAL A COBRAR	$	345.244.236,96
PORCENTAJE EJECUTADO		9.82%

Tabla 1. Datos generales Proyecto

10. CONCLUSIONES

El día 16 de junio de 2022; es firmada acta de inicio para el contrato de obra, por medio del presente informe se presenta el avance de las actividades ejecutadas para el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 hasta el 15 de julio de 2023. Se realiza actividad de suministro e instalación de valla informativa del contrato de obra.

De acuerdo a lo descrito en el capítulo anterior, el proyecto lleva un avance del 28.08%, cumpliendo con la ejecución de las actividades programada. Se infiere que, a la fecha se cuenta con un porcentaje de rendimiento favorable, ya que el contratista de obra ha ejecutado a cabalidad las actividades de obra, demostrando un rendimiento eficiente.

Para el presente periodo se avanza en la ejecución de las siguientes actividades de obra: Se realiza localización, trazado y replanteo topográfico en terreno natural, excavación manual, suministro e instalación de bordillo prefabricado, suministro e instalación de prefabricado adoquín, construcción de muro de contención, construcción de zapatas en concreto y construcción de estructura metálica para cubierta.

Se realiza comité de seguimiento de obra

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO































DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

INFORME No 2
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA-PGIO
CONTRATO DE OBRA No: 033 DE 2023

OBJETO:
RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA.".

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

INTERVENTORÍA:
INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.

AGOSTO DE 2023

INTRODUCCIÓN

La **CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.** ha elaborado el informe No 2, sobre la implementación del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) de la obra cuyo objeto es la **RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA,** donde presenta detalladamente las actividades realizadas en el periodo comprendido del 16 de julio hasta el 15 de agosto del presente año con su personal profesional, acorde a los parámetro planeados, a las necesidades y requerimientos contractuales, así como a las políticas de seguridad y de salud ocupacional, de calidad y ambiental establecidas legalmente, priorizando siempre la seguridad de su recurso humano y de la comunidad en general.

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA-PGIO

La **CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.,** en su compromiso con el ambiente, la seguridad de su personal y la calidad de la obra que ejecutó, desarrollo las siguientes actividades en la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO:

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del Municipio de El Bagre, actualmente se encuentra extrayendo sus materiales de Piedra Rajón, Triturado, Arena y material seleccionado del proveedor Luis Fernando Dávila.

Los materiales provenientes de excavaciones y demoliciones de estructuras especiales en concreto (andenes, canchas, bordillos) se depositan en lotes de personas de la comunidad que solicitaron en donación este material.

La **CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.,** controla los documentos legales del contratos tales como: Planos, especificaciones técnicas, programación de obra, presupuesto de obra, hoja de seguridad de materiales, PGIO y requisitos legales tales como certificado de disponibilidad presupuestal del contrato y otros. Y hasta la fecha no han sufrido cambio alguno.

2. RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Entre los recursos del proyecto se ha contado desde el inicio de la obra hasta la fecha con recursos físicos y recursos humanos, entre los recursos humanos se cuenta con:

CANTIDAD	CARGO	TIEMPO DE PERMANENCIA
1	DIRECTOR DE OBRA	50%
1	INGENIERO RESIDENTE	100%
1	MAESTRO DE OBRA	100%
1	TOPÓGRAFO	100%
1	CADENERO	100%

Entre los recursos físicos se cuenta con un vibrocompactador-mono cilíndrico, 2 mezcladoras de un bulto, volquetas de 7 m3, vibrador de concreto, vibro compactador-tipo rana, mini cargador bobcat y retroexcavadora que también nos dan un porcentaje de 100% de permanencia en la ejecución del proyecto.

También la obra cuenta con productos químicos necesarios para la ejecución del proyecto como lo son el ACPM, gasolina, antisol, grasa. Al igual que la utilización de agregados pétreos tales como arena, triturado, afirmado, piedra rajón, que son identificados y controlados en cada frente de trabajo.

3. PLANES DE CONTROLES OPERATIVOS

Los Planes de Controles Operativos se inspeccionan acorde a las actividades que se van desarrollando.

Las inspecciones realizadas se evidencian en el formato de controles operativos de cada componente (Calidad, Ambiental y Seguridad Total de Trabajadores) anexo al presente informe.

4. CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD

En cuanto al Componente de Calidad; éste se ha socializado a través de charlas programadas con los trabajadores a nivel técnico, operativo y administrativo; donde se les divulga la política del Plan de Gestión Integral de Obra, así como la política del EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB y se les interioriza la importancia de realizar cada actividad de la obra con calidad, manteniendo el

cumplimiento de especificaciones técnicas de cada una, así como los procedimientos establecidos para la elaboración de las mismas.

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

La identificación y valoración de peligros se socializa con el personal operativo y administrativo a través de charlas programadas y haciendo seguimiento y control periódicamente, evidenciando todo en la matriz de identificación de peligros y en el formato de control operativo de seguridad y salud en el trabajo, comprometidos siempre en cumplir con los requisitos legales para la gestión en seguridad y salud en el trabajo.

A los trabajadores que se vincularon a la empresa se les ha realizado lo siguiente:

- Protocolo de inducción y capacitación según la actividad a desarrollar
- Notificación del tipo de riesgo al cual se somete
- Entrega de dotaciones y EPP

Periódicamente se les ha socializado la importancia de las brigadas de emergencia, la cual actualmente se encuentra constituida. También se les dictan charlas de importancia en los diversos componentes del PGIO y según cronograma de capacitaciones donde se les da a conocer el Plan de emergencia, el procedimiento en caso de accidentes y las funciones del comité paritario de seguridad ocupacional COPASO, el cual se constituyó el ACTA DE CONSTITUCION COMITÉ PRIORITARIO.


La evidencia del cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo se registra en los diversos formatos que controlan cada actividad realizada y registros fotográficos, anexo al presente informe.

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación y valoración ambiental se socializa a través de charlas periódicas programadas para los trabajadores, donde se da a conocer los aspectos ambientales a tener en cuenta en este tipo de obra y sus impactos en el ambiente, concientizándolos en la necesidad de la clasificación de la basura, el acopio de materiales, el control y manejo de derrames de químicos y la identificación de estos.

Las capacitaciones se evidencian en los registros fotográficos y asistencia, y el control ambiental en las inspecciones mensuales realizadas.

DIAGRAMA DE CAPACITACIONES

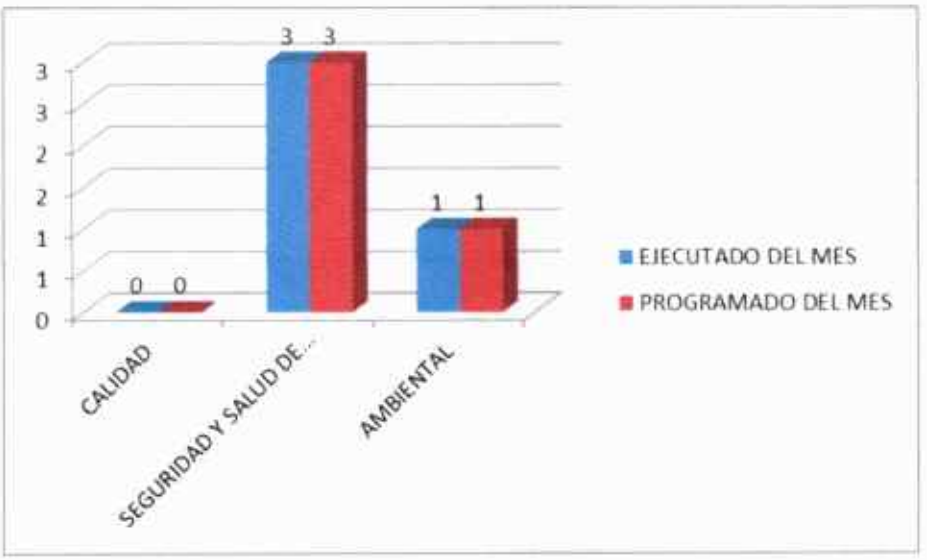



Las capacitaciones programadas en el periodo de evaluación del presente informe se ejecutaron en un 100%, donde el 100% de las capacitaciones relacionadas con el componente de seguridad y salud en el trabajo y el 100% de la capacitación relacionada con el componente ambiental.

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

EDIB	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: 033 DE 2023

RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	P/E	FECHA	Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				EJECUTADO	PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO
		periodicidad	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
COMPONENTE CALIDAD																																									
Socialización de objetos y alcances del PGIO, política de Gestión Integral de Obras de la EDIB	P	SEMANAL			1																																	1	1	100%
	E				1																																			
Presentación organigrama de la empresa, mapa de procesos y funciones de trabajadores	P	SEMANAL				1				1				1				1				1				1				1				1				2	8	25%
	E					1				1																														
Socialización de los ensayos a realizar en obra e identificación de conocimientos en elaboración de mezclas de concreto y tomas de muestras para ensayos de laboratorio	P	SEMANAL							1				1				1				1				1				1				1				1	8	13%
	E								1																															
Socialización de procedimientos para entrega de información, quejas y reclamos a oficina central	P	SEMANAL				1				1				1				1				1				1				1				1				2	8	25%
	E					1				1																														
	P																																							
	E																																							
	P																																							
	E																																							
Subtotal Cumplimiento																																						6	25	24%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: 033 DE 2023

RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	P/E	FECHA	Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				EJECUTADO	PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO
		periodicidad	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
COMPONENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES																																								
Socialización de clasificación de riesgos	P	SEMANAL				1									1											1							1					1	5	20%
	E					1																																		
Socialización sobre el sistema general de Riesgos Laborales	P	SEMANAL			1								1											1						1								1	5	20%
	E				1																																		
Socialización del reglamento de higiene y seguridad industrial	P	SEMANAL					1												1											1								1	4	25%
	E						1																																
Socialización Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	P	SEMANAL					1												1											1								1	4	25%
	E						1																																
Socialización política de Prevención de alcoholismo, drogadicción y Farmacodependencia	P	SEMANAL						1				1				1				1				1				1				1					2	9	22%
	E							1				1																											
Socialización de tipos de señalización	P	SEMANAL									1												1							1								1	4	25%
	E										1																												
Presentación de brigadas de emergencia	P	SEMANAL									1												1							1								1	4	25%
	E										1																												
Presentación de Procedimientos Operativos Normalizados	P	SEMANAL													1															1								0	2	0%
	E																																						
Entrenamiento de brigadas de emergencia	P	SEMANAL							1												1															1			1	3	33%
	E								1																														
Simulacros	P	SEMANAL				1																			1														1	3	33%
	E					1																																		
Socilizar el procedimiento para reportar accidentes de trabajo	P	SEMANAL					1																															1	2	50%
	E						1																																
Subtotal Cumplimiento																																						11	45	24%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: 033 DE 2023

RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	P/E	FECHA	Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUTADO
		periodicidad	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
COMPONENTE DE MANEJO AMBIENTAL																																									
Manejo de escombros, material reutilizable, material reciclble y basuras	P	SEMANAL					1								1								1								1								1	4	25%
	E						1																																		
Manejo de materiales de obra	P	SEMANAL			1						1								1								1							1					2	5	40%
	E				1						1																														
Manejo de concretos	P	SEMANAL				1						1								1								1							1				2	5	40%
	E					1						1																													
Manejo de residuos liquidos, residuos combustibles, aceites y otros	P	SEMANAL			1						1								1								1							1					2	5	40%
	E				1						1																														
Capacitación de manejo temporal y disposición final de escombros y tierras	P	SEMANAL		1							1													1				1												2	4	50%
	E			1							1																														
Manejo de campamento y almacenes	P	SEMANAL						1								1										1														1	3	33%
	E							1																																	
Socializacion a conductores de maquinaria y equipos sobre acopios y cubrimiento de materiales cortados (Cerrados)	P	SEMANAL		1					1											1						1													2	4	50%
	E			1					1																																
Aseo de frentes de obra, campamentos y oficinas	P	SEMANAL			1								1								1							1												1	4	25%
	E				1																																				
Procedimiento de repuesta a emergencias ambientales	P	SEMANAL							1								1							1										1						1	4	25%
	E								1																																
Subtotal Cumplimiento																																							14	38	37%

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

EDTB

ASISTENCIA CAPACITACIONES

Nombre del Proyecto:	RECUPERACIÓN URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA
Nombre Capacitador:	Holbin Bedoya Vega
Objeto de la capacitación:	Garantizar el buen uso de los Materiales
Departamento:	Operativo
Descripción del tema tratado:	Manejo de Materiales en obra

Declaro que entendí los temas de la capacitación

No.	Fecha	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	01/08/23	Aden Jose	Bedoya Fernandez	1073544046	Aden Bedoya F
2	01/08/23	Jorge William	Calle Perez	78259451	Jorge Williams
3	01/08/23	Olber	Guerrero	1040762015	OLBER GUERRERO
4	01/08/23	Moises	Castillo	78651849	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

Powered by CamScanner

EDTB

ASISTENCIA CAPACITACIONES

Nombre del Proyecto:	RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA
Nombre Capacitador:	Adan Jose Pedroza Fernandez
Objeto de la capacitación:	Conocer dosificaciones correctas del concreto
Departamento:	Operativo
Descripción del tema tratado:	Manejo de concretos y morteros

Declaro que entendí los temas de la capacitación

No.	Fecha	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	22/03/23	Jorge Wilbar	Calle Perez	78259 99	Jorge Wilbar
2	22/03/23	Olber	Guerrero	1040 762 018	OLBER GUERRERO
3	22/03/23	Moises	Castillo	78681 844	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

Powered by CamScanner

EDTB

ASISTENCIA CAPACITACIONES

Nombre del Proyecto:	RECUPERACIÓN URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA
Nombre Capacitador:	Milena Villegas Galvis
Objeto de la capacitación:	Conocer las Politicas de SST
Departamento:	Operativo
Descripción del tema tratado:	Socializacion e implementacion de politicas de SST

Declaro que entendí los temas de la capacitación

No.	Fecha	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	29/07/23	Isaac Estiven	Alban	1001741562	Isaac Alban
2	29/07/23	Wilson Andres	Perez Bermudez	1069471136	wilson Perez
3	29/07/23	Enuar	Cuadrado	8.364.752	Enuar
4	29/07/23	Luis Angel	Jaramillo Medina	1063080056	Luis Jaramillo
5	29/07/23	Olber	Guerrero	1040762018	OLBER GUERRERO
6	29/07/23	Juan David	Guerrero	1040762860	Juan Guerrero
7	29/07/23	Jorge William	Calle Perez	78259951	Jorge Williams
8	29/07/23	Oscar Emilio	Perez Pelaez	1040501242	Oscar Perez P.
9	29/07/23	Everto	Medina Fernandez	9.137.185	Everto
10	29/07/23	Moises	Castillo	78681844	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

Powered by CamScanner

EDTB

ASISTENCIA CAPACITACIONES

Nombre del Proyecto:	RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA
Nombre Capacitador:	Aden Pedroza Fernandez
Objeto de la capacitación:	Implementar políticas de aseo y reciclaje
Departamento:	Operativo
Descripción del tema tratado:	Aseo de obra, campamento y oficina

Declaro que entendí los temas de la capacitación

No.	Fecha	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	15/08/23	Isaac Esteven	Alian	1001791562	Isaac Alian
2	15/08/23	Oscar Emilio	Yepez Peluez	1040342242	Oscar Yepez
3	15/08/23	Yerder	Perea	1007634562	Yerder
4	15/08/23	Luis Angel	Jeronimo Medina	1063080056	Luis Jeronimo
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

Powered by CamScanner

EDTB

ASISTENCIA CAPACITACIONES

Nombre del Proyecto:	RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA
Nombre Capacitador:	Milena Villegas Galvis
Objeto de la capacitación:	Prevenir alcoholismo y drogadiccion
Departamento:	Operativo
Descripción del tema tratado:	Politicas de prevencion de alcoholismo, drogadiccion y farmacodependientes

Declaro que entendí los temas de la capacitación

No.	Fecha	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	17/07/23	Wilson Andres	Perez Bermudez	1069 471136	Wilson Perez
2	17/07/23	Oscar Emilio	Yepez Pelaez	1040501 242	Oscar Yepez P
3	17/07/23	Isaac Estiven	Alvan	1001741562	Isaac Alvan
4	17/07/23	Juan David	Guerrero	1046762860	Juan Guerrero
5	17/07/23	Jesus David	Martinez	1001682658	Jesus
6	17/07/23	Everto	Medina Martinez	9137185	
7	17/07/23	Luis Angel	Jeronimo Medina	1063050056	Luis Jeronimo
8	17/07/23	Enuar	Cuadrado	8364752	Enuar
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S NIT 901.254.279-6 Construccion de Obras de Ingeniería Civil	FOR.SST- 01 VERSION: 01 13/06/2023
FORMATO DE ENTREGA DE EPP	

USO:

* Me comprometo a conservar y usar los elementos de protección personal y seguridad en el trabajo , que me han sido asignados única y exclusivamente en el desempeño de mis labores al servicio de esta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento interno de trabajo y en la resolución 2400/1979 (Art 176) .siendo consciente que es necesario para mi salud, y enterado que el no acatar las normas y el uso de los implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias llegando incluso a dar por terminado con justa causa mi contrato de trabajo. La no utilización o el uso indebido de los implementos de seguridad.

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	ENTREGADO POR	ELEMENTO DE PROTECCION	OTRO / OBSERVACIONES	FIRMA
04/07/23	Isaac Alean	Alex	Casco		Isaac Alian
18/07/23		Alex	Guantes		Isaac Alian
Recibe información del uso adecuado y oportuno de los EPP				☑ SI	☐ NO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S NIT. 901.254.279-6 Construcción de Obras de Ingeniería Civil	FOR.SST- 01 VERSION: 01 13/06/2023
FORMATO DE ENTREGA DE EPP	

USO:

* Me comprometo a conservar y usar los elementos de protección personal y seguridad en el trabajo , que me han sido asignados única y exclusivamente en el desempeño de mis labores al servicio de esta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento interno de trabajo y en la resolución 2400/1979 (Art 176) ,siendo consciente que es necesario para mi salud, y enterado que el no acatar las normas y el uso de los implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias llegando incluso a dar por terminado con justa causa mi contrato de trabajo. La no utilización o el uso indebido de los implementos de seguridad.

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	ENTREGADO POR	ELEMENTO DE PROTECCION	OTRO / OBSERVACIONES	FIRMA
03/8/23	Juan David Guerrero.	[illegible]	Casco		Juan guerrero
10/8/23		[illegible]	Guantes		Juan guerrero
Recibe información del uso adecuado y oportuno de los EPP				X SI	NO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S NIT. 901.253.279-6 Construcción de Obras de Ingeniería Civil	FOR.SST- 01 VERSION: 01 13/06/2023
FORMATO DE ENTREGA DE EPP	

USO

* Me comprometo a conservar y usar los elementos de protección personal y seguridad en el trabajo , que me han sido asignados única y exclusivamente en el desempeño de mis labores al servicio de esta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento interno de trabajo y en la resolución 2400/1979 (Art 176) .siendo consciente que es necesario para mi salud, y enterado que el no acatar las normas y el uso de los implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias llegando incluso a dar por terminado con justa causa mi contrato de trabajo. La no utilización o el uso indebido de los implementos de seguridad.

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	ENTREGADO POR	ELEMENTO DE PROTECCION	OTRO / OBSERVACIONES	FIRMA
8/07/23	Deiber Perez	Alex	Cosco		
08/07/23		Alex	Guantes		
28/07/23		Alex	Guantes.		
Recibe información del uso adecuado y oportuno de los EPP				X SI	NO

Powered by CamScanner

NOTIFICACION DE RIESGOS

EDTB	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROYECTO: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de **seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la** ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad **firmo este documento:**

ACTIVIDAD	Control general de obra
CARGO	Ing. residente

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS		BIOMECÁNICOS	
FÍSICOS	X	DE SEGURIDAD: MECÁNICOS	
FÍSICOS	X	DE SEG. ELÉCTRICO	
QUÍMICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	
QUÍMICOS		DE SEG. TECNOLÓGICO	
PSICOSOCIAL		DE SEG. ACC. TRANSITO	
FENÓMENOS NATURALES		DE SEG. PÚBLICO	
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	X

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Aden Badoya	1071 354 404	Aden Badoya F.

Powered by CamScanner

EDIB	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se mantendrá siempre en cabeza de los talleres del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROYECTO: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de **seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir** la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad **firmo este documento:**

ACTIVIDAD	Concretos y Morteros
CARGO	Maestro de obra
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO	BIOLÓGICOS_____ FÍSICOS_____ FÍSICOS X QUÍMICOS X QUÍMICOS_____ PSICOSOCIAL FENÓMENOS NATURALES_____ FEN. NAT._____ FEN. NAT._____ ☐ MECÁNICOS ☐ DE SEGURIDAD: MECANICO ☐ DE SEG. ELECTRICO ☐ DE SEG. LOCATIVO ☐ DE SEG. TECNOLOGICO ☐ DE SEG. M.C. TRANSITO ☐ DE SEG. PUBLICO ☐ DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS ☐ DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS ☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Jorge William Calle Ruiz	78295951	Jorge William

Powered by CamScanner

EDIB	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que ingresen al mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROYECTO: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

ACTIVIDAD	Corte y figuración de acero
CARGO	Oficial de obra

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS		MECÁNICOS	
FÍSICOS		DE SEGURIDAD MECÁNICOS	
FÍSICOS	X	DE SEG. ELÉCTRICO	
QUÍMICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	
QUÍMICOS		DE SEG. TECNOLÓGICO	
PSICOSOCIAL		DE SEG. ALT. TRABAJO	
FENÓMENOS NATURALES		DE SEG. PÚBLICO	
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Edwar Cuadrado Olber Guerrero	8364752 1040762018	Edwar Olber Guerrero

Powered by CamScanner

EDTB	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será diligenciado para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROYECTO: **RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA**

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

ACTIVIDAD	Recibo de materiales de obra
CARGO	Ayudante de obra

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS		BIOMECÁNICOS	☐
FÍSICOS		DE SEGURIDAD MECÁNICOS	☐
FÍSICOS	X	DE SEG. ELÉCTRICO	☐
QUÍMICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	☐
QUÍMICOS		DE SEG. TECNOLÓGICO	☐
PSICOSOCIAL		DE SEG. ACC. TRÁNSITO	☐
FENÓMENOS NATURALES		DE SEG. PÚBLICO	☐
FEN. NAT		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	☐
FEN. NAT		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Juan David Guerrero	1040762860	Juan Guerrero
Everto Medina Fernandez	9137185	Everto
Wilson Perez Benavidez	1069471136	Wilson Perez
Luis Angel Jeronimo M	1069471136	Luis Jeronimo
Oscar Perez Pelaez	1040501242	Oscar Perez P

Powered by CamScanner

EDTB

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será suministrado para ser llenado al momento de realizar el proceso de inducción y/o reinducción, previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROYECTO: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales. En constancia firmo este documento:

ACTIVIDAD	Localización y replanteo
CARGO	Topografo
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO	BIOLÓGICOS_____ FÍSICOS_____ FÍSICOS__X__ QUÍMICOS_____ QUÍMICOS_____ PSICOSOCIAL FENÓMENOS NATURALES_____ FEN. NAT_____ FEN. NAT_____

☐	BIOMECÁNICOS	☐	
☐	DE SEGURIDAD MECÁNICOS	☐	
☐	DE SEG. ELÉCTRICO	☐	
☐	DE SEG. LOCATIVO	☐	
☐	DE SEG. TECNOLÓGICO	☐	
☐	DE SEG. ACC. TRANSITO	☐	
☐	DE SEG. PÚBLICO	☐	
☐	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	☐	
☐	DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	☐	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Francisco Luna	1040 497 598	Francisco Luna

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE EL BAGRE
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S
CONTRATO N°:	033 DE 2023
FECHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO:	JULIO/AGOSTO DE 2023




































INFORME N° 2

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA

CONTRATO N° 033 - 2023

"RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA."

PERIODO

JULIO 16 DE 2023 – AGOSTO 15 DE 2023

Presentado Por:

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

CONTRATISTA

Agosto de 2023

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
1.1 OBJETIVO DEL INFORME 5
1.2 MARCO LEGAL 5
1.3 CONTENIDO DEL IN FORME 5
1.4 GENERALIDADES CONTRACTUALES 6
1.5 LOCALIZACION GENERAL 7
1.6 BREVE DESCRIPCCION DE LA OBRAS EJECUTADAS 8
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS AMBIENTALES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PAGA 11
2.2 Capacitación en Gestión socio-ambiental y seguridad industrial 11
2.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 12
2.4 Manejo integral de materiales de construcción 12
2.5 Señalización frentes de obra 12
2.6 Manejo y disposición final de escombros y lodos 13
2.7 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales 13
2.8 Manejo de aguas residuales 14
2.9 Manejo de residuos liquidos domesticos e industriales 14
2.10 Maejo de descapote y covertura vegetal 15
2.11 Protección de fauna 15
2.12 Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal 15
2.13 Manejo de maquinas, equipos y vehiculos 15
2.14 Atención e información a la comunidad y participación institucional y comunitaria 15
2.15 Contratación mano de obra 17
2.16 Manejo de infraestructura de predios y servicios publico 17
3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

• INTRODUCCIÓN

El presente informe de avance ambiental del proyecto de recuperación urbanística del parque principal del barrio Las Delicias, zona urbana del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia se basa en el seguimiento y control al Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental presentado por el contratista **CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.** el cual contempla las acciones pertinentes para mitigar los problemas ambientales que se han generado durante la fase de ejecución de éste.

El informe está compuesto por dos capítulos, el primero contiene una descripción del área de influencia, como la delimitación de su área y la descripción de las obras realizadas.

El segundo capítulo describe los Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental, entre los cuales están:

- Capacitación ambiental al personal de obra
- Cumplimiento de requerimientos legales
- Proyecto Manejo integral de materiales de construcción
- Proyecto Señalización de frentes de obra y sitios temporales
- Proyecto Manejo y disposición final de escombro y lodos
- Proyecto Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales
- Proyecto Manejo de aguas residuales
- Proyecto de Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales
- Proyector de manejo del descapote y cobertura vegetal
- Proyecto de protección de fauna
- Proyecto de Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal
- Proyecto manejo de maquinaria, equipos y vehículos
- Proyecto de atención a la comunidad
- Proyecto de contratación de la mano de obra.

1.1 OBJETO DEL INFORME

Presentar el balance Ambiental del contrato N° 033 de 2023 ejecutado por la CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S., cuyo objeto es RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA, para el periodo comprendido entre el 15/07/2023 al 16/08/2023

Balance en el cual se evidencia el cumplimiento de los requisitos contractuales del contrato N° 033 de 2023 celebrado entre CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. y LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB.

1.2 MARCO LEGAL

El presente informe se elaboró con base en la normatividad ambiental vigente para proyectos no licenciados, en el marco del Plan de adaptación de la Guía ambiental, "PAGA" del INVIAS. Así como la normatividad ambiental colombiana vigente.

1.3 CONTENIDO DEL INFORME

El presente documento contiene información contractual del contratista, información general de la localización de la obra, las actividades realizadas durante el periodo, así como un registro fotográfico que evidencia lo realizado a la fecha a nivel de obras civiles. Igualmente contiene las actividades Ambientales propuestas en el marco de las fichas ambientales aprobadas en el PAGA versión N.° 2. Actividades bajo las cuales se realiza el seguimiento a la implementación del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA con sus respectivos indicadores de cumplimiento al cierre de esta.

También encontramos en cuadro con listado de los pendientes ambiental a cargo del contratista y por ultimo las conclusiones y recomendaciones a por parte del especialista ambiental de Interventoría.

1.4 GENERALIDADES CONTRACTUALES

Contrato de obra

CONTRATO No.	033 DE 2023
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. NIT: 901254279-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS MARTÍNEZ MENDOZA
ENTIDAD CONTRATANTE	LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB. NIT: 901526561-7
OBJETO	RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($3.514.300.088,00) M/CTE. INCLUIDO EL AU Y DEMÁS COSTOS QUE HAY LUGAR
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16-06-2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16-02-2024

1.5 Localización General



Ilustración 1 Departamento de Antioquia



Ilustración 2 Municipio de el Bagre

El municipio del Bagre, está situado en el departamento de Antioquia, Su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital Medellín. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüi, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca. Presenta las siguientes coordenadas geográficas: 7°36'17" de latitud norte y 74°48'31" de longitud oeste, el municipio hace parte de la subregión del Bajo Cauca y presenta una temperatura media de 37ºC.

Limita por el norte con el municipio de Nechí, por el sur con el municipio de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el Departamento de Bolívar y por el occidente con el municipio de Caucasia y Zaragoza. Está constituido territorialmente por dos corregimientos: Puerto Claver y Puerto López y por 53 veredas.

El municipio posee gran riqueza hídrica; por su territorio cruza el río Nechí, el cual nace en el municipio de Yarumal, tiene una longitud de 270 km hasta desembocar en el río Cauca. Sus principales cuencas son la de los ríos Tigüi y Amacerí y las quebradas Villa, Santa Isabel, El Guamo y San Pedro (PBOT, 2009).

Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, según censo de población de 2018, el municipio tiene 51.862 habitantes, en la zona urbana se encuentran 32.823, y los restantes 19.039 habitantes en zona rural.

1.6 Breve Descripción de las Obras Realizadas

Durante el periodo del presente informe entre el 16/06/2023 hasta 15/07/2023 ya se iniciaron en pleno los trabajos de instalación de cerramiento provisional, localización y replanteo, Demolición mecánica de estructuras especiales en concreto (andenes, canchas, bordillos), retiro y disposición de material sobrante de excavaciones y demoliciones, excavación de material heterogéneo a cualquier profundidad, no incluye retiro, construcción de lleno con material de préstamo y compactación proctor modificado ≥ 90%, suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto 210 Kg/cm2 de 16 cm x 45 cm X 80 cm, incluye mortero 1:4 para nivelación, suministro y construcción de muro de contención en bloque de concreto 15X20X40 e=15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno, suministro y construcción de zapatas, pedestales y vigas de cimentación en concreto de 4000 psi, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción

Dentro de las actividades que se destacan para el periodo se encuentran:

1. Localización y Replanteo
2. Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.
3. Colocación de adoquín 10 x 20 x 8. Color café, Para un ancho de 0.20m. Incluye el suministro y transporte de los adoquines, adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, suministro e instalación de manto impermeabilizante de 3 mm con traslapo de 10 cm en ambos lados y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.
4. Construcción de solado en concreto de 1500 PSI. Incluye el suministro y el transporte del concreto, formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo.
5. Construcción de zapatas, pedestales y vigas de cimentación en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y el transporte del concreto, formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. no incluye refuerzo.
6. Construcción y montaje de estructura metálica de soporte de cubierta en acero estructural ASTM A36, ASTM A572, ASTM A500GR
7. Construcción de banca en concreto de 3000 psi. incluye el suministro y el transporte del concreto, formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. no incluye refuerzo.

8. Suministro y construcción de muro de contención en bloque de concreto 15X20X40 e=15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno.























ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PAGA

A continuación, se presenta el primer informe de las actividades ambientales ejecutadas en el desarrollo del contrato recuperación urbanística del parque principal de los barrios Las Delicias, definidas en el Programa de Adaptación de las Guías Ambientales (PAGA).

Algunas actividades realizadas en este mes por este grupo fueron las siguientes:

- Obtención de los permisos ambientales y mineros de la explotación de materiales de construcción ante la CAR
- Actualización y corrección del Programa de adaptación de la Guía Ambiental PAGA
- Cumplimiento de las capacitaciones e inducción programadas al personal de la obra.
- Elaboración de los informes y formatos propios del seguimiento.
- Implementación de señalizaciones, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra.
- Verificación diaria de la señalización temporal en frentes de obra.

2.1 Capacitación en Gestión socio-ambiental y seguridad industrial

Se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Información de los diferentes impactos ambientales que se podrían causar durante la ejecución del proyecto al no cumplir los lineamientos del PAGA Afectación de la movilidad
- Procedimientos de trabajo seguro
- Uso y manejo de elementos de protección personal (EPP).

Los talleres fueron realizados con los trabajadores del parque. Se adjunta registro fotográfico:



Asistencia charla SST



Charlas de Orden y Aseo



Charlas de actos inseguros



Charlas de uso de EPP





2.2 Cumplimiento de los requerimientos legales

Antes del inicio de la obra se habían obtenido de forma oportuna las licencias ambientales necesarias para la ejecución del proyecto.

El proveedor de los materiales granulares son: LUIS FERNANDO DÁVILA, cuentan con la licencia requerida y se presentó copia de esta documentación a la Interventoria, ver Anexo del documento PAGA.

2.3 Manejo integral de materiales de construcción

Los materiales usados para la construcción de llenos, son dispuestos en áreas del parque durante la jornada laboral, dichos materiales son conformados de manera inmediata por los operarios de las maquinas, dejando por descartado que se generen cualquier tipo de conflicto y/o accidentes con la comunidad inmersa en el área de influencia.

Al respecto del control de las emisiones de material particulado a la atmosfera y el arrastre de materiales a los cuerpos de agua, se cumplió con mantener los materiales cubiertos.

En lo relacionado con el impacto sobre el paisaje, los materiales sobrantes de la explanación no utilizados en las obras, no presentaron ninguna afectación porque son sacados de inmediato de la obra, en ningún momento se ubicaron materiales de construcción en áreas verdes adyacentes al proyecto.

2.4 Señalización frentes de obra

Durante este mes del proyecto, se instalaron señales preventivas e informativas, con el objeto de que personas ajenas al proyecto, ingresaran y no sufrieran accidentes.

Los materiales de obra, se ubicaron en sitios donde no interfirieron con el tránsito peatonal; fueron demarcados y acordonados con cinta de señalización y se encontraban dentro del cerramiento instalado

Por otra parte, se garantizó los accesos para los ingresos a las viviendas y/o fincas ubicadas en las zonas adyacentes al proyecto





2.5 Manejo y disposición final de escombros y lodos

En este mes se generaron escombros de demolición mecánica de estructuras especiales en concreto (andenes, canchas, bordillos), los cuales fueron dispuestos en lotes de personas de la comunidad que solicitaron en donación este material.



2.6 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Para la disposición de estos residuos se tiene estimado un código de colores tales como:

- Caneca verde: residuos orgánicos y residuos domésticos no aprovechables
- Gris: residuos inorgánicos no peligrosos y residuos aprovechables (vidrio, cartón, papel, metal, etc.)
- Azul: residuos industriales no peligrosos (grasas, aceites, empaques)

Por lo anterior, en el periodo se obtuvieron dichas canecas y bolsas para la disposición de los residuos diferentes a escombros y lodos. Sin embargo, el volumen ha sido mínimo, lo que mayormente se ha producido son residuos de comida de los trabajadores, que han sido entregados a la comunidad del AID, como alimento para sus animales.



2.7 Manejo de aguas residuales

Durante este mes del proyecto, se hizo un buen manejo del agua que se utilizó para la construcción de llenos y posterior compactación del material granular, optimizando la cantidad utilizada sin causar afectación a las aguas superficiales y de escorrentía.

2.8 Manejo de residuos liquidos domésticos e industriales

Durante este mes del proyecto, el manejo de residuos liquidos domésticos se realizó a través de la utilización de baños en el la casa que se utilizó como bodega y en los restaurantes donde tomaba los alimentos el personal de la obra.



2.9 Protección de fauna

Durante este mes del proyecto, se realizó una buena protección y conservación de la fauna, ya que se tomaron las medidas necesarias para no afectar el habitad de fauna existente en los sitios donde se realiza acopio de material de construcción.

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal

Durante este mes del proyecto, se hicieron acopios de materiales únicamente dentro del área del proyecto, la cual cuenta con un cerramiento provisional.

2.10 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Al respecto del manejo de maquinaria, se tuvieron en cuenta las siguientes acciones:

- Se realiza mantenimiento rutinario de inspección
- Toda la maquinaria y vehículos cuenta con pito y luces de reversa
- Al operario se le proporcionaron los elementos de protección personal
- Los equipos, maquinarias y vehículos, son manejados por personal capacitado y formado para ello
- Se hizo la verificación del cumplimiento de la vigencia de los certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehículos de la obra

- Las volquetas van totalmente cubiertas, para evitar la caída de materiales por la vía.

2.11 Atención e información a la comunidad y participación institucional y comunitaria

Se cuenta con un personal encargado de la comunidad entre contratista, comunidad y autoridades. Durante el periodo en mención no se ha presentado quejas ni reclamos.

Actualmente no se ha afectado los predios vecinos, por lo que a nivel social no han generado problemas.

Entre las actividades realizadas en la obra en materia social, se tiene:

- Contactos y establecimiento de relaciones con los líderes de la zona
- Comunicación periódica con autoridades locales para mantenerlos informados sobre el avance de las obras
- Atención de quejas y reclamos
- Vigilancia al cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores contratados
- Apoyar la incorporación del personal de la zona a la ejecución de los trabajos
- Ofrecer información preventiva sobre seguridad industrial
- Producción de informes

2.12 Contratación mano de obra

Para la realización de las actividades constructivas de mejoramiento y rehabilitación, se vincularon trabajadores como mano de obra no calificada residentes en el municipio



2.13 Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.

Durante este mes del proyecto, Se realizó la actividad de seguimiento de Actas de Vecindad en todas las construcciones aledañas a las actividades de obra.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La aplicación por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S., de las acciones Ambientales especificadas en el PAGA del proyecto ha arrojado a la fecha los resultados positivos esperados, al punto que hoy no se evidencian quejas o reclamaciones por parte de la comunidad sobre las obras o actividades relacionadas con las obras, así mismo no se han presentado accidentes laborales, derrames u otro tipo de incidentes que causes afectaciones a la comunidad, trabajadores y medio ambiente en general.

Con lo cual se puede concluir que el contratista a nivel de cumplimiento del PAGA, en general se ha dado un buen manejo ambiental a la obra RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, ANTIOQUIA.

Sin embargo, se recomienda mantener la intensidad de implementación de las actividades que a la fecha se han venido ejecutando y que han logrado los resultados positivos mostrados a la fecha.

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2023

1. Inducción.

La empresa CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S viene ejecutando la construcción del parque la victoria, desde la parte de Seguridad y Salud en el trabajo se viene realizando una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se están ejecutando de acuerdo a las necesidades de la obra, reforzando así puntos específicos y corrigiendo actitudes humanas para prevenir accidentes y preservar la salud de los trabajadores.

2. Objetivos.

- Ejecutar la programación mensual de actividades de seguridad y salud en el trabajo.
- Concientizar al personal sobre los riesgos y peligros presente en sus actividades diarias e implementar los controles.
- Prevenir y/o controlar los riesgos en las diferentes áreas y lugares donde se desarrollarán los trabajos
- Prevenir y/o mitigar los accidentes y enfermedades laborales

3. Alcance

En el presente informe se detallan las actividades de SST realizadas en la obra.

4. Seguridad y salud en el trabajo

Es importante cumplir con las normas de seguridad tal y como lo indica el decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 del 2019, estándares de seguridad y salud en el trabajo, para proteger y preservar el bienestar físico social y mental de los trabajadores.

5. Verificación de seguridad social

La seguridad social de los trabajadores al momento de ingresar a trabajar en la empresa es muy importante por eso se realizan actividades de verificación del pago de la seguridad social de los trabajadores con el fin de estar seguros que todo el personal contratado y que está laborando se encuentren al día con las afiliaciones de: ARL, EPS, AFP, CCF.

6. Actividades en SST

- Entrega de EPP (guantes, gafas claras y oscuras de seguridad, protectores auditivos)
- Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.
- Acompañamiento en las actividades en obra.
- Se realizan charlas de SST
- Se realiza calistenia.

ANEXOS:

Listado de asistencias charlas de SST

Registro fotográfico

	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S NIT. 901.254.279-6 Construccion de Obras de Ingeniería Civil	FOR.SST- 06 VERSION: 01 13/06/2023
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

Asistencia charla SST



CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S

Capacitación ☐ Charlas de SST ☐ Inducción - reinducción ☐ — 21/08/23 — TEMA: Higiene postural

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
1	Omar Eduardo Ellen Ruiz	7509779	
2	Rodolfo Arroyo	7208390	
3	William Andres	1.069431736	
4			
5	William Andres	1.069431736	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Charlas de Orden y Aseo



CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S

Capacitación ☐ Charlas de SST ☐ Inducción - reinducción ☐ — 11/09/23 — TEMA: Orden y Aseo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Charlas de actos inseguros



CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S

Capacitación ☐ Charlas de SST ☐ Inducción - reinducción ☐ — 14/09/23 — TEMA: Actos inseguros

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
1	Alberto Medina	91371185	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Charlas de uso de EPP



CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S

Capacitación ☐ Charlas de SST ☐ Inducción - reinducción ☐ — 05/09/23 — TEMA: Uso correcto de EPP

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

REGISTRO FOTOGRAFICO.

Charlas de SST







Calentamiento







Informe realizado por:

Milena Villegas Galvis
Profesional de SST

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (5) días calendario del SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENCIA S.A.S. Representado por CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELIECER MORALES ALEMAN, y como SUPERVISOR, el ING. DOWER ANTONIO RESPALDA LÓPEZ Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisora, teniendo en cuenta que dicho balance solo entre los siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 1:		OBRAS PRELIMINARES				$ 107.851.791,52		$ 99.346.841,52		$ 0,00		$ 99.346.841		$ 8.304.951
1.1		REPLANTEO, DEMOLICION Y EXCAVACIÓN												
	1.1.1	Suministro y construccion de cerramiento provisional en lona de verde, altura 2,10m, incluye listones de madera 2" x 2" x 3,00 mts a cada 3,00 mts y todo lo necesario para su correcta construcción.	ml	754,37	$ 71.145,00	$ 53.671.367,40	345,95	$ 5.200.632,75			345,95	$ 5.700.673	8,17	$ 122.713
	1.1.2	Localización y replanteo, incluye comisión topografica.	m2	3928	$ 6.500,00	$ 25.648.840,00	3.928,00	$ 25.648.840,00			3.928,00	$ 25.648.840		$ 0
	1.1.3	Excavación en material heterogeneo a cualquier profundidad, incluye retiro.	m3	295,28	$ 54.384,00	$ 16.058.107,52	205,07	$ 11.152.354,96			205,07	$ 11.152.355	90,21	$ 4.905.753
	1.1.4	Demolicion mecanica de estructuras especiales en concreto (pesebres, cerchas, barandas)	m2	157	$ 24.119,00	$ 3.786.683,00	157,00	$ 3.786.683,00			157,00	$ 3.786.683	-	$ 0
	1.1.5	Retiro y disposicion de material sobrante en excavaciones y demoliciones.	m3	237	$ 35.957,00	$ 8.521.809,00	158,66	$ 5.525.252,62			158,66	$ 5.525.253	93,34	$ 2.996.556
	1.1.6	Construccion de lleno con material de prestamo y compactación Proctor modificado +90%	m3	282,75	$ 112.213,00	$ 31.728.225,75	282,75	$ 31.728.225,75			282,75	$ 31.728.226	-	$ 0
	1.1.7	Suministro y construccion de entresuano en piedra para soporte placa gimnasio y juegos infantiles	m3	86,735	$ 189.321,00	$ 16.333.798,65	86,58	$ 16.304.078,90			86,58	$ 16.304.079	0,16	$ 29.720
CAPITULO 2:		ESTRUCTURA CONCRETO				$ 234.213.934,52		$ 175.266.220,23		$ 0,00		$ 175.266.220		$ 58.947.614
2.1		CONCRETOS												
	2.1.1	Suministro y construccion en sobrelosa en concreto de 3,000 psi para estructura en cubierta	m3	73,31	$ 457.719,00	$ 33.669.429,89	73,31	$ 33.669.429,89			73,31	$ 33.669.430		$ 0
	2.1.2	Suministro y construcción de zapatas, pedestales y vigas en construcción en concreto de 4000 psi, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	78,89	$ 1.009.157,00	$ 79.572.104,73	69,09	$ 69.722.647,13			69,09	$ 69.727.057	9,80	$ 9.849.448
	2.1.3	Suministro y construccion de placa en piso en concreto 3000 psi, para area de gimnasio y zona de juegos infantiles, incluye malla electrosoldada D84 y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	306,4	$ 93.203,00	$ 28.557.705,60	0,00				-	$ 0	306,40	$ 28.557.706
	2.1.4	Suministro y construccion de escalera en concreto 3000 psi a la vista, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	34,33	$ 286.456,00	$ 10.137.399,58	0,00				-	$ 0	94,33	$ 10.137.396
	2.1.5	Acero de refuerzo en F'y=60,000 psi	kg	12346	$ 9.000,81	$ 109.577.288,12	10.533,57	$ 94.874.733,39			10.533,57	$ 94.874.733	1.812,43	$ 14.703.863
CAPITULO 3:		PISOS Y RECUBRIMIENTOS				$ 659.946.503,77		$ 19.481.634,00		$ 69.865.918,00		$ 19.481.634		$ 589.896.952

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (8) días calendario del SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA FORTENTIA S.A.S. Representada JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SAS, representado por JORGE ELIECER MORALES ALEMAN, y como SUPERVISOR, el ING. EDWER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, con el Fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y validado a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisora, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1		MAMPOSTERIA												
	3.1.1	Suministro e instalacion de sardinel prefabricado en concreto 210 kg/cm2 de 10 cm x 45 cm x 80 cm, incluye mortero 1:4 para nivelacion.	ml	242	$ 75.246,00	$ 18.209.532,00	119,00	$ 13.964.124,00	83,00	$ 6.245.418,00	242,00	$ 18.209.532		$ 0
	3.1.2	Suministro e instalacion de sardinel prefabricado en concreto 210 kg/cm2 de 10 cm x 30 cm x 60 cm, incluye mortero 1:4 para nivelacion.	ml	676,6	$ 85.467,00	$ 84.201.572,20	-	$ 0,00			-	$ 0	676,60	$ 84.201.572
	3.1.3	Suministro y construccion de muro en contension en bloque de concreto 15x20x40 e=15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno	ml	80	$ 125.292,00	$ 9.917.520,00	68,00	$ 7.517.520,00			68,00	$ 7.517.520	-	$ 0
3.2		RECUBRIMIENTOS						$ 0,00				-		
	3.2.1	Suministro e instalacion de arroz andamiado en peldaños, de escalera	m	737	$ 99.242,00	$ 3.849.354,00		$ 0,00			-	$ 0	737,00	$ 3.849.354
	3.2.2	Suministro y construccion de piso en adoquin color café o similar 10 x 20 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	1950,51	$ 96.490,00	$ 188.204.729,90	-	$ 0,00	450,00	$ 43.420.500,00	450,00	$ 43.420.500	1.500,51	$ 144.784.230
	3.2.3	Suministro y construccion de piso en adoquin exagonal color café o similar 10 x 22 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	135,636	$ 78.842,00	$ 10.693.813,51	-	$ 0,00			-	$ 0	135,64	$ 10.693.834
	3.2.4	Suministro e instalacion de prefabricado para zona de bordillo 30 x 30 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	98,6741	$ 157.490,00	$ 15.540.675,55	-	$ 0,00			-	$ 0	98,67	$ 15.540.636
	3.2.5	Suministro e instalacion de bordillo tipo 30 x 30 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	ml	863	$ 12.553,00	$ 10.837.979,00		$ 0,00			-	$ 0	863,00	$ 10.837.979
	3.2.6	Suministro e instalacion de Piso Caucho en Grama Sintetica Ecotuser 30m para zona de gimnasio y juegos infantiles.	m2	133,655	$ 105.010,00	$ 145.778.781,55	-	$ 0,00			-	$ 0	133,66	$ 145.778.762
	3.2.7	Suministro y construccion de piso en madera plastica tipo deck o equivalente incluye viga de apoyo en concreto de 3000 psi, estructura metalica en tubería redonda de 4" y 2", anclada en cimentaciones y pernos.	m2	26,901	$ 506.155,00	$ 13.616.075,66	-	$ 0,00			-	$ 0	26,90	$ 13.616.076

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (6) días calendario de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, por parte del contratante CONSTRUCTORA POTENCIA S.A.S. Representado LUIS EDUARDO MARTINEZ MEDINA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SCS S.A.S. representado por JORGE ELIECER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. EDINER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance solo refleja aquellas especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el CONTRATO de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES R/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	3.2.9	Suministro y aplicación de pintura epoxica en viga, fibrita, zoc y riga o similar, segun diseño.	m2	320	$ 41.583,00	$ 13.306.560,00	-	$ 0,00			-	$ 0	320,00	$ 13.306.560
CAPITULO 4:		CUBIERTA				$ 1.250.719.330,00		$ 0,00		$ 195.251.790,00	$ 0	$ 0		$ 1.055.467.540
4.1		ESTRUCTURA METALICA												$ 0
	4.1.1	Suministro, construcción y montaje de estructura metálica en soporte de concreto, en acero estructural ASTM A36, ASTM A572, ASTM A36, ASTM A1011Gr. 50, ASTM A500Gr. C, ASTM A53 Gr. V, ASTM A193 Gr.	und	30	$ 39.850.352,00	$ 1.171.510.560,00	-	$ 0,00	5,00	$ 195.251.760,00	5,00	$ 195.251.760	25,00	$ 976.258.800
4.2		CUBIERTA										$ 0		$ 0
	4.2.1	Suministro, construcción y montaje de cerramiento en tubería rectangular tipo madera 150 x 25 x 1,2mm galvanizado segun diseño, incluye estructura metalica en soporte, acabado en anticorrosivo y pintura electrostatica, incluye alquiler de equipos y todo lo necesario para su correcta construcción.	und	30	$ 1.640.392,00	$ 59.108.760,00	-	$ 0,00			-	$ 0	30,00	$ 59.108.760
CAPITULO 5:		EQUIPAMIENTO				$ 375.217.185,00		$ 55.784.167,68		$ 0,00		$ 55.784.168		$ 319.433.016
5.1		EQUIPAMIENTO												$ 0
	5.1.1	Suministro e instalación de equipamiento en juegos infantiles, (columpios, casetas metalicas, pasamanos).	und	1	$ 11.785.536,00	$ 11.785.536,00	-	$ 0,00			-	$ 0	1,00	$ 11.785.536
	5.1.2	Suministro y construcción en banca en concreto a la vista de 3000 psi, (40 cm de ancho), incluye formaleta super 1 y todo lo necesario para su correcta construcción	und	730,9	$ 748.991,00	$ 57.493.753,80	731,01	$ 55.784.167,68			731,01	$ 55.784.168	6,86	$ 1.708.085
	5.1.3	Suministro y construcción en banca en concreto a la vista de 3000 psi, (80 cm de ancho), incluye formaleta super 1 y todo lo necesario para su correcta construcción.	und	84	$ 288.091,00	$ 24.195.444,00	-	$ 0,00			-	$ 0	84,00	$ 24.195.444
	5.1.4	Suministro e instalacion de banca ecilvi 0,70m x 0,44m x 0,15m (Ancho x Alto x Profundidad).	und	30	$ 977.767,00	$ 29.333.010,00	-	$ 0,00			-	$ 0	30,00	$ 29.333.010
	5.1.5	Suministro e instalacion de mesa sora (1,04m x 0,21m x 1,05m (Ancho x Alto x Profundidad).	und	8	$ 1.052.343,00	$ 8.418.840,00	-	$ 0,00			-	$ 0	8,00	$ 8.418.840

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (6) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representado JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE S.A.S. representado por JORGE ELIECER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR el ING. DORVEY ANTONIO MOSQUERA LOPEZ Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y revisado y aclaciones por parte de la interventoria y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	5.1.6	Suministro e instalacion de ecosistema generico, maquinas elaboradas en acero en cedma revestidas. Tuberia redonda de 4 ½" calibre 3.5 mm con anillos y codos de 4.5", calibre 3 mm, y cuadrados de 120 x 120 mm para los centros principales Tuberia redonda de 2.0" calibre 2.5 mm para los accesorios) (juegos parabolic, Bicicleta estática, Columpio aéreo, Doble swing)	und	12	$ 2.108.191,00	$ 25.298.292,00	-	$ 0,00			-	$ 0	12,00	$ 25.298.292
	5.1.7	Suministro e instalacion de Sicledero en tuno rectangular de Ca 18 Para 6 bicicletas	und	4	$ 877.416,00	$ 3.509.744,00		$ 0,00				$ 0	4,00	$ 3.509.744
	5.1.8	Suministro e instalacion de asadero doble en concreto a la vista	und	10	$ 1.444.596,00	$ 14.445.960,00	-	$ 0,00			-	$ 0	10,00	$ 14.445.960
CAPITULO 6:		INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y				$ 111.883.717,50		$ 111.516.595,00				$ 111.516.595		$ 367.123
6.1		INSTALACIONES AGUAS DE LLUVIA												-
	6.1.1	Suministro e Instalacion de tuberia Pead Corrugada Aguas Lluvia PVC Ø 4"(incluye excavaciones, y rellenos segun profundidad en diseño para red de aguas lluvias).	ml	429,25	$ 145.209,00	$ 62.380.334,00	429,86	$ 62.419.110,88			429,86	$ 62.419.111	0,61	$ 88.527
	6.1.2	Suministro e instalacion tuberia y sostenible PVC Novafort 160 mm (incluye excavaciones) y rellenos segun profundidad en diseño para red de aguas lluvias)	ml	95,48	$ 139.821,00	$ 13.350.681,96	94,09	$ 13.156.322,43			94,09	$ 13.156.322	1,39	$ 194.360
	6.1.3	Suministro y construccion de Camaras (cajico de protocolo) con rejilla para drenaje de aguas lluvia (medida interna 40 cm x 40 cm).	ml	131,8	$ 275.093,00	$ 36.262.502,00	130,55	$ 35.941.161,75			130,55	$ 35.941.162	0,99	$ 261.340
CAPITULO 7:		INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 159.258.518,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0		$ 159.258.518
7.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS PARA SISTEMA ELECTRICO												-
	7.1.1	Suministro e instalacion de acometida (alimento para el 18 circuitos compuesto por (3) cables No.6 AWG-Cu (F) con a elemento HEPE (N), mas (1) cables No 6 AWG a elemento HEPE (N), mas (1) cables No 8 AWG aislamiento HEPR (T). Incluye marcación, terminales para los cables, todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	30	$ 83.850,00	$ 2.515.500,00		$ 0,00			-	$ 0	30,00	$ 2.515.500

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 031 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (6) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. representado JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSULTORIAS DE S.A.S. representado por JORGE ELIECER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DORVEY ANTONIO MOSQUERA LOPEZ Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	7.1.2	Suministro e instalación de tablero monofásico 220V de 18 circuitos con barraje a 175A, con espacio de totalizador, incluye 1 totalizador de 250A, 3 breaker 250A enchufables, 3 breaker 160A, incluye cerradura o tablero para intemperie PAA, medidor de energía directa 500A monofásico 240 Amperios, construcción de pedestal, incluye soldado de tablero, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	1	$ 2.682.195,00	$ 2.682.195,00		$ 0,00				$ 0	1,00	$ 2.682.195
	7.1.3	Suministro e instalación de cajas subterráneas según norma RS3-001 , y o tapa RS4-001, la caja tiene la medida de 400All, formaleteada y vaciada en concreto de 3000 psi, incluye excavación, ladrillos, mezcla y cemento de 2".	und	16	$ 280.305,00	$ 10.090.980,00		$ 0,00			-	$ 0	36,00	$ 10.090.980
	7.1.4	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC DB, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demas accesorios para su correcta instalación, incluye la excavación y el tendido de estas	ml	342	$ 52.366,00	$ 17.909.172,00		$ 0,00			-	$ 0	342,00	$ 17.909.172
	7.1.5	Suministro e instalación de tubería de 1" PVC DB, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demas accesorios para su correcta instalación, incluye la excavación y el tendido de estas.	ml	201	$ 43.634,00	$ 8.770.434,00		$ 0,00			-	$ 0	201,00	$ 8.770.434
	7.1.6	Suministro e instalación conductor 12 AWG HFFR tipo halogenos, pertenecientes a las luminarias que se tipo bollarina y las bolardo en parque incluye, conectores, resorte, marcación y demas accesorios para su correcta instalación.	ml	375	$ 8.180,00	$ 3.067.500,00		$ 0,00			-	$ 0	375,00	$ 3.067.500
	7.1.7	Suministro e instalación conductor 10 AWG HFFR tipo halogenos, pertenecientes a las luminarias que se tipo bollarina y las bolardo en parque incluye, conectores, resorte, marcación y demas accesorios para su correcta instalación	ml	1.000	$ 10.808,00	$ 10.808.000,00		$ 0,00			-	$ 0	1.000,00	$ 10.808.000

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2022 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (6) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTE S.A.S. representada JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representada por JORGE ELIECER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOINER ANTONIO RESPALDIZA LÓPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1, según balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibida a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES B/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	7.1.8	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo tan bajo bay ubicada en el techo, incluye caja de plástico fundida Nema 4 4X4, 6 m de tubería PVC de 1/2", 5m de cable 3X12 AWG Cu HFFR libre de halógenos conteine (Fase, Neutro, Tierra), marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	33	$ 365.305,00	$ 5.038.965,00		$ 0,00				$ 0	33,00	$ 5.038.965
	7.1.9	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo flotante 2X8, incluye 3 mt de cable 3X10 AWG HFFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 3 mt de tubería 1" PVC-DS, caja plástica 4X4, tapa Pvc, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	und	50	$ 82.468,00	$ 4.123.400,00		$ 0,00				$ 0	50,00	$ 4.123.400
	7.1.10	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria Pública LED, incluye tornillos, conectores, marcación 3X10 AWG HFFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 3 m de tubería PVC de 1/2", poste metálico de 8m, brazo metálico tipo sodio vial	und	20	$ 1.445.270,00	$ 28.905.400,00		$ 0,00				$ 0	20,00	$ 28.905.400

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 031 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (6) días calmas de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA FORTEBAL S.A.S. Representado JUAN CANIZALES MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoría INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SCS S.A.S. representado por JORGE ELIECER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DONALD ANTONIO BERRIO LOPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2, según balance en obra realizado a la fecha por el contratista y validado y satisfactorio por parte de la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance cita en las siguientes especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES A/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	7.1.11	Suministro e instalación de luminaria tipo LED, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und	50	$ 364.320,00	$ 18.216.000,00		$ 0,00			-	$ 0	50,00	$ 18.216.000
	7.1.12	Suministro e instalación de led high bay colocada en el techo, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und	53	$ 681.318,00	$ 7.814.534,00		$ 0,00			-	$ 0	13,00	$ 7.814.534
	7.1.13	Suministro e instalación de luminaria Publica LED 20W ubicado en poste y brazo metálico tipo bahareque, incluye tornillos y demás accesorios para su correcta instalación.	und	40	$ 952.759,00	$ 38.110.360,00		$ 0,00			-	$ 0	40,00	$ 38.110.360
	7.1.14	Suministro e instalación de poste o tierra para cámara domo, incluye varilla corrugada roble acero 3,48m, abrazaderas fina, cable desnudo N° 6 AWG, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	2	$ 667.759,00	$ 1.335.518,00		$ 0,00			-	$ 0	2,00	$ 1.335.518
CAPITULO 8:		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 26.318.688,04		$ 0,00		$ 0,00		$ 0		$ 26.318.688
8.1		MANEJO DE ZONAS VERDES												-
	8.1.1	Suministro y construcción de tierra vegetal para antiderrapante según diseño.	m3	48,16	$ 144.941,00	$ 6.952.607,04		$ 0,00			-	$ 0	48,16	$ 6.952.607
	8.1.2	Suministro e instalación de grama natural.	m2	688	$ 25.687,00	$ 17.673.656,00		$ 0,00			-	$ 0	688,00	$ 17.673.656
	8.1.3	Suministro y siembra de árbol para compensación forestal, Alt. Mín. de Fuste 0,8 Mts. Incluye transporte, cuscarria en arriz, tierra negra y todo lo necesario para su correcta siembra, plantados en los huecos perforados con taladro.	und	25	$ 67.777,00	$ 1.694.425,00		$ 0,00			-	$ 0	25,00	$ 1.694.425
CAPITULO 9:		LIMPIEZA				$ 7.856.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ -		$ 7.856.000
9.1		VARIOS												-
	9.1.1	Limpieza y aseo de obra para entrega final.	un	1	$ 7.856.000,00	$ 7.856.000,00		$ 0,00				$ 0	1,00	$ 7.856.000
(1) COSTO DIRECTO =						$ 2.527.865.589		$ 462.395.564,93		$ 264.917.679,00		$ 583.854.403,93		$ 1.823.552.326,07
(2) COSTO ADMINISTRACIÓN =					28,94%	$ 731.648.824	28,94%	$ 133.842.162,00		$ 70.886.949,00		$ 168.981.972,00		$ 527.214.983,00
(3) COSTO IMPREVISTOS =					2,00%	$ 50.557.312	2,00%	$ 9.177.911,00		$ 4.859.351,00		$ 11.677.088,00		$ 36.431.048,00
(4) UTILIDADES =					5,00%	$ 126.393.278	5,00%	$ 23.059.778,00		$ 12.245.884,00		$ 29.192.720,00		$ 91.077.630,00
(5) IVA SOBRE UTILIDAD = (4) x (19%)					19%	$ 24.014.723	19%	$ 4.383.217,82		$ 2.326.717,96		$ 5.546.616,80		$ 17.304.747,22
(6) RETE + RETEAIP					7,5% comp ellec	$ 3.981.483	2,5% comp ellec	$ 0,00				$		$ 3.981.482,95
(7) PAM (PILO PAPSO)						$ 49.843.320		$ 9.968.664,00		$ 9.968.664,00		$ 9.968.664,00		$ 29.905.992,00
(8) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)						$ 3.534.300.088		$ 642.587.677,75		$ 345.344.356,96		$ 809.225.464,73		$ 2.527.468.173,29

ACTA PARCIAL N° 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (5) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. Representado JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, con el Fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1, segun balance de obra realizado a la fecha por el contratista y verificado satisfactoriamente por parte de la interventoria y la supervisión, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 2		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	3.514.380.688,00
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	3.514.380.688,00
VALOR DE ANTICIPO	$	-
VALOR DE ACTA PARCIAL No. 02	$	345.244.236,96
VALOR A AMORTIZAR	$	-
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA No. 2		9,82%
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA N° 2	$	345.244.236,96

VALOR EN LETRAS: SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

EN CONTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON

Firma

Nombre: JORGE ELICER MORALES ALEMAN
Cargo: Representante Legal
Empresa: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.
INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
Cargo: Representante Legal
Empresa: CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

Firma

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: Supervisor del Convenio
Empresa: EDTB
CONTRATANTE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.		
CONTRATO No.	013 - 2023	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER ANTONIO HISPERUZA LOPEZ
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA POTENTIA	ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
INTERVENTOR	INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONS ISC S.A.S.		

Item	CANT	Descripción	UN
3.1.1	83,00	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado en concreto 210 Kgrcm2 de 16 cm x 45 cm X 80 cm. incluye monolitico 1:4 para nivelacion.	ml



Calculo de Cantidades

Observaciones	Largo	Ancho	Altura	ml	Cant.	Sb,total
Suministro e instalacion de bordillo prefabricado en concreto 210 Kgrcm2 de 16 cm x 45 cm X 80 cm. incluye monolitico 1:4 para nivelacion						
	54,00			54,00		54,00
	5,00			5,00		5,00
	24,00			24,00		24,00
		Total Lleno de material proveniente de la misma ex				83,00

Observaciones

Elaboro	Aprobo	Supervisio
EL CONTRATISTA.	EL INTERVENTOR.	
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: JUAN CARLOS MARTINEZ NARANJO	Nombre: JORGE MORALES ALEMAN	Nombre: DOIVER ANTONIO HISPERUZA LOPEZ
Cargo: Representante Legal	Cargo: Representante Legal	Cargo: Director Técnico
Empresa: CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.	Emp.: ISC S.A.S.	Empresa: EDTB
CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORÍA	SUPERVISOR CONVENIO

PARQUE DE LAS DELICIAS

Memoria Calculo de Cantidades

Item	CANT	Descripción	UN
3.2.2	490.00	Suministro y construccion de piso con adoquin color café o similar 10 x 20 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2



Calculo de Cantidades

Observaciones	Largo	Ancho	Altura	M2	Cant.	Sb.total
Suministro y construccion de piso con adoquin color café o similar 10 x 20 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	13.00	6.00		78.00		
Zonas peatonales	13.00	2.00		26.00	440.00	490.00
Zonas peatonales	1.60	20.00		32.00		
Zonas peatonales	2.50	34.00		85.00		
Zonas peatonales	30.00	3.00		110.00		
Zonas peatonales	4.50	16.00		68.96		
		Total piso con adoquin color café o similar 10 x 20				490.00


Observaciones

Elaboró	Aprobó	Supervisó
EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR	
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: JUAN CARLOS MARTINEZ NAVARRO	Nombre: JORGE MORALES ALEMAN	Nombre: DORVER ANTONIO HERRERA LOPEZ
Cargo: Representante Legal	Cargo: Representante Legal	Cargo: Director Tecnico
Empresa: CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.	Emp.: IBC S.A.S.	Empresa: EDTB
CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISOR CONVENIO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.		
CONTRATO No.	033 - 2023	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA POTENTIA	ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
INTERVENTOR	INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONS ISC S.A.S.		

Item	CANT	Descripción	UN
4.1.1	5.00	Suministro, construccion y montaje de estructura metalica de soporte de cubierta, en acero Estructural AS1M A36, ASTM A572, AB7M A36, AS1M A572Gr. 50, AS7M A500Gr. C, AB1M A53 Gr. V, AS7M A193 Gr B7, ASTM F1554 Gr. 36, ASTM A325 T1, segun diseño, acbado en anticorrosivo y pintura electrostatica, incluye alquiler de equipos y todo lo necesario para su correcta construccion.	UN

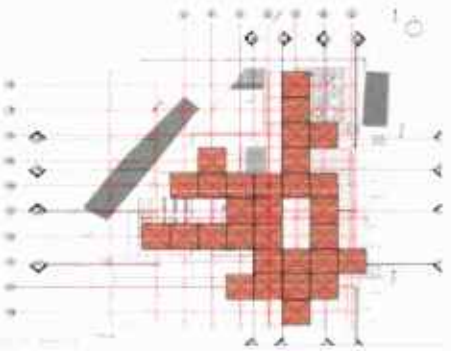



Calculo de Cantidades

Observaciones	Largo	Ancho	Altura	ml	Cant.	Sb.total
Suministro, construccion y montaje de estructura metalica de soporte de cubierta, en acero Estructural ASTV A36, ASTM A572, AS1M A36, ASTV A572Gr. 50, ASTV A500Gr. C, ASTM A53 Gr. V, ASTM A193 Gr B7, ASTM F1554 Gr. 36, ASTM A325 T1, segun diseño, acbado en anticorrosivo y pintura electrostatica, incluye alquiler de equipos y todo lo necesario para su correcta construccion.					5.00	5.00
		Total Lleno de material tipo subbase granular y cd				5.00

Observaciones

Elaboro	Aprobo	Supervisó
EL CONTRATISTA:	EL INTERVENTOR:	
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: JUAN CARLOS MARTINEZ MARINEZ	Nombre: JORGE MORALES ALEMAN	Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: Representante Legal	Cargo: Representante Legal	Cargo: Director Técnico
Empresa: CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.	Emp.: ISC S.A.S.	Empresa: EDTB
CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISOR CONVENIO

CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.
NIT 901.254.279-6
MANZANA C LOTE 14 BARRIO LA CONSOLATA
Tel: (3006646852)
Cartagena - Colombia
constructorapotentia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 42

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE- EDTB		
NIT	901.526.561-7	**Teléfono**	(605) 3113590471
Dirección	BRR BIJAO CR 49 A 48 A 56	**Ciudad**	El Bagre - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/09/2023, 09:34
Expedición	07/09/2023, 09:48
Vencimiento	22/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N°2 DE CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	1.00	345,244,236.96

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos m/cte con noventa y seis cent.

Total Bruto	345,244,236.96
Total a Pagar	345,244,236.96

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-22 por $ 345,244,236.96

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización 18764046646871 aprobado en 20230328 prefijo E desde el número 31 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 12089a0c38c9895493a74863b317322fa396dbd327c03c03748f848dfd84a82c36173f1f9111f8838169e69263f502547

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-4 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27528739
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-09-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA POTENTIA SAS	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901254279	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ C LT 14 SEC ALTO PARAISO BRR LA CONSO	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ASECONTRYSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	8371090
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1066742453	PRIMER APELLIDO	MARTINEZ	SEGUNDO APELLIDO	MENDOZA
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CARLOS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		$22.000.000		27528739

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1001741652	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	ALIAN SAEZ ISAAC ESTIVEN	$1.160.000
CC-1005653668	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	ARIAS CRIADO DIEGO	$1.160.000
CC-1040490971	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	BALDOVINO MARTINEZ LUIS MIGUEL	$1.160.000
CC-1071354404	01	No	No	No	23	678	5429001	Fijo	BEDOYA FERNANDEZ ADEN JOSE	$4.600.000
CC-11151559	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	$3.480.000
CC-78295951	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	CALLE PEREZ JORGE WILLIAM	$1.160.000
CC-1040762860	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	GUERRERO CASTAÑO JUAN DAVID	$1.160.000
CC-1040762018	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	GUERRERO FUENTE OLBER	$1.160.000
CC-1041087519	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	GUTIERREZ MUÑETON WILSON ANTONIO	$1.160.000
CC-8364487	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	MARTINEZ GUERRA ANDERSON	$1.160.000
CC-1066727617	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	MELENDREZ PEREZ EDER ANTONIO	$1.160.000
CC-71082908	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	PAREJA RODOLFO DE JESUS	$1.160.000
CC-1069471136	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	PEREZ BERMUDEZ WILSON ANDRES	$1.160.000
CC-1040501242	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	YEPES PELAEZ OSCAR EMILIO	$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1001741652																													0		
CC - 1005653668																													0		
CC - 1040490971																													0		
CC - 1071354404																													0		
CC - 11151559																													0		
CC - 78295951																													0		
CC - 1040762860																													0		
CC - 1040762018																													0		
CC - 1041087519																													0		
CC - 8364487																													0		
CC - 1066727617																													0		
CC - 71082908																													0		
CC - 1069471136																													0		
CC - 1040501242																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1001741652	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1005653668	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1040490971	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1071354404	PORVENIR	30	$4.600.000	0.1600000	$736.000	$0	$0	$736.000	$0	$0	$0
CC - 11151559	PORVENIR	30	$3.480.000	0.1600000	$556.800	$0	$0	$556.800	$0	$0	$0
CC - 78295951	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1040762860	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1040762018	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1041087519	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 8364487	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1066727617	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 71082908	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1069471136	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1040501242	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1001741652	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1005653668	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1040490971	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1071354404	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.600.000	0.0400000	$184.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.600.000	4290	0.0696000	$320.200
CC - 11151559	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.480.000	0.0400000	$139.200	$0	0	$0	0	$0	30	$3.480.000	4290	0.0696000	$242.300
CC - 78295951	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1040762860	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1040762018	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1041087519	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 8364487	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1066727617	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 71082908	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1069471136	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800
CC - 1040501242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1001741652	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005653668	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1040490971	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1071354404	COMFACOR	30	$4.600.000	0.0400000	$184.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11151559	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.480.000	0.0400000	$139.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78295951	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1040762860	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1040762018	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1041087519	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-8364487	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1066727617	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-71082908	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069471136	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1040501242	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
PORVENIR	6	$2.035.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.035.200
PROTECCION	6	$1.113.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.113.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	9	$417.600	$0	0	$0	0	$0	$417.600	0	$0	$0	$417.600	$0	0	$0	$0	$417.600	$0	$0	$417.600
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$462.400	$0	0	$0	0	$0	$462.400	0	$0	$0	$462.400	$0	0	$0	$0	$462.400	$0	$0	$462.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	14	$1.532.100	0	$0	$0	$1.532.100	0	$0	$1.532.100	0	$0	$0	$1.532.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	1	$184.000	0	$0	$184.000
COMFAMA ANTIOQUIA	13	$696.000	0	$0	$696.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$880.000
PENSIONES	4	$3.520.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.532.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$880.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.812.100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066742453		JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA	INDEPENDIENTE	Principal	BARRIO BIJAO	EL BAGRE-ANTIOQUIA	3142129226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	143129237	945413654	I	2023/09/13	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Rie.	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	1066742453	MARTINEZ JUAN	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066742453		JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA	INDEPENDIENTE	Principal	BARRIO BIJAO	EL BAGRE-ANTIOQUIA	3142129226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	143129237	945413654	I	2023/09/13	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/09/05 03:52 PM

Certificación Bancaria

Bancolombia

Planeta rica, 24 de Mayo de 2023

Señor

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S. identificado(a) con NIT No. 901254279 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	68700000760	2021/01/27	A ACTIVA

* **Importante**: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes numeros: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Powered by CamScanner
