Folio No. _____

predio 42-38SUR. 6.06x 1.40 -1caja- 1cajilla. =7.67m2.
predio 42-32SUR 6.04x 1.05 -1caja -1cajilla =5.53m2
predio 42-26SUR. 5.97x 0.90 -1caja -1cajilla. = 4.56m2.
predio 42-20SUR. 6.06x0.92 -1caja - 1cajilla = 4,76m2
predio 42-14SUR. 7 x 1.10 - 1caja - 2cajillas = 6,71m2
Total demolición costado oriente = 53.53m2
personal: 2oficiales, 1 boal, 1operador.
equipo: 1 minicargador CAT
ROSA LOA MONROY
Resid. Técnico

Miercoles 02 Agosto 2023
P-16 CIV 8000907
KR98 CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29940 Sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Excavación parcial en anderes costado oriente.
personal: 2 oficiales.
ROSA LOA MONROY
Resid. Técnico

Jueves 03 Agosto 2023
P-16 CIV 8000907
Kr 98 CL42Sur - CL42ASur
PK-ID 29940 Sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividades: Excavación manual parcial de los anderes sobre el costado oriental
Personal: 3 Ayudantes, 3 oficiales, 2 Boal

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Viernes 04 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

Kr98 CL42sur - CL42Asur

PK-ID 29940 Suroriente

PK-ID 29941 Nor/occidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Se realizo excavación manual de anden, sobre el costado oriental en los predios 42-14s, 42-20s, 42-26s, 42-32s y 42-38s

Excavación manual: $(31,13 \times 1.8 \times 0,45) - 5(0,8 \times 0,8 \times 0,45) = 23,77 m^3$

Personal: 3 Oficial, 3 Ayudante

L. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Luis R.
Inte Ventas

Sabado 05 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

Kr98. CL 42Sur -CL42ASur.

PK-ID 29940 sur/oriente.

PK-ID 29941 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Excavación parcial para anden en costado oriental

Personal: 2 Oficial

Observación: Se le hace la observación al contratista que falta personal para adelantar las actividades en esta Prioridad.

L. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Luis R.
Inte Ventas

Martes 08 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

Kr98 CL42sur - CL42Asur

PK-ID 29940 Sur/oriente

PK-ID 29941 nor/occidente

tiempo: seco

Folio No. _____

Ambiental-SST: Se observan actividades de excavación manual en espacio publico, RCD acordonado alo largo del espacio Publico Para retirar

Nancy Alberto Ortega

Residente SST Entoventario

Actividad: excavación parcial de anden sobre costado oriental

Personal: 2 Oficial, 3 Ayudante

J. ANDRES PARRA
C.C. 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 09 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

Kr 98 CL42sur - CL42Asur

PK-ID 29940 Suroriente

PK-2D 29941 no/oriente

tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo Saturado

PM, Suelo seco.

~~Actividad: Se realiza los sondeos al pozo en perfil Interno.~~

Actividad: Excavación manual en anden costado oriental, Nivelación y compactación Subrasante en anden oriental

Excavación manual: $(27,43 \times 1,9 \times 0,45) - (4(0,8 \times 0,8 \times 0,45)) = 22,30 m^3$ anden. oriente

Nivelación Subrasante: $(31,13 \times 1,9) - (5(0,8 \times 0,8)) = 55,95 m^2$ anden. oriente

Geotextil: $(31,13 \times 2,0) - (5(0,8 \times 0,8)) = 59,06 m^2$ anden. oriente

Fresado: $(31,13 \times 1,9 \times 0,20) - (5(0,8 \times 0,8 \times 0,20)) = 11,19 m^3$ anden. oriente (Alternativa)

Personal: 2 Oficial, 2 Ayudante

JOSHUA LUNA MONTOYA

Resid. Tecnico.

Jueves 10 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

Kr 98 CL42sur - CL42Asur

PKID 29940 Suroriente

Folio No. _____

PK-ID 29941 nor/occidente

tiempo: seco

Actividad: Demolición parcial de anden es y excavación manual parcial en anden es.

observación: el rendimiento y avance en esta prioridad es mínimo, el contratista no cuenta con material para iniciar la construcción de cajas de inspección

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Viernes 11 Agosto 2023

P-16 CZV8000907

Kr 98 CL42sur - CL42Asur

PK-ID 29940 Suroriente

PK-ID 29941 nor/occidente.

tiempo: Nublado AM Suelo saturado, PM Suelo seco.

Actividad: Excavación manual y demolición de anden en los predios: 42-45s, 42-51s 42-57s y 98-04

Demolición: Predio 42-45s: (6,04 x 1,45) - (Caja inspección + Caja medidor) = 8,04 m²

Predio 42-51s: (5,97 x 1,01) - (Caja inspección + caja medidor) = 5,29 m²

Predio 42-57s: (6,04 x 1,03) - (Caja med.dor) = 6,12 m²

Predio 98-04: (9,35 x 1,52) - (Caja inspección + 3 Caja medidor) = 13,27 m²

total demolición: 32,77 m²

excavación manual: (27,45 x 1,9 x 0,45) - (3 x (0,8 x 0,8 x 0,45)) = 22,61 m³

Personal: 3 Oficial, 3 Ayudante.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Sabado 12 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

Kr 98 CL42s - CL42As

PK-ID 29940 Suroriente

PK-ID 29941 nor/occidente

Folio No. _____

tiempo: Seco
Actividad: Excavación manual y perfilados.
Personal: 2 oficial, 2 Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lago
Interventoría

Lunes 14 Agosto 2023
P-16 CIV 8000907
K298 CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29940 sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza demolición placa andenes.
predio 42-25SUR. 5.92 x 1 - 1caja - 1cajilla = 5.11m².
predio 42-31SUR. 6.02 x 0.9 - 1caja - 1cajilla. = 4.60 m²
predio 42-37SUR 6 x 1.35 - 3cajillas = 7.58m².
placa doble. Total demolición occidente: 2 x 17,29 = 34.58m²,
excavación manual predios 42-25SUR, 42-31SUR,
32-37SUR. 17,94 x 1.90 x 0,45 - 3 cajas = 14.48 m3
personal: 2oficiales, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 15 Agosto 2023
P-16 CIV 8000907
K298 CL 42SUR - CL 42ASUR.
PK-ID 29940 sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, Acopio

Folio No. _____

de RLD para retirar, Sendero Peatonal central, definido.
Nury Alberto Diaz
Interventoria SST Residente.
Dir. Acts. Interv
No hay actividad en esta jornada
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoria
Miercoles 16 Agosto 2023
P-16 CIV 8000907
KR 98 CL 42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29940 sur/oriente.
PK-ID 29941 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación manual parcial en andenes.
personal: 2oficiales, 1 ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoria
Jueves 17 Agosto 2023
P-16 CIV 8000 907
KR98 CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29940 sur/oriente.
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Demolición de cajas de inspección costado oriente.
predio 41-14SUR, 41-20SUR, 41-26SUR, 41-32SUR.,
0,27 x 4 = 1.08 m3, construcción de cajas de.
inspección de los mismos predios 4unidades.
personal: 2oficiales, 2ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoria

Folio No. _____

Viernes 18 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907.

KR98 CL42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29940 suroriente.

PK-ID 29941 norloccidente.

Tiempo: Seco 2:45pm - 3:30pm. (se definen actividad)

Actividad: Se realiza demolición concreto costado occidente predio 41-13SUR. 7.20 x 0,95 - 1caja - 1 cajilla = 6,40m², predio 41-19SUR.

6,06 x1.15 - 1caja - 1cajilla = 6,23m².

Total demolición occidente = 12,33m².

excavación Manual predio 41-13SUR, 41-19SUR.

13,26 x1.90 x 0,45 = 10,76m³

personal: 3 oficiales, 1 ayudante.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Luis Astrepo Rey

Inte. Ventana

Sabado. 19 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

KR98 CL42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29940 suroriente.

PK-ID. 29941 norloccidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Demolicion de cajas de inpeccion costado oriental. 42-38SUR, 42-44SUR, 42-50SUR.

3 x 0,27 = 0,81m3, construccion de cajas de inspeccion de las mismas 3 unidades

personal: 2 oficiales, 2 ayudantes

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Luis Astrepo Rey

Inte. Ventana

Folio No. _____

Martes 22 Agosto 2023
P-16 CIV 8000907
KR 98 CL42SUR - CL.42ASUR.
PK-ID 29940 Sur/oriente.
PK-ID 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Excavación manual en andenes, material acopiado producto de la excavación que estan realizando para ser retirado.
Nuyl Albarracin Pabon
Residente SST Interventoria
Actividad: Se realiza perfilado de excavación manual andenes costado oriental
Personal: 2 Oficial, 2 Ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Residente Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Miercoles 23 Agosto 2023
P-16 CIV 8000907
Kr 98 CL42S - CL42AS
PK-2D 29940 Sur/oriente
PK-2D 29941 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza demolición y construcción de cajas de inspección a los siguientes predios. 42-51S, 42-57S, 98-04, 42-56S, 97F-16
Construcción: 5 unidades
Demolición: $5 \times 0,27 = 1,35 m^3$
Equipo: 1 Mini cargador
Personal: 3 Oficial, 3 Ayudante, 1 Operador, 2 Aux tratico.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Jueves 24 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

K, 98 CL42$_S$ - CL42A$_S$

PK-ZD 29940 Sur/oriente

Pk-ZD 29941 nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: Se realizo Demolición y construcción de cajas de inspección.

Demolición: 6 und x 0,27 = 1,62 m^3

Construcción: 6 und a predios: 42-13$_S$, 42-19$_S$, 42-25$_S$, 42-31$_S$, 42-37$_S$, 42,45$_S$

Personal: 3 oficial, 3 Ayudantes

ROSA LIDA MONCADA Resid. Técnico

Interventoría.

Viernes 25 Agosto 2023.

P-16 CIV 8000907

KP98 CL42SUR - CL42ASUR.

PK-10 29940 sur/oriente.

PK-10 29941 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza instalación de fresado en anden costado oriente., predios 42-44 SUR, 42-50SUR, 42-56SUR, 97F-16.

27,43 x 2 x 0,20 - 4 cajas = 10,46m3.

personal: 2oficiales, 1ayudante.

Observación: La subrasante se encuentra firme, por lo tanto no se realiza nivelación y compactación. en los predios 42-44SUR, 42-50SUR, 42-56SUR, 97F-16.

ROSA LIDA MONCADA Resid. Técnico


Interventoría

Sabado 26 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907.

Folio No. _____

KR98 CL42SUR - CL 42ASUR.
PK-ID 29940 Suroriente.
PK-ID 29941 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates cajas de inspección
personal: 3oficiales, 2ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Inter Ventoria.
Lunes 28 Agosto 2023
P-16 CZV8000907
Kr98 CL42S - CL42AS
PK-ID 29940 Suroriente
PK-ID 29941 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: Perfilado de excavación costado oriental y remates de cajas costado oriental
Personal: 3Oficial, 2 Ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria
Martes 29 Agosto 2023
P-16 CZV8000907
Kr98 CL42S - CL42AS
PK-ID 29940 Suroriente
PK-ID 29941 nor/occidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa excavación manual de andenes, compactación de fresado en andenes, Material RCD producto de la excavación para ser retirado, se evidencia punto ecológico, punto de hidratación, kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), personal hace uso de sus EPP's.
Nuby Alvarez Diaz
Residente SST Interventoria

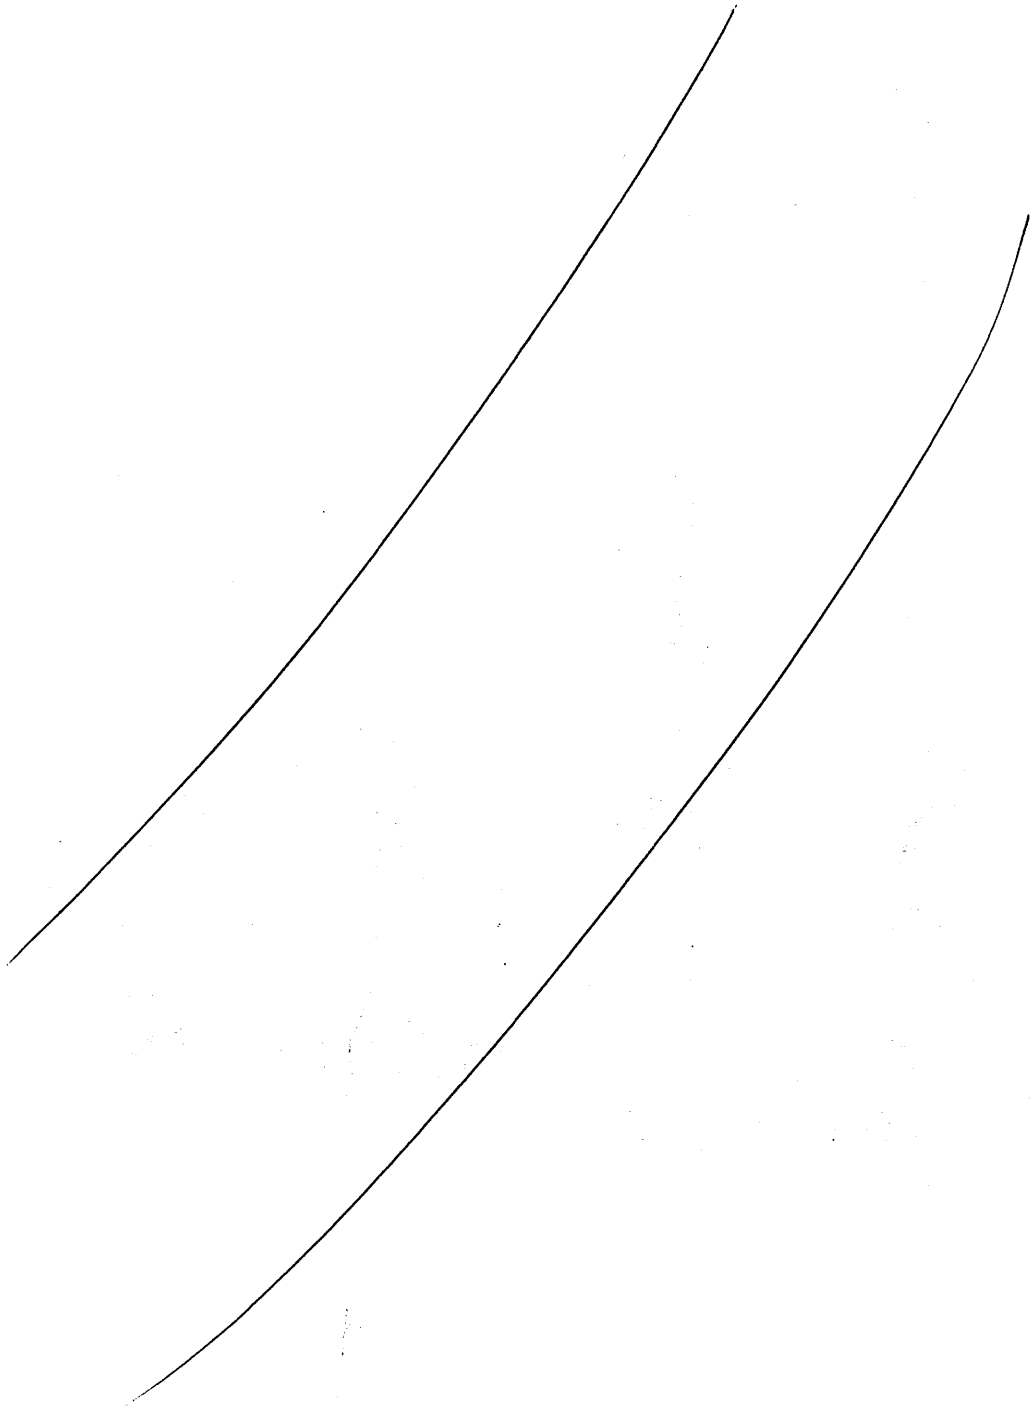


XIE
LOS ALMENDROS
Parque
Diadelito
Bella Vista
CIUDAD DE CALI
Google
10 Calle 42a Sur
Kennedy
Bogotá
31 ago 2023

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Se realizará la rampa peatonal dentro de las actividades normales de construcción de espacio público	Contratista XIE S.A	Ejecución de obra

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN						
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**			

Observaciones
Ninguna

Siendo las 9.15 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Patricia Satorre
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN REVISA EL ACTA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN APRUEBA EL ACTA:	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

				DD	MM	AA
ACTA No. 01	**COMITÉ/REUNIÓN:** Recorrido PQRSD No 25			25	ago	2023
LUGAR:	Prioridad 16	**HORA DE INICIO:**	9.00 am	**HORA FIN:**		9.15 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDECIA	FIRMA
PATRICIA LATORRE	AUXILIAR SOCIAL	CONTRATRISTA	
JAIME ALFONSO DIAZ	RESIDENTE TÉCNICO	CONTRATRISTA	
JIMMY MONTEALEGRE	ESPECIALISTA EN ESPACIO PÚBLICO	CONTRATRISTA	

ORDEN DEL DIA

1. Recorrido de obra
2. Socialización prioridad 16
3. Cierre

TEMAS TRATADOS

Siendo las 9.00 am se da inicio al recorrido técnico con el especialista en espacio público, residente técnico, y área social, para definir la rampa peatonal solicitada en la PQRSD No 25, ubicada en la carrera 98 # 42-44 sur PRIOIRDAD 16.

De acuerdo al compromiso del comité integral # 46 del 24 de agosto en el cual debían realizar visita conjunta de especialistas de espacio publico de interventoría y contratista.

El especialista de espacio público del contratista el cual considera viable la construcción de la rampa peatonal y determina los parámetros pertinentes para su ejecución.

Siendo las 9.15 am se culmina el recorrido.

FORMATO ACTA DE REUNION							
CÓDIGO	**PROCESO**				**VERSIÓN**		
FECHA	25/08/2023	**HORA INICIO**		**DURACIÓN (HORAS)**		**ACTA No.**	
ASUNTO	DEFINICION DE ESPACIO PUBLICO EN PREDIOS						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto: Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1						

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Jiimmy Montealegre Henao	XIE S.A	Especialista Urbanista	
Jaime Alfonso Diaz Moreno	XIE S.A	Residente Técnico	
Rosalida Mongua	XIE S.A	Residente Técnico	
Milena Medina	XIE S.A	Residente Social	

TEMAS

1- Concepto Entrega de Calzada CIV No. 8000979
2- Concepto Entrega de Calzada CIV No. 8001041
3- Concepto de Espacio Publico del Predio carrera 97 No. 41-44 Sur
4- Concepto de Espacio Publico del Predio carrera 98 No. 40A-04 Sur
5- Concepto de Espacio Publico del Predio Calle 41 Sur No. 97F-17
6- Concepto de Espacio Publico del Predio carrera 98 No. 42-44 Sur

DESARROLLO

En dia de hoy se hace recoorido con el Arq, Jimmy Montealegre H., especialista de E.P., especificamente sobre l predio de la Carrera 98 No. 42-44 Sur, sobre el cual se generó PQR y como compromiso del comité integral del dia 24 de Agosto de 2023

De igual manera se aprovecha la visita del especialista para la verificacion y concepto de actividades ejecutadas en el espácio publico que en su momento fueron avaladas por el Arq. Mario Burgos especialista de E.P. de la interventoria y otras ejecutadas posteriormente a la visita del Arq. Burgos y que fueron diseñadas por nuestro especilista Arq. Montealegre.

CONCLUSIONES

Sobre el predio de la carrera 98 No. 42-44 Sur, el Arq. conceptuó viable ejecutar la rampa peatonal para acceso al predio de personas con capacidad limitada de movilidad y determino los parametros de construcción.

Terminado el recorrido se queda pendiente la emision de los conceptos por parte de nuestro especialista de E.P.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios

Folio No. _____

Actividad: Se realizo corte de estabilizado para instalación de bordillo provisional, excavación de estab.lizado para instalación de bordillo y nivelación y compactación de fresado primera capa.

Personal: 3 Oficial, 3 Ayudante.

Rosa Lida Monqua

Lucas Restrepo
Interventoría.

Resid. Técnico

Nota: El dia viernes. 25 Agosto se realizo el recorrido con el esp. de Esp. Público para ela aprobacion del o rompa de la sra / / / / / / / / - Predio / / / / (Adjunta Acta de Aprobación). Rosa Lida Monqua

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 30 Agosto 2023

P-16 CIV 8000907

PK-ID 29940 surloriente

PK-ID 29941 norloccidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Perfilación de excavación costado occidente.

personal: 1 oficial, 1 ayudante.

Rosa Lida Monqua

Lucas Restrepo
Interventoría.

Resid. Técnico.

Jueves 31 Agosto 2023

P16 CIV 8000907

PK-ID 29940 Surloriente

PK-ID 29941 norlocciente

tiempo: Seco

Actividad: Nivelación y compactación de Subrasante, Instalación de geotextil y primera capa de fresado sobre costado occidental.

Nivelación y compactación: $(58,71 \times 1,9) - 9(0,64) = 105,74 m^2$

Geotextil: $(58,71 \times 1,9) - 9(0,64) = 105,74 m^2$

fresado: $(58,71 \times 1,9 \times 0,2) - (9(0,8 \times 0,8 \times 0,2) = 21,16 m^3$

Personal: Oficiales, Ayudantes.

Lucas Restrepo
Interventoría

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico

Folio No. _____

Viernes 1 Septiembre 2023
P-16 CZV 8000907
PK-ID 29940 Surloriente
PK-ID 29941 norloccidente
tiempo: Seco
Actividad: Nivelación y compactación de fresado en anderes y remates de cajas de inspección.
ROSA LIDA MONCUA — Lucas Restrepo
Resid. Técnico — Interventoría

Sabado 02 Septiembre 2023
P-16 CZV 8000907
PK-ID 29940 Surloriente
PK-ID 29941 norloccidente
tiempo: seco
Actividad: Se realiza bordillo A-80 costado oriente del K0+000 al K0+026 26ML
personal: 2oficiales, 2ayudantes
ROSA LIDA MONCUA — Lucas Restrepo
Resid. Técnico — Interventoría

Lunes 04 Septiembre 2023
P16 CZV 8000907
PK-ID 29940 Sur/oriente
PK-ID 29941 nor/occidente
tiempo: seo
Actividad: Se realiza instalación bordillo A-80 costado occidente del K0+000 al K0+027 27ML. costado oriente del K0+026 al K0+027 1ML.
personal: 2oficiales, 2ayudantes.
