FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	09/08/2023	**HORA INICIO**	10:30 AM	**DURACIÓN (HORAS)**	1	**ACTA No.**	42

ASUNTO	COMITÉ AMBIENTAL SEMANAL		
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2		
ÁREA RESPONSABLE	AMBIENTAL	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**	☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
ADRIANA CASTRO ALBA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio Vías Kennedy 2022 - COP-690-22**	
YANET CLARO PEÑARANDA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio SCLV - CIN717**	

TEMAS

1 Programación
2 Documentación contractual
3 Cantidades y certificaciones
4 Otros

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D
	7	8	9	10	11	12	13
SEGUIMIENTO AL MAO							
INSPECCIONES DE OBRA CONJUNTA							
COMITE TECNICO							
COMITE SEGUIMIENTO							
INFORME SEMANAL							

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

- No aplica para esta semana
- El contratista entrega el informe Mensual N.10 Mes de Julio – Se encuentra observado.

CANTIDADES Y CERTIFICACIONES

- Se adjunta el formato FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0. Semanales con las calificaciones que aplican para esta semana. La calificación en del 100% para el Componente Ambienta SST, MQ y Forestal.

- RCD GENERADO. El Residente Ambiental del Contratista indica, que para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación por un total de **300 m^3**.

- Material fresado que ingreso: Unidad de Mantenimiento vial **330 m^3**

- **ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA SEMANA**:

  El contratista informa las siguientes actividades de la semana:

CIV 8004757 (44) - Sin actividades

CIV 8004699 (48) - Descargue Fresado - Fresado Estabilizado RAP - Nivelación y Conformación 1a capa fresado Estabilizado RAP - Compactación Fresado Estabilizado RAP 1a capa -

CIV 8004816 (49) - Cargué y retiro de material de excavación Andenes C occidental - Demolición y excavación Andén C/ occidental - Construcción cajas de inspección - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén C occidental - Excavación para instalación Bordillo A-80 - Construcción cajas de inspección C/ occidental

CIV 8004663 (50) - Instalación Monoblock C/Occidental - Demolición y construcción Cajas de inspección C/occidental - excavación manual para demolición de cajas de aguas negras - Construcción cajas de inspección - Conformación Andén C occidental - Instalación Bordillo A-80

CIV 8004947 (56) - Demolición y excavación Andén C/occidental

CIV 8002162 (60) - Sin actividades

CIV 8002265 (61) - Sin actividades

CIV 8001931 (64) - Sin actividades

CIV 8002008 (65) - Sin actividades

CIV 8001876 (66) - Instalación de bordillo A80 K0+000

CIV 8001715 (68) - Dosificación fresado estabilizado - Cereo última capa de Fresado estabilizado - Sello y compactación última capa de Fresado estabilizado cajón de vía - Instalación cabezal sumideros - Excavación para instalación caja inferior sumideros

CIV 8001823 (69) -Instalación concreto MR-41 microfibra - Estampado toperol en rampas - Buenos días instalación cargue superior pozo - Instalación geotextil andén costado occidental - Lleno con fresado andén costado occidental - Riego con agua andén costado occidental - Compactación con canguro andén costado occidental - fundida solados para instalación cajón inferior sumideros - Instalación cajón inferior sumideros - Instalación tubería 12" conexión sumideros

CIV 8001657 (70) - Instalación geotextil y lleno primera capa de Fresado punta sur occidental - Lleno con fresado andén costado occidental primera capa - Lleno con fresado andén costado occidental segunda capa - Compactación primera capa de Fresado andén costado occidental - Compactación con canguro andén - Construcción caja de inspección 40x 40 predio bajo nivel #40-16 P70 e instalación tubería de 4" para conexión costado occidental - Riego con agua para compactación andén costado occidental - Compactación con canguro andén costado occidental primera capa de Fresado - Fundida cañuelas cajas de inspección - Instalación geotextil andén costado oriental - Lleno con fresado andén costado oriental

CIV 8001771 (71) - Excavación para andén costado occidental - Retiro material excavación - Construcción mampostería pozo K0+064 - Excavación para cajón inferior sumideros - fundida solados para cajón inferior sumideros - Instalación cajón inferior sumideros

CIV 8001148 (73) - Sin actividades

CIV 8001184 (74) - Excavación manual para instalación de geotextil con geocelda - Instalación cabezal sumidero andén norte y sur - Excavación manual para realizar empalme de geotextil y geocelda - Reparación de sumideros con mortero - Instalación geocelda y geotextil para empalme - Extendida de primera capa de fresado con geocelda

CIV 8001123 (75) - Excavación manual para instalación de geotextil con geocelda - Instalación cabezal sumidero andén occidental y oriental - Excavación manual para realizar empalme de geotextil y geocelda - Instalación de geocelda y geotextil para rellenar con fresado

CIV 8001183 (76) - Excavación manual para instalación de geotextil con geocelda - Instalación cabezal sumidero andén oriental y occidental - Excavación manual para destapar geocelda y hacer empate con geocelda

CIV 8001285 (77) - Subterranización de manguera agua potable calle 39a 93d -53 ABS K0+030 - Subterranizacion de 2 mangueras de agua potable Calle 39a 93d 35 Calle 39a 93d 29

CIV 8001390 (79) - Preparación de mezcla (RAP) con cemento - Homogeneización de estabilizado - extención nivelación y compactación de estabilizado - Demolición de andenes en concreto - Se retira medidor de agua del predio Cra 93c 38c 58s - Excavación andén oriental - excavación manual de andén oriental para retirar medidores, polos a tierra e identificar tubería de gas

CIV 8001581 (80) - Cargue de excavación tuberia 12" - Compactacion de estabilizado RAP - Cereo de estabilizado RAP - Concreto solado de limpieza para pozo K0+040 - excavación manual para domiciliaria 6" - Dado en concreto tuberia 6" Novafor e instalación de tuberia - Instalación de placa fondo pozo ALL - Lleno con arena de peña para cama tuberia 12" - Excavacion manual para domiciliaria predio 38c76s - Instalación de domiciliaria tuberia 6" - Construcción de pozo K0+040 ALL - Lleno con fresado zanja tuberia 12" ALL - Instalación de geotextil y geocelda

CIV 8005000 (81) - Sin actividades

CIV 8005078 (82) - Sin actividades

CIV 8001841 (89) - Mezcla de estabilizado RAP - demolición de anden en concreto costado oriental - Estendida y cereo de estabilizado RAP 1ra capa - Demolicion y desistalada de contadores en andenes

OTROS:

En recorrido realizado por parte de la Residente Ambiental del Contratista y la Residente Ambiental de interventoría se evidenció lo siguiente:

- A manera generar los frentes de obra se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo, es de anotar que varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de excavación, donde se realiza acopio de residuos para ser retirados cuando se complete la capacidad de la volqueta.
- Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y baños fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.
- El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.
- Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.
- En la misma visita se evidenció“Ausencia de Personal y de actividades” en algunos CIV´s.

NOTA: las observaciones realizadas durante el recorrido fueron atendidas en hora de la tarde, satisfactoriamente.

- El residente ambiental del contratista adjunta la trazabilidad de los informes sugerida por el FDLK:

INFORME	VERSIÓN 0		VERSIÓN 1		ALCANCE		ALCANCE	
	ENTREGA	OBSE.	ENTREGA	APRO. U OBS	OBSE. FDLK CORREO		OBSE. FDLK COMITÉ	
					ENTREGA	OBSE.	ALCANCES	APRO.
INFORME 1	CE-CVK22-ADM-045	U233-G2-032-22	CE-CVK22-ADM-057	**U233-G2-064-22**				
	2/11/2022	4/11/2022	5/11/2022	**25/11/2023**				
INFORME 2	CE-CVK22-ADM-098			**U233-G2-095-22**				
	28/11/2022			**30/11/2023**				
INFORME 3	CE-CVK22-ADM-167			**U233-G2-172-23**	CE-CVK22-ADM-378	U233-G2-377-23	CE-CVK22-ADM-403	**U233-G2-379-23**
	30/12/2022			**10/01/2023**	11/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	**17/04/2023**
INFORME 4	CE-CVK22-ADM-219			**U233-G2-225-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-382-23**
	30/01/2023			**3/02/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**18/04/2023**
INFORME 5	CE-CVK22-ADM-294	U233-G2-294-23	CE-CVK22-ADM-310	**U233-G2-316-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-388-23**
	4/03/2023	8/03/2023	9/03/2023	**5/03/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**21/04/2023**
INFORME 6	CE-CVK22-ADM-365	U233-G2-349-23			CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-431-23**
							17/04/2023	
							CE-CVK22-ADM-418	
	31/03/2023	5/04/2023			14/04/2023		21/04/2023	
							CE-CVK22-ADM-427	
							26/04/2023	
INFORME 7	CE-CVK22-ADM-443		CE-CVK22-ADM-458	**U233-G2-433-23**	CE-CVK22-ADM-505		CE-CVK22-ADM-507	**U233-G2-507-23**
	4/05/2023		11/05/2023	**23/05/2023**	30/05/2023		31/05/2023	**2/06/2023**
INFORME 8	CORREO SCLV -AMB		CE-CVK22-ADM-641	**U233-G2-590-23**				
	1/06/2023							
	CE-CVK22-ADM-531		2/08/2023	**4/08/2023**				
	8/06/2023							
INFORME 9	CE-CVK22-ADM-565	COMITÉ No. 40	CE-CVK22-ADM-602					
	30/06/2023	18/07/2023	18/07/2023					
INFORME 10	CE-CVK22-ADM-638							
	2/08/2023							
	CE-CVK22-ADM-647							
	4/08/2023							

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS













PUNTOS ECOLOGICOS













KIT DE DERRAMES















BAÑOS

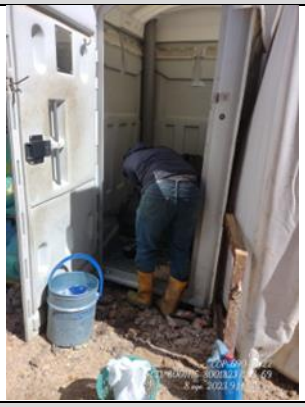



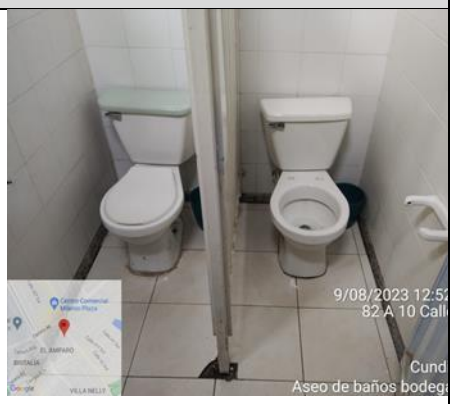

CERRAMIENTOS













PROTECCIÓN DE SUMIDEROS







CONCLUSIONES

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
Mantener en forma permanente los frentes de obra en buenas condiciones de orden y aseo.	Contratista.	Permanente.

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		
2		
