FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	16/08/2023	**HORA INICIO**	4:30 PM	**DURACIÓN (HORAS)**	1	**ACTA No.**	43

ASUNTO	COMITÉ AMBIENTAL SEMANAL		
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2		
ÁREA RESPONSABLE	AMBIENTAL	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**	☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
ADRIANA CASTRO ALBA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio Vías Kennedy 2022 - COP-690-22**	
YANET CLARO PEÑARANDA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio SCLV - CIN717**	

TEMAS

1 Programación
2 Documentación contractual
3 Cantidades y certificaciones
4 Otros

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D
	14	15	16	17	18	19	20
SEGUIMIENTO AL MAO							
INSPECCIONES DE OBRA CONJUNTA							
COMITE TECNICO							
COMITE SEGUIMIENTO							
INFORME SEMANAL							

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

- No aplica para esta semana
- El contratista entrega el informe Mensual N.10 Mes de Julio – Se encuentra observado.

CANTIDADES Y CERTIFICACIONES

- Se adjunta el formato FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0. Semanales con las calificaciones que aplican para esta semana. La calificación en del 100% para el Componente Ambienta SST, MQ y Forestal.

- RCD GENERADO. El Residente Ambiental del Contratista indica, que para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación por un total de **510 m^3**.

- Material fresado que ingreso: Unidad de Mantenimiento vial **300 m^3**

- **ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA SEMANA**:

  El contratista informa las siguientes actividades de la semana:

CIV 8004757 (44) - Sin actividades

CIV 8004699 (48) - Sin actividades

CIV 8004816 (49) - Construcción cajas de inspección C/ occidental - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén C/occidental - Cargué y retiro de material de excavación Andenes - Demolición y excavación Andén C/oriental - Demolición y construcción Cajas de inspección C/ oriental

CIV 8004663 (50) - Descargue concreto 3000 espacio público - Estampado espacio público C/ Occidental - Instalación Monoblock espacio público predio N 41a25 C/occidental - descargue Concreto MR-41 Microfibra - Estampado Rampas vehiculares - Conformación espacio público C/ occidental

CIV 8004947 (56) - Demolición - Excavación -lleno fresado Andén C/ occidental - Cargué y retiro de material de excavación - Descargue Fresado - Demolición -excavación lleno Fresado Andén C occidental - Demolición y excavación manual espacio publico - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén C occidental - Demolición y excavación manual Andén C/occidental

CIV 8002162 (60) - Ordenamiento conexión medidores predio #40-58 y arreglo fuga de agua

CIV 8002265 (61) - Sin actividades

CIV 8001931 (64) - Sin actividades

CIV 8002008 (65) - Sin actividades

CIV 8001876 (66) - Sin actividades

CIV 8001715 (68) - Descargue de Fresado - Mezcla fresado estabilizado punta sur - Compactación fresado estabilizado punta sur

CIV 8001823 (69) - Instalación Monoblock 320 - Conexión monoblock 320 a sumidero con accesorios de 6" - Lleno con fresado segunda capa andén costado oriental - Compactación con canguro andén costado occidental - Instalación bordillo A-80 punta norte - Lleno con fresado andén costado occidental - Fundida rampas en contreto - Estampado en rampas - Mezcla fresado estabilizado punta norte

CIV 8001657 (70) - Riego con agua para vaciado de concreto - Vaciado y vibrado concreto MR - Alistado concreto MR rampas - Estampado toperol en rampar - Inicio estampado en rampas - Riego con agua para compactación segunda capa de Fresado andén costado oriental - Compactación con canguro andén costado occidental - Vibrado concreto MR en rampas - Estampado en rampas - Compactación con canguro andén costado oriental - Estampado toperol andén - Instalación tapas en cajas de inspección - Inicio estampado tipo adoquin andén

CIV 8001771 (71) - Extendido geotextil andén costado oriental - Lleno con fresado primera capa andén costado oriental - Compactación punta norte - Descargue de Fresado - Instalación geocelda y geotextil punta norte - Extendido geotextil andén costado oriental - Lleno con fresado andén costado oriental - Riego con agua para compactación primera capa de Fresado andén costado oriental - Fundida cañuela pozo - Instalación placa superior pozo - Riego con agua para compactación primera capa de Fresado andén costado oriental - Compactación con canguro andén costado oriental - Instalación bordillo A-80 punta norte costado oriental - Instalación Monoblock 320 costado oriental - Extendido geotextil andén costado occidental

CIV 8001148 (73) - Sin actividades

CIV 8001184 (74) - Preparación estabilizado (RAP) con cemento intersección - Compactación con vibrocompactador de 1ra capa de estabilizado intersección P74, P75 y P76

CIV 8001123 (75) - Excavación para instalar fresado con geocelda y geotextil - Sondeo de tubería - Excavación para instalación de pozo - Mezclado de solado para pozo - Preparación estabilizado (RAP) con cemento intersección - Compactación con vibrocompactador de 1ra capa de estabilizado intersección P74, P75 y P76
CIV 8001183 (76) - Compactación con canguro capa de fresado con geocelda - Riego con agua de 2da capa fresado para andén oriental - Preparación estabilizado (RAP) con cemento intersección - Compactación con vibrocompactador de 1ra capa de estabilizado intersección P74, P75 y P76

CIV 8001285 (77) - Excavación para pozo - Excavación para tubería 12" - Cargue de Volqueta con material de excavación - Excavación manual de zanja para ajustar tubería agua sanitaria

CIV 8005282 (78) - Excavacion Mecánica vía - Excavacion manual para instalación Manguera 1/2 pf Predio N 82-23 C/sur - Cargué y retiro de material de excavacion - Compactación Subrasante

CIV 8001390 (79) - Cargue de Volqueta con material de excavación - excavación manual para nivelar caja de andén occidental - Se continúa excavando manualmente para perfilar caja de andenes - Construcción caja de inspección 0.60 * 0.60. 38c 76s - Lleno Fresado Andén C/oriental - Construcción caja de inspección 38c 70 - 38c 64s - 38c 58s - 38c 52s - 38c 46s - 38c 40s - 38c 77s - 38c 71s - 38c 28s - 38c 22s - 38c 16s - Excavación de zanja para filtro con geodren
CIV 8001581 (80) - Conformada y limpieza de via - Instalación de placa superior de pozo ALL K0+040 - Descargue de fresado - Instalación de geotextil , geocelda y lleno con fresado - Nivelacion y Compactacion de la subrasante - Excavacion para tuberia 12" novafor - Cama de arena de peña para tubería 12" ALL

CIV 8005000 (81) - Sin actividades

CIV 8005078 (82) - Sin actividades

CIV 8001841 (89) - Se colocan niveles en paramentos para espacio publico - Limpieza y aseo - Demolición de caja sanitaria predio # esquina K0+000 costado oriental - Retiro de escombro - Demolición de anden en concreto costado oriental - Instalación de cargue superior pozo ALL K0+062 - Demolición de caja sanitaria predio # 38c46s costado oriental - predio # 38c82s costada oriental - predio # 38c76s - predio # 38c72s - predio # 38c52s - predio # 38c58s - predio # 38c64s - predio # 38c59s - predio #38c71s - predio # 38c58s - Mezcla se estabilizado RAP 1ra capa - Extendida y cereo de estabilizado - Compactacion 1ra capa estabilizado - Estendida y cereo de estabilizado RAP 1ra capa

CIV 8005210 (90) - Compactación Subrasante - Excavacion Mecánica vía - Cargué y retiro de material de excavacion - Instalación Geotextil y Geocelda vía - Lleno Fresado Geocelda - Compactación fresado Geocelda - Fresado Estabilizado RAP 1a capa - Cereo comformacion y Compactación Fresado Estabilizado RAP 1a capa -

OTROS:

En recorrido realizado por parte de la Residente Ambiental del Contratista y la Residente Ambiental de interventoría se evidenció lo siguiente:

- Es de anotar que varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de excavación, donde se realiza acopio de residuos para ser retirados cuando se complete la capacidad de la volqueta. Se realizó observación por desorden en algunos puntos y por evidencia de derrame de cemento y residuos sobre el paso peatonal.

- Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y baños fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.
- El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.
- Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.
- En la misma visita se evidenció“Ausencia de Personal y de actividades” en algunos CIV´s.

NOTA: las observaciones realizadas durante el recorrido fueron atendidas en hora de la tarde, satisfactoriamente.

- El residente ambiental del contratista adjunta la trazabilidad de los informes sugerida por el FDLK:

INFORME	VERSIÓN 0		VERSIÓN 1		ALCANCE		ALCANCE	
	ENTREGA	OBSE.	ENTREGA	APRO. U OBS	OBSE. FDLK CORREO		OBSE. FDLK COMITÉ	
					ENTREGA	OBSE.	ALCANCES	APRO.
INFORME 1	CE-CVK22-ADM-045	U233-G2-032-22	CE-CVK22-ADM-057	**U233-G2-064-22**				
	2/11/2022	4/11/2022	5/11/2022	**25/11/2023**				
INFORME 2	CE-CVK22-ADM-098			**U233-G2-095-22**				
	28/11/2022			**30/11/2023**				
INFORME 3	CE-CVK22-ADM-167			**U233-G2-172-23**	CE-CVK22-ADM-378	U233-G2-377-23	CE-CVK22-ADM-403	**U233-G2-379-23**
	30/12/2022			**10/01/2023**	11/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	**17/04/2023**
INFORME 4	CE-CVK22-ADM-219			**U233-G2-225-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-382-23**
	30/01/2023			**3/02/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**18/04/2023**
INFORME 5	CE-CVK22-ADM-294	U233-G2-294-23	CE-CVK22-ADM-310	**U233-G2-316-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-388-23**
	4/03/2023	8/03/2023	9/03/2023	**5/03/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**21/04/2023**
INFORME 6	CE-CVK22-ADM-365	U233-G2-349-23			CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-431-23**
							17/04/2023	
							CE-CVK22-ADM-418	
	31/03/2023	5/04/2023			14/04/2023		21/04/2023	
							CE-CVK22-ADM-427	
							26/04/2023	
INFORME 7	CE-CVK22-ADM-443		CE-CVK22-ADM-458	**U233-G2-433-23**	CE-CVK22-ADM-505		CE-CVK22-ADM-507	**U233-G2-507-23**
	4/05/2023		11/05/2023	**23/05/2023**	30/05/2023		31/05/2023	**2/06/2023**
INFORME 8	CORREO SCLV - AMB		CE-CVK22-ADM-641	**U233-G2-590-23**				
	1/06/2023							
	CE-CVK22-ADM-531		2/08/2023	**4/08/2023**				
	8/06/2023							
INFORME 9	CE-CVK22-ADM-565	COMITÉ No. 40	CE-CVK22-ADM-602	**U233-G2-594-23**				
	30/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	**14/08/2023**				
INFORME 10	CE-CVK22-ADM-638							
	2/08/2023							
	CE-CVK22-ADM-647							
	4/08/2023							

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS














PUNTOS ECOLOGICO









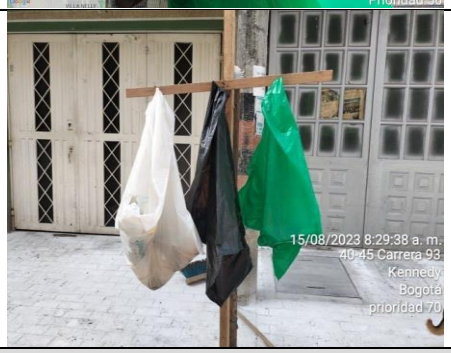



KIT DE DERRAMES


















BAÑOS












CERRAMIENTOS













PROTECCIÓN DE SUMIDEROS













CONCLUSIONES

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
Mantener en forma permanente los frentes de obra en buenas condiciones de orden y aseo.	Contratista.	Permanente.

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		
2		
