BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 18-05-2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** G1

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 32 CIN-717-2022 | COP-621-2022.

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X						X	FDLK - Infraestructura	andres.m.llanos@gobierno bogota.gov.co	3057034773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3118488034	
ANGIE MILENA MEDINA GUZMÁN			X						X	CONTRATISTA - XIE	xiesocial@outlook.com	3102804420	A. MILENA M.
ROSA LIDA MONGUA			X						X	CONTRATISTA XIE	xie.kennedy.residente2@gmail.com	3223141853	
Manuel Alejandro Mosquera Garcia			X						X	XIE SA	xie.directorproyectos.621@gmail.com	3212149482	
Juan M. Alba R.			X						X	Interventoria	gerenciaelaridad	3107621142	
Lucas Restrepo Rojas			X						X	Interventoría.	UE335cl.kennedy@outlook.com	3002133006	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento No. 32 en las instalaciones del PAC del contratista de obra Grupo 1 XIE S.A a las 9:30 am, con la presencia del apoyo a la supervisión FDLK, contratista de obra Grupo 1 XIE S.A e Interventoría Consorcio SCLV.

Orden del Día

1. Compromisos Pendientes

A la fecha la Interventoría manifiesta que no se dio cumplimiento a los siguientes compromisos:

- *Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público:* la Interventoría nuevamente solicita al contratista presentar el documento. La Interventoría, además, solicita radicar con el balance las longitudes totales del monoblock que se implementara, puesto que han pasado varios comités en los cuales se les ha solicitado y no ha sido remitido.
  La Interventoría manifiesta, que, sin los NPs de espacio público aprobados, no se realizara el pago correspondiente de los mismos. El contratista se compromete a entregar esta documentación el martes 23 de mayo de2023.

- *Atención de observaciones al ajuste a la programación del plan de contingencia:* la Interventoría manifiesta que a la fecha el contratista de obra no ha realizado la radicación del ajuste al plan de contingencia. A la fecha el contratista tendrá que realizar un ajuste a las actividades de la programación inicial, puesto que ya culmino el plan de contingencia, estos ajustes deberán ajustarse sin cambiar las fechas.

- *Radicación de informes y cuentas – Facturación:* El contratista de obra manifiesta que cuenta con casi la totalidad de informes aprobados, excepto el técnico, puesto que aún no se habían revisado y conciliado las cantidades, informes semanales del Informe mensual No.5 correspondiente al mes de febrero de 2023. La Interventoría manifiesta que el informe mensual No.5 correspondiente al mes de febrero ya fue aprobado por la Interventoría., y la cuenta fue radicada al FDLK el 12 de mayo de 2023.
  El contratista manifiesta además que, de acuerdo a compromisos radicara a la interventoría el pre acta del mes de marzo, para revisión del componente técnico el viernes 19 de mayo de 2023, de ser aprobada, radicara el día martes 23 de mayo de 2023 la cuenta completa. La Interventoría menciona informa a contratista y FDLK, que la revisión se hace en un día y de estar correcta se radica el FDLK al otro día temprano. La Interventoría manifiesta y reitera al contratista que, las cuentas e informes se deben radicar sin errores, puesto que se evidencia que el contratista persiste en los errores y eso causa que la radicación de las cuentas al FDLK tarde más.

- *Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas:* A la fecha la Interventoría no cuenta con la respuesta a este comunicado, es un listado simple donde contratista debe presentar en cuales prioridades va implementar las rejillas soportadas en viga, puesto que esta solicitud la realizo el delegado de la EAAB hace más de 6 meses y la última reunión que se realizó. El contratista manifiesta que, el delegado de la EAAB solicito solo 8, ellos tienen más instalados, es decir se perderían casi

20 unidades. Esto implicaría, romper las tuberías y realizar un atraco a la estructura, sin embargo, ya se programó la demolición y luego se procederá a la construcción de una placa de fondo, subir el muro de mampostería para solución del cabezal, solución que también se socializo con el delegado de la EAAB. Además, manifiesta que socializo una solución nueva para no afectar el prefabricado, sino implementar una conexión de codos a la caja de inspección a un ángulo de 60 grados. La interventoría manifiesta al contratista dar respuesta al oficio inmediato para dar claridad al tema.

- *Listado de cantidades de monoblock a remplazar por A80*: La Interventoría manifiesta que se ha solicitado este listado por más de 8 semana y no ha recibido respuesta alguna. El contratista manifiesta que a la fecha ya se sacaron los perfiles y diseños hidráulicos y geométricos ajustados, se realizó un consenso de la curva que se realizó de acuerdo al concepto aprobado por los especialistas de interventoría y contratista.

- *Balance del monoblock instalado e inventario de monoblock por instalar:* La interventoría manifiesta que es muy importante dar respuesta a este requerimiento, puesto que la ruta crítica del contrato es el monoblock, es necesario tener en cuenta cuanto monoblock se va a instalar.

Componentes

Componente SST
- Informe semanal 32: Aprobado
- Informe Mensual 7: Observado por los anexos 2, 3 y 4
-Calificación: 100%

Componente Ambiental
- Informe semanal 32: Aprobado
-Informe Mensual 7: Aprobado
- Calificación: 100%

Componente Social
- Informe semanal 32: Aprobado
- Informe Mensual 7: Aprobado
- Calificación: 98%

Técnico
-Frentes de obra activos: 7 -16 CIV
-Frentes de obra inactivos: 30 y 31.
-Frentes de obra intermitentes:24 y 25.
-Informe semanal 30 al 32: Sin radicar
-Informe mensual 6: En revisión de interventoría
-Informe mensual 7: Sin radicar
-Calificación: 99% (La calificación ha sido afectada por llamados de atención reiterativos al PMT en senderos peatonales).

Se evidencia en obra que de los 16 CIV abiertos por el contratista están pendientes detalles muy mínimos, pero es necesario que el contratista finiquite actividades ya en esos frentes puesto que están abiertos desde el mes de diciembre y es necesario empezar a realizar entregas a la comunidad y abran nuevos frentes, puesto que estos CIV no equivalen a la mitad de los CIV programados para ejecución.
El contratista manifiesta que para poder terminar detalles y abrir nuevos frentes necesitan el monoblock, asfalto y perfilar ciertos detalles, pero no cuentan con el recurso para poder dar apertura a nuevos frentes. Sin embargo, el contratista indica que ha realizado otras actividades como excavaciones manuales y mecánicas en otros CIV para avanzar.

**Se adjunta agenda que contiene plano y cuadro de actividades por prioridades*

Programación
A la fecha el contratista de obra continua con los atrasos en obra, como se evidencia en los avances para la semana No. 32 (11 al 17 de mayo de 2023), presentados a continuación:

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	35.83%	37.02%	35.83%
%Ejecutado	15.95%	15.25%	10.73%
%Desviación	-19.88%	-21.77%	-25.10%

La Interventoría manifiesta que, pese a varios intentos y solicitudes de ajuste a la programación, el contratista no ha realizado los respectivos ajustes y el plan de contingencia termino, es decir que se empezara a evaluar al contratista con la programación inicialmente aprobada por la interventoría y la Interventoría procederá a solicitar al FDLK inicio de proceso de incumplimiento.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	NPs espacio público -Balance de mayores y menores	XIE S.A	23-may-23
2	Radicación de informes y cuentas – Facturación	XIE S.A	23-may-23
3	Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas	XIE S.A	19-may-23
4	Listado de cantidades de monoblock a remplazar por A80	XIE S.A	19-may-23
5	Balance del monoblock instalado e inventario de monoblock por instalar.	XIE S.A	19-may-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 25 de mayo de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.32

Fecha: 18 de mayo 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos	
No	**Asunto**
1	Balance Mayores y menores – NPS Esp. Público
2	Atención de observaciones al ajuste a la programación del plan de contingencia
3	Radicación de informes y cuentas – Facturación
4	Respuesta a oficio U233-G1-410-23 de sumideros en los cuales va a implementar la rejilla soportada en vigas
5	Listado de cantidades de monoblock a remplazar por A80
6	Balance del monoblock instalado e inventario de monoblock por instalar.
2. Componentes	
A. Técnico	
- **Informe semanal 30 al 32:** Sin Radicar	
- **Informe Mensual 6:** En revisión de la interventoría - **Informe Mensual 7:** Sin Radicar	
- **Calificación:** 99%	
Obra	
B. SST	
- **Informe semanal 32:** Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Observado en mesa de trabajo anexo 2,3 y 4	
- **Calificación:** 100%	
C. Ambiental	
- **Informe semanal 32 :**Aprobado	
- **Informe Mensual 7:** Aprobado	
- **Calificación:** 100%	
D. Gestión Social	
- **Informe semanal 31:** Aprobado	


- **Informe Mensual 7:** Aprobado
- **Calificación:** 98%
Obra

Alcaldía Local de Kennedy

Frentes de obra en la semana del 3 al 9-may-23

Frentes de obra: 7

CIV: 16

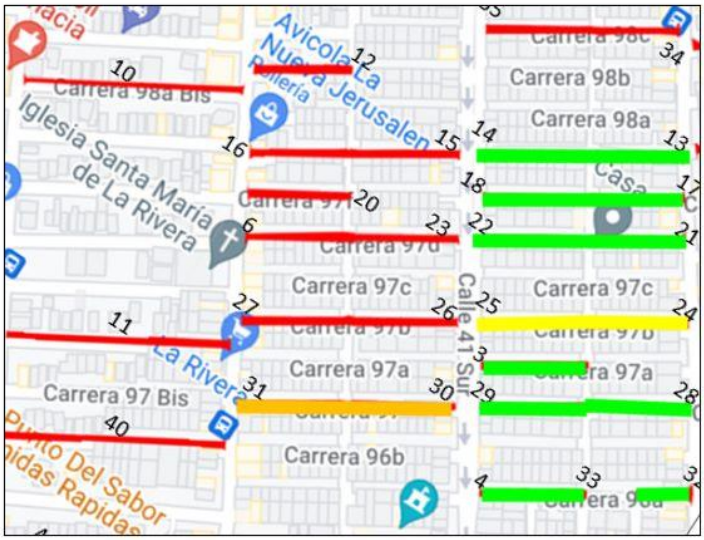

Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** excavación manual para instalación de tubería de 12 pulgadas de sumidero a pozo 3,74m3 **Andén oriental:** demolición manual parcial de anden 20,2m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual parcial de anden 18,46m3 del K0+000 al K0+060, Instalación parcial de geotextil 54,04m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 8,23m3 del K0+000 al K0+060, construcción de una caja de inspección 1 unidad del K0+000 al K0+030. **Andén occidental:** demolición manual parcial de anden 21,84m2 del K0+000 al K0+060, excavación manual

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		parcial de anden 17,92m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0.81m3 y construcción parcial de cajas de inspección 3 unidades del K0+000 al K0+060.
32	8000979	**Calzada**: se realiza instalación de tubería 12 pulgadas costado occidente 4,10ML, costado oriente 3,50ML del K0+028,58 al K0+032,40; instalación de arena de peña para recubrimiento de tubería 0,92m3. **Andén oriental:** Sin actividades. **Andén occidental:** Sin actividades.
28	8000929	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Excavación manual de andén 14,28m3 del K0+000 al K0+033, demolición parcial de andén 20 m2 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0,81m3 y construcción parcial de cajas de inspección 3 unidades del K0+000 al K0+060.
29	8000996	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 3000 psi 41,12m2 del K0+010 al K0+060, instalación parcial de cajillas nuevas 5 unidades del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 4000 psi 20.41 m2 del K0+010 al K0+060. **Andén occidental:** Nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial 4000 psi 18,49 m2 del K0+010 al K0+060.
24	8000871	**Calzada:** Instalación parcial de fresado en la intersección de la prioridad 24 y 25 del K0+000 al K0+015 9,45m3. **Andén oriental:** Nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial para rampa de 4000 psi 15,57m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Nivelación y compactación parcial de fresado en anden para instalación de concreto del K0+000 al K0+060.
25	8000923	**Calzada:** Instalación parcial de fresado en la intersección de la prioridad 24 y 25 del K0+055 al K0+064 5,67m3. **Andén oriental:** instalación de concreto parcial para rampa de 4000 psi 8,01m2 del K0+010 al K0+060.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Instalación de base estabilizada primera capa 11,28m3 del K0+003,50 al K0+020. **Andén oriental:** instalación parcial de bordillo A-80 3,3 ML del K0+003 al K0+060, instalación de concreto parcial para rampa de 4000 psi 30,41m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial para anden 3000 psi 12,16m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de bordillo A-80 11,62 ML del K0+003 al K0+060, instalación de concreto parcial para rampa de 4000 psi 24,86m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto parcial para anden 3000 psi 37,11m2 del K0+000 al K0+060.
22	8000864	**Calzada:** Instalación de base estabilizada primera capa 5,77 m3del del K0+058,97 al K0+062,97. **Andén oriental**: instalación parcial de bordillo A-80 del K0+003 al K0+060 2,86 ML, instalación parcial de concreto 3000psi del K0+000 al K0+060 1,51m32, se realiza acabados en fachas en la parte inferior del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** instalación de bordillo parcial 26,76 ML del K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 11,98m2 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Instalación de concreto 3000 psi para anden 10,50m3 K0+000 al K0+060, instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 2,77m2 del K0+000 al K0+060.
13	8000772	**Calzada:** Corte de base estabilizada para instalación de monoblock del K0+010 al K0+020. **Andén occidental:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad.
14	8000814	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 21,92m2 del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000 psi para anden 10,27m2 K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** instalación parcial de concreto para rampa MR41 4000psi 11,05m2 del K0+000 al K0+060,

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		instalación de concreto 3000 psi para anden 10m2 K0+000 al K0+060.
17	8000794	**Calzada:** Instalación de primera capa de fresado del K0+040 al K0+050. **Andén oriental:** Excavación parcial manual de andén 27,59 m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de andén 27,01 m2 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de cajas de inspección 0,54m3 y construcción parcial de cajas de inspección 2 unidades del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** demolición parcial de cajas de inspección 1,62m3 y construcción parcial de cajas de inspección 6 unidades del K0+000 al K0+060.
18	8000839	**Calzada:** a nivel de segunda capa de RCD. **Andén oriental:** Nivelación parcial e instalación de fresado 1,56m3 del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Nivelación parcial de cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
33	8001041	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Excavación parcial manual de andén 3,98 m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de andén 26,7m2 del K0+000 al K0+060 **Andén occidental:** Excavación parcial manual de andén 28,54m3 del K0+000 al K0+060, demolición parcial de caja de inspección 0,81m3 y construcción parcial de caja de inspección 3 unidad del K0+000 al K0+060.
31	8001058	**Calzada:** Instalación de fresado para base estabilizada K0+050 al K0+058. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
30	8001125	**Calzada:** Excavación manual para sumideros 2,07m3, se desplaza debido a localización de red de aguas residuales. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	3			4		13			14			17			18			21			22			24			25			28			29			30			31			32			33		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (156201)	ORI (29896)	OCC (29897)	VIA (156189)	ORI (29872)	OCC (29873)	VIA (156220)	ORI (29934)	OCC (29935)	VIA (156221)	ORI (29936)	OCC (29937)	VIA (156216)	ORI (29926)	OCC (29927)	VIA (156217)	ORI (29928)	OCC (29929)	VIA (156212)	ORI (29918)	OCC (29919)	VIA(156213)	ORI(29920)	OCC(29921)	VIA(156204)	ORI(29902)	OCC(29903)	VIA(156205)	ORI(29904)	OCC(29905)	VIA(156196)	ORI(29886)	OCC(29887)	VIA(156197)	ORI(29888)	OCC(29889)	VIA(156198)	ORI(29890)	OCC(29891)	VIA(156199)	ORI(29892)	OCC(29893)	VIA(156186)	ORI(29866)	OCC(29867)	VIA(156188)	ORI(29870)	OCC(29871)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																													
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																												
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																												
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																												
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																												
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																												
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																												
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI Y MR41	CONCRETO DE 3000 PSI Y MR41																																												

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA - GRUPO 1 COP-621-22

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 16-MAYO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM	% PROG-ACUM	EJEC-ACUM	% EJEC-ACUM	% PESO EJEC	% ATRASO
28	8000929	$ 347 200 311	$ 229 341 798	1.37%	$ 231 854 843	1.38%	66.78%	0.01%
29	8000996	$ 292 279 155	$ 232 383 529	1.38%	$ 250 273 298	1.49%	85.63%	0.11%
24	8000871	$ 303 712 088	$ 247 724 155	1.48%	$ 259 386 325	1.55%	85.41%	0.07%
25	8000923	$ 378 908 264	$ 309 077 299	1.84%	$ 241 833 998	1.44%	63.82%	-0.40%
13	8000772	$ 274 339 089	$ 211 259 208	1.26%	$ 107 670 370	0.64%	39.25%	-0.62%
14	8000814	$ 404 676 565	$ 314 655 171	1.88%	$ 154 889 518	0.92%	38.27%	-0.95%
17	8000794	$ 343 212 808	$ 217 409 987	1.30%	$ 236 203 729	1.41%	68.82%	0.11%
18	8000839	$ 395 629 378	$ 313 096 499	1.87%	$ 198 534 827	1.18%	50.18%	-0.68%
21	8000821	$ 374 906 711	$ 295 520 891	1.76%	$ 233 920 814	1.39%	62.39%	-0.37%
22	8000864	$ 444 284 148	$ 361 999 606	2.16%	$ 263 919 244	1.57%	59.40%	-0.58%
3	8000957	$ 350 804 854	$ 276 704 113	1.65%	$ 280 793 556	1.67%	80.04%	0.02%
33	8001041	$ 173 766 372	$ 99 517 604	0.59%	$ 8 378 623	0.05%	4.82%	-0.54%
4	8001069	$ 172 153 562	$ 77 292 211	0.46%	$ 11 915 121	0.07%	6.92%	-0.39%
16	8000907	$ 356 743 482	$ 207 442 801	1.24%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.24%
15	8000856	$ 308 449 741	$ 179 221 586	1.07%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.07%
26	8000988	$ 303 045 416	$ 178 386 555	1.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.06%
6	8000977	$ 440 627 039	$ 217 092 506	1.29%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.29%
32	8000979	$ 181 397 134	$ 108 266 435	0.65%	$ 4 021 741	0.02%	2.22%	-0.62%
30	8001058	$ 352 063 180	$ 139 454 157	0.83%	$ 28 990 486	0.17%	8.23%	-0.66%
20	8000938	$ 389 376 441	$ 226 374 943	1.35%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.35%
31	8001125	$ 346 894 732	$ 137 629 123	0.82%	$ 45 742 187	0.27%	13.19%	-0.55%
8	8002417	$ 520 851 148	$ 202 735 718	1.21%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.21%
9	8002500	$ 347 361 803	$ 135 206 851	0.81%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.81%
27	8001052	$ 446 170 102	$ 173 666 918	1.03%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.03%
12	8000849	$ 350 989 548	$ 136 618 916	0.81%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.81%
23	8000916	$ 367 411 857	$ 210 896 814	1.26%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.26%
5	8000655	$ 470 405 871	$ 183 100 436	1.09%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.09%
1	8000687	$ 457 563 625	$ 178 101 719	1.06%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.06%
7	8000736	$ 484 559 005	$ 188 609 393	1.12%	$ 0	0.00%	0.00%	-1.12%
40	8011953	$ 708 106 011	$ 118 713 610	0.71%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.71%
2	8001195	$ 360 865 577	$ 60 498 934	0.36%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.36%
39	8000584	$ 454 498 306	$ 44 342 113	0.26%	$ 0	0.00%	0.00%	-0.26%
Totales			**$ 6 212 341 596**	**37.02%**	**$ 2 558 328 680**	**15.25%**		-21.77%
			$ 16 781 065 424					

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA - GRUPO 1 COP-621-22


AVANCE ACUMULADO SEMANAL


FECHA EVALUACIÓN			28-feb	7-mar	14-mar	21-mar	28-mar	4-abr	11-abr	18-abr	25-abr	2-may	9-may	16-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 347 200 311.00	48.39%	50.91%	53.86%	56.56%	60.74%	62.24%	63.49%	63.68%	64.58%	65.53%	66.09%	66.78%
29	8000996	$ 292 279 155.00	57.86%	60.81%	60.92%	63.35%	68.87%	70.93%	73.38%	73.38%	74.56%	76.82%	82.83%	85.63%
24	8000871	$ 303 712 088.00	62.36%	62.68%	63.61%	66.85%	70.53%	72.98%	74.44%	76.76%	81.24%	82.78%	82.87%	85.41%
25	8000923	$ 378 908 264.00	48.61%	51.74%	53.59%	55.10%	58.96%	60.32%	61.83%	61.83%	62.86%	62.98%	63.14%	63.82%
13	8000772	$ 274 339 089.00	15.49%	16.57%	18.64%	18.64%	22.00%	28.45%	35.56%	36.46%	37.01%	37.47%	37.94%	39.25%
14	8000814	$ 404 676 565.00	16.98%	19.15%	19.58%	19.58%	19.60%	19.63%	20.02%	23.98%	32.70%	32.83%	33.40%	38.27%
17	8000794	$ 343 212 808.00	52.94%	55.24%	55.26%	58.19%	61.39%	61.98%	63.21%	63.21%	63.25%	64.51%	68.04%	68.82%
18	8000839	$ 395 629 378.00	40.34%	42.11%	42.11%	44.63%	46.86%	47.87%	48.83%	49.05%	49.57%	49.70%	49.70%	50.18%
21	8000821	$ 374 906 711.00	39.37%	39.63%	39.63%	39.64%	40.64%	44.43%	45.32%	45.59%	57.80%	58.25%	60.18%	62.39%
22	8000864	$ 444 284 148.00	48.33%	48.33%	48.33%	49.06%	51.75%	53.57%	54.64%	56.44%	57.97%	58.33%	58.82%	59.40%
3	8000957	$ 350 804 854.00	67.91%	67.91%	67.91%	67.93%	71.33%	72.73%	74.18%	74.38%	74.94%	76.50%	78.76%	80.04%
33	8001041	$ 173 766 372.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.53%	3.53%	3.60%	4.39%	4.39%	4.39%	4.57%	4.82%
4	8001069	$ 172 153 562.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.01%	5.01%	5.01%	5.18%	6.92%
32	8000979	$ 181 397 134.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.40%	0.40%	1.60%	2.22%
30	8001058	$ 352 063 180.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.34%	2.34%	7.60%	8.23%	8.23%
31	8001125	$ 346 894 732.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.42%	7.82%	12.56%	13.19%	13.19%

FECHA EVALUACIÓN			16-may
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE SEMANAL
28	8000929	$ 347 200 311.00	0.69%
29	8000996	$ 292 279 155.00	2.80%
24	8000871	$ 303 712 088.00	2.53%
25	8000923	$ 378 908 264.00	0.69%
13	8000772	$ 274 339 089.00	1.31%
14	8000814	$ 404 676 565.00	4.88%
17	8000794	$ 343 212 808.00	0.78%
18	8000839	$ 395 629 378.00	0.48%
21	8000821	$ 374 906 711.00	2.21%
22	8000864	$ 444 284 148.00	0.58%
3	8000957	$ 350 804 854.00	1.28%
33	8001041	$ 173 766 372.00	0.25%
4	8001069	$ 172 153 562.00	1.74%
32	8000979	$ 181 397 134.00	0.61%
30	8001058	$ 352 063 180.00	0.00%
31	8001125	$ 346 894 732.00	0.00%

G1	CORTE AL 16 DE MAYO DE 2023		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	35.83%	37.02%	35.83%
% EJECUTADO	15.95%	15.25%	10.73%
% DESVIACIÓN	-19.88%	-21.77%	-25.10%

SEGUIMIENTO CURVA S - 621

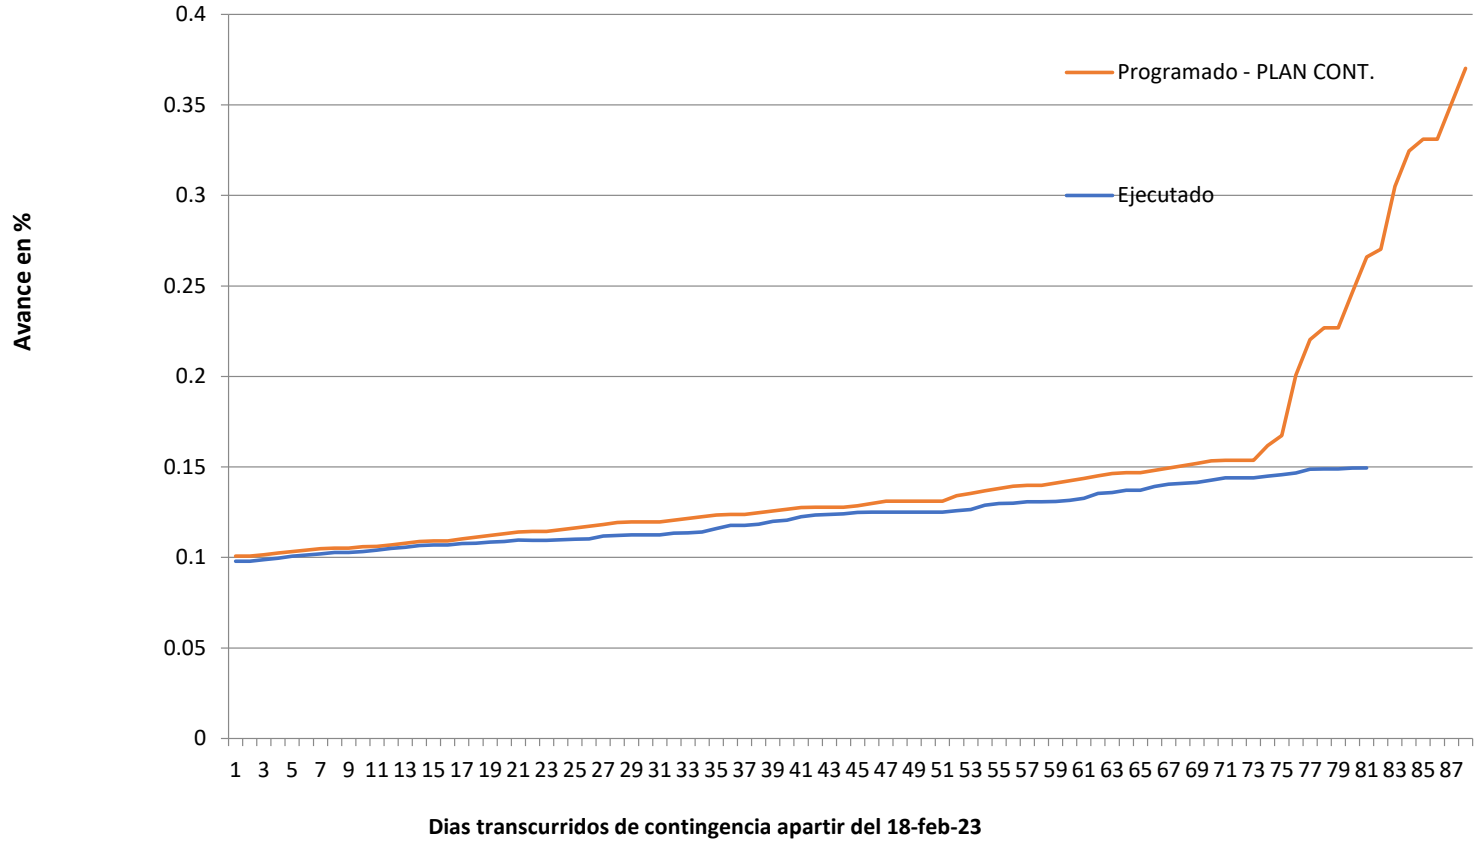

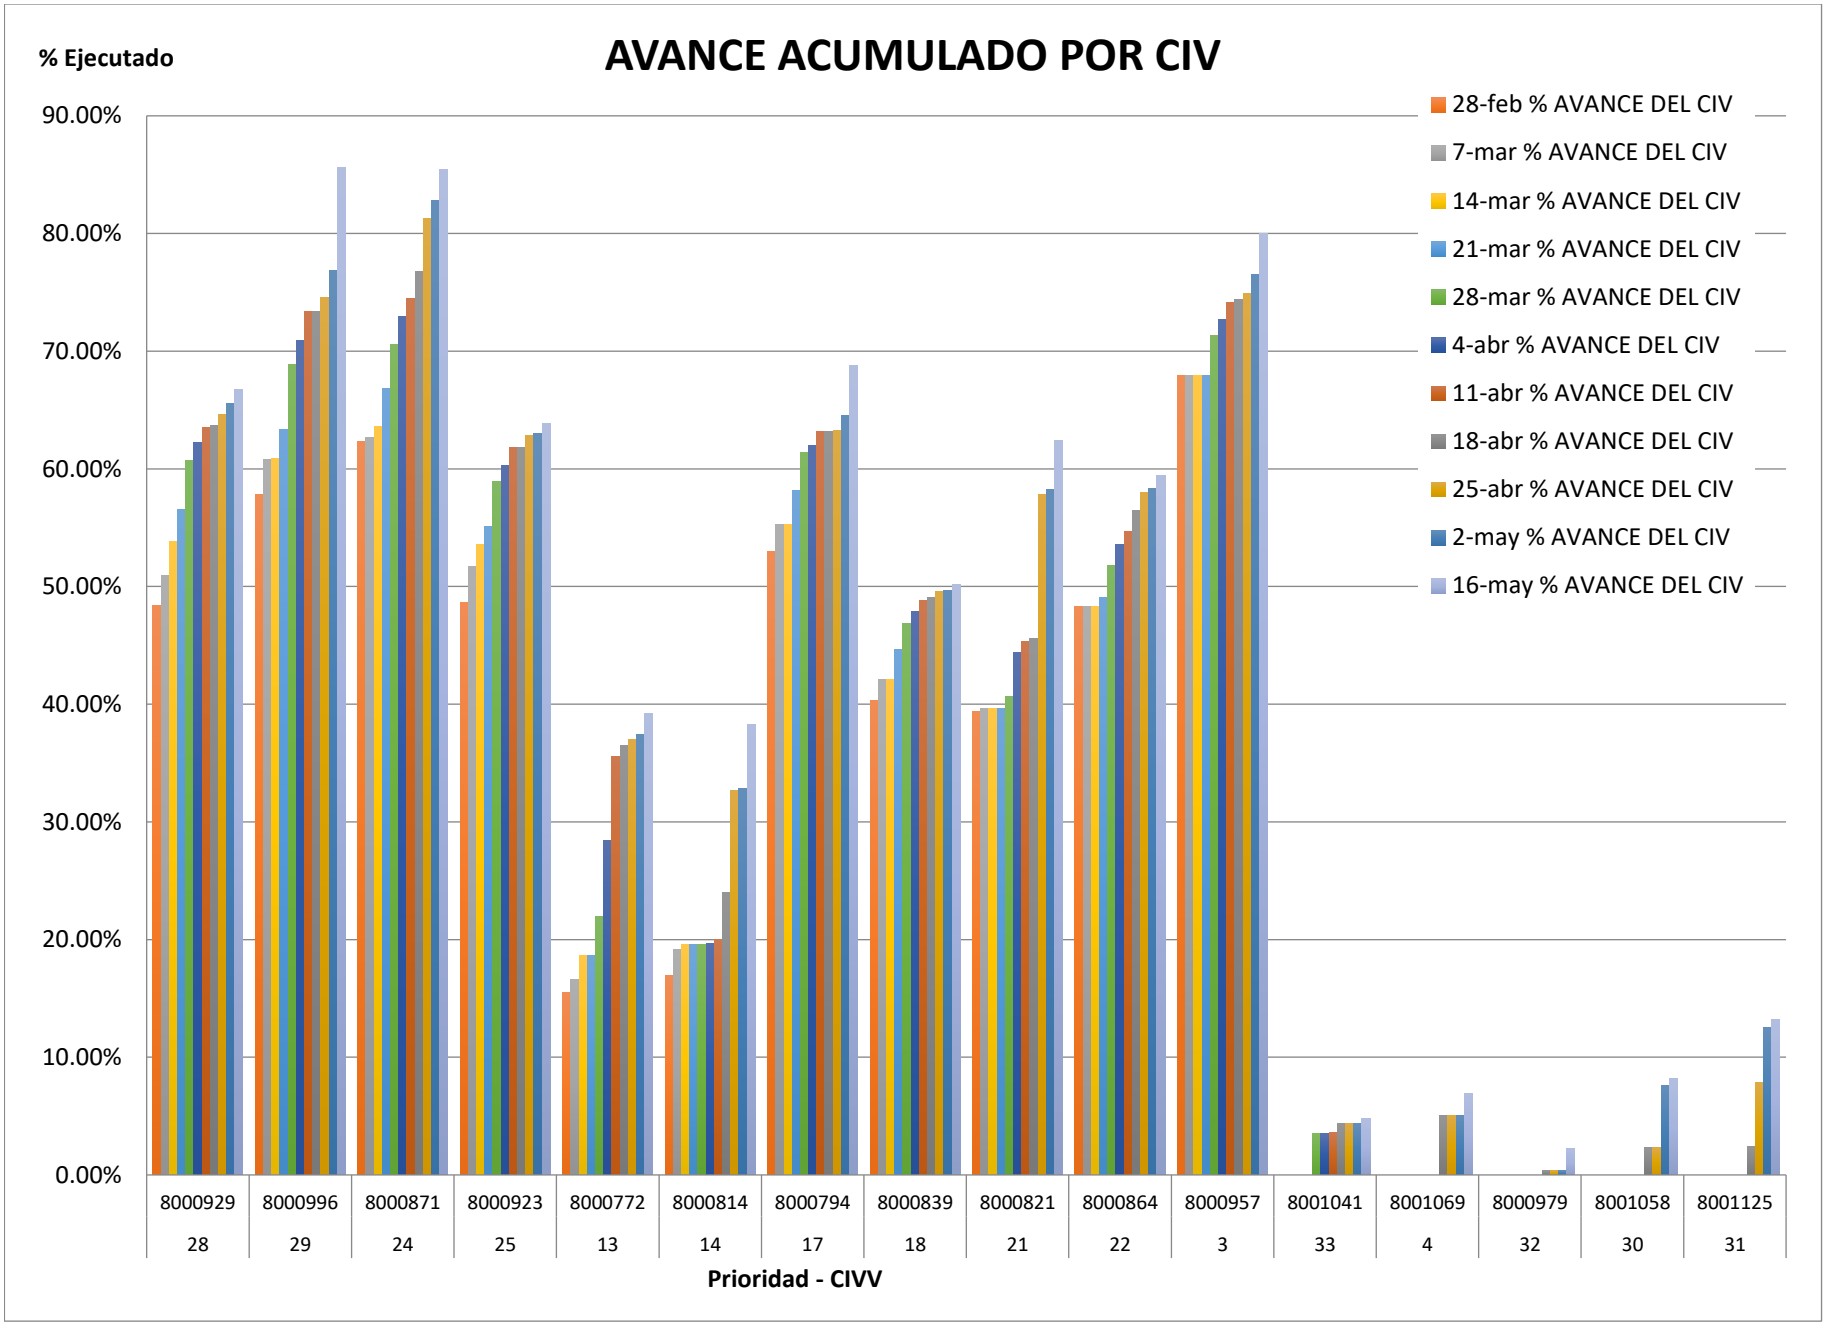
AVANCE ACUMULADO POR CIV
% Ejecutado
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
28-feb % AVANCE DEL CIV
7-mar % AVANCE DEL CIV
14-mar % AVANCE DEL CIV
21-mar % AVANCE DEL CIV
28-mar % AVANCE DEL CIV
4-abr % AVANCE DEL CIV
11-abr % AVANCE DEL CIV
18-abr % AVANCE DEL CIV
25-abr % AVANCE DEL CIV
2-may % AVANCE DEL CIV
16-may % AVANCE DEL CIV
8000929 28
8000996 29
8000871 24
8000923 25
8000772 13
8000814 14
8000794 17
8000839 18
8000821 21
8000864 22
8000957 3
8001041 33
8001069 4
8000979 32
8001058 30
8001125 31
Prioridad - CIVV
