BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 3 de agosto de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Alcaldía local de Kennedy

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No.43 – Grupo 1

HORA DE INICIO: 2: 35 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Manuel Alejandro Mazabuel García									x	Contratista – XIE S.A	xie.directorproyecto.621@gmail.com	321 2149476	
Oscar Vargas Galindo									x	Contratista – XIE S.A	oscardavid53@hotmail.com	310 2239581	
Oswaldo Ladino Chávez			x							Interventoría - SCLV	dir-viales@silcarsa.com.co	310 3178077	
Juan Manuel Alba Rojas			x							Interventoría - SCLV	juan.alba@lavialidad.com	310 3178077	
Laura Daniela Díaz			X							Interventoría - SCLV	dlaura0898@gmail.com	316 8270441	
Andrés Mauricio Llanos			x							Supervisión - FDLK	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	305 7039773	
Danilo Meneses Toro			x							Supervisión - FDLK	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	311 8988034	
			x										

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento No.43

Se da inicio a comité de seguimiento No.43 a las 2:35 pm, en las instalaciones de la Alcaldía local de Kennedy con la presencia del contratista de obra grupo 1 XIE S.A, interventoría y supervisión del FDLK.

Orden del día

La Interventoría indica que el motivo de este comité es saber el sentido que va a tomar el contrato, puesto que en varios comités de seguimiento se ha solicitado al contratista de obra XIE S.A - grupo 1, remitir un cronograma y programación (no contractual) de las actividades que va desempeñar en los meses que quedan de ejecución del contrato. Si bien es cierto que el contratista tiene un proceso sancionatorio abierto por incumplimiento al cronograma y PDT, y el contratista se abstiene de una la radicación del mismo, por este proceso, es necesario saber de manera no oficial que actividades se realizaran y si le van a dar continuidad al mismo.

La Interventoría indica que su fin no es solicitar al FDLK caducidad al contrato de contratista de obra – grupo 1, pero ya en reiterados comités se ha solicitado al contratista se muestre o se presente el norte de ejecución del contrato.

Se evidencia en obra que el contratista puede terminar por lo menos 6 CIV de manera rápida y si llega más monoblock pueden terminar otros 7 CIV, hay CIV que pueden cerrar y quedan pendientes solo los remates y señalización. Pero es evidente que el contratista tiene muy poco personal, muy poca maquinaria, es importante que el contratista de obra indique cual es la proyección que se tiene del proyecto.

El contratista manifiesta que se tienen tres puntos para dar respuesta a la Interventoría:

1. Se tiene el cronograma y programación, pero este se maneja de manera interna, puesto que no se oficializará hasta tanto no se tenga claro el segundo punto y que está sujeto al proceso sancionatorio.
2. El contratista indica que la situación está dependiendo únicamente del flujo de caja, ya que está pendiente a la fecha de cobrar mayo, junio y julio, el contratista indica que quiere marcar un precedente, puesto que demostró que en 3 días logró la instalación del monoblock y

pavimentación. El contratista manifiesta que para poder terminar la ejecución del contrato en los CIV estipulados necesita de por los menos tres meses más, ejecución que terminaría la primera semana de enero de 2024.

Esto con el fin de mover el flujo de caja, propuesta que garantizaría un flujo de caja estable que garantiza el cobro de manera mensual, de lo contrario la situación seguirá empeorando.

3. El contratista manifiesta que esta intención adicionalmente incluye la posibilidad de que se provea el monoblock faltante, puesto que al tener un flujo de caja constante hay posibilidad de que se seda parte de la facturación a ACO (sin contar todo lo que está facturando incluyendo hasta el mes de julio). No es una sesión del contrato. Ese monoblock es el que se instalará en agosto.

   El contratista además solicita que se liberen las cantidades de manera semanal entre interventoría y contratista, con el fin de que a final de mes se cuente con las cantidades conciliadas. La Interventoría por su parte manifiesta que el componente técnico, algunas veces hay inconformidad puesto que cambian las cantidades por más de que se dejen firmados los documentos.

   La Interventoría indica que en ocasiones ha sucedido que se ha realizado mesas de trabajo en donde se concreta un tema, y al levantarse de la mesa y volver ya se ha presentado un cambio, cuando estas situaciones pasan, se generan reprocesos.

   La verificación de las cantidades las puede hacer cualquier, pero verificación de las memorias y cantidades las hace el residente. El contratista manifiesta que cuando hay una diferencia es porque hay una incertidumbre con la cantidad y es necesario volver a verificar.

La Interventoría lo que solicita al contratista es que en un día o dos se libere la revisión y evaluación de las pre actas y sus respectivos soportes, para la radicación de las cuentas de manera mensual.

En cuanto a la propuesta del punto tres que propone el contratista, en la cual propone una sesión de derechos económicos a ACO por una suma considerable, pagando el 70% del monoblock como lo dicen las especificaciones técnicas, la interventoría expone que haciendo tomando como ejemplo la evaluación de 1000 m de monoblock, se pagara el 70%, es decir 700

metros lineales, pero de donde los pagara el contratista. El contratista manifiesta que en cuanto entre el dinero a la fiducia y este se libere se pagara a ACO.

La Interventoría manifiesta que el contratista está rompiendo con el acuerdo que se tenía, puesto que en varias reuniones que el total de lo que se adelantara de la cuenta de junio el contratista lo pagaba, no para para pagar a ACO.

La interventoría indica que si esto no se cumple se pude ver en un lio el contrato, puesto que se ha evidenciado que ACO puede que le entregué o no el monoblock, así como el canal de inspección y revisando solo hay dos cajas de inspección. Caso diferente que paso con el otro proveedor el cual si garantizaba la entrega del mismo.

El contratista manifiesta que ya se realizó la entrega de canal monoblock de 32, 23 y sus respectivos canales inspeccionable, se le entrego a ACO esa cantidad, y se firmó un documento en el cual se dejó constancia de lo se suministrara. El proveedor indico al contratista que cuando necesitaba que se realizara el despacho, a lo cual el contratista al ver los tiempos tan largos de entrega de los parciales, tomo la decisión de solicitar que se hiciera el total de la entrega del monoblock y guardarlo en una bodega, para guardar los 3600 m^2 que se tendrían que suministrar de solo canal monoblock. El contratista indica que lo que busca es terminar el proyecto con el monoblock garantizado.

La interventoría lo que necesita del contratista es que en realidad se comprometan. El FDLK indica que se está poniendo en riesgo la interventoría y el FDLK, puesto que el contratista no ha realizado el pago del monoblock que se pagó de manera anticipad, esta sería la última propuesta que se evaluaría por el estado del proyecto. La interventoría además indica que el contratista no debería realizar el pago del 70% a ACO, es importante que el contratista aclare cómo se liberara de esa posición.

El contratista manifiesta que para liberarse de esa posición es necesario que se realice una reprogramación y prórroga del contrato. La Interventoría solicita al contratista que el día 11 de agosto de 2023 sustente de manera jurídica la solicitud e prorroga, la interventoría indica que personalmente se le daría solo 2 meses de prórroga, puesto que se evidencia que el contratista ha trabajado de manera muy rápida con pocos recursos, con el fin de hacer la entrega de todos los CIV finalizando diciembre.

La Interventoría indica que se ha podido evidenciar en campo que el contratista trabaja de manera muy ágil, como es el caso de la prioridad 8, prioridad que ha desarrollado tareas en una semana y cuenta con la base estabilizada.

El FDLK indica que el contratista deberá hacer la evaluación de la prórroga.

El contratista solicita información acerca de los NPs radicados a la interventoría, el director de obra del contratista manifiesta que ya fueron radicados el día de hoy a la interventoría y están para revisión de interventoría.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	XIE S.A - SCLV	10-ago-23
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.	XIE S.A	10-ago-23
3	Radicación de oficio solicitando limpieza de colector colmatado.	XIE S.A	10-ago-23
4	Cronograma de pavimentación	XIE S.A	10-ago-23
5	Actualización de cronograma de inspecciones CCTV	XIE S.A	10-ago-23
6	Cronograma general de actividades – No contractual	XIE S.A	10-ago-23
7	Mesa de trajo de NPs – Radicación de concepto	XIE S.A	10-ago-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 10 de agosto de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.43

Fecha: 3 de agosto de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	Contratista e interventoría	2-ago-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	2-ago-23	NO
3	Radicación de oficio solicitando limpieza de colector colmatado.	Contratista	26-jul-23	NO
4	Radicación de la pre-acta de recibo parcial No.9 (junio)	Contratista	27-jul-23	NO
5	Cronograma de pavimentación	Contratista	28-jul-23	NO
6	Actualización de cronograma de inspecciones CCTV	Contratista	28-jul-23	NO

2. Componentes
A. Técnico
- **Informes semanales junio:** el contratista se encuentra atendiendo observaciones.
- **Informe Mensual 9 (junio):** en elaboración por el contratista
- **Pre-Acta No.11 de recibo parcial No.9 (junio):** en revisión por parte de la Interventoría.
- **Calificación semanal:** 89% ***Calificación afectada por realizar actividades de pavimentación sin el PMT aprobado.*
B. SST
- **Informe semanal 43:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** Observado
- **Ingresos en la semana:** 3 ayudantes
- **Retiros en la semana:** 6 ayudantes
- **Calificación semanal:** 100%
C. Ambiental
- **Informe semanal 43:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado
- **Calificación semanal:** 100%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 43:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado

- **Calificación semanal:**100%

Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada**: Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Se realiza instalación de monoblock costado occidente 9ML del K0+004 al K0+013.
28	8000929	**Calzada:** Se realiza instalación de monoblock PD200 del K0+035 al K0+0046 costado oriente 41ML, se realiza instalación de bordillo A-80 costado oriente 5,25ML del K0+046 al K0+051, costado occidente 5,25ML del K0+046 al K0+051. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
29	8000996	**Calzada:** Se realiza instalación parcial monoblock costado occidente PD100 24ML del K0+033 al K0+057, costado oriente 24ML del K0+033 al K0+057. **Andén oriental:** **Andén occidental:**
24	8000871	**Calzada:** Se realiza instalación de asfalto 0.94m3 del K00+055 al K00+061. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental** Sin actividades.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Se realiza aplicación de emulsión asfáltica 206.5m2 del K0+000 al K0+059, se continua con instalación de grano-caucho 15.05m3 del K0+000 al K0+059, instalación de asfalto 10.72m3 del K0+000 al K0+059, **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
22	8000864	**Calzada:** Se realiza instalación de asfalto 1.64m3 del K0+053 al K0+062.57. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
13	8000772	**Calzada:** Se realiza demolición y corte parcial en parte superior de sumidero para instalación de cabezales en ambos costados. **Andén occidental:** Se realiza remates parciales en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Se realiza remates parciales en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** Se realiza cargue y nivelación de pozos 0.23ML, instalación de monoblock PD200 costado oriente 9ML del K0+001 al K0+010, costado occidente 9ML del K0+001 al K0+010, demolición y corte parcial en parte superior de sumidero para instalación de cabezales en ambos costados. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060.
18	8000839	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060.
33	8001041	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
31	8001058	**Calzada:** Se realiza instalación parcial de bordillo A-80 costado oriente en intersección 9.88ML, costado occidente en intersección 7.88ML. **Andén oriental:** Se realiza instalación de fresado parcial 1.94m3 del K00+000 al K00+060, se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación de fresado parcial 2.03m3 del K00+000 al K00+060, se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060.
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
12	8000849	**Calzada:** Se realiza excavación ara instalación de sumidero 4.16m3 del K00+000, nivelación cargue de pozos 0.10ML del K00+000. **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000psi para acceso de peatonal 4.60m2 del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Sin actividad.
15	8000856	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación de fresado parcial segunda capa 11.29m3 del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de cajas de inspección 2.43m3 del K00+000 al K00+060, se realiza construcción de las mismas cajas 9 unidades, se realiza nivelación y compactación parcial de sub-rasante 110.52m2

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		del K00+000 al K00+060, instalación de geotextil parcial 116.64m2 del K00+000 al K00+060.
16	8000907	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
26	8000988	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de geotextil 70.48m2 del K0+000 al K0+060, instalación parcial de fresado 3.5m3 **Andén occidental:** Sin actividad.
27	8001052	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición de concreto 45.96m2 del K0+000 al K0+060, nivelación y compactación de sub-rasante 109.60m2 del K00+000 al K00+61.06, se realiza instalación de concreto de 3000psi con un asentamiento de 4.75 pulgadas 13.01m2 del K00+000 al K00+61.06, instalación de concreto de 4000psi con un asentamiento de 5.5 pulgadas 17.46m2 del K00+000 al K00+061. **Andén occidental:** Se realiza nivelación y compactación de sub-rasante 106.21m2 del K00+000 al K00+60.87, se realiza instalación de concreto de 3000psi con un asentamiento de 4.75 pulgadas 11.61m2 del K00+000 al K00+61.06, instalación de concreto de 4000psi con un asentamiento de 5.5 pulgadas 19.08m2 del K00+000 al K00+061.
8	8002417	**Calzada:** Se realiza inicio de excavación mecánica 141.85m3 del K00+025 al K00+85.70, fallo en sub-rasante 3.15m3 del K00+057 al K00+067, se realiza nivelación en sub-rasante 267.3m2 del K00+000 al K00+86, instalación de geotextil 267.3m2 del K00+000 al K00+86, instalación de geo-celda 267.3 m2 del K00+000 al K00+86, instalación de fresado 48.11m3 del K00+000 al K00+86 **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
9	8002500	**Calzada:** Se realiza excavación en vía 82.17m3 del K00+035 al K00+070.57, nivelación y compactación de sub-rasante 117.38m2 del K00+035 al K00+070.57, **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

Frentes de obra en la semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2023:


Frentes de obra: 6


CIV abiertos: 23




Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

Estados de las obras en los CIV

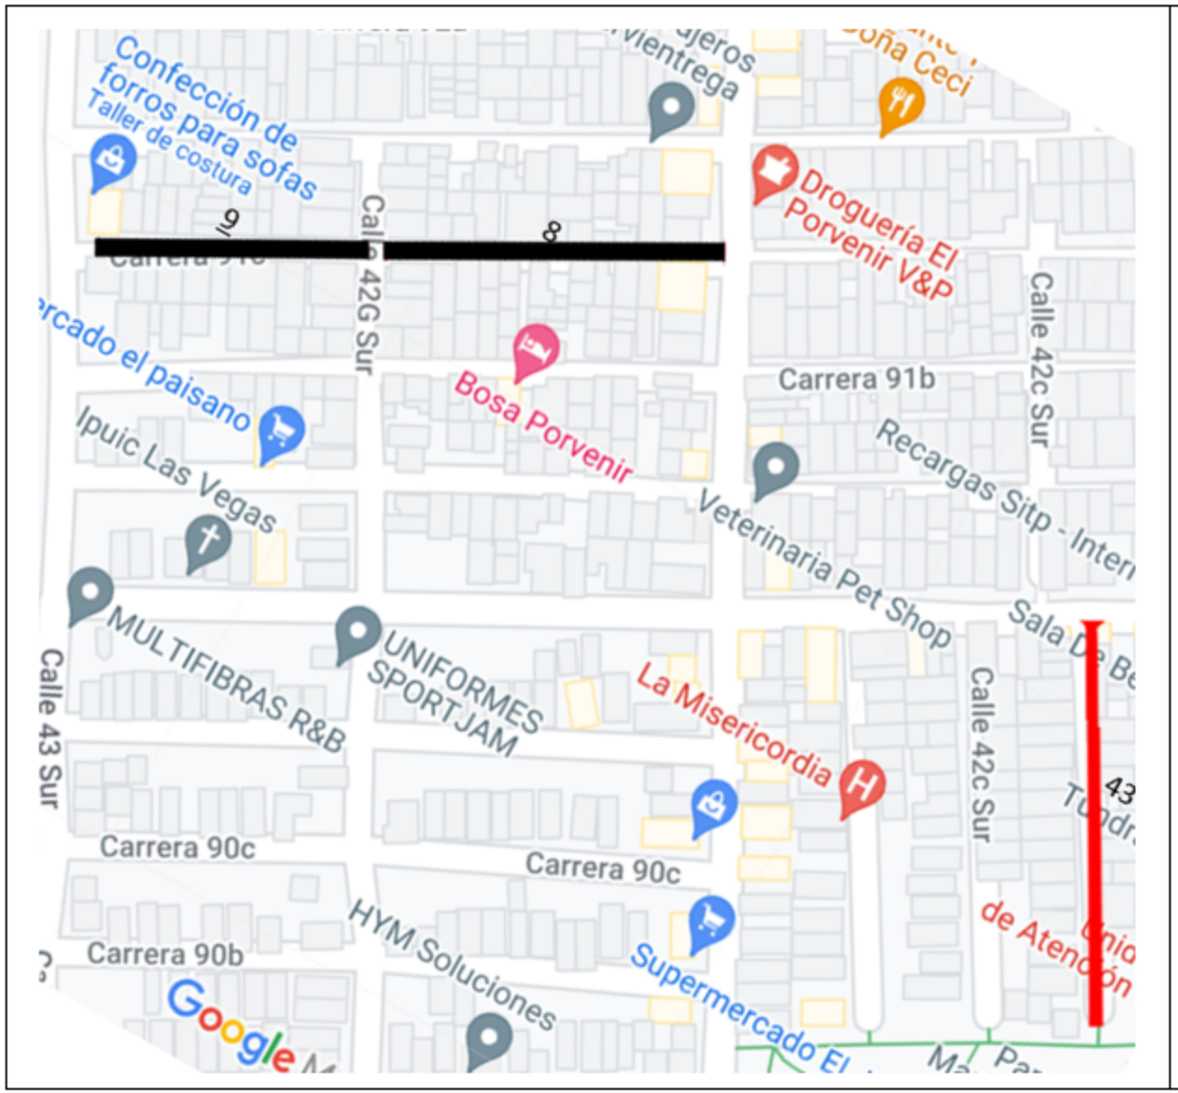

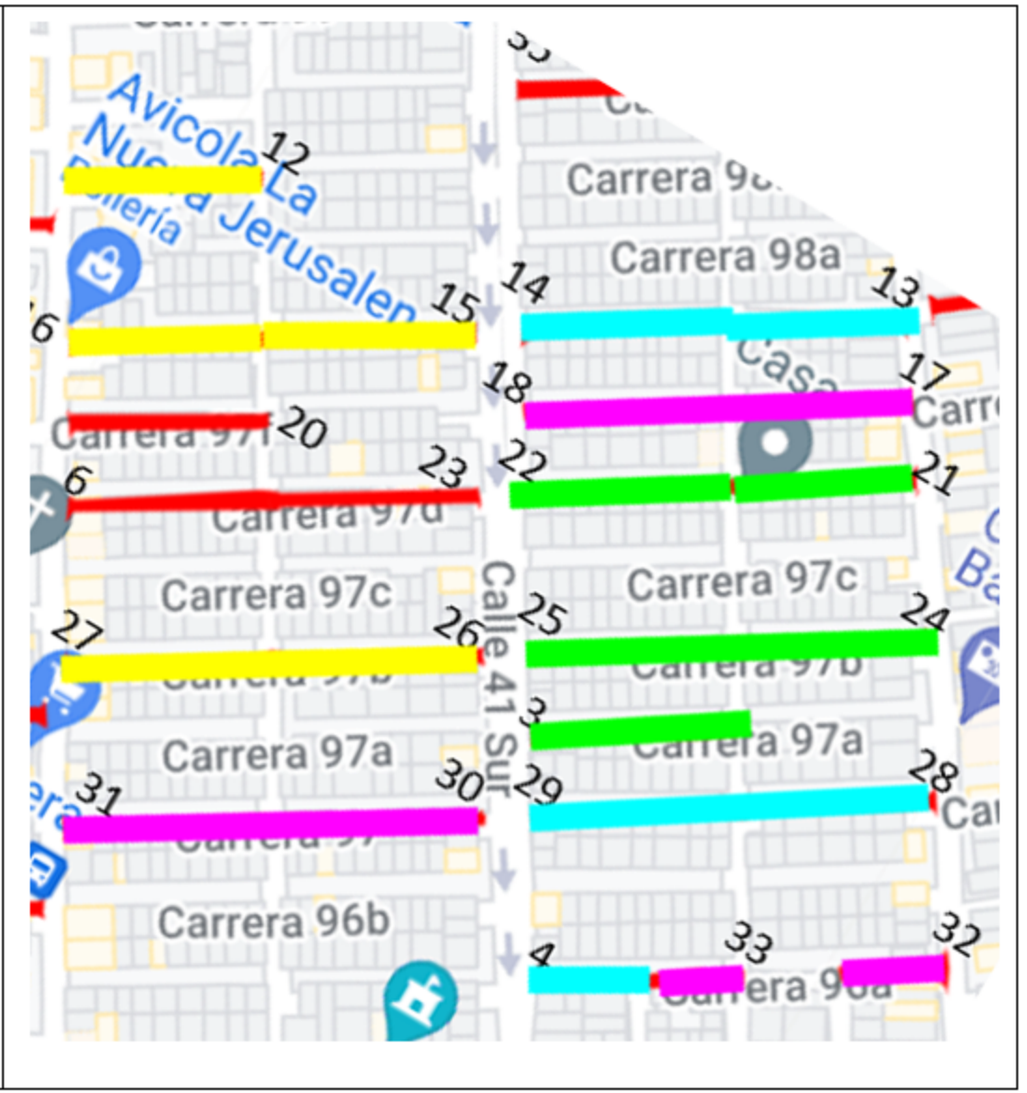

Nomenclatura	Cantidad
CIV Pavimentados	5
CIV Con Monoblock para pavimentar	5
CIV con estabilizado sin Monoblock	6
CIV En Excavación de vía	2
CIV con obras en andenes	5
Frente de obra sin inicio	20
Suma	**43**

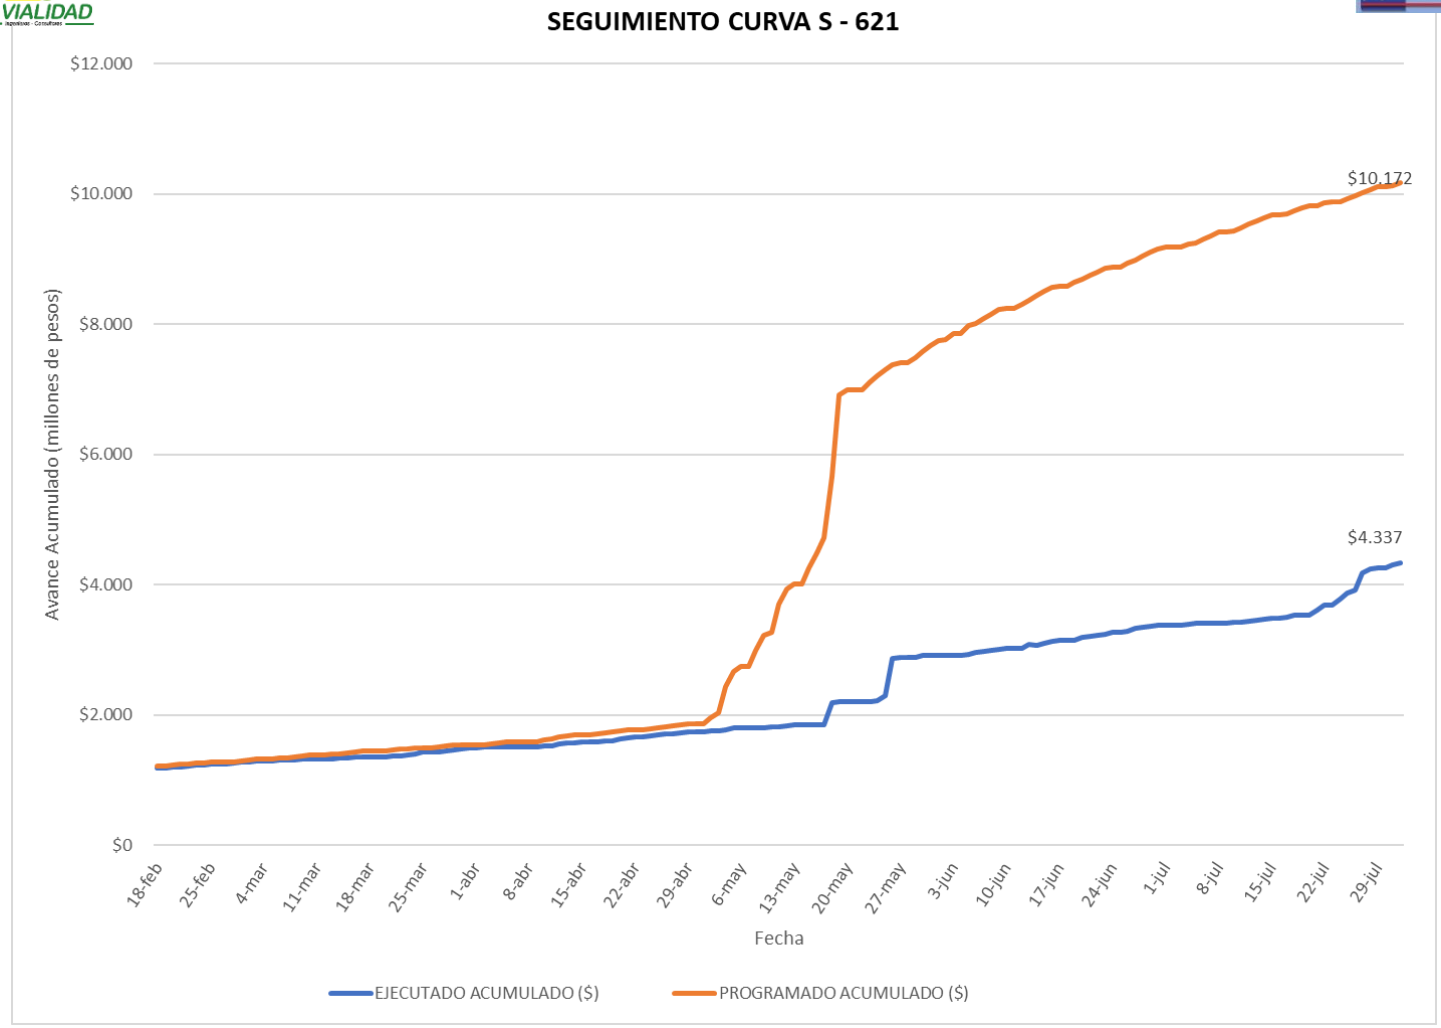


SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**27-jul**	**28-jul**	**29-jul**	**30-jul**	**31-jul**	**1-ago**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$10.022	$10.067	$10.112	$10.117	$10.127	$10.172
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	82,63%	83,00%	83,37%	83,41%	83,50%	83,87%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$4.177	$4.252	$4.255	$4.255	$4.308	$4.337
EJECUTADO ACUMULADO (%)	34,44%	35,06%	35,08%	35,08%	35,52%	35,76%
DESVIACIÓN ($)	$ 5.844	$ 5.814	$ 5.857	$ 5.862	$ 5.818	$ 5.835
DESVIACIÓN (%)	**-48,19%**	**-47,94%**	**-48,29%**	**-48,33%**	**-47,97%**	**-48,11%**

G1	1-ago-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	80,86%	83,87%	80,86%
% EJECUTADO	38,76%	35,76%	17,52%
% DESVIACIÓN	-42,10%	-48,11%	-63,34%

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 1-AGOSTO-2023								
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
28	8000929	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 370.848.168,59	3,06%	106,04%	0,70%
29	8000996	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 513.204.957,16	4,23%	185,33%	2,23%
24	8000871	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 285.639.032,93	2,36%	101,12%	0,13%
25	8000923	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 253.700.358,60	2,09%	63,64%	-0,76%
13	8000772	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 268.118.682,63	2,21%	89,76%	-0,18%
14	8000814	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 285.375.131,32	2,35%	66,58%	-1,07%
17	8000794	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 212.241.939,90	1,75%	58,06%	-0,77%
18	8000839	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 220.730.067,11	1,82%	49,62%	-1,60%
21	8000821	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 303.048.993,63	2,50%	76,54%	-0,63%
22	8000864	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 364.765.653,33	3,01%	76,80%	-0,35%
3	8000957	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 337.550.165,43	2,78%	97,29%	0,11%
33	8001041	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 111.414.226,25	0,92%	67,71%	-0,31%
4	8001069	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 99.191.898,48	0,82%	53,95%	-0,45%
16	8000907	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 29.516.267,72	0,24%	7,80%	-2,74%
15	8000856	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 69.194.822,06	0,57%	21,71%	-2,03%
26	8000988	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 106.253.448,11	0,88%	34,04%	-1,18%
32	8000979	$ 384.241.540,00	$ 313.656.771,99	2,59%	$ 79.149.699,58	0,65%	20,60%	-1,93%
30	8001058	$ 167.606.525,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 131.948.964,49	1,09%	78,73%	-0,16%
31	8001125	$ 347.840.618,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 114.848.300,88	0,95%	33,02%	-1,58%
27	8001052	$ 394.454.974,00	$ 379.247.233,34	3,13%	$ 61.568.973,76	0,51%	15,61%	-2,62%
12	8000849	$ 353.440.216,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 85.550.375,07	0,71%	24,21%	-1,73%
8	8002417	$ 436.309.464,00	$ 433.765.201,90	3,58%	$ 32.164.268,35	0,27%	7,37%	-3,31%
9	8002500	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 603.743,21	0,00%	0,18%	-2,73%
27	8001052	$ 455.180.038,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,17%
12	8000849	$ 307.654.668,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,44%
23	8000916	$ 389.375.082,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,81%
5	8000655	$ 464.716.467,00	$ 422.232.227,50	3,48%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,48%
40	8011953	$ 462.079.926,00	$ 341.506.123,69	2,82%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,82%
10	8011960	$ 492.144.459,00	$ 352.547.297,72	2,91%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,91%
35	8000743	$ 769.586.187,00	$ 320.002.674,88	2,64%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,64%
7	8000736	$ 492.144.459,00	$ 312.508.817,70	2,58%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,58%
2	8001595	$ 338.872.088,69	$ 86.647.793,13	0,71%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,71%
39	8000584	$ 443.145.176,00	$ 73.344.835,54	0,60%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,60%
TOTALES			**$ 10.171.804.761,81**	**83,87%**	**$ 4.336.628.138,59**	**35,76%**		**-48,11%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					

FECHA EVALUACIÓN			4-jul	11-jul	18-jul	25-jul	1-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	73,07%	73,17%	73,70%	90,07%	106,04%
29	8000996	$ 276.918.878,00	93,93%	93,93%	94,50%	95,67%	185,33%
24	8000871	$ 282.489.045,00	89,59%	89,59%	89,59%	100,78%	101,12%
25	8000923	$ 398.643.978,00	55,03%	55,03%	55,03%	63,64%	63,64%
13	8000772	$ 298.711.275,00	62,10%	62,10%	62,63%	89,76%	89,76%
14	8000814	$ 428.629.368,00	60,60%	60,66%	60,87%	60,88%	66,58%
17	8000794	$ 365.563.428,00	52,80%	52,80%	58,06%	58,06%	58,06%
18	8000839	$ 444.842.291,00	49,09%	49,11%	49,62%	49,62%	49,62%
21	8000821	$ 395.944.862,00	57,57%	57,57%	58,49%	68,37%	76,54%
22	8000864	$ 474.960.513,00	69,89%	69,89%	69,89%	76,45%	76,80%
3	8000957	$ 346.941.971,00	87,25%	87,98%	87,98%	97,29%	97,29%
33	8001041	$ 164.541.658,00	65,34%	65,34%	67,71%	67,71%	67,71%
4	8001069	$ 183.856.740,00	38,71%	39,81%	40,74%	40,74%	53,95%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,80%
15	8000856	$ 318.778.666,00	16,16%	18,01%	18,37%	19,44%	21,71%
26	8000988	$ 312.106.601,00	21,62%	23,78%	26,55%	30,16%	34,04%
32	8000979	$ 384.241.540,00	16,76%	16,76%	17,44%	17,44%	20,60%
30	8001058	$ 167.606.525,00	66,87%	66,87%	78,73%	78,73%	78,73%
31	8001125	$ 347.840.618,00	26,94%	27,00%	32,13%	32,70%	33,02%
27	8001052	$ 394.454.974,00	8,39%	11,12%	13,07%	13,17%	15,61%
12	8000849	$ 353.440.216,00	15,64%	15,97%	19,37%	23,96%	24,21%
8	8002417	$ 436.309.464,00					7,37%
9	8002500	$ 341.127.565,00					0,18%

FECHA EVALUACIÓN			1-ago
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	15,97%
29	8000996	$ 276.918.878,00	89,65%
24	8000871	$ 282.489.045,00	0,34%
25	8000923	$ 398.643.978,00	0,00%
13	8000772	$ 298.711.275,00	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	5,70%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	0,00%
21	8000821	$ 395.944.862,00	8,17%
22	8000864	$ 474.960.513,00	0,35%
3	8000957	$ 346.941.971,00	0,00%
33	8001041	$ 164.541.658,00	0,00%
4	8001069	$ 183.856.740,00	13,21%
16	8000907	$ 378.482.383,00	0,12%
15	8000856	$ 318.778.666,00	2,27%
26	8000988	$ 312.106.601,00	3,89%
32	8000979	$ 384.241.540,00	3,16%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	0,32%
27	8001052	$ 394.454.974,00	2,44%
12	8000849	$ 353.440.216,00	0,24%
8	8002417	$ 436.309.464,00	7,37%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,18%

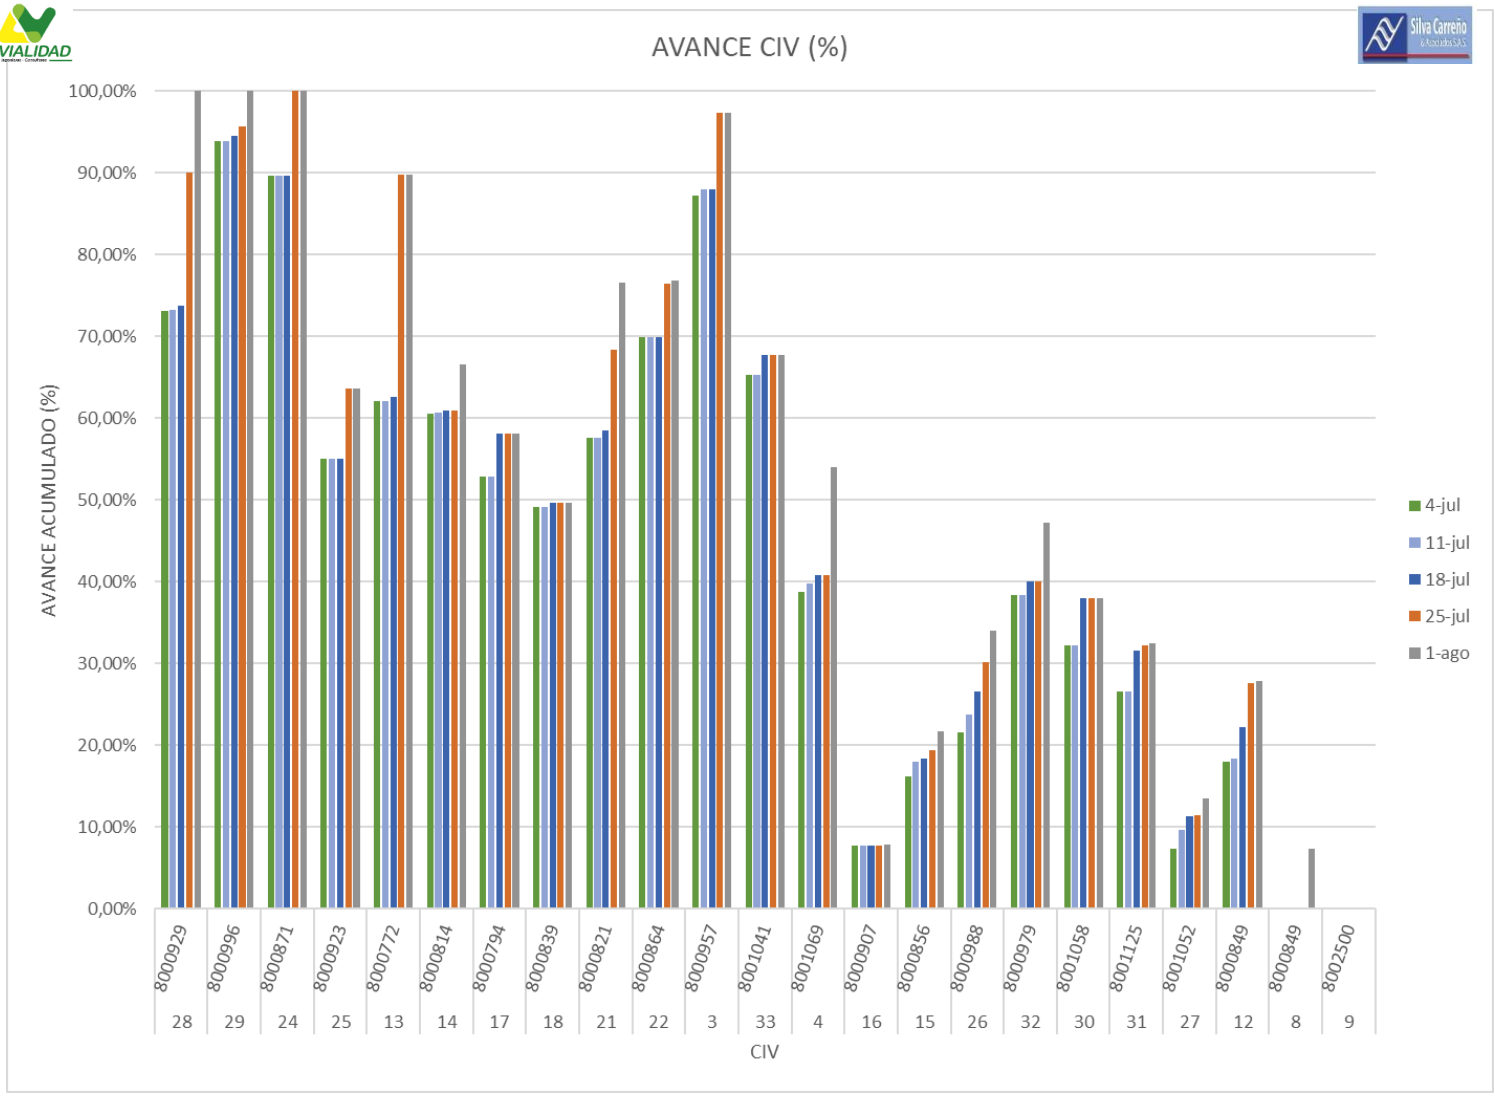
AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
8000929 8000996 8000871 8000923 8000772 8000814 8000794 8000839 8000821 8000864 8000957 8001041 8001069 8000907 8000856 8000988 8000979 8001058 8001125 8001052 8000849 8000849 8002500
28 29 24 25 13 14 17 18 21 22 3 33 4 16 15 26 32 30 31 27 12 8 9
CIV
4-jul
11-jul
18-jul
25-jul
1-ago
