BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 11 de agosto de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Alcaldía local de Kennedy

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No.44 – Grupo 1

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Manuel Alejandro Mazabuel García									x	Contratista – XIE S.A	xie.directorproyecto.621@gmail.com	321 2149476	
Oscar Vargas Galindo									x	Contratista – XIE S.A	oscardavid53@hotmail.com	310 2239581	
Oswaldo Ladino Chávez			x							Interventoría - SCLV	dir-viales@silcarsa.com.co	310 3178077	
Juan Manuel Alba Rojas			x							Interventoría - SCLV	juan.alba@lavialidad.com	310 3178077	
Laura Daniela Díaz			X							Interventoría - SCLV	dlaura0898@gmail.com	316 8270441	
Andrés Mauricio Llanos			x							Supervisión - FDLK	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	305 7039773	
Danilo Meneses Toro			x							Supervisión - FDLK	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	311 8988034	
			x										

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento No.44

Se da inicio a comité de seguimiento No.44, en las instalaciones de la Alcaldía local de Kennedy con la presencia del contratista de obra grupo 1 XIE S.A, interventoría y supervisión del FDLK.

Orden del día

La Interventoría indica que la finalidad del comité de seguimiento, es verificar las dos solicitudes que se le realizaron al contratista de obra:

1. Determinar la situación legal del contrato
2. Estado de las cuentas

Como primer punto, la interventoría indica que el contratista manifiesto que el 10 de agosto llego la mitad el pedido de monoblock solicitado, está a la espera que se haga el recibo de la prioridad 33, anuncia la pavimentación de la prioridad 14,13,28,29,4 y 32, con estas 7 prioridades y las 5 que se tienen abiertas, quedaría faltando por entregar solo la prioridad 19 o 18. La Interventoría le propone al contratista ejecutar en la prioridad en la pueda instalar el restante de monoblock.

A partir de lo anterior la Interventoría indica que, se puede evidenciar que el contratista está a 15 días de alcanzar la meta de los 13 CIV, para lo cual la Interventoría sugiere realizar todos los procedimientos técnicos que se deben realizar.

Con respecto al segundo punto la Interventoría indica que:

- El acta de recibo parcial No 8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 fue aprobada y radicada por la interventoría al FDLK.

- El acta de recibo parcial No 9 correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2023 fue aprobada y radicada por la interventoría al FDLK.

Con respecto al acta de recibo parcial No.10 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2023, la interventoría indica que se tenían unos condicionales para poder realizar la entrega de las misma como lo son:

1. Cantidades teóricas y memorias de cálculo conciliadas entre interventoría y contratista, el cual ya fue entregado por el contratista.
2. Inventario completo del canal Monoblock instalado, el cual ya fue entregado por el contratista.
3. Se solicita al contratista de obra realizar la entrega del inventario de pendientes de obra de las prioridades parcialmente finalizadas, por lo cual el contratista deberá delegar cuadrillas de trabajo exclusivamente para este proceso.
4. NPS, la interventoría solicita al contratista asistir a una mesa de trabajo el lunes 14 de agosto de 2023 a las 3 pm. La interventoría indica que por el momento se tienen 9 NPs que se le puede dar vía libre., pero hay el NP de sumideros si tiene varias objeciones, puesto que no hay una justificación técnica para demostrar el cambio de sumidero que inicialmente propuesto. La Interventoría espera la evaluación al respecto.

La Interventoría por otra parte aclara que al contratista se le autorizo el fresado, y ha sido seleccionado el material de manera correcta para que se cumplan con las condiciones de calidad del material.

En cuanto a obra, se informa que el contratista iba a realizar la construcción de pozo profundo para la conexión de dos sumideros en la prioridad 14, sin embargo, en recorrido de obra se evidencio que el contratista sin la autorización de la Interventoría realizo el cargue. En obra se informó que eso no sería aceptado por la Interventoría, pero surgió que el especialista hidráulico de interventoría dio aval al mismo, realizándose la verificación con la construcción del mismo se hacía alguna interferencia con el colector. En la verificación se pudo evidenciar que este no quedo por encima del colector. Verificación que realizo el especialista de interventoría en compañía con el delegado de la EAAB, el ingeniero Javier Patiño, donde la única observación que hizo fue que el cargue del pozo era alto, y se esperaba que el contratista en la construcción hubiese realizado un cono.

En términos generales se evidencia que la obra va marchando de marea positiva.

El contratista indica que:

- Se está realizado la estabilización de las prioridades de los CIV abiertos, prioridades 8 y 9 están prácticamente completos.
- Se están realizando los ajustes y remates del espacio público de las prioridades 13 y 14, corte de losetas para instalación y fundida del concreto nuevamente.
- Con el fresado que se contaba se realizó la estabilización que estuvo a su alcance y posterior a la aprobación de fresado de la UMV, el día 10 de agosto de 2023 se realizaron tres viajes y se continuara trayecto material al 12 de agosto de 2023.
- El 12 de agosto de 2023 se tiene planeado cerrar la excavación de los 2 CIV abiertos, prioridades 12 y 20.

El contratista espera que al cierre de los pendientes espera realizar la apertura de nuevos frentes de obra, en dos fases (estas intervenciones dependen del ancho de calzada y la maquinaria requerida para excavación):

- ***Primera fase:*** 10 CIV en excavación para que en 15 días subir los 10 CIV a nivel de estabilización. Se abrirán las prioridades 1,7,40,2,39,34,35,10,1 y 41.

La Interventoría solicita que el contratista dar inicio a estas prioridades el 17 de septiembre de 2023 a actividades de excavación, ya que se evidencia que el rendimiento realizado por el contratista en prioridades anteriores fue muy significativo. Se espera contar con el desembolso de las cuentas ya mencionadas y poder continuar con la ejecución en obra e ir surtiendo e instalar el monoblock de manera continua. Con este desembolso el contratista no tendrá problemas de ninguna índole para dar continuidad al contrato.

Por otra parte, el FDLK solicita que se fije una mesa de trabajo para dejar precedente del cierre del presunto incumplimiento junto con contratista e Interventoría. El contratista de obra manifiesta que saliendo de la mesa de trabajo de NPs, y verificación del acta de junio de 2023, se espera que con el acta de junio y julio se pueda avanzar significativamente y realizar la reunión.

La Interventoría indica que se debe tener claro el procedimiento de pago de monoblock, y realizar los cruces del monoblock que se debe descontar.

La Interventoría indica que el miércoles 16 de agosto de 2023 se realizará mesa de trabajo de levantamiento de presunto incumplimiento.

Por otra parte, la Interventoría indica que el componente técnico informa que para la cuenta del mes de mayo se presentaron 2 versiones y para la cuenta del mes de junio se tuvieron 4 versiones, esto ha provocado el atraso en la radicación de las cuentas, puesto que en cada versión se ha tenido que realizar la verificación completa nuevamente, por varios cambios que se hacen sin previo aviso.

Se solicita y se reitera las cuentas sean entregadas con sus respectivos soportes y ajustes solicitados.

El contratista manifiesta que realizara la revisión de manera interna con sus profesionales y se acoge a las observaciones informadas por la interventoría para mitigar estos errores en la radicación de las cuentas.

El FDLK por otra parte solita sean verificados los avances por prioridad presentados en la agenda adjunta al comité, puesto que hay valores que superan el 100%. La Interventoría manifiesta que estas serán ajustadas una vez se termine con la recolección de cantidades, para así emitir un avance de obra ejecutado real para cada una de las prioridades.

**Se adjunta al acta de comité agenda con las actividades realizadas en la semana.*

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	XIE S.A - SCLV	16-ago-23
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.	XIE S.A	16-ago-23
3	Radicación de oficio solicitando limpieza de colector colmatado.	XIE S.A	16-ago-23
4	Cronograma de pavimentación	XIE S.A	16-ago-23
5	Actualización de cronograma de inspecciones CCTV	XIE S.A	16-ago-23
6	Cronograma general de actividades – No contractual	XIE S.A	16-ago-23
7	Mesa de trajo de NPs – Radicación de concepto	XIE S.A	16-ago-23
8	Mesa de trabajo de levantamiento de presunto incumplimiento	XIE S.A - SCLV	16-ago-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 17 de agosto de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.44

Fecha: 11 de agosto de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	Contratista e interventoría	10-ago-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	10-ago-23	NO
3	Radicación de oficio solicitando limpieza de colector colmatado.	Contratista	10-ago-23	NO
4	Cronograma de pavimentación	Contratista	10-ago-23	NO
5	Actualización de cronograma de inspecciones CCTV	Contratista	10-ago-23	NO
6	Cronograma general de actividades – No contractual	Contratista	10-ago-23	NO


2. Componentes
A. Técnico
- **Informes semanales junio:** Aprobados.
- **Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado
- **Pre-Acta No.11 de recibo parcial No.9 (junio):** Aprobado
- **Calificación semanal:** 82%
B. SST
- **Informe semanal 44:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado
- **Ingresos en la semana:** 4 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 Inspector de obra
- **Retiros en la semana:** 1 Ayudante, 2 Oficial
- **Calificación semanal:** 94%
C. Ambiental
- **Informe semanal 44:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado
- **Calificación semanal:** 94%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 44:** Aprobado
- **Informe Mensual 10 (julio):** En revisión
- **Calificación semanal:**100%
Obra


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada**: Se realiza instalación de bordillo A-80 2,6ML costado occidente del K0+013 al K0+015,6, instalación de monoblock costado oriente 9ML del K0+004 al K0+013. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:**
28	8000929	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
29	8000996	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** **Andén occidental:**
24	8000871	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental** Sin actividades.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
22	8000864	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
13	8000772	**Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 4.24m3 en intersección con prioridad 13 y 14. **Andén occidental:** Se realiza remates parciales en fachada parte inferior del K0+000 al K0+060. **Andén oriental:** Se realiza remates parciales en fachada parte inferior del K0+000 al K0+060.
14	8000814	**Calzada:** Se realiza excavación para pozo 6.07m3 del K00+000 al K00+060, concreto 3000psi para construcción pozo 0.66m3, acero para parrilla base pozo 28 varillas 44.5Kg acero, excavación manual para instalación de tubería 12 pulgadas corrugada 1.59m3, construcción de cargue de pozo 1.68m diámetro externo. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén oriental: Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060.
18	8000839	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates en cajas de inspección, fachada en parte inferior parcial del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza remates en cajas de inspección , fachada en parte inferior parcial del K00+000 al K00+060.
33	8001041	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates parciales en fachada parte inferior del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con un asentamiento de 4 pulgadas 8.19m2 del K0+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza remates parciales en fachada parte inferior del K0+000 al K0+060, instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con un asentamiento de 4 pulgadas 18.59m2 del K0+000 al K00+060.
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
12	8000849	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates en cajas de inspección, instalación de concreto parcial de 3000psi para acceso peatonal 4.81m3 del K0+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza remates en cajas de inspección.
15	8000856	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado del K0+000 al K00+060, instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con un asentamiento de 4 pulgadas 66.39m2 del K0+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza nivelación y compactación parcial e instalación de fresado parcial 10.35m3 del K0+000 al K00+060.
16	8000907	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza excavación parcial manual en anden 23.77m3 del K0+000 al K00+060.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Sin actividad.
26	8000988	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza nivelación parcial de fresado 11.25m3 del K00+000 al K00+060, instalación parcial de concreto de 3000psi para acceso peatonal 28.27m2 del K00+000 al K00+060, instalación parcial de concreto de 4000psi con un asentamiento de 5.5 pulgadas para acceso vehicular 50.09m2 del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza nivelación parcial de fresado 11.23m3 del K00+000 al K00+060, instalación parcial de concreto de 3000psi para acceso peatonal 26.72m2 del K00+000 al K00+060.
27	8001052	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición parcial de cajas de inspección 1.08m3 del K00+000 al K00+060 y construcción parcial de cajas de inspección 4 unidades del K00+000 al K00+060, se realiza compactación de sub-rasante parcial 109.7m2 del K00+000 al K00+060, instalación parcial de geotextil 115.78m2 del K00+000 al K00+060, nivelación, compactación e instalación de fresado parcial 21.94m3 del K00+000 al K00+060 **Andén occidental:** Sin actividad.
8	8002417	**Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 31.39m3 del K0+000 al K0+086. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
9	8002500	**Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 34.34m3 del K0+000 al K0+070,57, excavación mecánica del 112,11m3 K0+000 al K0+035, nivelación de la sub-rasante 113.23m2 del K0+000 al K0+035, instalación de geotextil 228.94m2 K0+000 al K0+070.57, instalación de geo-celda 228.94m2 K0+000 al K0+070.57, instalación de fresado 41,23m3 K0+000 al K0+070.57, sobre excavación fallo 0,13m3 K0+020, relleno con fresado fallo 0,13m3 K0+020. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
20	8000938	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica 156.11m3 K0+000 al K0+059.35, nivelación y compactación de sub-rasante 156m2 del K0+000 al K0+039, instalación de geo-celda 120m2 del K0+000 al K0+039, instalación de geotextil 120m2 del K0+000 al K0+039, instalación de fresado para lleno de geo-celda 21.6m3 del K0+000 al K0+039, **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

Estados de las obras en los CIV

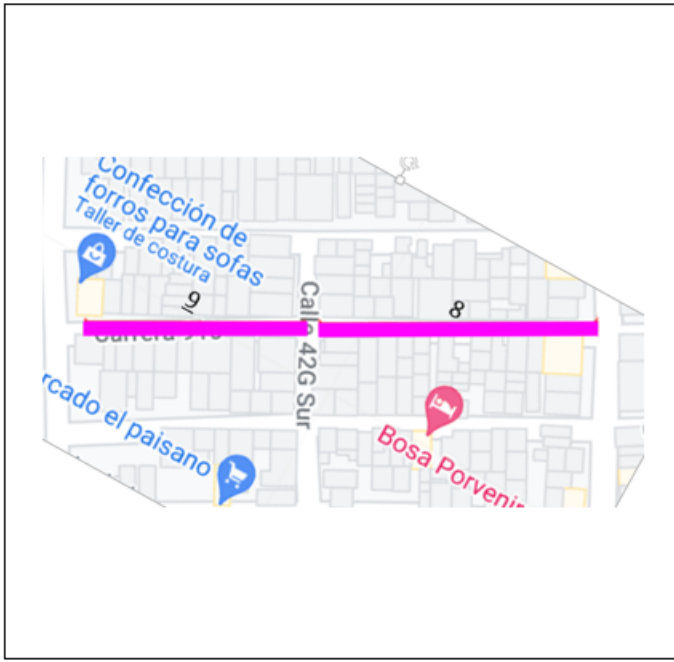

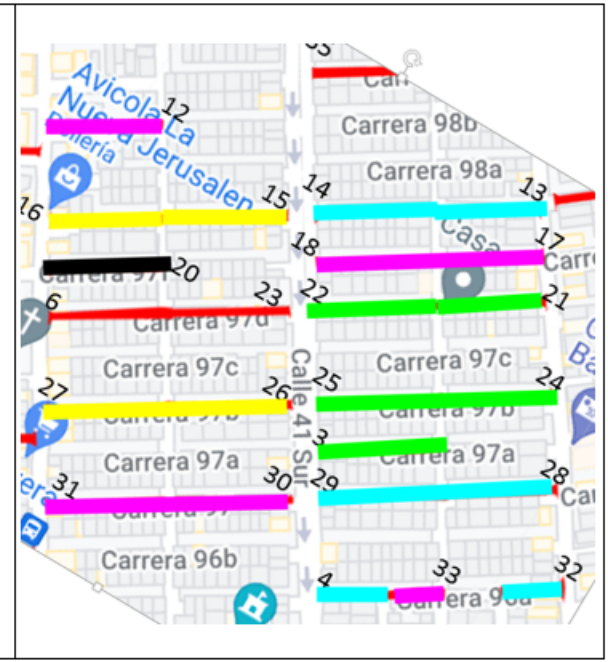


Nomenclatura	Cantidad
CIV Pavimentados	5
CIV Con Monoblock para pavimentar	6
CIV con estabilizado sin Monoblock	8
CIV En Excavación de vía	1
CIV con obras en andenes	4
Frente de obra sin inicio	19
Suma	**43**


Frentes de obra en la semana del 2 al 8 de agosto de 2023:


Frentes de obra: 5

CIV abiertos: 24

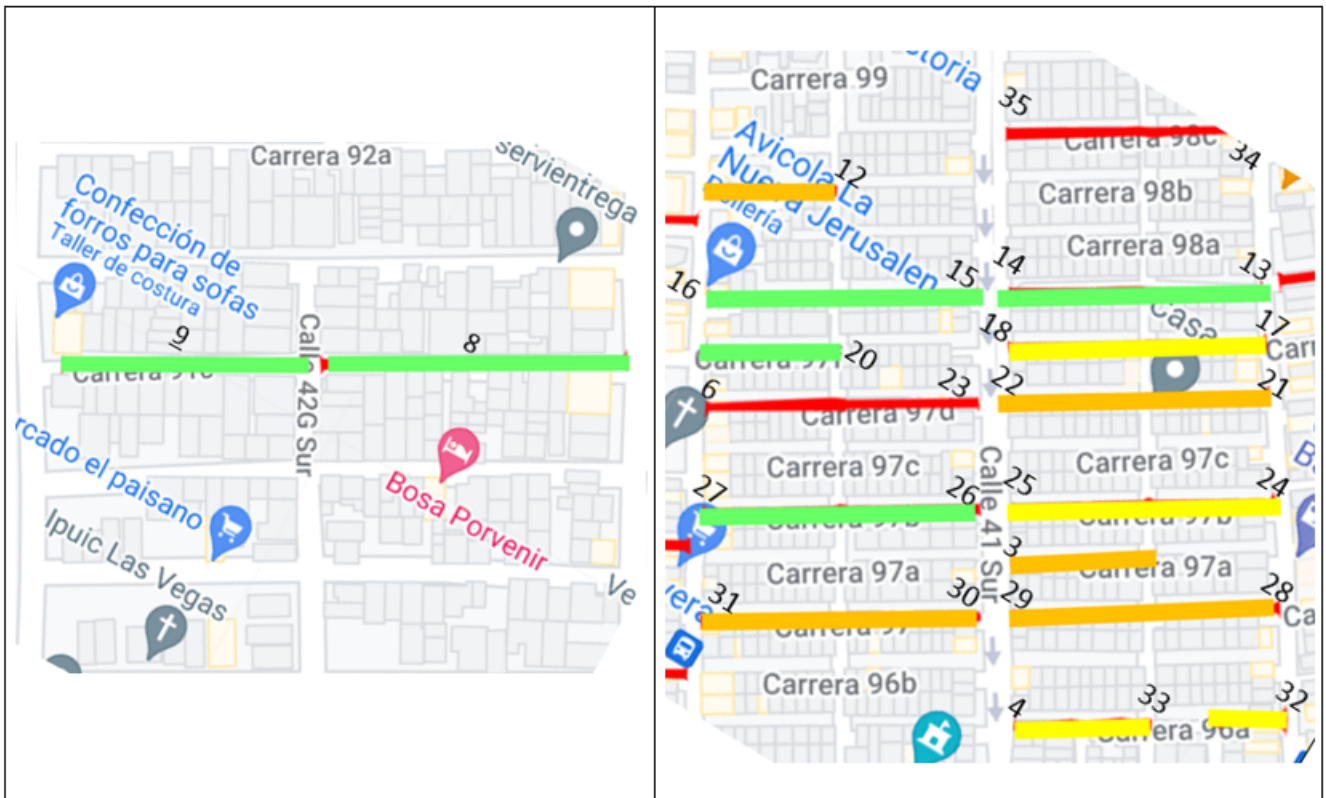

Nomenclatura
Frente de obra Activo
Frente de obra Intermitente
Frente de obra Inactivo
Frente de obra sin inicio

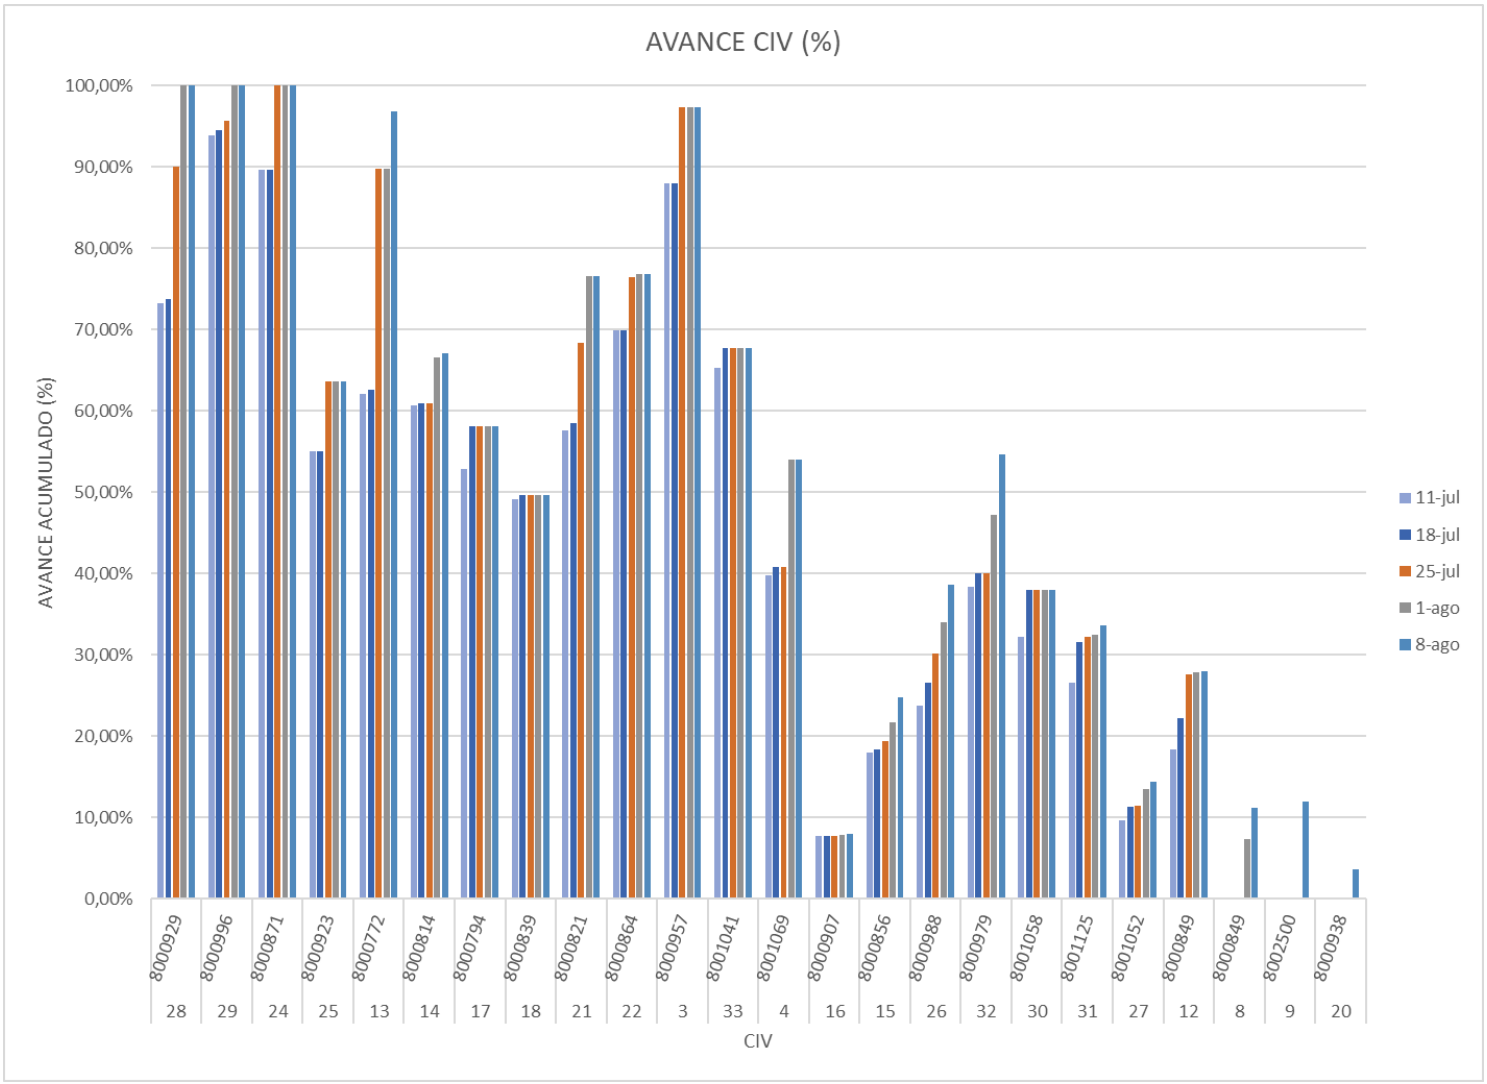
AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
11-jul
18-jul
25-jul
1-ago
8-ago
8000929 28
8000996 29
8000871 24
8000923 25
8000772 13
8000814 14
8000794 17
8000839 18
8000821 21
8000864 22
8000957 3
8001041 33
8001069 4
8000907 16
8000856 15
8000988 26
8000979 32
8001058 30
8001125 31
8001052 27
8000849 12
8000849 8
8002500 9
8000938 20
CIV

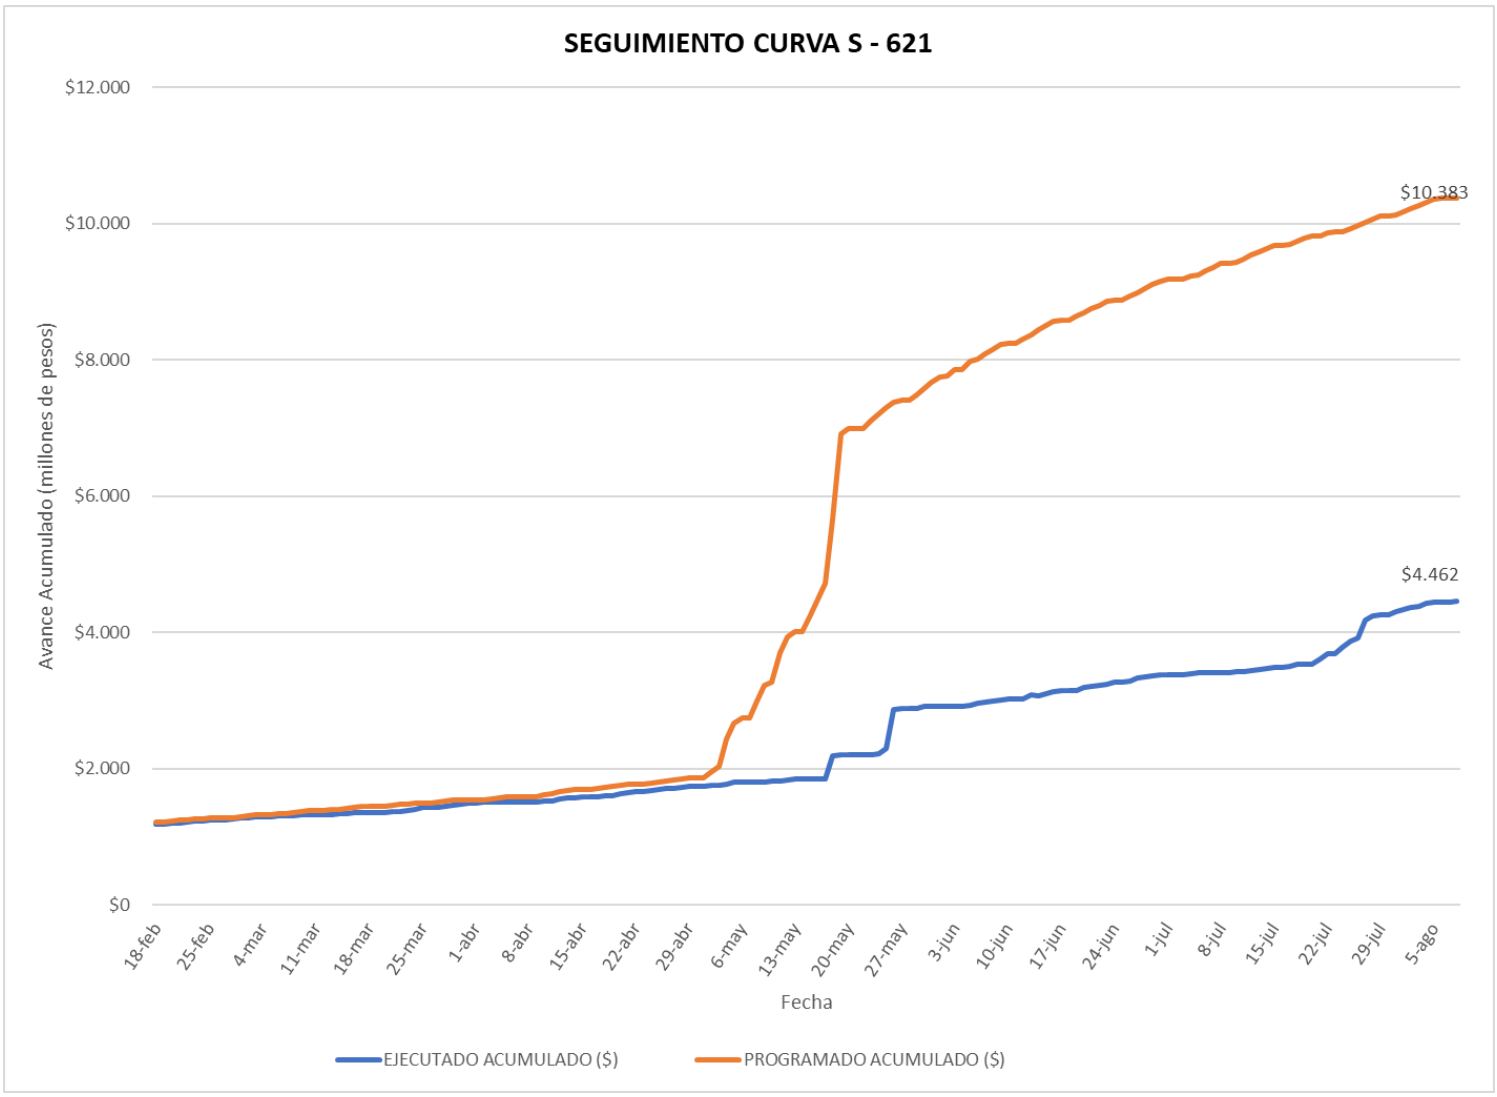

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**3-ago**	**4-ago**	**5-ago**	**6-ago**	**7-ago**	**8-ago**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$10.264	$10.315	$10.366	$10.372	$10.372	$10.383
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	84,63%	85,05%	85,47%	85,52%	85,52%	85,61%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$4.385	$4.431	$4.441	$4.441	$4.441	$4.462
EJECUTADO ACUMULADO (%)	36,16%	36,54%	36,62%	36,62%	36,62%	36,79%
DESVIACIÓN ($)	$ 5.879	$ 5.884	$ 5.925	$ 5.931	$ 5.931	$ 5.921
DESVIACIÓN (%)	**-48,47%**	**-48,51%**	**-48,85%**	**-48,90%**	**-48,90%**	**-48,82%**

G1	8-ago-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	82,65%	85,61%	82,65%
% EJECUTADO	39,79%	36,79%	17,52%
% DESVIACIÓN	-42,87%	-48,82%	-65,13%

SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 8-AGOSTO-2023								
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
28	8000929	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 370.848.168,59	3,06%	106,04%	0,70%
29	8000996	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 513.204.957,16	4,23%	185,33%	2,23%
24	8000871	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 285.639.032,93	2,36%	101,12%	0,13%
25	8000923	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 253.700.358,60	2,09%	63,64%	-0,76%
13	8000772	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 289.278.735,33	2,39%	96,84%	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 287.549.582,50	2,37%	67,09%	-1,05%
17	8000794	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 212.241.939,90	1,75%	58,06%	-0,77%
18	8000839	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 220.730.067,11	1,82%	49,62%	-1,60%
21	8000821	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 303.048.993,63	2,50%	76,54%	-0,63%
22	8000864	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 364.765.653,33	3,01%	76,80%	-0,35%
3	8000957	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 337.550.165,43	2,78%	97,29%	0,11%
33	8001041	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 111.414.226,25	0,92%	67,71%	-0,31%
4	8001069	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 99.191.898,48	0,82%	53,95%	-0,45%
16	8000907	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 30.369.182,96	0,25%	8,02%	-2,73%
15	8000856	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 78.952.072,73	0,65%	24,77%	-1,95%
26	8000988	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 120.531.465,90	0,99%	38,62%	-1,06%
32	8000979	$ 384.241.540,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 91.553.491,94	0,75%	23,83%	-0,50%
30	8001058	$ 167.606.525,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 131.948.964,49	1,09%	78,73%	-1,44%
31	8001125	$ 347.840.618,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 118.681.697,32	0,98%	34,12%	-1,45%
27	8001052	$ 394.454.974,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 65.199.339,13	0,54%	16,53%	-2,63%
12	8000849	$ 353.440.216,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 86.238.897,70	0,71%	24,40%	-2,73%
8	8002417	$ 436.309.464,00	$ 433.765.201,90	3,58%	$ 48.698.543,10	0,40%	11,16%	-3,17%
9	8002500	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 40.527.895,79	0,33%	11,88%	-2,40%
23	8000916	$ 389.375.082,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,81%
5	8000655	$ 464.716.467,00	$ 454.907.485,31	3,75%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,75%
40	8011953	$ 462.079.926,00	$ 365.568.885,80	3,01%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,01%
10	8011960	$ 492.144.459,00	$ 380.184.171,31	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
35	8000743	$ 769.586.187,00	$ 16.265.658,50	0,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,13%
7	8000736	$ 492.144.459,00	$ 341.701.258,16	2,82%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,82%
2	8001595	$ 338.872.088,69	$ 111.224.258,09	0,92%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,92%
39	8000584	$ 443.145.176,00	$ 102.682.769,76	0,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,85%
6	8000977		$ 313.656.771,99	2,59%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,59%
20	8000938		$ 379.247.233,34	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
1	8000687		$ 347.281.591,43	2,86%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,86%
TOTALES			**$ 10.382.831.070,01**	**85,61%**	**$ 4.461.865.330,32**	**36,79%**		**-48,82%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					

FECHA EVALUACIÓN			11-jul	18-jul	25-jul	1-ago	8-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	73,17%	73,70%	90,07%	106,04%	106,04%
29	8000996	$ 276.918.878,00	93,93%	94,50%	95,67%	185,33%	185,33%
24	8000871	$ 282.489.045,00	89,59%	89,59%	100,78%	101,12%	101,12%
25	8000923	$ 398.643.978,00	55,03%	55,03%	63,64%	63,64%	63,64%
13	8000772	$ 298.711.275,00	62,10%	62,63%	89,76%	89,76%	96,84%
14	8000814	$ 428.629.368,00	60,66%	60,87%	60,88%	66,58%	67,09%
17	8000794	$ 365.563.428,00	52,80%	58,06%	58,06%	58,06%	58,06%
18	8000839	$ 444.842.291,00	49,11%	49,62%	49,62%	49,62%	49,62%
21	8000821	$ 395.944.862,00	57,57%	58,49%	68,37%	76,54%	76,54%
22	8000864	$ 474.960.513,00	69,89%	69,89%	76,45%	76,80%	76,80%
3	8000957	$ 346.941.971,00	87,98%	87,98%	97,29%	97,29%	97,29%
33	8001041	$ 164.541.658,00	65,34%	67,71%	67,71%	67,71%	67,71%
4	8001069	$ 183.856.740,00	39,81%	40,74%	40,74%	53,95%	53,95%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,80%	8,02%
15	8000856	$ 318.778.666,00	18,01%	18,37%	19,44%	21,71%	24,77%
26	8000988	$ 312.106.601,00	23,78%	26,55%	30,16%	34,04%	38,62%
32	8000979	$ 384.241.540,00	16,76%	17,44%	17,44%	20,60%	23,83%
30	8001058	$ 167.606.525,00	66,87%	78,73%	78,73%	78,73%	78,73%
31	8001125	$ 347.840.618,00	27,00%	32,13%	32,70%	33,02%	34,12%
27	8001052	$ 394.454.974,00	11,09%	13,04%	13,13%	15,58%	16,53%
12	8000849	$ 353.440.216,00	15,97%	19,37%	23,96%	24,21%	24,40%
8	8002417	$ 436.309.464,00				7,37%	11,16%
9	8002500	$ 341.127.565,00				0,18%	11,88%

FECHA EVALUACIÓN			8-ago
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	0,00%
29	8000996	$ 276.918.878,00	0,00%
24	8000871	$ 282.489.045,00	0,00%
25	8000923	$ 398.643.978,00	0,00%
13	8000772	$ 298.711.275,00	7,08%
14	8000814	$ 428.629.368,00	0,51%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	0,00%
21	8000821	$ 395.944.862,00	0,00%
22	8000864	$ 474.960.513,00	0,00%
3	8000957	$ 346.941.971,00	0,00%
33	8001041	$ 164.541.658,00	0,00%
4	8001069	$ 183.856.740,00	0,00%
16	8000907	$ 378.482.383,00	0,23%
15	8000856	$ 318.778.666,00	3,06%
26	8000988	$ 312.106.601,00	4,57%
32	8000979	$ 384.241.540,00	3,23%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	1,10%
27	8001052	$ 394.454.974,00	0,95%
12	8000849	$ 353.440.216,00	0,19%
8	8002417	$ 436.309.464,00	3,79%
9	8002500	$ 341.127.565,00	11,70%
