BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 17 de Agosto de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento #95 (61)

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Nury Albarracín Peña			X							Interventoría Consorcio SDV	sstkennedy@outlook.es	3123230618	
Laura Daniela Díaz			X							Interventoría Consorcio	dlaura0898@gmail.com	3168270491	
Lina Alejandra Borgo			X							Interventoría SCV	U2335dvinterventoriakennedy@outlook.com	3002136	
Rosalba Monguí			X						X	CONTRATISTA XIE S.A	xie.kennedy621.residente@gmail.com	3223141853	
Angie Milena Medina G			X						X	Contratista XIE S.A	xiesocial@outlook.com	3102504420	
Sandra Pinto			X						X	Contratista XIE. S.A	xie621sst@gmail.com	3208932056	
Manuel Alejandro Murcia Gómez			X						X	XIE S.A.	xie.director.proyecto621@gmail.com	3142984026	
Daniel Cruz			X						X	XIE SA.	tecnico.planing@gmail.com	3208965438	
Oscar Barros			X						X	XIE. S.A	oscar.vargas@xie.com.co	3102554971	
María Camila Perea Pena			X						X	XIE. S.A	xie.ambiental@gmail.com	3102457734	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK-Infraestructura	andres.llanes@gobiernobogota.gov.co	3053039773	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 17 de agosto de 2023 **Virtual:** ___ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ___

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento # 45

HORA DE INICIO: ___ **HORA DE FINALIZACIÓN:** 6:1

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK Infraestructura	Danilo.Meneses@gobiernobogota.gov.co	3[illegible]4	
Juan Manuel Alba R			X						X	Interventoria	garantia@lavitalidad.com	3107671842	
ARTURO ZARATE M.			X						X	INTERVENTORIA	[illegible]	[illegible]	
Ana Leonor Porras R			✓							Interventora	aleoporras@gmail.com	3212071499	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento No.45

Se da inicio a comité de seguimiento No.45, en las instalaciones de la Alcaldía local de Kennedy con la presencia del contratista de obra grupo 1 XIE S.A, interventoría y supervisión del FDLK.

Orden del día

Componentes

a. Componente Técnico

-Informes semanales julio: Sin radicar
-Informe Mensual 10(julio): Sin radicar
-Pre-Acta No.12 de recibo parcial No.10 (julio): En revisión
-Calificación semanal: 89%

b. Componente SST

-Informe semanal 45: Aprobado
-Informe Mensual 10 (julio): Observado
-Ingresos en la semana: 1 Ayudantes, 1 Oficiales
-Retiros en la semana: 1 BOAL
-Calificación semanal: 99,06%

c. Componente Ambiental

-Informe semanal 45: Aprobado
-Informe Mensual 10 (julio): Observado
-Calificación semanal: 99,06%

d. Componente Gestión Social

-Informe semanal 45: Aprobado
-Informe Mensual 10 (julio): Aprobado

-Calificación semanal:96% (Afectada por desinformación a la comunidad)

e. Componente de tránsito y transporte

Estado de PMT:

- ***Etapa 1:*** 22 CIVs
- ***Etapa 2:*** 10 CIVs
- ***Etapa 3***: 6 CIVs – 4 terminados
- ***Etapa 4:*** 0
- ***Sin solicitar:***0
- En solicitudes 2 etapa 2 y 5 etapa 4

La Interventoría índica que se han observado de manera reiterativa los informes semanales puesto que no se están adjuntado las respuestas a los oficios de la SDM, puesto que estos hacen parte de las PQRSD. El contratista a la fecha sigue sin responder los incumplimientos de los oficios y se deben dar respuesta de marea inmediata.

El contratista indica que se responderán en el transcurso de la semana.

En cuanto a la prórroga de diseños de señalización, el contratista cuenta con la prorroga aprobada para todos los CIV correspondientes. El FDLK solicita se remita la copia de esa aprobación.

a. Componente Técnico

La Interventoría informa que al corte del lunes 14 de agosto de 2023 el contratista conto con:

- 7 frentes de obra activos
- 27 CIV
- En la semana hizo la apertura del CIV 43 (se encuentra en actividades de excavación)

Principales actividades en la semana:

- ***Prioridades 26 y 27:*** cajas de inspección

- ***Prioridad 30:*** Instalación de concretos en espacio público
- ***Prioridad 28, 29 y 32***: Instalación de monoblock

**Se adjunta agenda con las actividades realizadas en la semana en obra de cada uno de los CIV*

- ***Calificación de la semana:*** 89%, afectada por senderos peatonales inexistentes o inadecuada instalación y trabajos sin COI aprobado en la prioridad 12.
  Se solicita al contratista implementar el PMT de acuerdo al COI aprobado o realizar un ajuste al mismo, para causar afectaciones a la calificación.

En cuanto a temas documentales la interventoría manifiesta que:

- ***Informes semanales:*** Sin radicar los de mes de julio y agosto
- ***Informe mensual y acta del mes de junio:*** aprobada y radicada al FDLK.
- ***Informe mensual y acta del mes de julio:*** en elaboración del contratista
- ***Pre-acta No.10 del mes de julio***: en revisión de la interventoría

De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que la pre-acta No.10 del mes de julio esta por un valor estimado de $400 millones de pesos. Se espera que se estabilice un flujo de caja a partir del mes de agosto. El FDLK y la interventoría indica que estas actas deben contar con las carteras topográficas para poder aprobar.

El FDLK indica que la cuenta No. 8 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 ya fue girada y la cuenta No.9 correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2023 se encuentra en revisión de despacho.

La Interventoría por otra parte, indica que se ha estado postergando la entrega de volúmenes teóricos, se solicitó realizar una evaluación del total por CIV de las cantidades y su estado, puesto que al revisar las cantidades se evidencia que hay diferencias.

El componente técnico de interventoría manifiesta que no ha podido realizar este listado, puesto que no ha tenido acompañamiento por parte del contratista, se recuerda que la medida debe ser conciliada por las dos partes. Es importante empezar a realizar estas actividades de manera inmediata, para dejar las cantidades al día, además el contratista tiene ventaja en que ha realizado topografía antes, durante y después de la ejecución de cada uno de los CIV.

El contratista manifiesta que a partir del viernes 18 de agosto empezar a chequear en campo esta actividad en compañía de la Interventoría.

En cuanto a NPs la interventoría indica que el viernes 18 de agosto de 2023, se estará remitiendo al contratista las instrucciones para la radicación de los NPs ajustados de acuerdo a la mesa de trabajo realizada. Se radicarán al FDLK por paquetes de acuerdo a lo aprobado, estos NPs tendrán acta de fijación a corte del 30 de julio de 2023. La Interventoría indica que de no tener objeción con lo presentado por el contratista se radicaran los NPs el martes 22 de agosto de 2023.

El FDLK indica que sigue pendiente el balance de contrato con respecto al monoblock cobrado en el mes de diciembre. La Interventoría indica que se tomará el valor teórico menos el valor instalado y el sado por el 70% dará como resultado el pago del acta de julio. Con respecto al valor de monoblock pagado, se evidenciará que habrá valores negativos, cuando ya se presente el acta del mes de agosto se tiene que presentar un saldo de 0 para nivelar el cobro.

b. Presupuesto y programación

La Interventoría indica que al corte de la semana 45 se cuenta con los siguientes avances:

- ***Avance semanal:*** 0.15%
- ***Programado:*** 87.51%
- ***Ejecutado acumulado:*** 33.66%
- ***Desviación:*** 56.85%

**Se adjunta agenda con los avances presentados en la semana.*

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	XIE S.A - SCLV	23-ago-23
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.	XIE S.A	23-ago-23
3	Actualización de cronograma de inspecciones CCTV	XIE S.A	23-ago-23

4	Cronograma general de actividades – No contractual	XIE S.A	23-ago-23
5	Respuesta a oficios de la SDM	XIE S.A	18-ago-23
6	Concepto de NPs	SCLV	22-ago-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 24 de agosto de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.45

Fecha: 17 de agosto de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	Contratista e interventoría	16-ago-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	16-ago-23	NO
3	Radicación de oficio solicitando limpieza de colector colmatado.	Contratista	16-ago-23	NO
4	Cronograma de pavimentación	Contratista	16-ago-23	NO
5	Actualización de cronograma de inspecciones CCTV	Contratista	16-ago-23	NO
6	Cronograma general de actividades – No contractual	Contratista	16-ago-23	NO
7	Revisión y concepto de NPs	Interventoría	16-ago-23	NO
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales julio:** Sin radicar				
- **Informe Mensual 10(julio):** Sin radicar				
- **Pre-Acta No.12 de recibo parcial No.10 (julio):** En revisión				
- **Calificación semanal: 89**%				
B. SST				
- **Informe semanal 45:** Aprobado				
- **Informe Mensual 10 (julio):** Observado				
- **Ingresos en la semana:** 1 Ayudante, 1 Oficial				
- **Retiros en la semana:** 1 BOAL				
- **Calificación semanal:** 99,06%				
C. Ambiental				
- **Informe semanal 45:** Aprobado				
- **Informe Mensual 10 (julio):** Observado				
- **Calificación semanal:** 99,06%				
D. Gestión Social				
- **Informe semanal 45:** Aprobado				
- **Informe Mensual 10 (julio):** Aprobado				
- **Calificación semanal:**96% (Afectada por desinformación a la comunidad)				

Obra


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** Se realiza demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock del K0+ 000 al K0+030 por ambos costados de calzada. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada**: Se realiza demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock del K0+ 000 al K0+032.40 por ambos costados de calzada. **Andén oriental:** Se realiza remates parciales en cajas de inspección del K0+ 000 al K0+032.40. **Andén occidental:** Se realiza remates parciales en cajas de inspección del K0+ 000 al K0+032.40.
28	8000929	**Calzada:** Se realiza demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock del K0+ 000 al K0+063.84 por ambos costados de calzada. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
29	8000996	**Calzada:** Se realiza instalación parcial monoblock referencia PD100 del K00+000 al K00+063. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
24	8000871	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental** Sin actividades.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
22	8000864	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
3	8000957	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
13	8000772	**Calzada:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad. .**Andén oriental:** Sin actividad.
14	8000814	**Calzada:** Se realiza instalación de cargue de pozo, instalación de tubería corrugada 12 pulgadas 4.1ML de pozo a sumidero, instalación de arena de peña para recubrimiento de tubería 0.63m3 **Andén oriental:** Sin actividad.


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
18	8000839	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza remates en cajas de inspección parcial del K00+000 al K00+060.
33	8001041	**Calzada:** Se inicia instalación de monoblock del K00+000 al K00+031 costado oriente de calzada. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza remates parciales en fachada parte inferior del K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza remates parciales en fachada parte inferior del K0+000 al K0+060.
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
12	8000849	**Calzada:** Se realiza instalación de solado 1500psi de base para sumideros 0.15m3, se inicia re nivelación de pozos. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de concreto MR41 para rampa acceso vehicular 4.82m2 del K0+000 al K00+061.4. **Andén occidental:** Sin actividad.
15	8000856	**Calzada:** Se realiza instalación de bordillo A-80 costado occidente 6.60ML del K0+063 al K00+056.4, costado oriente 7ML del K0+063 al K00+056, se realiza excavación manual para sumideros 3.67m3, **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con un asentamiento de 5 pulgadas 28.04m2 del K0+000 al K00+062, instalación de bordillo A-80 3.1ML del K0+000 al K00+062 **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de fresado segunda capa en anden 6.83m3 del K0+000 al K00+063, instalación de bordillo A-80 1.31ML del K0+000 al K00+062, realiza instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con un asentamiento de 4 pulgadas45.46m2 del K0+000 al K00+062.
16	8000907	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza excavación manual parcial 22.30m3 del K00+000 al K00+060, nivelación y compactación de sub-rasante parcial 55.95m2 del

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		K00+000 al K00+060, instalación parcial de geotextil 59.06 m2 del K00+000 al K00+060, instalación parcial de fresado 11.19 m3 del K00+000 al K00+060 **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de concreto 67.36 m2 del K00+000 al K00+060, excavación manual parcial 37.01 m3 del K00+000 al K00+060.
26	8000988	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con un asentamiento de 5.5 pulgadas 57.04m2 del K0+000 al K00+062 instalación parcial de bordillo A-80 8.12ML del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación parcial de fresado 8.72m3 del K00+000 al K00+060, instalación parcial de bordillo A-80 13.43ML del K00+000 al K00+060.
27	8001052	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza nivelación y compactación parcial de fresado del K00+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza instalación de fresado 9.55ML del K00+000 al K00+060, nivelación y compactación parcial de fresado del K00+000 al K00+060.
8	8002417	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
9	8002500	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
20	8000938	**Calzada:** Se realiza instalación de geotextil 120m2 del K00+000 al K00+030, se realiza instalación de geo-celda 120m2 del K00+000 al K00+030, se realiza instalación de fresado 121.6m3 del K00+000 al K00+030, nivelación y compactación de fresado en geo-celda del K00+000 al K00+030, se realiza instalación de base estabilizada 33m3 del K00+000 al K00+055. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
23	8000916	**Calzada:** Se realiza apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica 185m3 del K00+000 al K00+050, nivelación y compactación de sub-rasante 253m2 del K00+000 al K00+063.20, instalación de geotextil 221m2 del K00+08 al K00+063.20, instalación de geo-celda 221m2 del K00+08 al K00+063.20, instalación de fresado 39.8m3 del K00+08 al K00+063.20 **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
6	8000977	**Calzada:** Se realiza apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica 183m3 del K00+00 al K00+062.1, se realiza nivelación y compactación de sub-rasante 248m2 del K00+00 al K00+062.1, se realiza instalación de geo-celda 100m2 del K00+000 al K00+025, se realiza instalación de geotextil 100m2 del K00+000 al K00+025, se realiza instalación de fresado 18m3 del K00+000 al K00+025, **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

Estados de las obras en los CIV

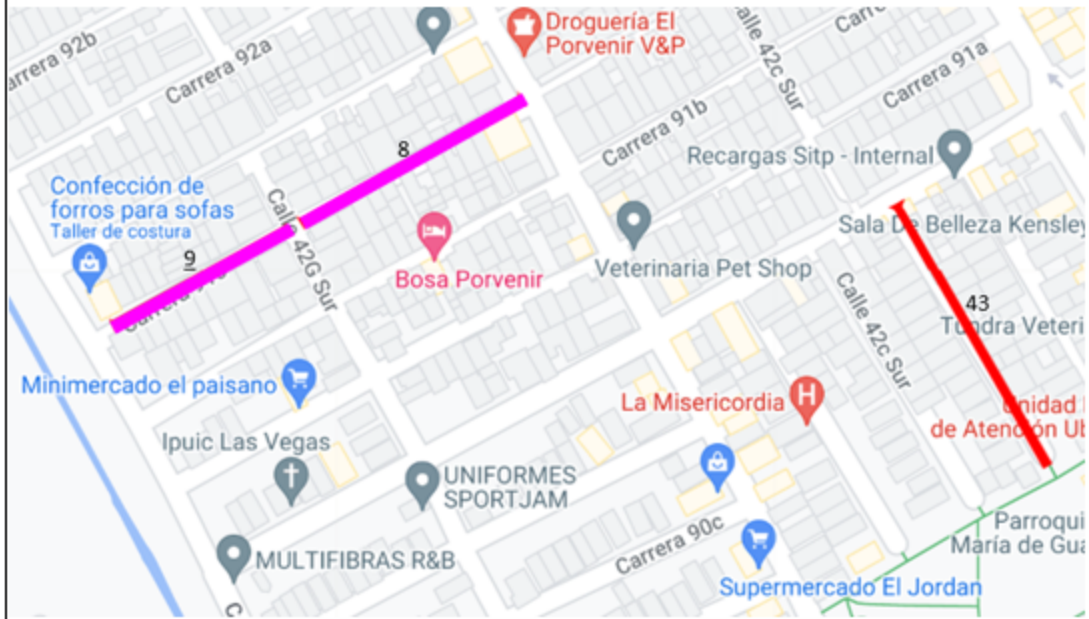

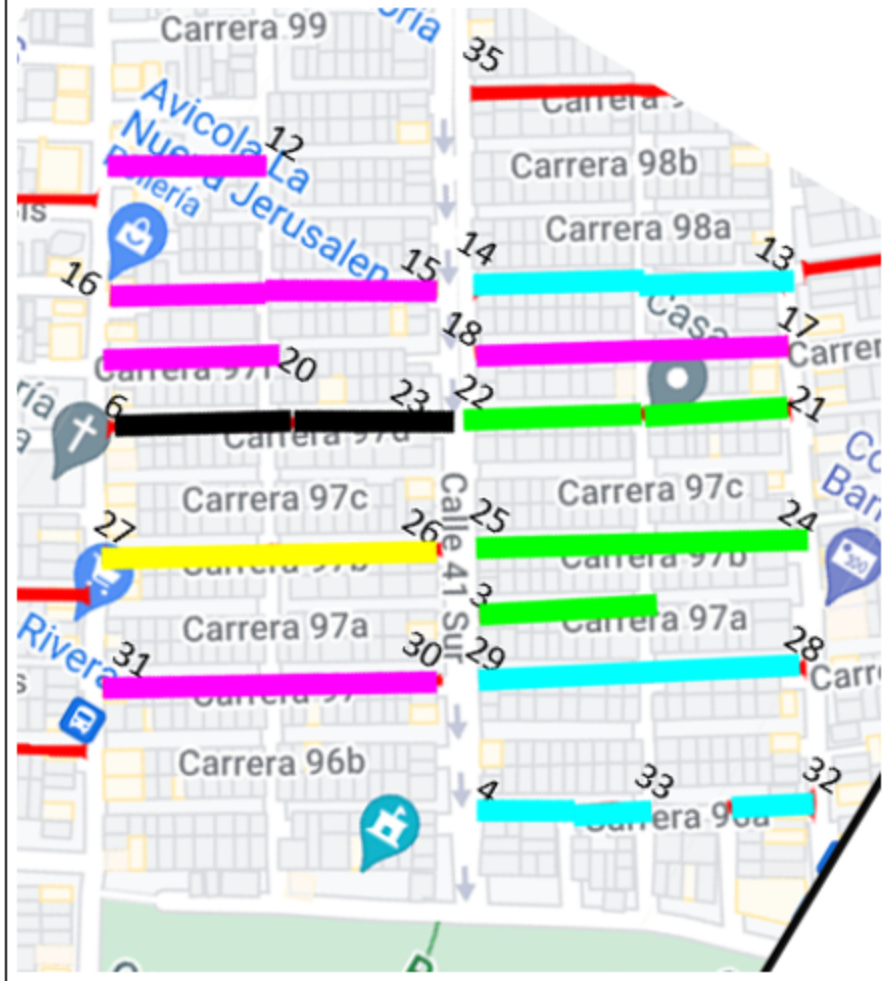


Nomenclatura	Cantidad
CIV Pavimentados	5
CIV Con Monoblock para pavimentar	7
CIV con estabilizado sin Monoblock	10
CIV En Excavación de vía	2
CIV con obras en andenes	2
Frente de obra sin inicio	17
Suma	**43**

Frentes de obra en la semana del 2 al 8 de agosto de 2023:


Frentes de obra: 7

CIV abiertos: 27



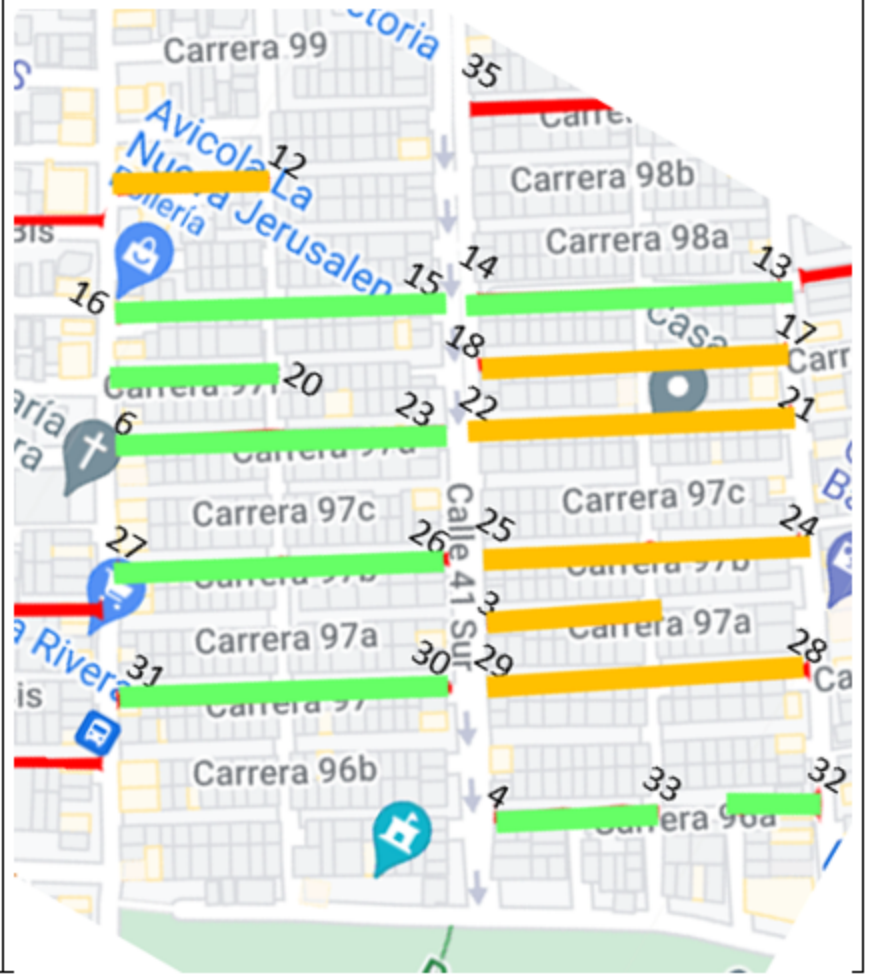

Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio

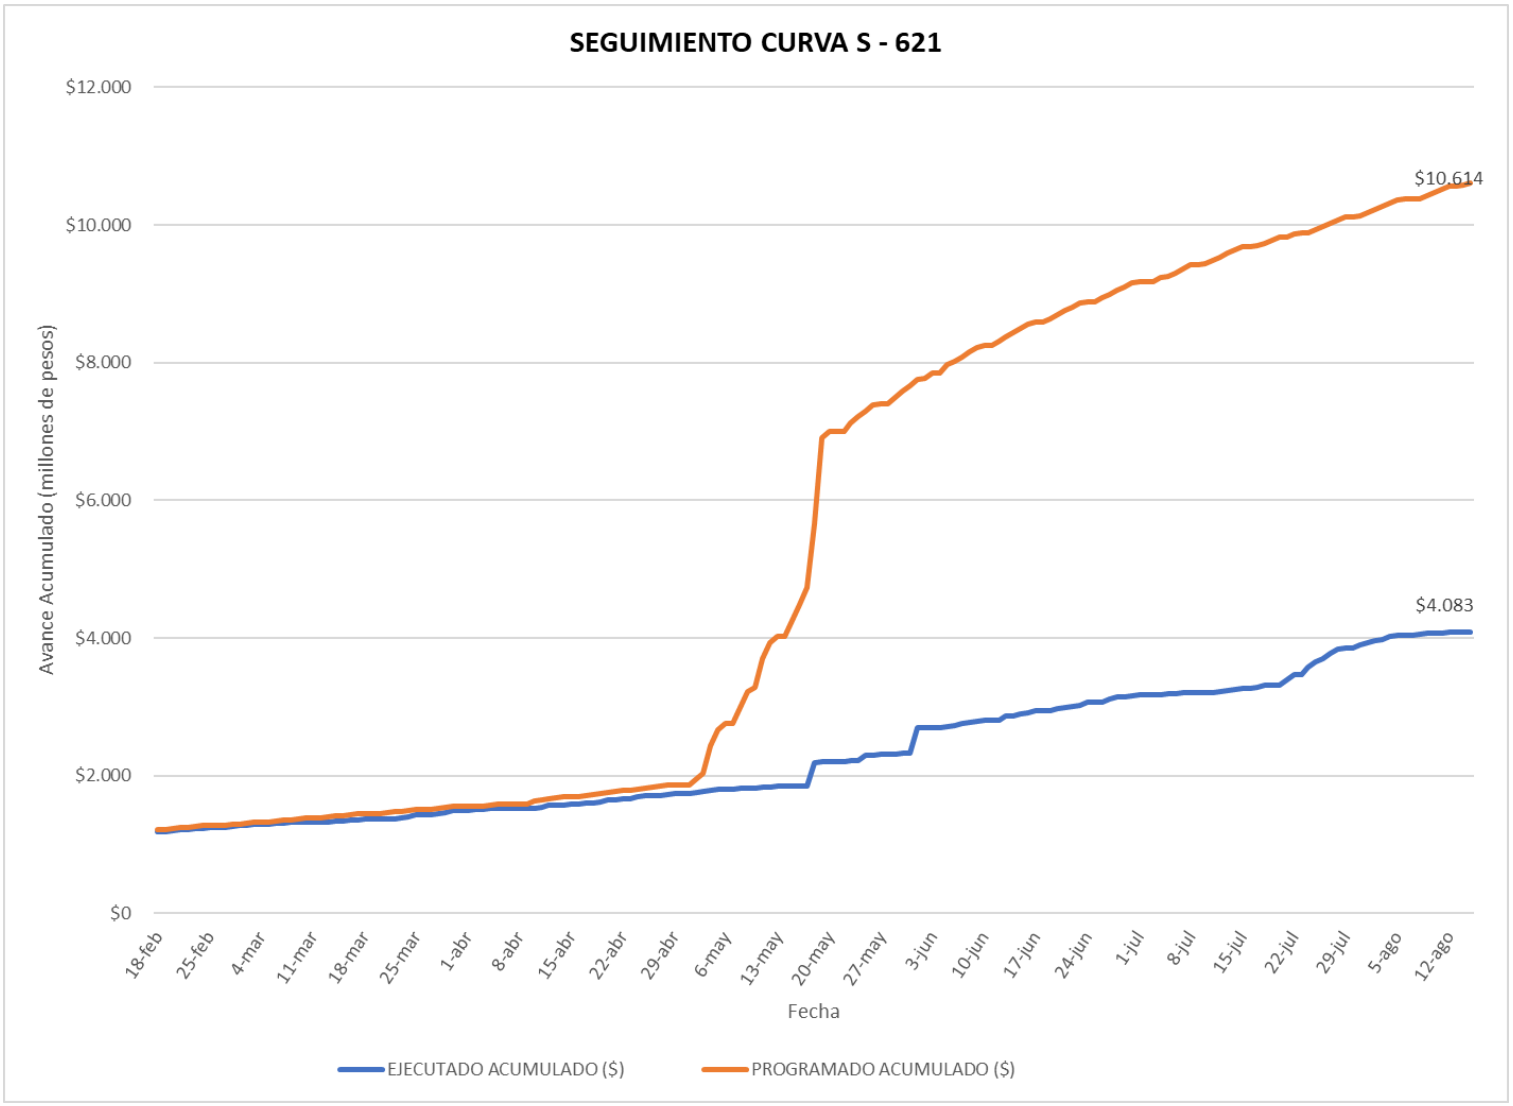


SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**10-ago**	**11-ago**	**12-ago**	**13-ago**	**14-ago**	**15-ago**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$10.470	$10.513	$10.556	$10.561	$10.571	$10.614
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	86,32%	86,68%	87,04%	87,08%	87,16%	87,51%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$4.072	$4.075	$4.081	$4.081	$4.083	$4.083
EJECUTADO ACUMULADO (%)	33,58%	33,59%	33,65%	33,65%	33,66%	33,66%
DESVIACIÓN ($)	$ 6.397	$ 6.438	$ 6.475	$ 6.480	$ 6.488	$ 6.532
DESVIACIÓN (%)	**-52,75%**	**-53,09%**	**-53,39%**	**-53,43%**	**-53,50%**	**-53,85%**

G1	15-ago-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	84,72%	87,51%	84,72%
% EJECUTADO	36,66%	33,66%	40,64%
% DESVIACIÓN	-48,05%	-53,85%	-44,08%

			SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 15-AGOSTO-2023					
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
28	8000929	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 245.857.650,18	2,03%	70,30%	-0,33%
29	8000996	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 230.017.742,59	1,90%	83,06%	-0,10%
24	8000871	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 285.639.032,93	2,36%	101,12%	0,13%
25	8000923	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 253.700.358,60	2,09%	63,64%	-0,76%
13	8000772	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 289.278.735,33	2,39%	96,84%	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 288.084.304,60	2,38%	67,21%	-1,04%
17	8000794	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 212.241.939,90	1,75%	58,06%	-0,77%
18	8000839	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 220.730.067,11	1,82%	49,62%	-1,60%
21	8000821	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 303.048.993,63	2,50%	76,54%	-0,63%
22	8000864	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 364.765.653,33	3,01%	76,80%	-0,35%
3	8000957	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 337.550.165,43	2,78%	97,29%	0,11%
33	8001041	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 111.414.226,25	0,92%	67,71%	-0,31%
4	8001069	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 99.191.898,48	0,82%	53,95%	-0,45%
16	8000907	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 34.395.903,89	0,28%	9,09%	-2,70%
15	8000856	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 91.415.625,95	0,75%	28,68%	-1,84%
26	8000988	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 130.283.923,81	1,07%	41,74%	-0,98%
32	8000979	$ 384.241.540,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 91.553.491,94	0,75%	23,83%	-0,50%
30	8001058	$ 167.606.525,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 131.948.964,49	1,09%	78,73%	-1,44%
31	8001125	$ 347.840.618,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 118.681.697,32	0,98%	34,12%	-1,45%
27	8001052	$ 394.454.974,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 65.775.586,11	0,54%	16,68%	-2,63%
12	8000849	$ 353.440.216,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 87.068.322,93	0,72%	24,63%	-2,72%
8	8002417	$ 436.309.464,00	$ 433.765.201,90	3,58%	$ 48.698.543,10	0,40%	11,16%	-3,17%
9	8002500	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 41.319.887,58	0,34%	12,11%	-2,39%
23	8000916	$ 389.375.082,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,81%
5	8000655	$ 464.716.467,00	$ 454.907.485,31	3,75%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,75%
40	8011953	$ 462.079.926,00	$ 395.184.593,00	3,26%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,26%
10	8011960	$ 492.144.459,00	$ 414.198.784,96	3,42%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,42%
35	8000743	$ 769.586.187,00	$ 48.133.071,08	0,40%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,40%
7	8000736	$ 492.144.459,00	$ 377.630.415,64	3,11%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,11%
2	8001595	$ 338.872.088,69	$ 141.472.214,97	1,17%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,17%
39	8000584	$ 443.145.176,00	$ 138.790.996,48	1,14%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,14%
6	8000977	$ 384.241.540,00	$ 313.656.771,99	2,59%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,59%
20	8000938	$ 394.454.974,00	$ 379.247.233,34	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
1	8000687	$ 461.620.649,00	$ 380.855.642,57	3,14%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,14%
TOTALES			**$ 10.614.188.195,66**	**87,51%**	**$ 4.082.662.715,48**	**33,66%**		**-53,85%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					

FECHA EVALUACIÓN			18-jul	25-jul	1-ago	8-ago	15-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	37,96%	54,33%	70,30%	70,30%	70,30%
29	8000996	$ 276.918.878,00	60,69%	61,86%	83,06%	83,06%	83,06%
24	8000871	$ 282.489.045,00	89,59%	100,78%	101,12%	101,12%	101,12%
25	8000923	$ 398.643.978,00	55,03%	63,64%	63,64%	63,64%	63,64%
13	8000772	$ 298.711.275,00	62,63%	89,76%	89,76%	96,84%	96,84%
14	8000814	$ 428.629.368,00	60,90%	60,90%	66,60%	67,11%	67,21%
17	8000794	$ 365.563.428,00	58,06%	58,06%	58,06%	58,06%	58,06%
18	8000839	$ 444.842.291,00	49,62%	49,62%	49,62%	49,62%	49,62%
21	8000821	$ 395.944.862,00	58,49%	68,37%	76,54%	76,54%	76,54%
22	8000864	$ 474.960.513,00	69,89%	76,45%	76,80%	76,80%	76,80%
3	8000957	$ 346.941.971,00	87,98%	97,29%	97,29%	97,29%	97,29%
33	8001041	$ 164.541.658,00	67,71%	67,71%	67,71%	67,71%	67,71%
4	8001069	$ 183.856.740,00	40,74%	40,74%	53,95%	53,95%	53,95%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,68%	7,68%	7,80%	8,02%	9,09%
15	8000856	$ 318.778.666,00	18,37%	19,44%	21,71%	24,77%	28,68%
26	8000988	$ 312.106.601,00	26,55%	30,16%	34,04%	38,62%	41,74%
32	8000979	$ 384.241.540,00	17,44%	17,44%	20,60%	23,83%	23,83%
30	8001058	$ 167.606.525,00	78,73%	78,73%	78,73%	78,73%	78,73%
31	8001125	$ 347.840.618,00	32,13%	32,70%	33,02%	34,12%	34,12%
27	8001052	$ 394.454.974,00	13,04%	13,13%	15,58%	16,53%	16,68%
12	8000849	$ 353.440.216,00	19,37%	23,96%	24,21%	24,40%	24,63%
8	8002417	$ 436.309.464,00	0,00%	0,00%	7,37%	11,16%	11,16%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%	0,00%	0,18%	12,11%	12,11%

FECHA EVALUACIÓN			15-ago
P	**CV**	**VALOR TOTAL CIV**	**%AVANCE DEL CIV**
28	8000929	$ 349.737.154,00	0,00%
29	8000996	$ 276.918.878,00	0,00%
24	8000871	$ 282.489.045,00	0,00%
25	8000923	$ 398.643.978,00	0,00%
13	8000772	$ 298.711.275,00	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	0,10%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	0,00%
21	8000821	$ 395.944.862,00	0,00%
22	8000864	$ 474.960.513,00	0,00%
3	8000957	$ 346.941.971,00	0,00%
33	8001041	$ 164.541.658,00	0,00%
4	8001069	$ 183.856.740,00	0,00%
16	8000907	$ 378.482.383,00	1,06%
15	8000856	$ 318.778.666,00	3,91%
26	8000988	$ 312.106.601,00	3,12%
32	8000979	$ 384.241.540,00	0,00%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	0,00%
27	8001052	$ 394.454.974,00	0,15%
12	8000849	$ 353.440.216,00	0,23%
8	8002417	$ 436.309.464,00	0,00%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%

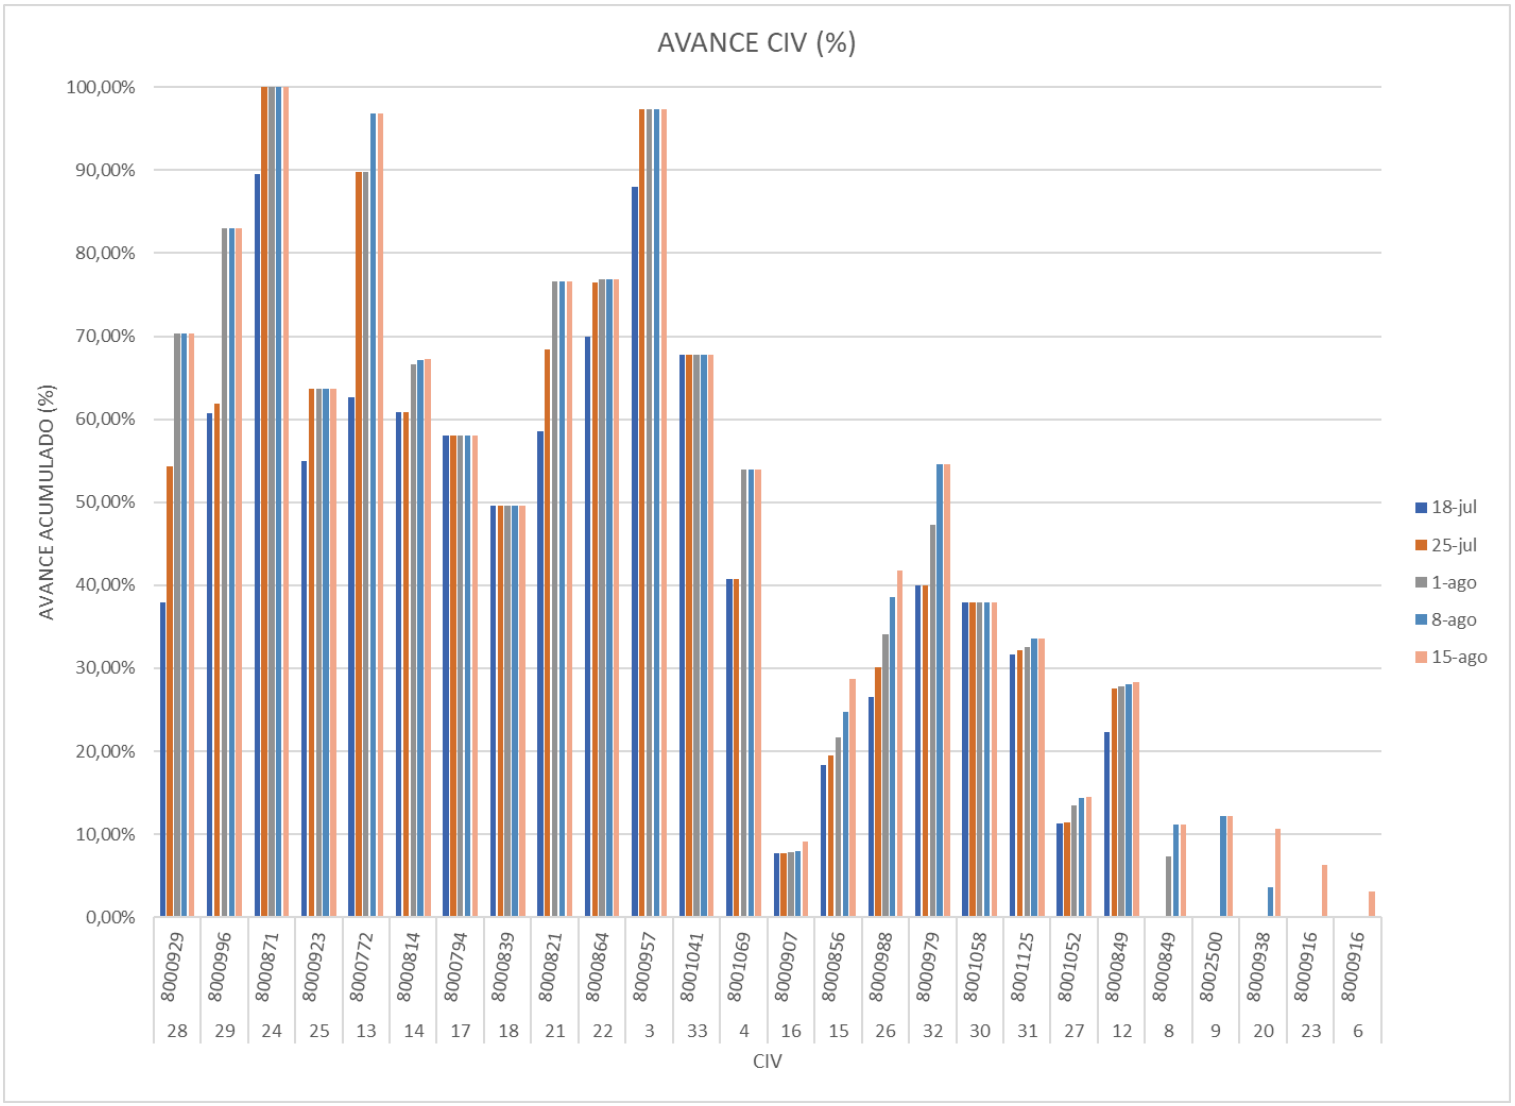
AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
18-jul
25-jul
1-ago
8-ago
15-ago
8000929 8000996 8000871 8000923 8000772 8000814 8000794 8000839 8000821 8000864 8000957 8001041 8001069 8000907 8000856 8000988 8000979 8001058 8001125 8001052 8000849 8000849 8002500 8000938 8000916 8000916
28 29 24 25 13 14 17 18 21 22 3 33 4 16 15 26 32 30 31 27 12 8 9 20 23 6
CIV
