BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 31 de agosto de 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X ____ **(En caso de ser presencial):** Alcaldía local de Kennedy

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No.47 – CIN-717-22 /COP 621-22 Grupo 1

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Manuel Alejandro Mazabuel García									x	Contratista – XIE S.A	xie.directorproyecto.621@gmail.com	321 2149476	
Oscar Vargas Galindo									x	Contratista – XIE S.A	oscardavid53@hotmail.com	310 2239581	
Oswaldo Ladino Chávez			x							Interventoría - SCLV	dir-viales@silcarsa.com.co	310 3178077	
Juan Manuel Alba Rojas			x							Interventoría - SCLV	juan.alba@lavialidad.com	310 3178077	
Andrés Mauricio Llanos			x							Supervisión - FDLK	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	305 7039773	
Danilo Meneses Toro			x							Supervisión - FDLK	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	311 8988034	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Comité de seguimiento No.47

Se da inicio al Comité de seguimiento No.46, en las instalaciones de la Alcaldía local de Kennedy con la presencia del contratista de obra grupo 1 XIE S.A, interventoría y supervisión del FDLK.

Orden del día

A 35 días de acabar el contrato, interventoría realiza un balance del estado de las obras.

La Interventoría menciona que al contratista de obra no se ha suministro monoblock.

El contratista menciona que el 2, 4 y 5 de septiembre de 2023 realizará la instalación de caucho y rodadura en las prioridades 28, 29, 32, 33, 13, 14 y 4.

Por otra parte, la Interventoría solicita al contratista de obra establecer las cuadrillas de trabajo para trabajos de cierre como remates y arreglos.

En cuanto a los Ítems no previstos NPs, el contratista de obra informa que el día de hoy se radica la atención a observaciones. La Interventoría informa que se emitirá concepto el 4 de septiembre de 2023.

La Interventoría informa que el lunes 4 de septiembre de 2023. a las 14 horas se realizará una mesa de trabajo con el contratista de obra para la revisión de la programación.

**Se adjunta agenda con los avances presentados en la semana.*

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Mesa de trabajo revisión de programación	XIE S.A - SCLV	4-sep-23
2	Atención observaciones de NPs	XIE S.A	4-sep-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 7 de septiembre de 2023 Lugar de la próxima reunión: NA

reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra XIE S.A – COP -621-22 Grupo 1

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.47

Fecha: 31 de agosto de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha.	Contratista e interventoría	30-ago-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G1-515-23 Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.	Contratista	30-ago-23	NO
3	Actualización de cronograma de inspecciones CCTV	Contratista	30-ago-23	NO
4	Cronograma general de actividades – No contractual	Contratista	23-ago-23	NO
5	Respuesta a oficios de la SDM	Contratista	24-ago-23	NO
6	Mesa de trabajo – Revisión de NPs	Interventoría Contratista	22-ago-23	SI
7	Mesa de trabajo - Programación	Interventoría Contratista	22-ago-23	SI
8	Mesa de trabajo especialista de especio público y urbanismo	Interventoría Contratista	25-ago-23	NO
9	Entrega de PAC ajustado	Contratista	Sujeto a radicación de la programación	
10	Ajuste al Plan de inspección de ensayos	Interventoría Contratista	Por definir	

2. Componentes
A. Técnico
- **Informes semanales 41, 42 y 43:** Observados
- **Informes semanales 39 y 40:** Aprobados
- **Informes semanales 44 al 47:** sin presentar
- **Informe Mensual 10(julio):** Sin radicar
- **Pre-Acta No.12 de recibo parcial No.10 (julio):** el contratista se encuentra atendiendo observaciones.
- **Calificación semanal:** 65% *Calificación afecta por no implementación correcta del PMT*
B. SST
- **Informe semanal 47:** Aprobado
- **Informe Mensual 10 (julio):** En revisión de interventoría.

- **Accidentes:** 1
- **Ingresos en la semana:** 6 ayudantes
- **Retiros en la semana:** 1 boal y 1 topógrafo
- **Ausentismo:** 0.74%
- **Calificación semanal:** 100%
- **Calificación mes de agosto:** 98.39%
C. Ambiental
- **Informe semanal 47:** Aprobado
- **Informe Mensual 10 (julio):** Aprobado
- **Calificación semanal:** 100%
- **Calificación mes de agosto:** 98.39%
D. Gestión Social
- **Informe semanal 47:** Aprobado
- **Informe Mensual 10 (julio):** Aprobado
- **PQRSD:** El contratista se encuentra en cierre de 6 PQRSD
- **Calificación semanal:** 100%
- **Calificación mes de agosto:** 100%
Obra

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
4	8001069	**Calzada:** Se realiza demolición y nivelación de estabilizado del K0+ 000 al K0+30. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividades.
32	8000979	**Calzada**: Se realiza demolición y nivelación de estabilizado del K0+ 000 al K0+032.40. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
28	8000929	**Calzada:** Se realiza instalación de base estabilizada 8,30m3 del K0+ 000 al K0+009. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
29	8000996	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
24	8000871	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental** Sin actividades.
25	8000923	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
21	8000821	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
22	8000864	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental**: Se realiza corte de concreto para dilatación de concreto K0+ 000 al K0+060.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Se realiza corte de concreto para dilatación de concreto del K0+ 000 al K0+060.
3	8000957	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
13	8000772	**Calzada:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad. .**Andén oriental:** Sin actividad.
14	8000814	**Calzada:** Se realiza instalación de bordillo A-80 17ML. **Andén oriental:** Se realiza retiro de adoquín 24.8m2 y reinstalación del mismo 24.8m2, nivelación con arena de peña 1.24m3, arena de sello 0.50m3, concreto de 3000psi (cintas) 8ML **Andén occidental:** Sin actividad.
17	8000794	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
18	8000839	**Calzada:** Se realiza instalación de monoblock de PD200 costado oriente 18ML del K0+ 010 al K0+034, costado occidente 20ML del K0+ 035 al K0+055. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
33	8001041	**Calzada:** Se realiza demolición y nivelación de estabilizado del K0+ 000 al K0+32. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
31	8001058	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
30	8001125	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
12	8000849	**Calzada:** Se realiza instalación de sumidero, se realiza excavación de sumidero a pozo costado occidente de calzada 1.14m3, costado oriente de calzada 1.15m3, se realiza instalación de solado 1500psi base de sumidero costado occidente 00.7m3, costado oriente 0.07m3, instalación de tubería de 12 pulgadas costado occidente 4.4ML, costado oriente 3.9ML instalación de arena de peña como recubrimiento de tubería 12 pulgadas costado occidente 0.88m3, costado oriente 0.88m3, nivelación de pozo 0.7ML. **Andén oriental:** Sin actividad.


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		Andén occidental: Sin actividad.
15	8000856	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza acabados e instalación de tapas parciales en cajas de inspección K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza acabados e instalación de tapas parciales en cajas de inspección del K0+000 al K0+060.
16	8000907	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza instalación parcial de fresado segunda capa 10.46m3del K0+000 al K0+060, acabados parciales en cajas de inspección K0+000 al K0+060. **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de cajas de inspección 1.62m3 y construcción de las mismas cajas de inspección 6unidades del K0+000 al K00+060.
26	8000988	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza acabados parciales en cajas de inspección del K0+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza acabados parciales en cajas de inspección del K0+000 al K00+060.
27	8001052	**Calzada:** Se realiza instalación de bordillo A-80 costado oriente 26ML del K0+000 al K00+026, costado occidente 26ML del K0+000 al K00+026. **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto 3000psi con un asentamiento 5 pulgadas 32.62m3 del K0+000 al K00+060, instalación parcial de fresado segunda capa 9.74m3 del K0+000 al K00+060, instalación de bordillo A-80 predio 42-23sur 3.10ML. **Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto 3000psi con un asentamiento 5 pulgadas 53.74m3 del K0+000 al K00+060, instalación de concreto 4000psi con un asentamiento 5 pulgadas 12.31m3 del K0+000 al K00+060, instalación parcial de fresado segunda capa 10.03m3 del K0+000 al K00+060, instalación de bordillo A-80 predio 42-14sur 3.47ML.
8	8002417	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición en concreto espesor 10cm 60.53m2 del K0+000 al K00+060, excavación manual 36m3 del K0+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza demolición en concreto espesor 10cm 51,12m2 del K0+000 al


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la Semana
		K00+060, excavación manual 47.12m3 del K0+000 al K00+060.
9	8002500	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
20	8000938	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición parcial de concreto espesor 10cm 54.53m2 del K0+000 al K00+060, excavación parcial manual 48.30m3 del K0+000 al K00+060. **Andén occidental:** Se realiza demolición parcial de concreto espesor 10cm 50.93m2 del K0+000 al K00+060, excavación parcial manual 45.08m3 del K0+000 al K00+060, se realiza nivelación y compactación de sub-rasante 108.34m2 del K0+000 al K00+060
23	8000916	**Calzada:** Se realiza instalación de fresado estabilizado 33.12m3 del K0+008 al K00+063.2, instalación de solado 1500psi base de sumideros 0.14m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad
6	8000977	**Calzada:** Se realiza instalación de solado 1500psi base de sumideros 0.14m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
43	8002595	**Calzada:** Se realiza excavación en calzada 5.94m3 del K0+000 al K0+003. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
37	8011994	**Calzada:** Se realiza apertura de prioridad, se inicia excavación mecánica 207m3 del K0+000 al K00+055, se realiza retiro de material 270m3, replanteo de 255m2 del K0+000 al K00+077.20, se realiza sub-teranización de agua potable costado occidente 6unidades del K0+000 al K00+077.20. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
38	8011973	**Calzada:** Se realiza apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica 73.92m3 del K0+000 al K0+035, retiro de material de excavación 120m3. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.

Frentes de obra en la semana del 23 al 29 de agosto de 2023:

Frentes de obra: 7


CIV abiertos: 29

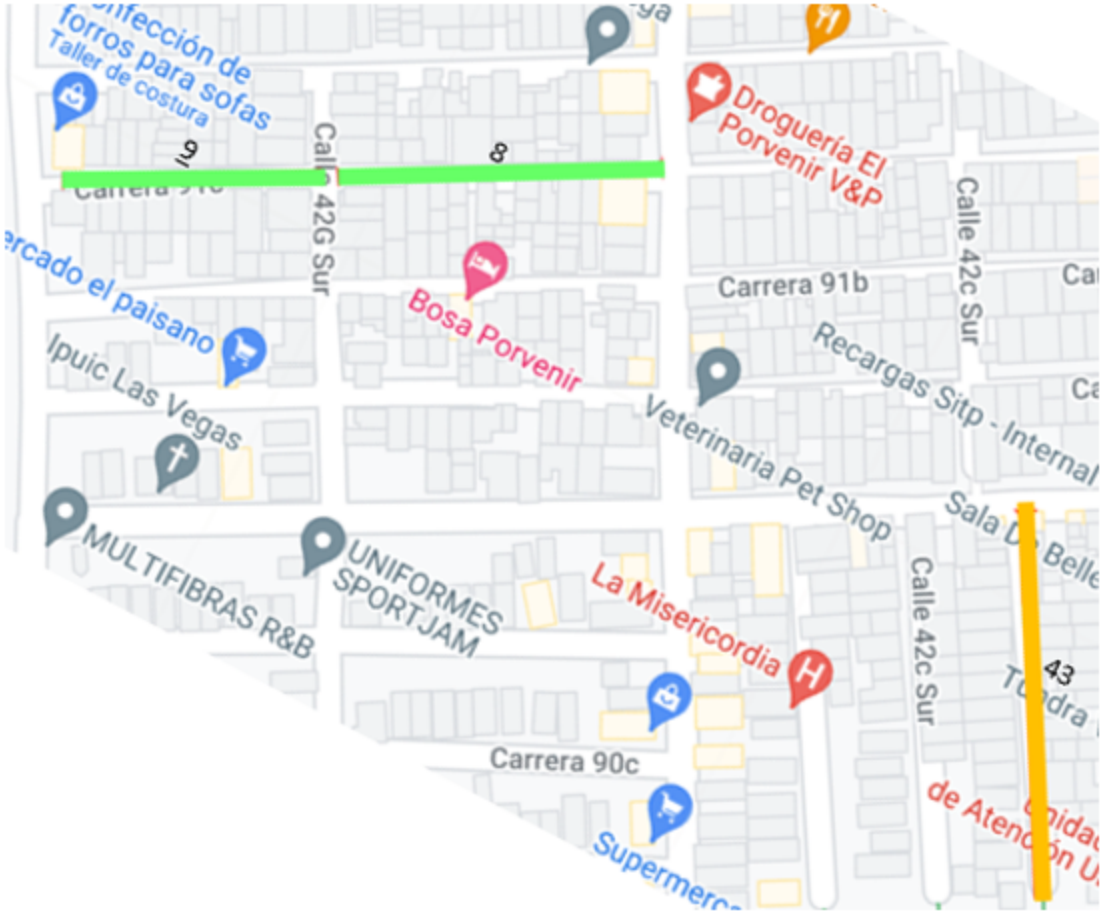

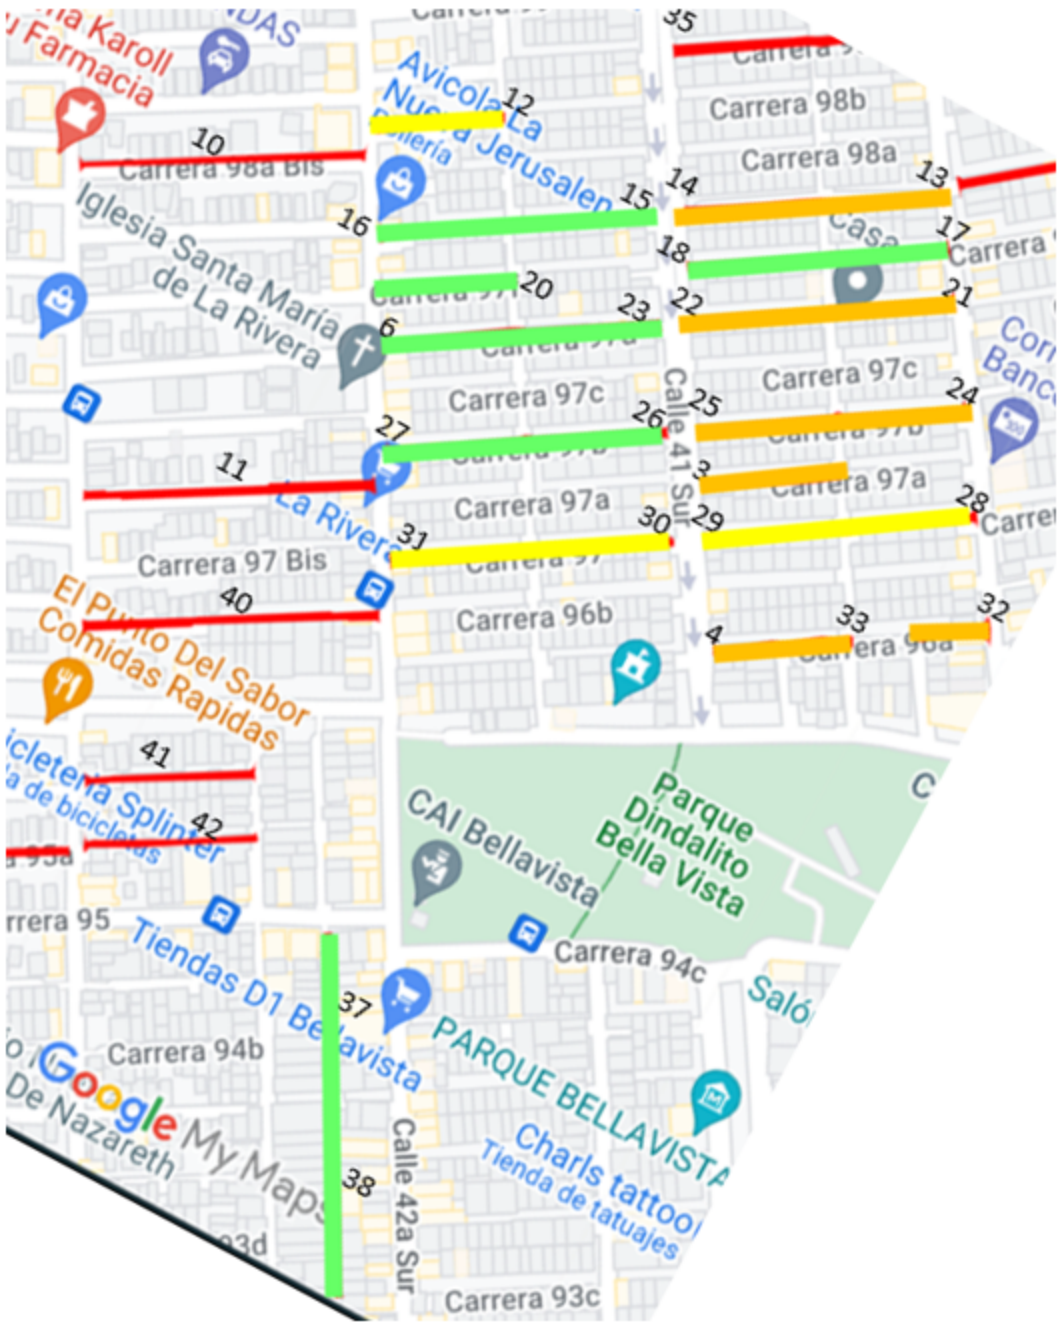


Nomenclatura	
	Frente de obra Activo
	Frente de obra Intermitente
	Frente de obra Inactivo
	Frente de obra sin inicio


Estados de las obras en los CIV

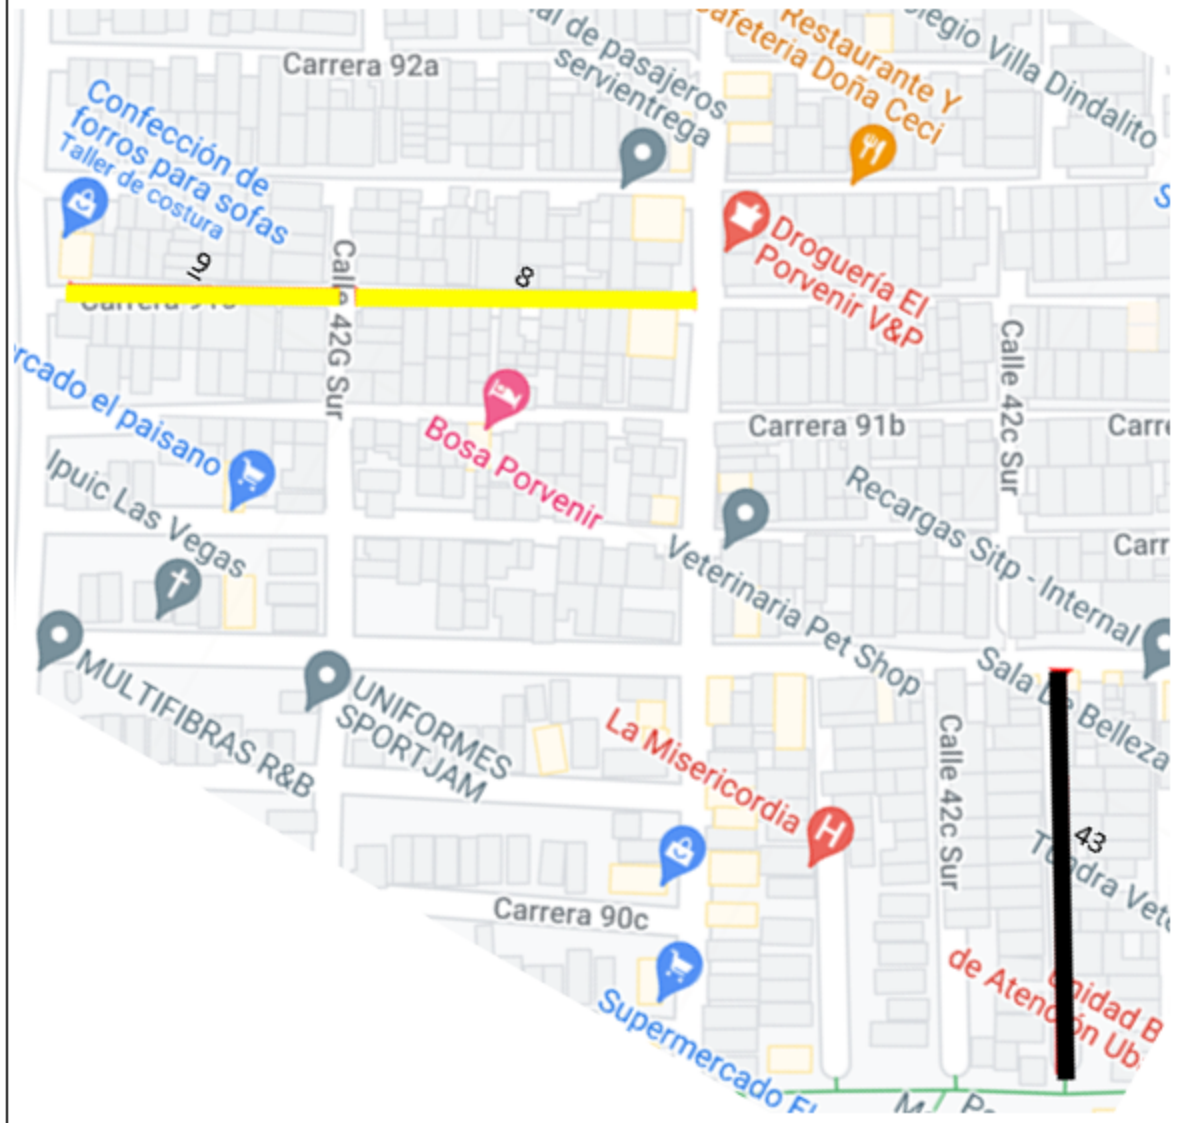



Nomenclatura		Cantidad
	CIV Pavimentados	5
	CIV Con Monoblock para pavimentar	8
	CIV con estabilizado sin Monoblock	9
	CIV En Excavación de vía	3
	CIV con obras en andenes	4
	Frente de obra sin inicio	14
	Suma	**43**

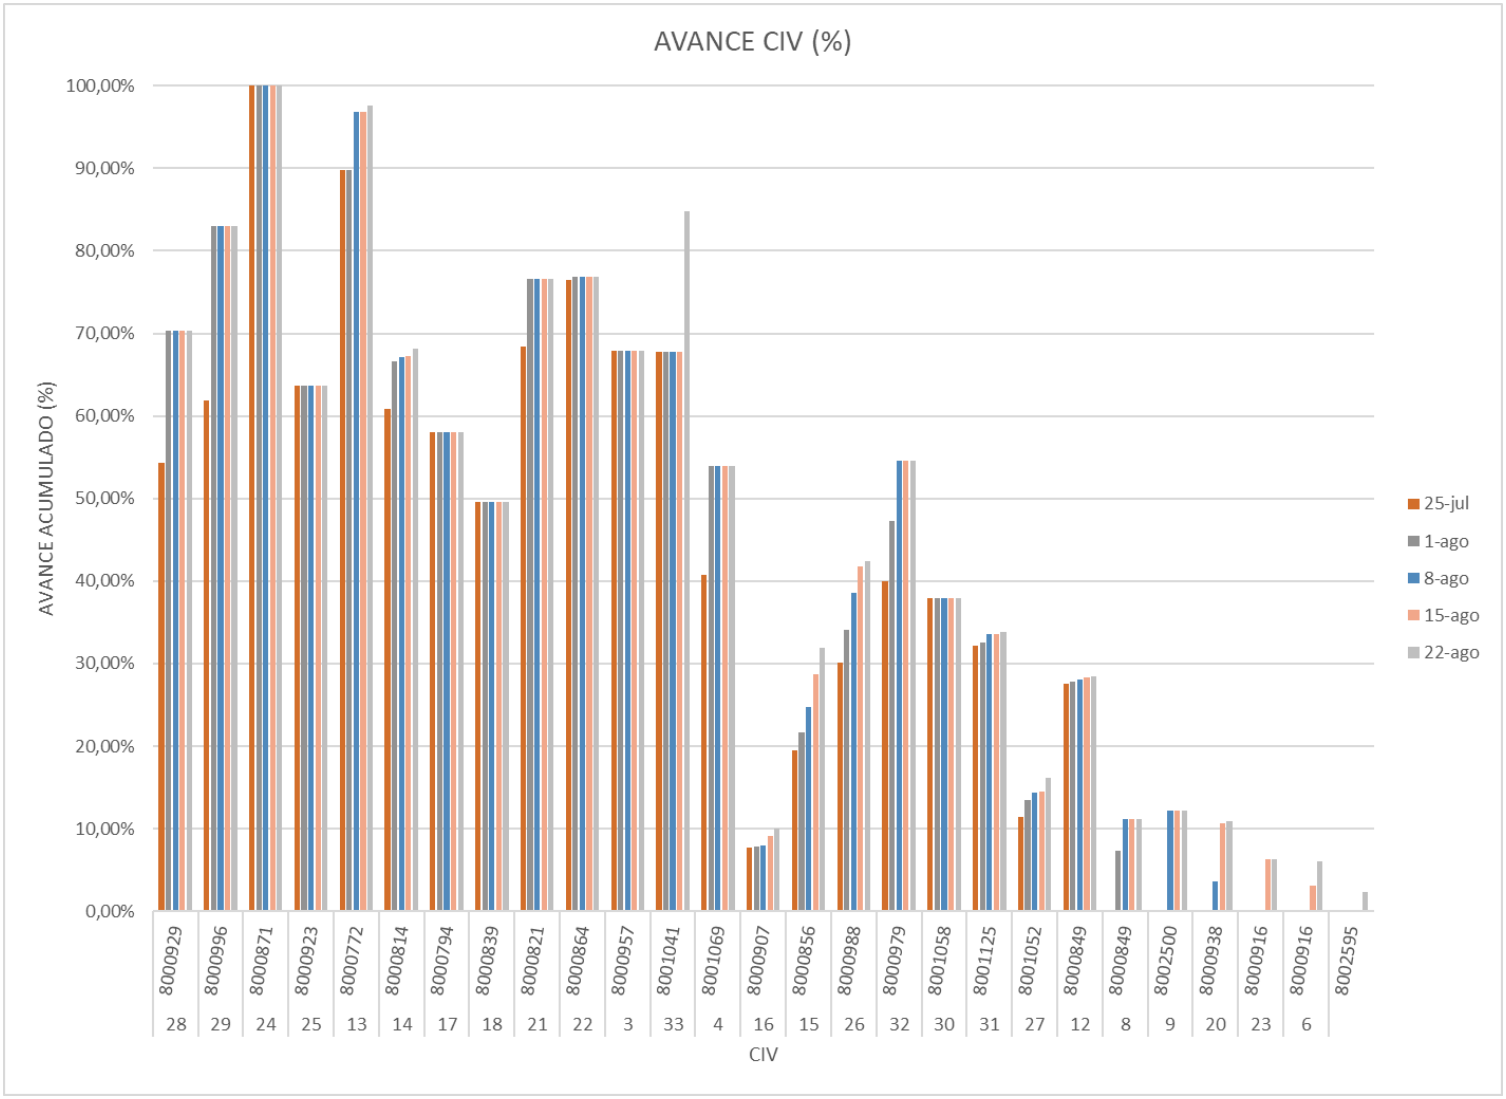
AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
25-jul
1-ago
8-ago
15-ago
22-ago
8000929 8000996 8000871 8000923 8000772 8000814 8000794 8000839 8000821 8000864 8000957 8001041 8001069 8000907 8000856 8000988 8000979 8001058 8001125 8001052 8000849 8000849 8002500 8000938 8000916 8000916 8002595
28 29 24 25 13 14 17 18 21 22 3 33 4 16 15 26 32 30 31 27 12 8 9 20 23 6
CIV

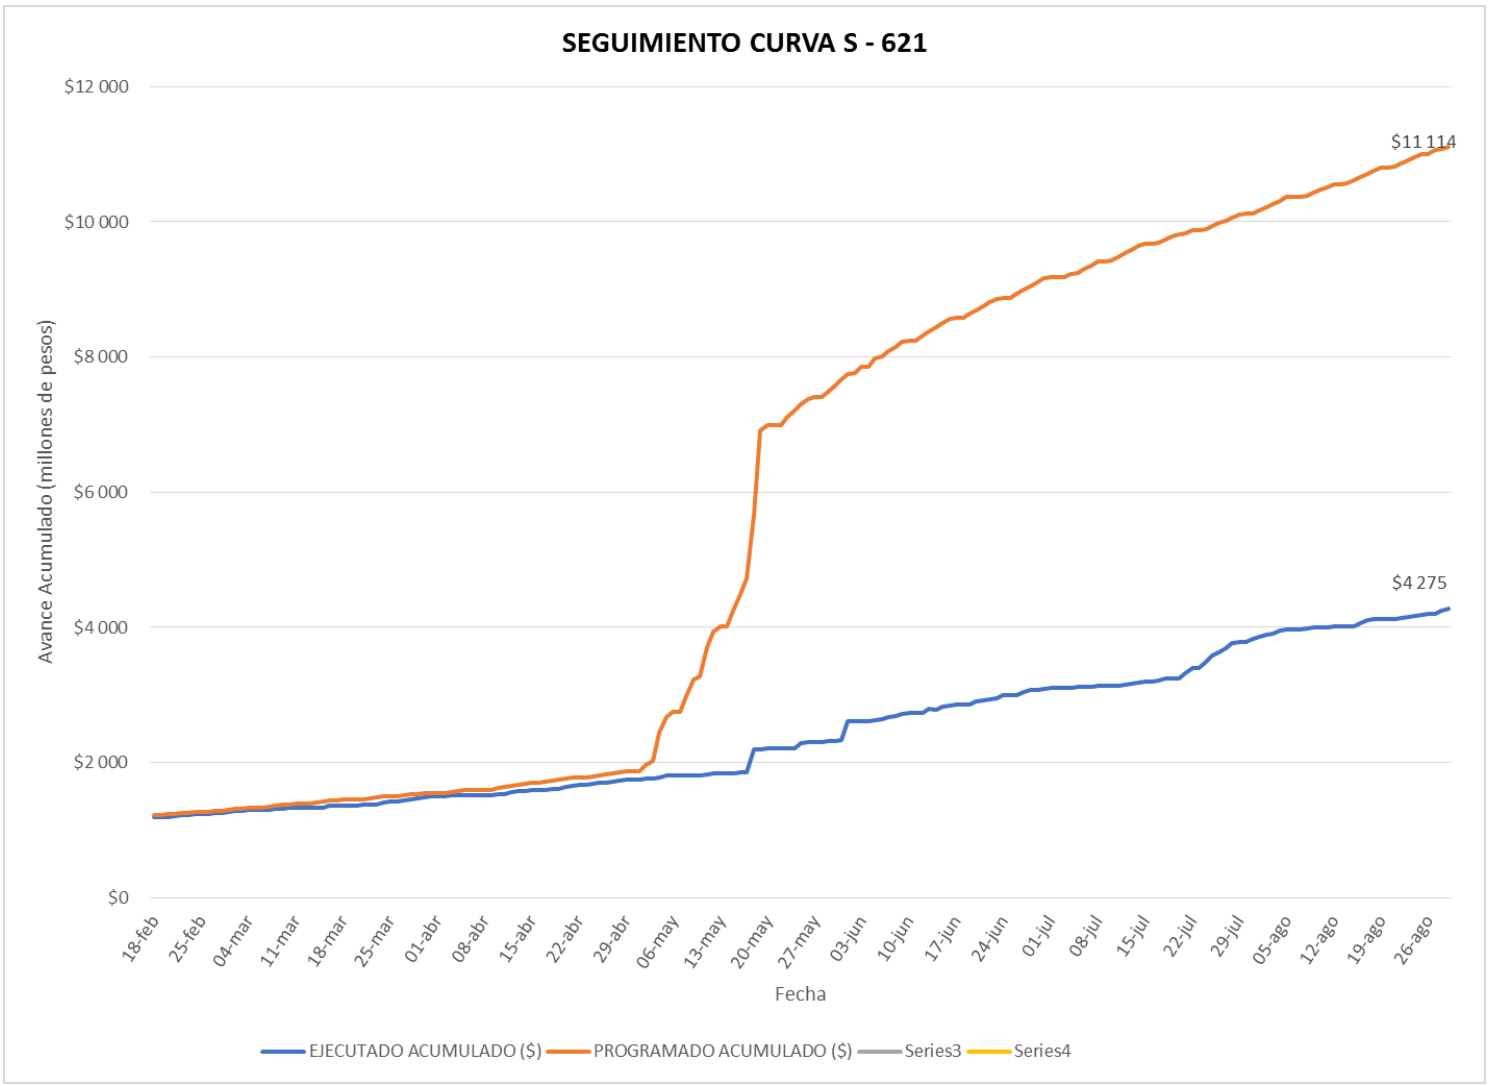

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**24-ago**	**25-ago**	**26-ago**	**27-ago**	**28-ago**	**29-ago**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$10 960	$11 008	$11 008	$11 061	$11 072	$11 114
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	90.36%	90.76%	90.76%	91.20%	91.29%	91.64%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$4 168	$4 184	$4 195	$4 195	$4 250	$4 275
EJECUTADO ACUMULADO (%)	34.36%	34.50%	34.59%	34.59%	35.04%	35.25%
DESVIACIÓN ($)	$ 6 792	$ 6 824	$ 6 813	$ 6 866	$ 6 822	$ 6 839
DESVIACIÓN (%)	**-56.00%**	**-56.26%**	**-56.17%**	**-56.61%**	**-56.25%**	**-56.39%**

G1	29-ago-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	89.03%	91.64%	89.03%
% EJECUTADO	38.25%	35.25%	40.64%
% DESVIACIÓN	-50.78%	-56.39%	-48.40%

			SEGUIMIENTO GRUPO 1 AL 29-AGOSTO-2023					
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
28	8000929	$ 349 737 154.00	$ 286 285 298.00	2.36%	$ 249 571 510.06	2.06%	71.36%	-0.30%
29	8000996	$ 276 918 878.00	$ 242 229 956.95	2.00%	$ 230 017 742.59	1.90%	83.06%	-0.10%
24	8000871	$ 282 489 045.00	$ 269 517 473.15	2.22%	$ 316 914 989.22	2.61%	112.19%	0.39%
25	8000923	$ 398 643 978.00	$ 345 626 779.89	2.85%	$ 253 760 698.60	2.09%	63.66%	-0.76%
13	8000772	$ 298 711 275.00	$ 289 860 253.15	2.39%	$ 291 457 831.48	2.40%	97.57%	0.01%
14	8000814	$ 428 629 368.00	$ 414 590 745.60	3.42%	$ 292 114 610.01	2.41%	68.15%	-1.01%
17	8000794	$ 365 563 428.00	$ 305 729 990.38	2.52%	$ 212 241 939.90	1.75%	58.06%	-0.77%
18	8000839	$ 444 842 291.00	$ 414 390 409.14	3.42%	$ 267 203 740.71	2.20%	60.07%	-1.21%
21	8000821	$ 395 944 862.00	$ 379 185 734.00	3.13%	$ 303 048 993.63	2.50%	76.54%	-0.63%
22	8000864	$ 474 960 513.00	$ 407 701 220.24	3.36%	$ 364 765 653.33	3.01%	76.80%	-0.35%
3	8000957	$ 346 941 971.00	$ 324 515 767.59	2.68%	$ 235 659 349.31	1.94%	67.92%	-0.73%
33	8001041	$ 164 541 658.00	$ 148 920 206.67	1.23%	$ 139 543 065.25	1.15%	84.81%	-0.08%
4	8001069	$ 183 856 740.00	$ 154 073 695.45	1.27%	$ 99 191 898.48	0.82%	53.95%	-0.45%
16	8000907	$ 378 482 383.00	$ 361 864 228.92	2.98%	$ 45 139 844.65	0.37%	11.93%	-2.61%
15	8000856	$ 318 778 666.00	$ 314 966 117.90	2.60%	$ 101 721 942.96	0.84%	31.91%	-1.76%
26	8000988	$ 312 106 601.00	$ 248 815 938.04	2.05%	$ 132 284 837.60	1.09%	42.38%	-0.96%
32	8000979	$ 384 241 540.00	$ 151 794 191.30	1.25%	$ 91 553 491.94	0.75%	23.83%	-0.50%
30	8001058	$ 167 606 525.00	$ 307 025 458.10	2.53%	$ 131 948 964.49	1.09%	78.73%	-1.44%
31	8001125	$ 347 840 618.00	$ 295 012 954.84	2.43%	$ 119 578 549.57	0.99%	34.38%	-1.45%
27	8001052	$ 394 454 974.00	$ 384 495 380.79	3.17%	$ 96 112 900.63	0.79%	24.37%	-2.38%
12	8000849	$ 353 440 216.00	$ 417 435 434.91	3.44%	$ 89 809 802.86	0.74%	25.41%	-2.70%
8	8000849	$ 436 309 464.00	$ 0.00	0.00%	$ 52 577 779.36	0.43%	12.05%	0.43%
9	8002500	$ 341 127 565.00	$ 331 158 979.28	2.73%	$ 41 319 887.58	0.34%	12.11%	-2.39%
20	8000938	$ 389 375 082.00	$ 379 247 233.34	3.13%	$ 57 722 627.10	0.48%	14.82%	-2.65%
23	8000916	$ 464 716 467.00	$ 341 149 570.13	2.81%	$ 14 944 272.69	0.12%	3.22%	-2.69%
6	8000916	$ 462 079 926.00	$ 313 656 771.99	2.59%	$ 24 366 339.32	0.20%	5.27%	-2.39%
37	8011974	$ 769 586 187.00	$ 111 867 896.23	0.92%	$ 10 746 302.73	0.09%	1.40%	-0.83%
38	8011973	$ 404 402 566.00	$ 449 488 730.61	3.71%	$ 894 310.52	0.01%	0.22%	-3.70%
2	8001595	$ 338 872 088.69	$ 201 968 128.72	1.67%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.67%
39	8000584	$ 443 145 176.00	$ 211 007 449.94	1.74%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.74%
1	8000687	$ 461 620 649.00	$ 442 058 339.95	3.64%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.64%
10	8011960	$ 725 200 480.00	$ 482 228 012.26	3.98%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.98%
34	8000709	$ 220 339 032.00	$ 43 418 981.91	0.36%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.36%
5	8000655	$ 463 799 391.00	$ 454 907 485.31	3.75%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.75%
40	8011953	$ 768 669 110.00	$ 454 416 007.41	3.75%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.75%
7	8000736	$ 491 684 934.00	$ 433 765 201.90	3.58%			0.00%	-3.58%
TOTALES			**$ 11 114 376 023.99**	**91.64%**	**$ 4 275 295 327.94**	**35.25%**		**-56.39%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12 128 504 795.27**					

FECHA EVALUACIÓN			01-ago	08-ago	15-ago	22-ago	29-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349 737 154.00	70.30%	70.30%	70.30%	70.30%	71.36%
29	8000996	$ 276 918 878.00	83.06%	83.06%	83.06%	83.06%	83.06%
24	8000871	$ 282 489 045.00	112.19%	112.19%	112.19%	112.19%	112.19%
25	8000923	$ 398 643 978.00	63.66%	63.66%	63.66%	63.66%	63.66%
13	8000772	$ 298 711 275.00	89.76%	96.84%	96.84%	97.57%	97.57%
14	8000814	$ 428 629 368.00	66.60%	67.11%	67.21%	68.14%	68.15%
17	8000794	$ 365 563 428.00	58.06%	58.06%	58.06%	58.06%	58.06%
18	8000839	$ 444 842 291.00	49.62%	49.62%	49.62%	49.62%	60.07%
21	8000821	$ 395 944 862.00	76.54%	76.54%	76.54%	76.54%	76.54%
22	8000864	$ 474 960 513.00	76.80%	76.80%	76.80%	76.80%	76.80%
3	8000957	$ 346 941 971.00	67.92%	67.92%	67.92%	67.92%	67.92%
33	8001041	$ 164 541 658.00	67.71%	67.71%	67.71%	84.81%	84.81%
4	8001069	$ 183 856 740.00	53.95%	53.95%	53.95%	53.95%	53.95%
16	8000907	$ 378 482 383.00	7.80%	8.02%	9.09%	10.01%	11.93%
15	8000856	$ 318 778 666.00	21.71%	24.77%	28.68%	31.91%	31.91%
26	8000988	$ 312 106 601.00	34.04%	38.62%	41.74%	42.38%	42.38%
32	8000979	$ 384 241 540.00	20.60%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%
30	8001058	$ 167 606 525.00	78.73%	78.73%	78.73%	78.73%	78.73%
31	8001125	$ 347 840 618.00	33.02%	34.12%	34.12%	34.38%	34.38%
27	8001052	$ 394 454 974.00	15.58%	16.53%	16.68%	18.67%	24.37%
12	8000849	$ 353 440 216.00	24.21%	24.40%	24.63%	24.79%	25.41%
8	8000849	$ 436 309 464.00	7.37%	11.16%	11.16%	11.16%	12.05%
9	8002500	$ 341 127 565.00	0.18%	12.11%	12.11%	12.11%	12.11%
20	8000938	$ 389 375 082.00	0.00%	0.00%	0.00%	11.05%	14.82%
23	8000916	$ 464 716 467.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.22%
6	8000916	$ 462 079 926.00	0.00%	0.00%	0.00%	2.35%	5.27%
43	8002595	$ 492 144 459.00	0.00%	0.00%	0.00%	1.85%	1.85%
37	8011974	$ 769 586 187.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%
38	8011973	$ 404 402 566.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%

FECHA EVALUACIÓN			29-ago
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349 737 154.00	1.06%
29	8000996	$ 276 918 878.00	0.00%
24	8000871	$ 282 489 045.00	0.00%
25	8000923	$ 398 643 978.00	0.00%
13	8000772	$ 298 711 275.00	0.00%
14	8000814	$ 428 629 368.00	0.01%
17	8000794	$ 365 563 428.00	0.00%
18	8000839	$ 444 842 291.00	10.45%
21	8000821	$ 395 944 862.00	0.00%
22	8000864	$ 474 960 513.00	0.00%
3	8000957	$ 346 941 971.00	0.00%
33	8001041	$ 164 541 658.00	0.00%
4	8001069	$ 183 856 740.00	0.00%
16	8000907	$ 378 482 383.00	1.92%
15	8000856	$ 318 778 666.00	0.00%
26	8000988	$ 312 106 601.00	0.00%
32	8000979	$ 384 241 540.00	0.00%
30	8001058	$ 167 606 525.00	0.00%
31	8001125	$ 347 840 618.00	0.00%
27	8001052	$ 394 454 974.00	5.69%
12	8000849	$ 353 440 216.00	0.62%
8	8000849	$ 436 309 464.00	0.89%
9	8002500	$ 341 127 565.00	0.00%
20	8000938	$ 389 375 082.00	3.77%
23	8000916	$ 464 716 467.00	3.22%
6	8000916	$ 462 079 926.00	2.92%
43	8002595	$ 492 144 459.00	0.00%
37	8011974	$ 769 586 187.00	1.40%
38	8011973	$ 404 402 566.00	0.22%
