


Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
0	**0**	**FLK-621-2022-GRUPO1-CSG-20230426**	**$ 11.365.438.175,59**	**$ 8.570.976.512,64**	**57,91%**	**43,67%**
1	**1**	**CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.**	***$ 11.365.438.175,59***	***$ 8.570.976.512,64***	***57,91%***	***43,67%***
2	**1.1**	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3	**1.2**	**FASE DE PRELIMINARES**	**$ 215.764.555,00**	**$ 215.764.555,00**	**100,00%**	**100,00%**
4	**1.2.1**	**INICIO DE LOS PRELIMINARES**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5	**1.2.2**	**Actividades despues inicio de contrato**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
6	**1.2.2.1**	**Entrega documentos preliminares de interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
7	**1.2.2.2**	**Aprobación de documentos preliminares de interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
8	**1.2.3**	**RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION**	**$ 215.764.555,00**	**$ 215.764.555,00**	**100,00%**	**100,00%**
9	**1.2.3.1**	**TOPOGRAFIA**	**$ 43.152.912,00**	**$ 43.152.912,00**	**100,00%**	**100,00%**
10	1.2.3.1.1	Elaboración del Informe de revisión, verificación y análisis de información topográfica 50% CIVs	$ 8.630.583,00	$ 8.630.583,00	100,00%	100,00%
11	1.2.3.1.2	Levantamiento de información para verificación del diseño geometrico (incluye ubicación y verificación de GPS) 50% de los CIVS	$ 8.630.583,00	$ 8.630.583,00	100,00%	100,00%
12	1.2.3.1.3	Materialización del abscisado 50% de los CIVS	$ 4.315.290,00	$ 4.315.290,00	100,00%	100,00%
13	**1.2.3.1.4**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
14	1.2.3.1.5	Levantamiento de información para verificación del diseño geometrico (incluye ubicación y verificación de GPS) 100% de los CIVS	$ 8.630.582,00	$ 8.630.582,00	100,00%	100,00%
15	1.2.3.1.6	Materialización del abscisado 100% de los CIVS	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
16	1.2.3.1.7	Elaboración del Informe de revisión, verificación y análisis de información topográfica saldo al 100% CIVs	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
17	**1.2.3.1.8**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y dseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
18	**1.2.3.2**	**ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**	**$ 21.576.456,00**	**$ 21.576.456,00**	**100,00%**	**100,00%**
19	1.2.3.2.1	Metodología para el estudio de transito	$ 10.788.228,00	$ 10.788.228,00	100,00%	100,00%
20	**1.2.3.2.2**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
21	**1.2.3.2.3**	**Aprobación interventoría y radicacion a SDM de los primeros CIVS**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
22	**1.2.3.2.4**	**Aprobacion SDM de los primeros CIVs de intervención**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
23	1.2.3.2.5	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información de transito 50% CIVS	$ 5.394.114,00	$ 5.394.114,00	100,00%	100,00%
24	**1.2.3.2.6**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
25	1.2.3.2.7	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información de transito saldo al 100% CIVs	$ 5.394.114,00	$ 5.394.114,00	100,00%	100,00%
26	**1.2.3.2.8**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
27	**1.2.3.3**	**GEOTECNIA Y PAVIMENTOS**	**$ 43.152.910,00**	**$ 43.152.910,00**	**100,00%**	**100,00%**
28	1.2.3.3.1	Exploración del subsuelo Priorización 50% CIVS	$ 12.945.873,00	$ 12.945.873,00	100,00%	100,00%
29	1.2.3.3.2	Elaboración de Informe de investigación y recopilación de información pavimentos del 50% de los CIVs	$ 8.630.582,00	$ 8.630.582,00	100,00%	100,00%
30	**1.2.3.3.3**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
31	1.2.3.3.4	Exploración del subsuelo Priorización hasta el 100% CIVS	$ 12.945.873,00	$ 12.945.873,00	100,00%	100,00%
32	1.2.3.3.5	Elaboración del informe de Analisis de los resultados de los ensayos de laboratorio y propuesta de alternativas de diseño del 100% de los CIVS	$ 8.630.582,00	$ 8.630.582,00	100,00%	100,00%
33	**1.2.3.3.6**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
34	**1.2.3.4**	**DISEÑO GEOMETRICO**	**$ 21.576.456,00**	**$ 21.576.456,00**	**100,00%**	**100,00%**
35	1.2.3.4.1	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información del 50% de CIVS	$ 10.788.228,00	$ 10.788.228,00	100,00%	100,00%
36	**1.2.3.4.2**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
37	1.2.3.4.3	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información del saldo al 100% de CIVS	$ 10.788.228,00	$ 10.788.228,00	100,00%	100,00%
38	**1.2.3.4.4**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
39	**1.2.3.5**	**DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO**	**$ 12.945.873,00**	**$ 12.945.873,00**	**100,00%**	**100,00%**
40	**1.2.3.5.1**	**Notificación a entidades de servicios publicos**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**

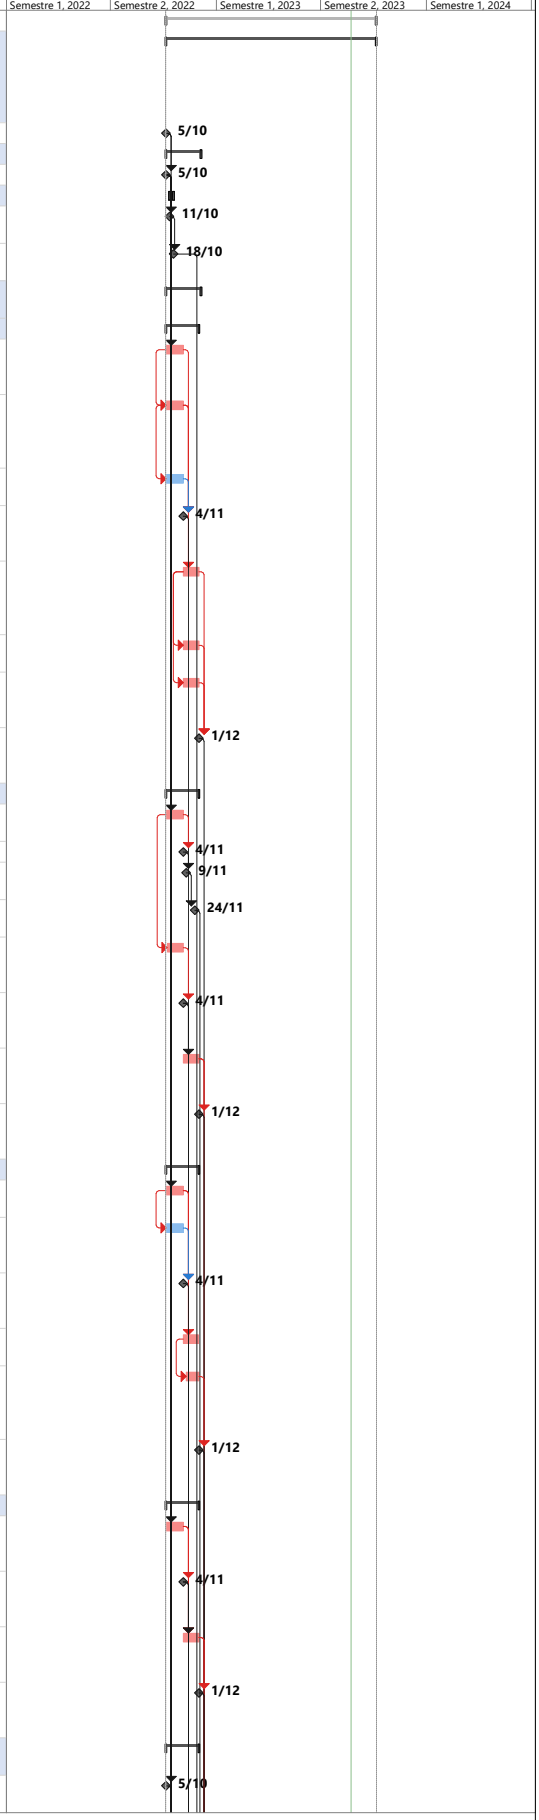


Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
41	1.2.3.5.2	Elaboración del informe de Recopilación y análisis de informacion existente del 50% de los CIVS	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
42	**1.2.3.5.3**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
43	1.2.3.5.4	Elaboración del informe de Recopilación y análisis de informacion del saldo al 100% de los CIVS	$ 6.472.936,00	$ 6.472.936,00	100,00%	100,00%
44	**1.2.3.5.5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**1.2.3.6**	**DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, Y OTROS OPERADORES**	**$ 12.945.873,00**	**$ 12.945.873,00**	**100,00%**	**100,00%**
46	**1.2.3.6.1**	**Notificación a entidades de servicios publicos**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
47	1.2.3.6.2	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	$ 6.472.936,00	$ 6.472.936,00	100,00%	100,00%
48	**1.2.3.6.3**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
49	1.2.3.6.4	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
50	**1.2.3.6.5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
51	**1.2.3.7**	**URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO**	**$ 12.945.873,00**	**$ 12.945.873,00**	**100,00%**	**100,00%**
52	1.2.3.7.1	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	$ 6.472.936,00	$ 6.472.936,00	100,00%	100,00%
53	**1.2.3.7.2**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
54	1.2.3.7.3	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
55	**1.2.3.7.4**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
56	**1.2.3.8**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES**	**$ 8.630.582,00**	**$ 8.630.582,00**	**100,00%**	**100,00%**
57	1.2.3.8.1	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	$ 4.315.291,00	$ 4.315.291,00	100,00%	100,00%
58	**1.2.3.8.2**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
59	1.2.3.8.3	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	$ 4.315.291,00	$ 4.315.291,00	100,00%	100,00%
60	**1.2.3.8.4**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
61	**1.2.3.9**	**ESTUDIOS FORESTALES**	**$ 12.945.874,00**	**$ 12.945.874,00**	**100,00%**	**100,00%**
62	1.2.3.9.1	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
63	**1.2.3.9.2**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
64	1.2.3.9.3	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
65	**1.2.3.9.4**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
66	**1.2.3.10**	**ESTUDIOS SOCIALES**	**$ 12.945.874,00**	**$ 12.945.874,00**	**100,00%**	**100,00%**
67	1.2.3.10.1	Plan de Gestion social, Plan de dialogo ciudadano, comunicación estrategica con la propuesta metodologica y cronograma	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
68	**1.2.3.10.2**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
69	**1.2.3.10.3**	**Aprobacion de interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
70	1.2.3.10.4	Elaboración de Actas de Vecindad (Programa de Acompañamiento Técnico)	$ 6.472.937,00	$ 6.472.937,00	100,00%	100,00%
71	**1.2.3.10.5**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
72	**1.2.3.11**	**ESTUDIOS AMBIENTALES Y SST**	**$ 12.945.872,00**	**$ 12.945.872,00**	**100,00%**	**100,00%**
73	**1.2.3.11.1**	**ENTREGA DE INFORMACION SST**	**$ 6.472.936,00**	**$ 6.472.936,00**	**100,00%**	**100,00%**
74	1.2.3.11.1.1	Elaboración de formatos y organización de Hojas de vida	$ 1.294.587,00	$ 1.294.587,00	100,00%	100,00%
75	**1.2.3.11.1.2**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
76	**1.2.3.11.1.3**	**Aprobacion de interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
77	1.2.3.11.1.4	Documentos de ingreso (contrato laboral, con sus respectivos soportes)	$ 1.294.587,00	$ 1.294.587,00	100,00%	100,00%
78	**1.2.3.11.1.5**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
79	**1.2.3.11.1.6**	**Aprobacion de interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
80	1.2.3.11.1.7	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y cronograma	$ 3.883.762,00	$ 3.883.762,00	100,00%	100,00%
81	**1.2.3.11.1.8**	**Aprobacion de interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
82	**1.2.3.11.2**	**ESTUDIOS AMBIENTALES**	**$ 6.472.936,00**	**$ 6.472.936,00**	**100,00%**	**100,00%**
83	1.2.3.11.2.1	Elaboración del MAO	$ 2.589.175,00	$ 2.589.175,00	100,00%	100,00%
84	**1.2.3.11.2.2**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
85	1.2.3.11.2.3	Elaboración Plan de Gestión de RCD de obras	$ 1.294.587,00	$ 1.294.587,00	100,00%	100,00%

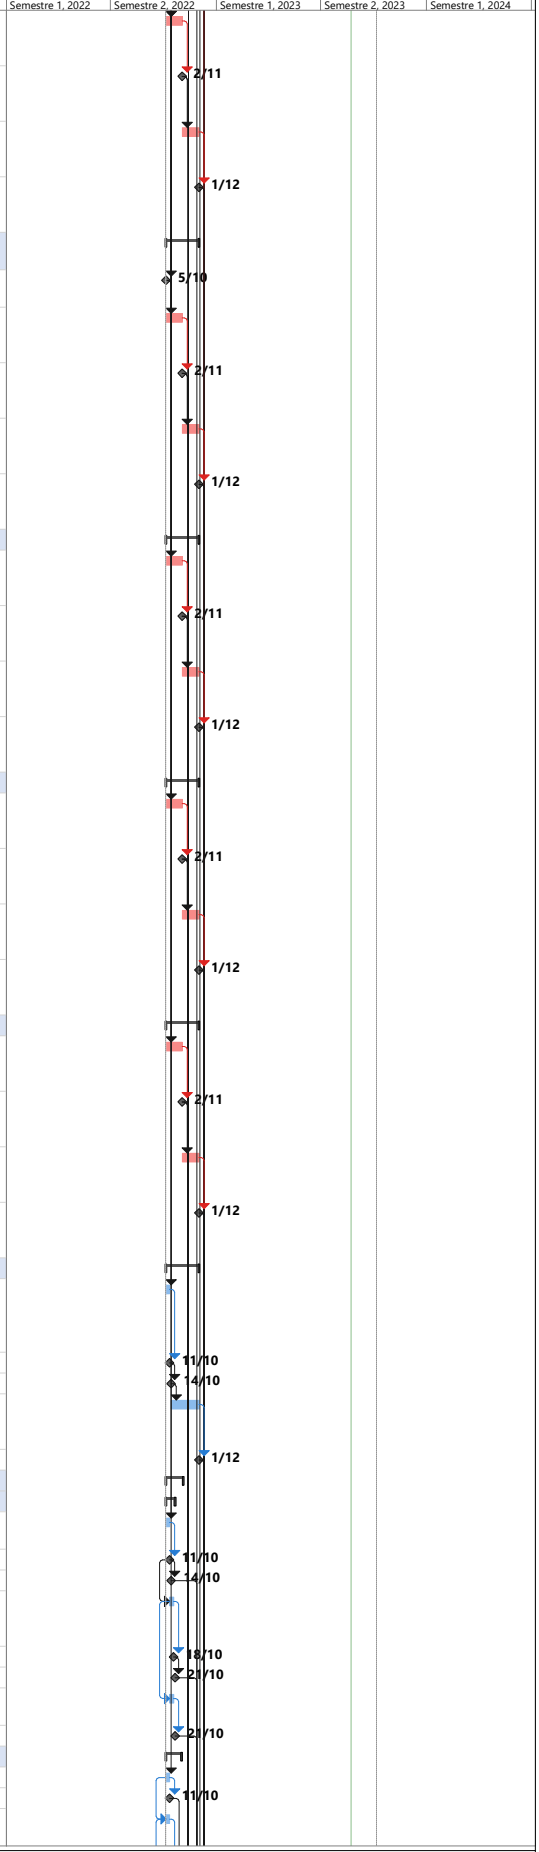


Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
86	**1.2.3.11.2.4**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
87	1.2.3.11.2.5	Elaboración de listado de Permisos Ambientales (según lo indicado en el MAO)	$ 1.294.587,00	$ 1.294.587,00	100,00%	100,00%
88	**1.2.3.11.2.6**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
89	**1.2.3.11.2.7**	**Capacitación en orden y aseo**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
90	1.2.3.11.2.8	Elaboración del Inventario de sumideros	$ 1.294.587,00	$ 1.294.587,00	100,00%	100,00%
91	**1.2.3.11.2.9**	**Entrega a interventoria**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
92	**1.2.3.11.3**	**Aprobación de formatos y planes por parte de la Interventoría para el contrato**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
93	**1.2.3.12**	**ENTREGA FINAL DE INFORMES DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION Y CONCEPTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
94	**1.2.3.12.1**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión e informes de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
95	**1.2.3.12.2**	**Aprobacion de interventoria de la revisión de información y los conceptos 50% de los CIVS**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
96	**1.2.3.12.3**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
97	**1.2.3.12.4**	**Aprobacion de interventoria de la revisión de información, los conceptos y/o alternativas del 100% de los CIVS**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
98	**1.2.4**	**FIN DE LOS PRELIMINARES**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
99	**1.3**	**FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA**	**$ 10.310.981.242,32**	**$ 7.516.519.579,38**	**61,44%**	**44,79%**
100	**1.3.1**	**INICIO DE OBRA**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
101	**1.3.2**	**BLOQUE 1**	**$ 3.967.403.865,00**	**$ 3.279.058.625,68**	**100,00%**	**82,65%**
102	**1.3.2.1**	**INICIO BLOQUE 1**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
103	**1.3.2.2**	**FRENTE 1**	**$ 649.076.605,00**	**$ 580.452.816,57**	**100,00%**	**89,43%**
104	1.3.2.2.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
105	**1.3.2.2.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
106	**1.3.2.2.3**	**P28-CIV8000929**	**$ 351.693.524,00**	**$ 352.982.317,12**	**100,00%**	**100,37%**
107	1.3.2.2.3.1	diciembre	$ 112.356.769,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
108	1.3.2.2.3.2	enero	$ 6.930.457,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
109	1.3.2.2.3.3	febrero	$ 21.537.574,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
110	1.3.2.2.3.4	marzo	$ 29.360.144,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
111	1.3.2.2.3.5	abril	$ 3.062.965,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
112	1.3.2.2.3.6	mayo	$ 108.241.473,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
113	1.3.2.2.3.7	junio	$ 70.204.142,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
114	**1.3.2.2.4**	**P29-CIV8000996**	**$ 297.383.081,00**	$ 227.470.499,45	100,00%	76,49%
115	1.3.2.2.4.1	diciembre	$ 104.834.230,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
116	1.3.2.2.4.2	enero	$ 6.466.447,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
117	1.3.2.2.4.3	febrero	$ 20.095.584,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
118	1.3.2.2.4.4	marzo	$ 27.394.415,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
119	1.3.2.2.4.5	abril	$ 3.674.433,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
120	1.3.2.2.4.6	mayo	$ 134.917.971,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
121	**1.3.2.2.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	$ 0,00	0,00%	0,00%
122	**1.3.2.3**	**FRENTE 2**	**$ 692.922.447,00**	$ 613.015.627,04	100,00%	88,47%
123	1.3.2.3.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
124	**1.3.2.3.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
125	**1.3.2.3.3**	**P24-CIV8000871**	**$ 308.285.163,00**	**$ 279.884.010,05**	**100,00%**	**90,79%**
126	1.3.2.3.3.1	diciembre	$ 119.077.032,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
127	1.3.2.3.3.2	enero	$ 7.344.980,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
128	1.3.2.3.3.3	febrero	$ 22.825.775,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
129	1.3.2.3.3.4	marzo	$ 31.116.227,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
130	1.3.2.3.3.5	abril	$ 2.216.119,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
131	1.3.2.3.3.6	mayo	$ 125.705.029,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
132	**1.3.2.3.4**	**P25-CIV8000923**	**$ 384.637.284,00**	**$ 333.131.616,99**	**100,00%**	**86,61%**
133	1.3.2.3.4.1	diciembre	$ 148.568.506,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
134	1.3.2.3.4.2	enero	$ 9.164.091,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
135	1.3.2.3.4.3	febrero	$ 28.478.971,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
136	1.3.2.3.4.4	marzo	$ 38.822.696,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
137	1.3.2.3.4.5	abril	$ 2.764.979,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
138	1.3.2.3.4.6	mayo	$ 156.838.041,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
139	**1.3.2.3.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
140	**1.3.2.4**	**FRENTE 3**	**$ 687.973.045,00**	**$ 566.768.727,80**	**100,00%**	**82,38%**
141	1.3.2.4.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
142	**1.3.2.4.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
143	**1.3.2.4.3**	**P13-CIV8000772**	**$ 279.423.565,00**	**$ 265.892.826,27**	**100,00%**	**95,16%**
144	1.3.2.4.3.1	diciembre	$ 87.693.650,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
145	1.3.2.4.3.2	enero	$ 5.409.172,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
146	1.3.2.4.3.3	febrero	$ 16.809.921,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
147	1.3.2.4.3.4	marzo	$ 22.915.381,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
148	1.3.2.4.3.5	abril	$ 5.108.331,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
149	1.3.2.4.3.6	mayo	$ 141.487.109,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
150	**1.3.2.4.4**	**P14-CIV8000814**	**$ 408.549.480,00**	**$ 300.875.901,53**	**100,00%**	**73,64%**
151	1.3.2.4.4.1	diciembre	$ 137.014.666,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
152	1.3.2.4.4.2	enero	$ 8.451.420,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
153	1.3.2.4.4.3	febrero	$ 26.264.225,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
154	1.3.2.4.4.4	marzo	$ 35.803.542,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
155	1.3.2.4.4.5	abril	$ 6.121.520,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
156	1.3.2.4.4.6	mayo	$ 194.894.106,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
157	**1.3.2.4.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
158	**1.3.2.5**	**FRENTE 4**	**$ 748.159.276,00**	**$ 621.633.479,47**	**100,00%**	**83,09%**
159	1.3.2.5.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
160	**1.3.2.5.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**

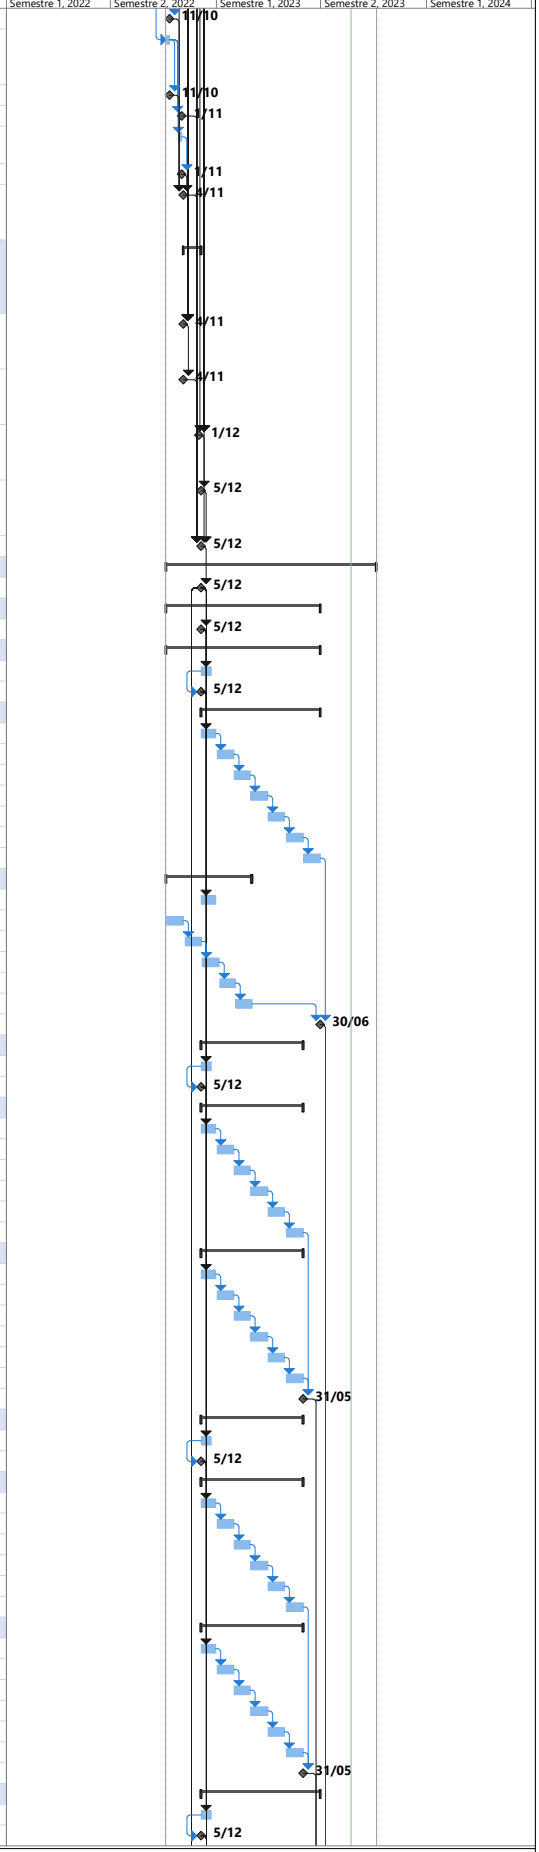


Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
161	**1.3.2.5.3**	**P17-CIV8000794**	**$ 347.694.568,00**	**$ 286.579.168,38**	**100,00%**	**82,42%**
162	1.3.2.5.3.1	diciembre	$ 96.548.638,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
163	1.3.2.5.3.2	enero	$ 5.955.370,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
164	1.3.2.5.3.3	febrero	$ 18.507.327,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
165	1.3.2.5.3.4	marzo	$ 25.229.294,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
166	1.3.2.5.3.5	abril	$ 4.141.042,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
167	1.3.2.5.3.6	mayo	$ 129.341.085,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
168	1.3.2.5.3.7	junio	$ 67.971.812,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
169	**1.3.2.5.4**	**P18-CIV8000839**	**$ 400.464.708,00**	**$ 335.054.311,09**	**100,00%**	**83,67%**
170	1.3.2.5.4.1	diciembre	$ 141.419.902,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
171	1.3.2.5.4.2	enero	$ 8.723.146,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
172	1.3.2.5.4.3	febrero	$ 27.108.661,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
173	1.3.2.5.4.4	marzo	$ 36.954.682,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
174	1.3.2.5.4.5	abril	$ 4.910.250,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
175	1.3.2.5.4.6	mayo	$ 181.348.066,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
176	**1.3.2.5.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
177	**1.3.2.6**	**FRENTE 5**	**$ 832.759.233,00**	**$ 603.184.777,93**	**100,00%**	**72,43%**
178	1.3.2.6.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
179	**1.3.2.6.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
180	**1.3.2.6.3**	**P21-CIV8000821**	**$ 381.190.142,00**	**$ 252.146.776,61**	**100,00%**	**66,15%**
181	1.3.2.6.3.1	diciembre	$ 130.792.584,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
182	1.3.2.6.3.2	enero	$ 8.067.626,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
183	1.3.2.6.3.3	febrero	$ 25.071.519,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
184	1.3.2.6.3.4	marzo	$ 34.177.638,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
185	1.3.2.6.3.5	abril	$ 5.259.178,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
186	1.3.2.6.3.6	mayo	$ 177.821.596,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
187	**1.3.2.6.4**	**P22-CIV8000864**	**$ 451.569.091,00**	**$ 351.038.001,32**	**100,00%**	**77,74%**
188	1.3.2.6.4.1	diciembre	$ 173.108.587,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
189	1.3.2.6.4.2	enero	$ 10.677.787,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
190	1.3.2.6.4.3	febrero	$ 33.183.038,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
191	1.3.2.6.4.4	marzo	$ 45.235.307,50	$ 0,00	100,00%	0,00%
192	1.3.2.6.4.5	abril	$ 3.447.207,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
193	1.3.2.6.4.6	mayo	$ 185.917.164,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
194	**1.3.2.6.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
195	**1.3.2.7**	**FRENTE 6**	**$ 356.513.259,00**	**$ 294.003.196,87**	**100,00%**	**82,47%**
196	1.3.2.7.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
197	**1.3.2.7.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
198	**1.3.2.7.3**	**P3-CIV8000957**	**$ 356.513.259,00**	**$ 294.003.196,87**	**100,00%**	**82,47%**
199	1.3.2.7.3.1	diciembre	$ 122.804.527,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
200	1.3.2.7.3.2	enero	$ 7.574.902,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
201	1.3.2.7.3.3	febrero	$ 23.540.296,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
202	1.3.2.7.3.4	marzo	$ 32.090.266,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
203	1.3.2.7.3.5	abril	$ 4.845.346,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
204	1.3.2.7.3.6	mayo	$ 165.657.922,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
205	**1.3.2.7.4**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
206	**1.3.2.8**	**FIN BLOQUE 1**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
207	**1.3.3**	**BLOQUE 2**	**$ 3.576.709.907,13**	**$ 1.658.878.073,19**	**87,43%**	**40,55%**
208	**1.3.3.1**	**INICIO BLOQUE 2**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
209	**1.3.3.2**	**FRENTE 7**	**$ 690.405.929,67**	**$ 133.133.694,24**	**79,52%**	**15,33%**
210	1.3.3.2.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
211	**1.3.3.2.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
212	**1.3.3.2.3**	**P8-CIV8002417**	**$ 414.182.627,19**	**$ 86.749.944,24**	**79,52%**	**16,66%**
213	1.3.3.2.3.1	mayo	$ 391.208.629,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
214	1.3.3.2.3.2	junio	$ 10.625.023,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
215	1.3.3.2.3.3	julio	$ 11.390.629,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
216	1.3.3.2.3.4	agosto	$ 958.346,19	$ 0,00	8,41%	0,00%
217	1.3.3.2.3.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
218	**1.3.3.2.4**	**P9-CIV8002500**	**$ 276.223.302,48**	**$ 46.383.750,00**	**79,52%**	**13,35%**
219	1.3.3.2.4.1	mayo	$ 260.901.671,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
220	1.3.3.2.4.2	junio	$ 7.085.953,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
221	1.3.3.2.4.3	julio	$ 7.596.546,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
222	1.3.3.2.4.4	agosto	$ 639.132,48	$ 0,00	8,41%	0,00%
223	1.3.3.2.4.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
224	**1.3.3.2.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
225	**1.3.3.3**	**FRENTE 8**	**$ 351.015.855,00**	**$ 189.687.083,18**	**100,00%**	**54,04%**
226	1.3.3.3.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
227	**1.3.3.3.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
228	**1.3.3.3.3**	**P33-CIV8001041**	**$ 176.572.662,00**	**$ 125.430.897,06**	**100,00%**	**71,04%**
229	1.3.3.3.3.1	diciembre	$ 13.083.564,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
230	1.3.3.3.3.2	enero	$ 807.028,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
231	1.3.3.3.3.3	febrero	$ 5.015.955,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
232	1.3.3.3.3.4	marzo	$ 910.912,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
233	1.3.3.3.3.5	abril	$ 3.237.483,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
234	1.3.3.3.3.6	mayo	$ 147.546.039,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
235	1.3.3.3.3.7	junio	$ 5.971.681,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
236	**1.3.3.3.4**	**P4-CIV8001069**	**$ 174.443.193,00**	**$ 64.256.186,12**	**100,00%**	**36,84%**
237	1.3.3.3.4.1	diciembre	$ 12.090.572,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
238	1.3.3.3.4.2	enero	$ 745.778,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
239	1.3.3.3.4.3	febrero	$ 4.635.263,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
240	1.3.3.3.4.4	marzo	$ 841.777,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
241	1.3.3.3.4.5	abril	$ 3.241.084,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
242	1.3.3.3.4.6	mayo	$ 116.957.601,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
243	1.3.3.3.4.7	junio	$ 35.931.118,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
244	**1.3.3.3.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
245	**1.3.3.4**	**FRENTE 9**	**$ 660.131.450,79**	**$ 474.199.717,11**	**98,00%**	**70,40%**
246	1.3.3.4.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
247	**1.3.3.4.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
248	**1.3.3.4.3**	**P16-CIV8000907**	**$ 354.156.003,04**	**$ 210.981.547,11**	**98,00%**	**58,38%**

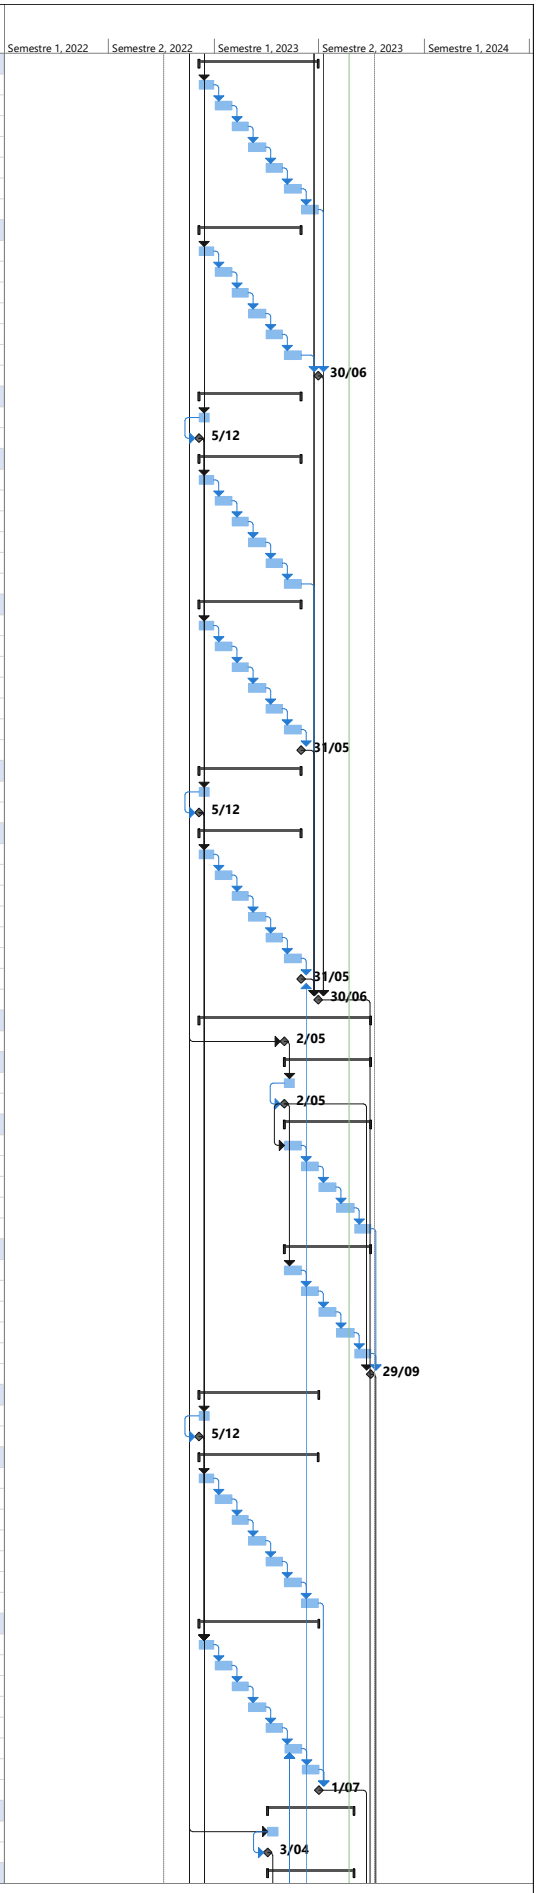


Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
249	1.3.3.4.3.1	abril	$ 66.773.867,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
250	1.3.3.4.3.2	mayo	$ 271.441.543,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
251	1.3.3.4.3.3	junio	$ 7.372.211,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
252	1.3.3.4.3.4	julio	$ 7.903.430,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
253	1.3.3.4.3.5	agosto	$ 664.952,04	$ 0,00	8,41%	0,00%
254	**1.3.3.4.4**	**P15-CIV8000856**	**$ 305.975.447,75**	**$ 263.218.170,00**	**98,00%**	**84,30%**
255	1.3.3.4.4.1	abril	$ 57.689.729,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
256	1.3.3.4.4.2	mayo	$ 234.513.737,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
257	1.3.3.4.4.3	junio	$ 6.369.271,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
258	1.3.3.4.4.4	julio	$ 6.828.221,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
259	1.3.3.4.4.5	agosto	$ 574.489,75	$ 0,00	8,41%	0,00%
260	**1.3.3.4.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
261	**1.3.3.5**	**FRENTE 10**	**$ 659.345.836,03**	**$ 352.531.653,51**	**87,11%**	**46,57%**
262	1.3.3.5.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
263	**1.3.3.5.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
264	**1.3.3.5.3**	**P26-CIV8000988**	**$ 304.549.834,09**	**$ 177.194.628,50**	**98,00%**	**57,02%**
265	1.3.3.5.3.1	abril	$ 57.420.938,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
266	1.3.3.5.3.2	mayo	$ 233.421.081,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
267	1.3.3.5.3.3	junio	$ 6.339.595,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
268	1.3.3.5.3.4	julio	$ 6.796.407,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
269	1.3.3.5.3.5	agosto	$ 571.813,09	$ 0,00	8,41%	0,00%
270	**1.3.3.5.4**	**P27-CIV8001052**	**$ 354.796.001,94**	**$ 175.337.025,01**	**79,52%**	**39,30%**
271	1.3.3.5.4.1	mayo	$ 335.116.078,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
272	1.3.3.5.4.2	junio	$ 9.101.578,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
273	1.3.3.5.4.3	julio	$ 9.757.410,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
274	1.3.3.5.4.4	agosto	$ 820.935,94	$ 0,00	8,41%	0,00%
275	1.3.3.5.4.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
276	**1.3.3.5.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
277	**1.3.3.6**	**FRENTE 11**	**$ 566.072.292,30**	**$ 219.353.682,24**	**79,52%**	**30,81%**
278	1.3.3.6.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
279	**1.3.3.6.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
280	**1.3.3.6.3**	**P31-CIV8001125**	**$ 281.171.898,61**	**$ 103.459.966,63**	**79,52%**	**29,26%**
281	1.3.3.6.3.1	mayo	$ 265.575.777,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
282	1.3.3.6.3.2	junio	$ 7.212.900,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
283	1.3.3.6.3.3	julio	$ 7.732.639,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
284	1.3.3.6.3.4	agosto	$ 650.582,61	$ 0,00	8,41%	0,00%
285	1.3.3.6.3.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
286	**1.3.3.6.4**	**P30-CIV8001058**	**$ 284.900.393,69**	**$ 115.893.715,61**	**79,52%**	**32,35%**
287	1.3.3.6.4.1	mayo	$ 269.097.459,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
288	1.3.3.6.4.2	junio	$ 7.308.547,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
289	1.3.3.6.4.3	julio	$ 7.835.178,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
290	1.3.3.6.4.4	agosto	$ 659.209,69	$ 0,00	8,41%	0,00%
291	1.3.3.6.4.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
292	**1.3.3.6.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
293	**1.3.3.7**	**FRENTE 10**	**$ 649.738.543,35**	**$ 289.972.242,91**	**89,10%**	**39,77%**
294	1.3.3.7.1	Tramite y Aprobación PMT	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
295	**1.3.3.7.2**	**Inicio de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
296	**1.3.3.7.3**	**P12-CIV8000849**	**$ 279.108.097,38**	**$ 171.998.487,91**	**79,52%**	**49,00%**
297	1.3.3.7.3.1	mayo	$ 263.626.451,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
298	1.3.3.7.3.2	junio	$ 7.159.957,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
299	1.3.3.7.3.3	julio	$ 7.675.882,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
300	1.3.3.7.3.4	agosto	$ 645.807,38	$ 0,00	8,41%	0,00%
301	1.3.3.7.3.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
302	**1.3.3.7.4**	**P6-CIV8000977**	**$ 370.630.445,97**	**$ 117.973.755,00**	**98,00%**	**31,19%**
303	1.3.3.7.4.1	abril	$ 69.880.019,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
304	1.3.3.7.4.2	mayo	$ 284.068.317,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
305	1.3.3.7.4.3	junio	$ 7.715.148,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
306	1.3.3.7.4.4	julio	$ 8.271.078,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
307	1.3.3.7.4.5	agosto	$ 695.883,97	$ 0,00	8,41%	0,00%
308	**1.3.3.7.5**	**Fin de actividades de obra**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
309	**1.3.3.8**	**FIN BLOQUE 2**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
310	**1.3.4**	**BLOQUE 3**	**$ 2.766.867.470,20**	**$ 2.578.582.880,51**	**31,72%**	**29,56%**
311	**1.3.4.1**	**INICIO BLOQUE 3**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
312	**1.3.4.2**	**P32-CIV8000979**	**$ 185.023.843,00**	**$ 108.333.428,75**	**100,00%**	**58,55%**
313	1.3.4.2.1	diciembre	$ 15.413.354,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
314	1.3.4.2.2	enero	$ 950.736,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
315	1.3.4.2.3	febrero	$ 5.909.145,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
316	1.3.4.2.4	marzo	$ 1.073.118,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
317	1.3.4.2.5	abril	$ 3.305.450,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
318	1.3.4.2.6	mayo	$ 157.487.536,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
319	1.3.4.2.7	junio	$ 884.504,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
320	**1.3.4.3**	**P23-CIV8000916**	**$ 360.052.854,82**	**$ 225.678.898,29**	**98,00%**	**61,42%**
321	1.3.4.3.1	abril	$ 67.885.681,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
322	1.3.4.3.2	mayo	$ 275.961.163,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
323	1.3.4.3.3	junio	$ 7.494.961,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
324	1.3.4.3.4	julio	$ 8.035.026,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
325	1.3.4.3.5	agosto	$ 676.023,82	$ 0,00	8,41%	0,00%
326	**1.3.4.4**	**P20-CIV8000938**	**$ 386.477.847,51**	**$ 85.609.510,00**	**98,00%**	**21,71%**
327	1.3.4.4.1	abril	$ 72.867.945,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
328	1.3.4.4.2	mayo	$ 296.214.501,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
329	1.3.4.4.3	junio	$ 8.045.031,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
330	1.3.4.4.4	julio	$ 8.624.732,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
331	1.3.4.4.5	agosto	$ 725.638,51	$ 0,00	8,41%	0,00%
332	**1.3.4.5**	**P5-CIV8000655**	**$ 374.068.369,80**	**$ 121.565.504,20**	**79,52%**	**25,84%**
333	1.3.4.5.1	mayo	$ 353.319.441,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
334	1.3.4.5.2	junio	$ 9.595.972,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
335	1.3.4.5.3	julio	$ 10.287.428,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
336	1.3.4.5.4	agosto	$ 865.528,80	$ 0,00	8,41%	0,00%

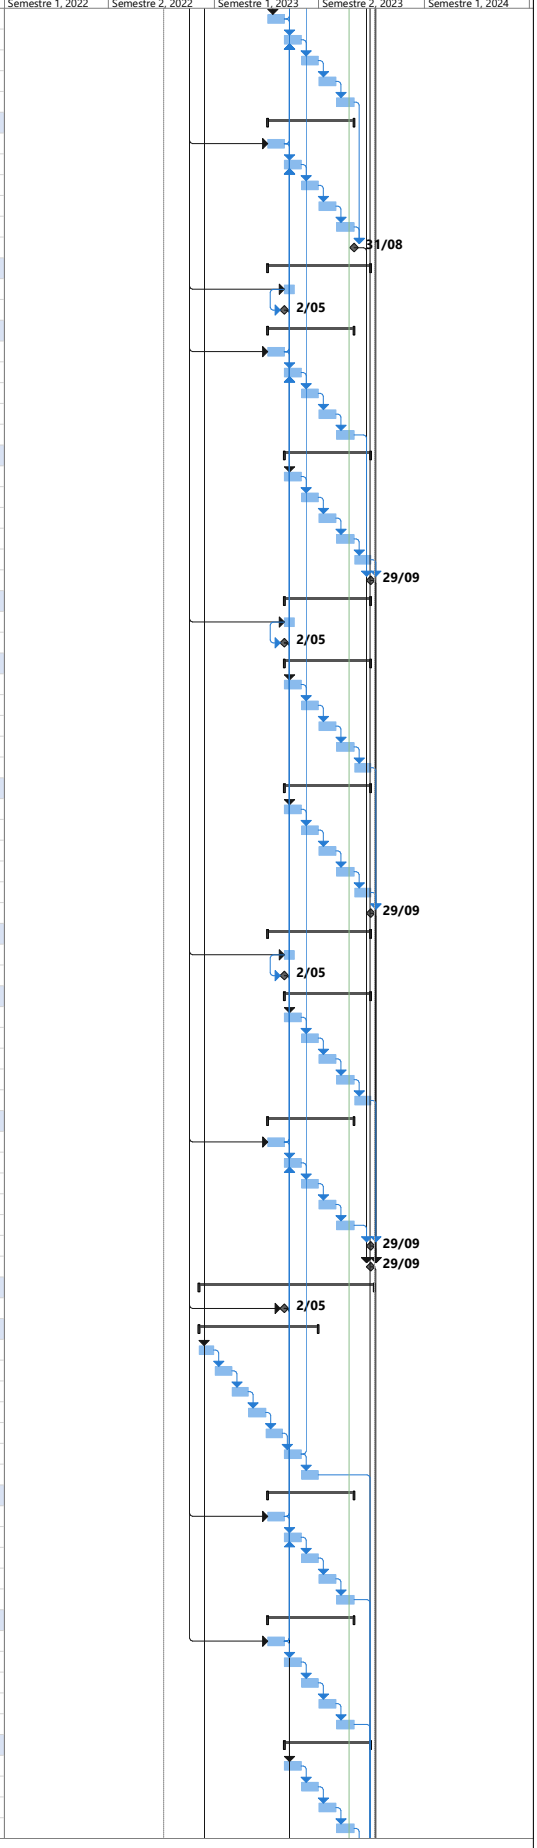

Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
337	1.3.4.5.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
338	**1.3.4.6**	**P1-CIV8000687**	**$ 363.856.170,59**	**$ 130.982.550,30**	**79,52%**	**28,63%**
339	1.3.4.6.1	mayo	$ 343.673.695,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
340	1.3.4.6.2	junio	$ 9.333.998,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
341	1.3.4.6.3	julio	$ 10.006.578,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
342	1.3.4.6.4	agosto	$ 841.899,59	$ 0,00	8,41%	0,00%
343	1.3.4.6.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
344	**1.3.4.7**	**P7-CIV8000736**	**$ 385.322.990,06**	**$ 182.739.614,06**	**79,52%**	**37,71%**
345	1.3.4.7.1	mayo	$ 363.949.786,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
346	1.3.4.7.2	junio	$ 9.884.687,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
347	1.3.4.7.3	julio	$ 10.596.947,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
348	1.3.4.7.4	agosto	$ 891.570,06	$ 0,00	8,41%	0,00%
349	1.3.4.7.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
350	**1.3.4.8**	**P40-CIV8011953**	**$ 260.309.060,04**	**$ 236.282.247,60**	**36,76%**	**33,37%**
351	1.3.4.8.1	mayo	$ 229.075.518,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
352	1.3.4.8.2	junio	$ 14.444.899,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
353	1.3.4.8.3	julio	$ 15.485.755,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
354	1.3.4.8.4	agosto	$ 1.302.888,04	$ 0,00	8,41%	0,00%
355	1.3.4.8.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
356	1.3.4.8.6	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
357	**1.3.4.9**	**P2-CIV8001595**	**$ 132.658.920,86**	**$ 84.753.414,90**	**36,76%**	**23,49%**
358	1.3.4.9.1	mayo	$ 116.741.657,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
359	1.3.4.9.2	junio	$ 7.361.422,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
360	1.3.4.9.3	julio	$ 7.891.863,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
361	1.3.4.9.4	agosto	$ 663.978,86	$ 0,00	8,41%	0,00%
362	1.3.4.9.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
363	1.3.4.9.6	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
364	**1.3.4.10**	**P39-CIV8000584**	**$ 105.611.950,54**	**$ 112.148.458,10**	**23,24%**	**24,68%**
365	1.3.4.10.1	mayo	$ 85.564.681,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
366	1.3.4.10.2	junio	$ 9.271.468,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
367	1.3.4.10.3	julio	$ 9.939.542,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
368	1.3.4.10.4	agosto	$ 836.259,54	$ 0,00	8,41%	0,00%
369	1.3.4.10.5	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
370	1.3.4.10.6	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
371	**1.3.4.11**	**P34-CIV8000709**	**$ 10.666.776,03**	**$ 29.221.762,50**	**4,41%**	**12,08%**
372	1.3.4.11.1	junio	$ 4.933.174,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
373	1.3.4.11.2	julio	$ 5.288.644,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
374	1.3.4.11.3	agosto	$ 444.958,03	$ 0,00	8,41%	0,00%
375	1.3.4.11.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
376	1.3.4.11.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
377	**1.3.4.12**	**P35-CIV8000743**	**$ 14.787.545,38**	**$ 59.070.561,90**	**4,41%**	**17,62%**
378	1.3.4.12.1	junio	$ 6.838.949,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
379	1.3.4.12.2	julio	$ 7.331.743,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
380	1.3.4.12.3	agosto	$ 616.853,38	$ 0,00	8,41%	0,00%
381	1.3.4.12.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
382	1.3.4.12.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
383	**1.3.4.13**	**P10-CIV8011960**	**$ 29.962.759,10**	**$ 220.872.535,80**	**4,41%**	**32,51%**
384	1.3.4.13.1	junio	$ 13.857.187,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
385	1.3.4.13.2	julio	$ 14.855.694,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
386	1.3.4.13.3	agosto	$ 1.249.878,10	$ 0,00	8,41%	0,00%
387	1.3.4.13.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
388	1.3.4.13.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
389	**1.3.4.14**	**P11-CIV8011955**	**$ 30.040.126,42**	**$ 233.713.962,30**	**4,41%**	**34,32%**
390	1.3.4.14.1	junio	$ 13.892.968,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
391	1.3.4.14.2	julio	$ 14.894.053,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
392	1.3.4.14.3	agosto	$ 1.253.105,42	$ 0,00	8,41%	0,00%
393	1.3.4.14.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
394	1.3.4.14.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
395	**1.3.4.15**	**P41-CIV8011950**	**$ 15.114.274,68**	**$ 56.588.175,00**	**4,41%**	**16,51%**
396	1.3.4.15.1	junio	$ 6.990.055,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
397	1.3.4.15.2	julio	$ 7.493.737,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
398	1.3.4.15.3	agosto	$ 630.482,68	$ 0,00	8,41%	0,00%
399	1.3.4.15.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
400	1.3.4.15.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
401	**1.3.4.16**	**P42-CIV8011949**	**$ 17.618.446,70**	**$ 123.277.694,40**	**4,41%**	**30,86%**
402	1.3.4.16.1	junio	$ 8.148.185,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
403	1.3.4.16.2	julio	$ 8.735.319,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
404	1.3.4.16.3	agosto	$ 734.942,70	$ 0,00	8,41%	0,00%
405	1.3.4.16.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
406	1.3.4.16.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
407	**1.3.4.17**	**P36-CIV8000619**	**$ 20.869.886,52**	**$ 141.255.691,50**	**4,41%**	**29,85%**
408	1.3.4.17.1	junio	$ 9.651.912,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
409	1.3.4.17.2	julio	$ 10.347.400,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
410	1.3.4.17.3	agosto	$ 870.574,52	$ 0,00	8,41%	0,00%
411	1.3.4.17.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
412	1.3.4.17.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
413	**1.3.4.18**	**P19-CIV8000563**	**$ 18.573.393,67**	**$ 131.190.459,11**	**4,41%**	**31,16%**
414	1.3.4.18.1	junio	$ 8.589.830,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
415	1.3.4.18.2	julio	$ 9.208.786,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
416	1.3.4.18.3	agosto	$ 774.777,67	$ 0,00	8,41%	0,00%
417	1.3.4.18.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
418	1.3.4.18.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
419	**1.3.4.19**	**P43-CIV8002595**	**$ 17.495.265,27**	**$ 65.864.925,00**	**17,72%**	**66,71%**
420	1.3.4.19.1	junio	$ 8.091.216,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
421	1.3.4.19.2	julio	$ 8.674.245,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
422	1.3.4.19.3	agosto	$ 729.804,27	$ 0,00	8,41%	0,00%
423	1.3.4.19.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
424	1.3.4.20	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%

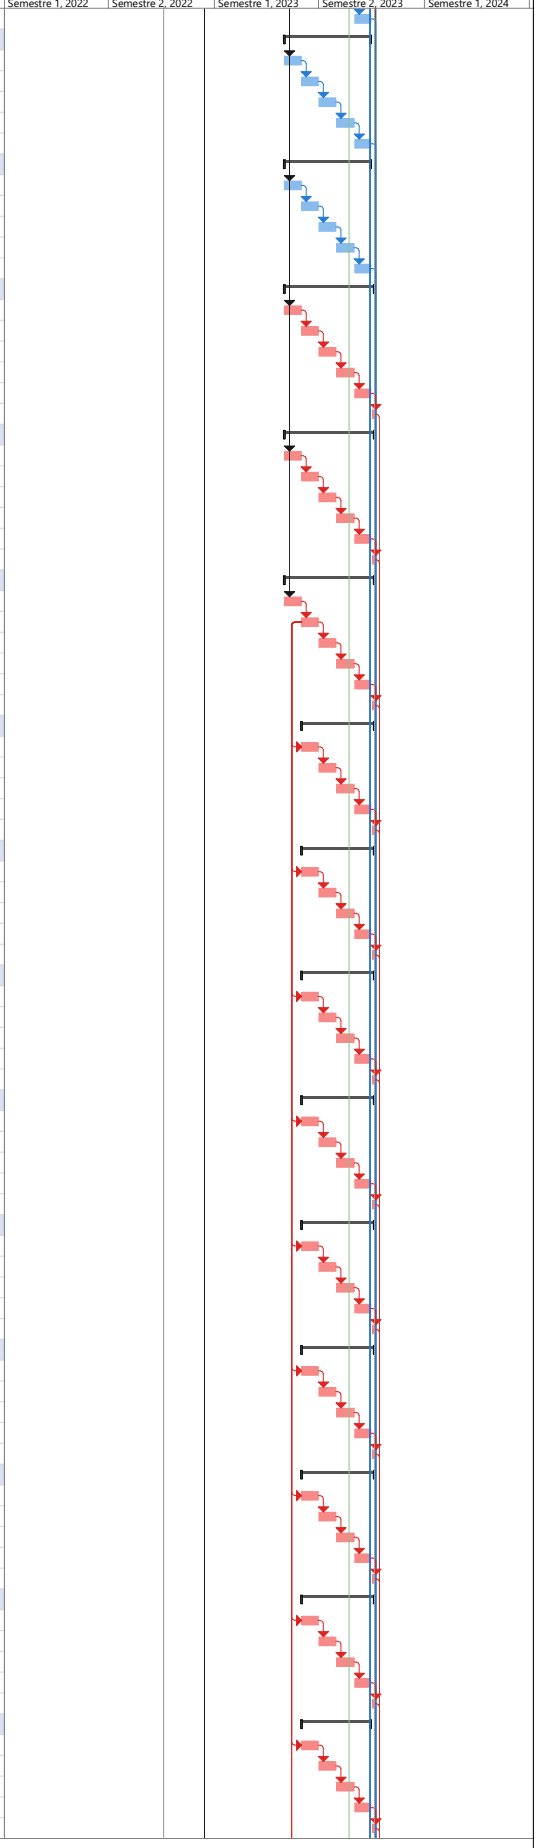

Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
425	**1.3.4.21**	**P38-CIV8011973**	**$ 17.735.899,12**	**$ 122.421.599,30**	**4,41%**	**30,45%**
426	1.3.4.21.1	junio	$ 8.202.505,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
427	1.3.4.21.2	julio	$ 8.793.552,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
428	1.3.4.21.3	agosto	$ 739.842,12	$ 0,00	8,41%	0,00%
429	1.3.4.21.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
430	1.3.4.21.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
431	**1.3.4.22**	**P37-CIV8011974**	**$ 20.621.090,09**	**$ 107.011.887,50**	**4,41%**	**22,89%**
432	1.3.4.22.1	junio	$ 9.536.849,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
433	1.3.4.22.2	julio	$ 10.224.045,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
434	1.3.4.22.3	agosto	$ 860.196,09	$ 0,00	8,41%	0,00%
435	1.3.4.22.4	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
436	1.3.4.22.5	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
437	**1.3.4.23**	**FIN BLOQUE 3**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
438	**1.3.5**	**FIN DE LA OBRA**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
439	**1.4**	**COMPONENTES**	**$ 838.692.378,27**	**$ 838.692.378,26**	**31,89%**	**31,89%**
440	**1.4.1**	**COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (B)**	**$ 409.683.072,67**	**$ 409.683.072,67**	**61,44%**	**61,44%**
441	1.4.1.1	diciembre	$ 56.214.079,00	$ 56.214.079,00	100,00%	100,00%
442	1.4.1.2	enero	$ 3.467.430,00	$ 3.467.430,00	100,00%	100,00%
443	1.4.1.3	febrero	$ 21.551.258,00	$ 21.551.258,00	100,00%	100,00%
444	1.4.1.4	marzo	$ 3.913.770,00	$ 3.913.770,00	100,00%	100,00%
445	1.4.1.5	abril	$ 17.794.429,00	$ 17.794.429,00	100,00%	100,00%
446	1.4.1.6	mayo	$ 278.034.776,00	$ 278.034.776,00	100,00%	100,00%
447	1.4.1.7	junio	$ 17.141.427,00	$ 17.141.427,00	100,00%	100,00%
448	1.4.1.8	julio	$ 10.668.328,00	$ 10.668.328,00	100,00%	100,00%
449	1.4.1.9	agosto	$ 897.575,67	$ 897.575,67	8,41%	8,41%
450	1.4.1.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
451	1.4.1.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
452	**1.4.2**	**COSTO COMPONENTE SOCIAL (C)**	**$ 155.199.939,94**	**$ 155.199.939,94**	**61,44%**	**61,44%**
453	1.4.2.1	diciembre	$ 21.295.538,00	$ 21.295.538,00	100,00%	100,00%
454	1.4.2.2	enero	$ 1.313.564,00	$ 1.313.564,00	100,00%	100,00%
455	1.4.2.3	febrero	$ 8.164.247,00	$ 8.164.247,00	100,00%	100,00%
456	1.4.2.4	marzo	$ 1.482.651,00	$ 1.482.651,00	100,00%	100,00%
457	1.4.2.5	abril	$ 6.741.051,00	$ 6.741.051,00	100,00%	100,00%
458	1.4.2.6	mayo	$ 105.327.712,00	$ 105.327.712,00	100,00%	100,00%
459	1.4.2.7	junio	$ 6.493.674,00	$ 6.493.674,00	100,00%	100,00%
460	1.4.2.8	julio	$ 4.041.475,00	$ 4.041.475,00	100,00%	100,00%
461	1.4.2.9	agosto	$ 340.027,94	$ 340.027,94	8,41%	8,41%
462	1.4.2.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
463	1.4.2.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
464	**1.4.3**	**COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D)**	**$ 197.290.301,86**	**$ 197.290.301,86**	**61,44%**	**61,44%**
465	1.4.3.1	diciembre	$ 27.070.907,00	$ 27.070.907,00	100,00%	100,00%
466	1.4.3.2	enero	$ 1.669.804,00	$ 1.669.804,00	100,00%	100,00%
467	1.4.3.3	febrero	$ 10.378.399,00	$ 10.378.399,00	100,00%	100,00%
468	1.4.3.4	marzo	$ 1.884.747,00	$ 1.884.747,00	100,00%	100,00%
469	1.4.3.5	abril	$ 8.569.230,00	$ 8.569.230,00	100,00%	100,00%
470	1.4.3.6	mayo	$ 133.892.679,00	$ 133.892.679,00	100,00%	100,00%
471	1.4.3.7	junio	$ 8.254.765,00	$ 8.254.765,00	100,00%	100,00%
472	1.4.3.8	julio	$ 5.137.527,00	$ 5.137.527,00	100,00%	100,00%
473	1.4.3.9	agosto	$ 432.243,86	$ 432.243,86	8,41%	8,41%
474	1.4.3.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
475	1.4.3.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
476	**1.4.4**	**AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
477	1.4.4.1	diciembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
478	1.4.4.2	enero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
479	1.4.4.3	febrero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
480	1.4.4.4	marzo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
481	1.4.4.5	abril	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
482	1.4.4.6	mayo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
483	1.4.4.7	junio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
484	1.4.4.8	julio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
485	1.4.4.9	agosto	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
486	1.4.4.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
487	1.4.4.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
488	**1.4.5**	**COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (G)**	**$ 76.519.063,79**	**$ 76.519.063,79**	**61,44%**	**61,44%**
489	1.4.5.1	diciembre	$ 10.499.454,00	$ 10.499.454,00	100,00%	100,00%
490	1.4.5.2	enero	$ 647.634,00	$ 647.634,00	100,00%	100,00%
491	1.4.5.3	febrero	$ 4.025.263,00	$ 4.025.263,00	100,00%	100,00%
492	1.4.5.4	marzo	$ 730.999,00	$ 730.999,00	100,00%	100,00%
493	1.4.5.5	abril	$ 3.323.577,00	$ 3.323.577,00	100,00%	100,00%
494	1.4.5.6	mayo	$ 51.930.290,00	$ 51.930.290,00	100,00%	100,00%
495	1.4.5.7	junio	$ 3.201.611,00	$ 3.201.611,00	100,00%	100,00%
496	1.4.5.8	julio	$ 1.992.590,00	$ 1.992.590,00	100,00%	100,00%
497	1.4.5.9	agosto	$ 167.645,79	$ 167.645,79	8,41%	8,41%
498	1.4.5.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
499	1.4.5.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
500	**1.4.6**	**COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA (H)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
501	1.4.6.1	diciembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
502	1.4.6.2	enero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
503	1.4.6.3	febrero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
504	1.4.6.4	marzo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
505	1.4.6.5	abril	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
506	1.4.6.6	mayo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
507	1.4.6.7	junio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%

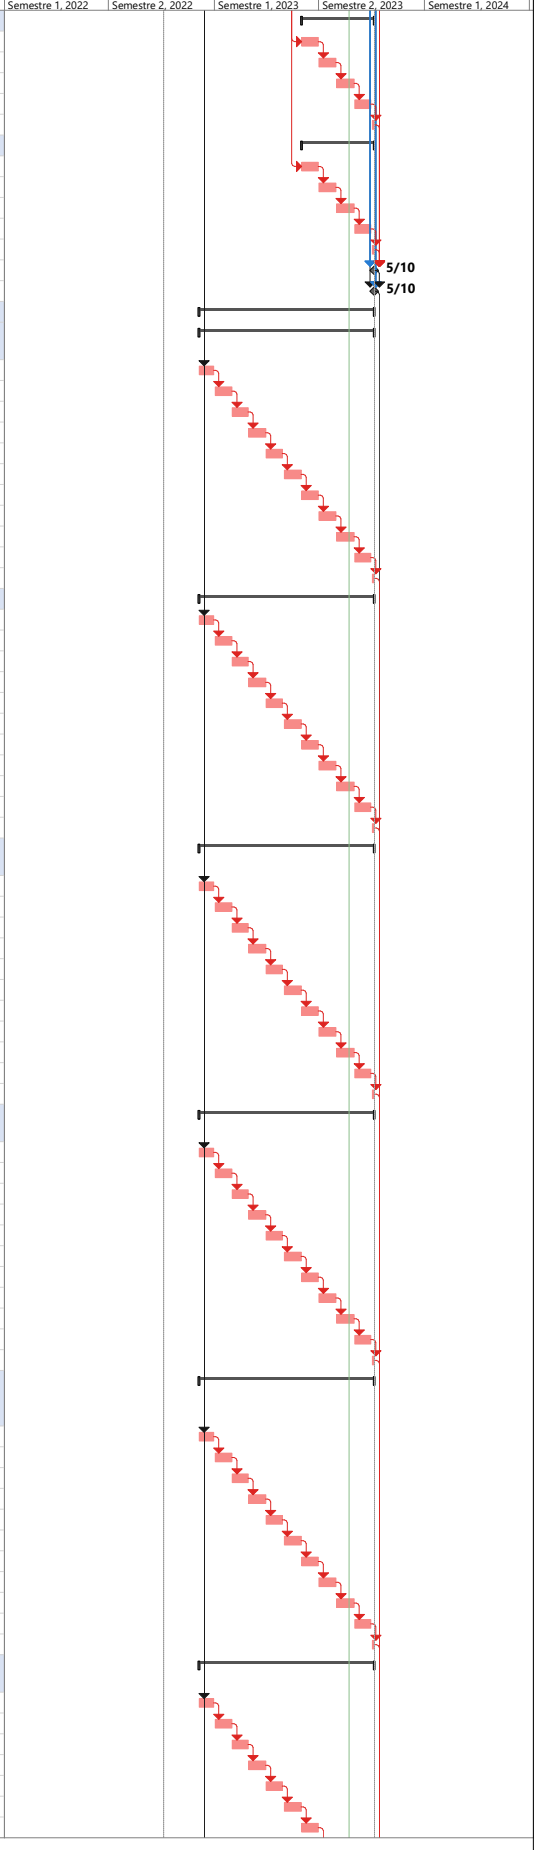

Id	EDT	Nombre de tarea	Valor planeado: PV (CPTP)	EV valor ganado	% Programado (PV)	% Ejecutado (EV)
508	1.4.6.8	julio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
509	1.4.6.9	agosto	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
510	1.4.6.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
511	1.4.6.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
512	**1.4.7**	**PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 (J)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
513	1.4.7.1	diciembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
514	1.4.7.2	enero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
515	1.4.7.3	febrero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
516	1.4.7.4	marzo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
517	1.4.7.5	abril	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
518	1.4.7.6	mayo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
519	1.4.7.7	junio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
520	1.4.7.8	julio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
521	1.4.7.9	agosto	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
522	1.4.7.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
523	1.4.7.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
524	**1.4.8**	**AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ACTIVIDADES DE ACERO**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
525	1.4.8.1	diciembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
526	1.4.8.2	enero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
527	1.4.8.3	febrero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
528	1.4.8.4	marzo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
529	1.4.8.5	abril	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
530	1.4.8.6	mayo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
531	1.4.8.7	junio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
532	1.4.8.8	julio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
533	1.4.8.9	agosto	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
534	1.4.8.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
535	1.4.8.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
536	**1.4.9**	**AJUSTE AL VALOR DEL CONTRATO POR PROPUESTA ECONOMICA**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
537	1.4.9.1	diciembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
538	1.4.9.2	enero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
539	1.4.9.3	febrero	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
540	1.4.9.4	marzo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
541	1.4.9.5	abril	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
542	1.4.9.6	mayo	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
543	1.4.9.7	junio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
544	1.4.9.8	julio	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
545	1.4.9.9	agosto	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
546	1.4.9.10	septiembre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
547	1.4.9.11	octubre	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
548	**1.4.10**	**ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**
549	**1.4.11**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**0,00%**

