FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 44 (número semana) **DEL** 3 de agosto de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 9 de agosto de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 717 de 2022 (Número con 3 dígitos) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número del contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

CONTRATISTA	XIE SA	**NIT**	830061684-1
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV (Nombre del consorcio, unión temporal o persona natural)	**NIT**	900547145 (Número de identificación)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 19.627.175.114,00	Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022	Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ** (Escribir el nombre del supervisor del IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: **ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO** (Escribir el nombre del profesional de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Escribir el número del radicado) **de fecha** (dd-mm-aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
CALZADA CIV	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43
TOTALES	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,53%	2,53%		Trabajo Ejecutado	7,21%	4,68%	
Valor del Trabajo Programado	$	$ 0,00		Valor del Trabajo Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%		Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -		Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRÁFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO	ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,18%	1,10%
10	2,31%	1,10%
11	2,42%	7,21%
12	2,53%	7,21%
13	3,47%	7,21%
14	4,68%	8,25%
15	6,10%	8,39%
16	6,10%	9,00%
17	8,97%	9,63%
18	11,45%	10,42%
19	13,67%	10,61%
20	16,42%	11,38%
21	11,03%	10,73%
22	11,48%	10,73%
23	11,93%	10,73%
24	12,38%	10,73%
25	12,75%	10,73%
26	13,13%	10,73%
27	13,66%	10,73%
28	15,73%	10,73%
29	16,77%	10,73%
30	17,27%	10,71%
31	26,09%	10,71%
32	35,83%	10,71%
33	41,55%	10,71%
34	44,08%	10,71%
35	46,47%	10,71%
36	48,50%	17,52%
37	48,50%	17,52%
38	50,50%	17,52%
39	52,60%	17,52%
40	75,12%	17,52%
41	77,04%	17,52%
42	78,75%	17,52%
43	80,88%	17,52%
44	82,65%	17,52%

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
Estudios y Diseños Program. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Pros. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Proparamada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%
Meta Física Proparamada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%
Meta Física Proparamada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%
Meta Física Proparamada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%
Meta Física Proparamada (%)				Meta Física Ejecutada (%)			

%Atraso /%Avance: 0%

AVANCE PROJECT

Avance Programado (%)	0%	Avance Ejecutado (%)	0%
Avance Proparamado Mantenimiento periódico	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%
Avance Proparamado Mantenimiento Rutinario	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%
Avance Proparamado Mantenimiento Reconstrucción	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%
Avance Proparamado Mantenimiento Rehabilitación	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%

%Atraso /%Avance: 0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERF	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Estado	INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: Fecha de inicio programada	Motivos por los cuales no ha iniciado	Acciones		
1	8000687	156049	29654	29665	KR 98B BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	46,42	6	CALZADA	4,2	91,12	382,89	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT			
2	8001595	156010	29588	29589	KR 95A	CL 42F SUR	CL 42G SUR	50,07	6	CALZADA	3,72	76,75	285,18	Sin iniciar	4-jul-23	SIN PMT			
3	8000957	156201	29896	29897	KR 97A	CL 41 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,53	67,8	307,36	SIN ACTIVIDADES	28-mar-23				
4	8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	47,61	6	CALZADA	4,35	34,72	150,9	SIN ACTIVIDADES	24-feb-23				
5	8000835	156051	29668	29669	KR 98C BIS	CL 39C SUR	CL 40 SUR	47,12	6	CALZADA	3,86	90,24	347,99	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT			
6	8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	47,61	6	CALZADA	5,07	65,69	333,12	Sin iniciar	16-dic-22	SIN PMT			
7	8000736	156045	29656	29657	KR 98	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	4,04	93,14	376	Sin iniciar	23-may-23	SIN PMT			
8	8002417	155940	29448	29449	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	29,9	6	CALZADA	2,57	88,02	226,36	Calzada: Instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	27-abr-23				
9	8002500	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	29,41	6	CALZADA	2,54	69,79	177,24	Calzada: Instalación de base estabilizada, excavación mecánica, nivelación de sub-rasante, instalación de geotextil, geo-celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	4-may-23				
10	8011960	156950	30682	30683	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	6	CALZADA	2,93	136,9	401,1	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT			
11	8011955	156945	30672	30673	KR 97A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	1	CALZADA	4,38	140,7	616,78	Sin iniciar	No se tiene				
12	8000849	156231	29956	29957	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,07	62,44	316,88	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección, instalación concreto 3000psi para acceso peatonal. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.	21-abr-23				
13	8000772	156220	29934	29935	KR 98	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,54	56,87	201,43	Calzada: Instalación de base estabilizada en intersección con prioridad 13 y 14. Andén occidental: Remates parciales en fachada parte inferior. Andén oriental: Remates en fachada parte inferior.	16-ene-23				
14	8000814	156221	29936	29937	KR 98	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,54	67,69	307,42	Calzada: Excavación para pozo, concreto 3000psi para construcción pozo, acero para parrilla base pozo, excavación manual para instalación de tubería 12" corrugada, construcción de cargua de pozo diámetro externo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	20-ene-23				
15	8000856	156222	29938	29939	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	46,42	6	CALZADA	4,61	67,45	310,79	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación y compactación de fresado, instalación concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4". Andén occidental: Nivelación y compactación e instalación de fresado.	9-mar-23				
16	8000907	156223	29940	29941	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,81	64,09	308,44	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual en anden. Andén occidental: Sin actividad.	2-mar-23				
17	8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,93	58,12	228,25	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.	26-ene-23				
18	8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	3,86	67,37	260,04	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección, fachada en parte inferior. Andén occidental: Remates en cajas de inspección, fachada en parte inferior.	2-feb-23				
19	8000563	156052	29670	29671	KR 99A BIS	CL 38C SUR	CL 38 SUR	47,12	6	CALZADA	4,66	80,91	376,93	Sin iniciar	No se tiene				
20	8000938	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,62	64,75	299,09	Calzada: Excavación mecánica, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geo-celda, geotextil y de fresado para lleno de geo-celda. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	29-dic-22				
21	8000821	156212	29918	29919	KR 97D	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,16	59,22	246,61	SIN ACTIVIDADES	8-feb-23				
22	8000864	156213	29920	29921	KR 97D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,05	67,76	274,11	SIN ACTIVIDADES	14-feb-23				
23	8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,42	67,76	299,83	Sin iniciar	22-dic-23	SIN IMPLEMENTACIÓN DE PMT			
24	8000871	156204	29902	29903	KR 97B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,1	6	CALZADA	4,45	60,94	271,42	SIN ACTIVIDADES	4-ene-23				
25	8000923	156205	29904	29905	KR 97B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,92	67,68	332,77	SIN ACTIVIDADES	10-ene-23				
26	8000988	156206	29906	29907	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,32	68,54	295,77	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación fresado, instalación concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 5.5" para acceso vehicular. Andén occidental: Nivelación fresado, instalación concreto 3000psi para acceso peatonal	15-mar-23				
27	8001052	156207	29908	29909	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,12	66,41	340,23	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y construcción de cajas de inspección 4 un, compactación de sub-rasante, instalación de geotextil, nivelación, compactación e instalación de fresado. Andén occidental: Sin actividad.	22-mar-23				
28	8000929	156196	29886	29887	KR 97	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,95	6	CALZADA	4,2	63,56	266,84	SIN ACTIVIDADES	5-dic-22				
29	8000996	156197	29888	29889	KR 97	CL 40A SUR	CL 41 SUR	47,26	6	CALZADA	4,24	67,58	286,62	SIN ACTIVIDADES	12-dic-22				
30	8001058	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,12	66,8	274,89	SIN ACTIVIDADES	10-abr-23				
31	8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	50,91	6	CALZADA	5,14	68,89	354,19	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates fachada parte inferior, instalación concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4". Andén occidental: Remates fachada parte inferior, instalación concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4".	3-abr-23				
32	8000979	156186	29866	29867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	49,66	6	CALZADA	5,14	34,54	177,45	Calzada: Instalación de bordillo A-80 y de monoblock. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	15-abr-23				
33	8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	48,3	6	CALZADA	5,11	32,2	164,5	SIN ACTIVIDADES	20-feb-23				
34	8000709	156232	29958	29959	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,09	53,43	218,4	Sin iniciar	10-ago-23				
35	8000743	156233	29960	29961	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,68	67,2	314,77	Sin iniciar	24-jul-23	SIN PMT			
36	8000619	156053	29672	29673	KR 99A BIS	CL 40 SUR	CL 38 C SUR	47,12	6	CALZADA	4,78	90,92	434,69	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
37	8011974	156971	31024	31025	CL 42A BIS SUR	KR 94A	KR 95	29,9	6	CALZADA	2,52	81,18	204,44	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
38	8011973	156970	31022	31023	CL 42A BIS SUR	KR 93C	KR 94A	29,9	6	CALZADA	2,18	89,41	194,58	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
39	8000584	156058	29682	29683	KR 99C BIS	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	3,87	85,64	331,62	Sin iniciar	10-jul-23	SIN PMT			
40	8011953	156943	30668	30669	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	65,55	6	CALZADA	3,13	143,02	448,03	Sin iniciar	2-may-23	SIN PMT			
41	8011950	156942	30666	30667	KR 95B	CL 42B SUR	CL 42F SUR	29,06	6	CALZADA	3,94	81,9	322,33	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
42	8011949	156941	30664	30665	KR 95A	CL 42B SUR	CL 42F SUR	27,35	6	CALZADA	3,28	83,12	272,55	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
43	8002595	155838	29246	29247	CL 42B SUR	KR 91	KR 90A BIS	33,9	6	CALZADA	3,04	104,89	319,35	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1. COMPONENTE TÉCNICO:

1.1. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA

- Calificación diaria del PMT instalado acorde con la aprobación de la SDM, la calificación para el presente periodo es de 82%
- Mesas de trabajo internas con el director de Interventoría para definir los lineamientos de revisión de documentos del contratista. Coordinación con las áreas SST, Social y Ambiental, para la elaboración de los documentos entregados por la Interventoría en el Periodo.
- Elaboración de memorandos para comunicaciones internas y otras dirigidas al Contratista con los productos revisados en el periodo.
- Revisión de los informes diarios de inspección y memorias de cálculo de las cantidades de obra, diligenciamiento de la bitácora.
- Reporte diario de cantidades para el seguimiento de la programación
- Revisión y aprobación de la preacta de obra, informe mensual técnico, lista de chequeo de cumplimiento de obligaciones e informe de cuenta del contratista, No.9 correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023.
- Elaboración del informe mensual de interventoría No.9, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023.
- Revisión y observaciones de los APUNP presentados por el Contratista

1.2 Seguimiento a las actividades del contratista

La interventoría realizó el seguimiento de:

- **P4:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
- **P32:**Calzada: Instalación de bordillo A-80 y de monoblock. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P33:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
- **P28:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P29:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P24:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
- **P25:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P21:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P22:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P3:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P13:**Calzada: Instalación de base estabilizada en intersección con prioridad 13 y 14. Andén occidental: Remates parciales en fachada parte inferior. Andén oriental: Remates en fachada parte inferior.
- **P14:**Calzada: Excavación para pozo, concreto 3000psi para construcción pozo, acero para parrilla base pozo, excavación manual para instalación de tubería 12" corrugada, construcción de cargue de pozo diámetro externo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P17:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.
- **P18:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección, fachada en parte inferior. Andén occidental: Remates en cajas de inspección, fachada en parte inferior.
- **P30:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P31:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en fachada parte inferior, instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4". Andén occidental: Remates en fachada parte inferior, instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4".
- **P12:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección, instalación de concreto de 3000psi para acceso peatonal. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.
- **P15:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación y compactación de fresado, instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4". Andén occidental: Nivelación y compactación e instalación de fresado.
- **P16:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual en anden. Andén occidental: Sin actividad.
- **P26:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación fresado, instalación concreto de 3000psi para acceso peatonal, concreto de 4000psi con asentamiento de 5.5" para acceso vehicular. Andén occidental: Nivelación fresado, instalación de concreto de 3000psi para acceso peatonal
- **P27:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y construcción de cajas de inspección 4 un, compactación de sub-rasante, instalación de geotextil, nivelación, compactación e instalación de fresado. Andén occidental: Sin actividad.
- **P8:**Calzada: Instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P9:**Calzada: Instalación de base estabilizada, excavación mecánica, nivelación de sub-rasante, instalación de geotextil, geo-celda y fresado, sobre excavación fallo 0,13m3, relleno con fresado fallo 0,13m3. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P20:**Calzada: Excavación mecánica, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geo-celda, geotextil y de fresado para lleno de geo-celda. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Elaboración del mensual técnico No.10 de la Interventoría correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2023.
- Participación del comité de seguimiento No.45.
- Seguimiento de las actividades que ejecute el Contratista en obra.
- Diligenciamiento de bitácora, revisión y aprobación de los informes diarios del inspector y calificación semanal del PMT.
- Evaluación diaria de cantidades para la respectiva evaluación de la programación
- Revisión del acta parcial de obra No.10 del Contratista, así como informe de cuenta.

2. COMPONENTE AMBIENTAL

- El 2 de agosto, se realiza en el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.
- El 8 de agosto, se realiza el comité de seguimiento ambiental y SST, llevado a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones alusivas al cerramiento ambiental y senderos peatonales, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros y se recalca sobre la calidad en la ejecución y presentación de los informes mensuales a la interventoría.
- Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 96% en todos los ítems de las fichas de seguimiento ambiental y SST
- En la presente semana se dispuso de 420m3 de material de excavación, con el gestor LAMO.
- Para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU y de la UMV
- Se utilizó concreto premezclado para los andenes de la vía, en la semana se utilizaron 14m3.
- En la presente semana, no se utilizó asfalto para las diferentes prioridades,
- Se realiza la revisión del correspondiente informe semanal del contratista, se generan observaciones y una vez subsanadas, se da aprobación mediante correo electrónico a la residente ambiental del contratista.

El Contratista realizó las siguientes actividades:

- Reconrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 Y ACOPIO para verificar en obra que se esté cumpliendo con lo establecido en el MAO.
- Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
- Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
- Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20 y acopio.
- Inducción ambiental y socialización de política integral.
- Comité de seguimiento.
- Recolección de material escombro.
- Delimitación de senderos peatonales en P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27.
- Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
0	1. Consorcio SCLV = 22 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Vialidad Limitada = 13 4. Carse Ingeniería Ltda = 1 5. J.V.R Estudios = 1 6. Gonsal Limitada = 5	0	53

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 3 de agosto de 2023 al 9 de agosto de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría.

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El 3 de agosto de 2023 se llevó a cabo recorrido de obra con los profesionales de Interventoría, donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, en las diferentes prioridades intervenidas se observaron equipos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla) e información de conformación de brigada de emergencias.
- El 3 de agosto de 2023 se llevó a cabo comité de seguimiento semanal en el FDLK donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales N° 9, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
- El 8 de agosto de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
- El 1 de agosto de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
- Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

P32: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido
P33: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido
P4: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P28: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P29: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P50: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido.
P51: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido
P3: Sin actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P24: Sin actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P25: Sin actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P26: Sin actividades de obra. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.
P27: Sin actividades de obra. Se evidencia señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.
P21: Sin actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P22: Sin actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P17: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido
P18: Remates de fachadas. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.
P20: Excavación mecánica en vía. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P13: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido
P14: Sin actividades de obra, el Contratista debe retirar acopio de arena y ladrillo y señalizar adecuadamente al final del CIV.
P15: Instalación de bordillos. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P16: Excavación manual en espacio público. Se evidencia señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P12: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido
P8: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.
P9: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.

- Como recomendaciones generales se solicitó al contratista retirar el material RDC que se encuentra acopiado en las diferentes prioridades que están siendo intervenidas. Por lo anterior se realizó comité de seguimiento Ambiental-SST presencial, donde se revisó la gestión SST y las actividades que ejecuto el contratista en la semana y se realizó registro en el formato FOAC 32..
- Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
- El 4 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
- El 9 de agosto de 2023 se llevó a cabo comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
- Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
AGL CONSTRUCCION SAS = 7 XIE S.A = 1	1. XIE S.A = 46 2. NOVA TOPOSMAR S.A.S = 8 3. PLANEACION EN INGENIERIA S.A.S = 1 4. JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S = 1 5. DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S = 1 6. JOSE ARGEON MORA SERRANO = 11 7. R.A.C PETREOS S.A.S = 1 8. INPASUELC LTDA = 2 9. INGCONDR S.A.S = 5 10. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 20 11. AGL CONSTRUCCION SAS = 5 12. Construcciones Obras Civiles y Transportes SAS = 1	1. AGL CONSTRUCCION SAS = 1 2. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 1 3. JOSE ARGEON MORA SERRANO = 1	113

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 3 de agosto de 2023 al 9 de agosto de 2023, el contratista reportó el ausentismo de 13 trabajadores entre oficiales, operadores y ayudantes
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 3 de agosto de 2023 al 9 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de días de ausencia = 19
N° de días de trabajo programados = 5
N° Trabajadores en la semana = 46
% de ausentismo = 8,26%
Es así como se evidencia que el 8,26% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El contratista realizó inducción al personal que ingreso a laborar en el periodo del presente informe donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la SST, condiciones de salud y medicina laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de EPP, Matriz de peligros entre otros.
- El contratista hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo
- El Contratista realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingreso a laborar al contrato COP 621-2022, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra.
- El Contratista mediante comunicación KN0E22-621-849 remite Informe semanal 43 del 27 de julio de 2023 al 2 de agosto de 2023 Componente SST. Sin embargo este ya había sido revisado por la Interventoría, teniendo en cuenta que fue insumo para el informe semanal SST del Consorcio SCLV.
- El Contratista en cumplimiento del cronograma de actividades SG-SST realizó capacitación estilo de vida saludable, campaña cuidado de manos y capacitación en riesgo biológico.
- El Contratista realizó acompañamiento a la capacitación sobre el buen trato a la mujer desarrollada por parte de la alcaldía local de Kennedy.
- El Contratista realizo cerramiento de áreas de trabajo y elaboración de escalones para garantizar el ingreso a las viviendas y seguimiento y revisión al uso adecuado de la dotación y EPP de todo el personal vinculado al contrato de obra.

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

- Se evidencia que durante el periodo el contratista, continua con la Atención del punto PAC en el horario de lunes a viernes de 8.00 am a 4.00 pm, así como la línea telefónica y correo electrónico.
- El 3 de agosto de 2023 se recibió mediante correo electrónico el derecho de petición No 5 del señor Diego López Montaro quien solicita *"1.se me allegue de manera digital y/o física el soporte de paz y salvo del contrato adjunto al presente correo, con el fin de verificar la autenticidad del documento en mención; lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no he firmado ningún documento* que acredite que la firma Xie s.a. se encuentra *a paz y salvo 2. se me indique porque la alcaldía a dado tramite a los pagos del contratista sin encontrarse a paz y salvo"* El cual se trasladó al contratista quien a su vez lo remite al área administrativa de la compañía para tramite de respuesta. Se encuentra abierto dentro de los días hábiles para dar cierre
- Se realizó recorrido urbano el 8 de agosto en las prioridades 28,29,24,25,22,21,13,14, 3, 17,18,4,32, 33, 31, 32 ,12,15,16,26,27,8,9 y 20. Se verificó la actualización de vallas informativas móviles y de los puntos satélites de información.
- En visita al punto de atención al ciudadano se revisó y firmó soportes de la gestión social y se actualizo la bitácora social.

4.2 Programa de acompañamiento técnico

- Levantamiento de 10 actas de compromisos sociales en el tema de custodia de medidores polo a tierra o cajillas de contador que son entregados al propietario o persona encargada de las prioridades 16 y 27, del 2 al 8 de agosto
- Levantamiento de 26 actas de vecindad en la prioridad 42 del tramo de la carrera 95 A desde la calle 42 B sur hasta la calle 42 f sur del 2 de al 08 de agosto.
- Se realizo el cierre de un acta de compromiso en el tema de afectación de espacio público en la prioridad 14.

4.3 Programa de cultura ciudadana

- Se revisó y aprobó por parte de la interventoría la metodología para la capacitación a personal de obra en el tema trabajo en equipo

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

- Se cumple con el porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de la localidad y de contratación de mujeres de acuerdo a lo requerido por la minuta del contrato.
- Se recibieron 2 hojas de vida en el punto de atención al ciudadano.
- Se realizo acompañamiento a capacitación a personal de obra realizada por el FDLK

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Durante este periodo se divulgaron las siguientes piezas informativas:

- Se entregaron 13 Volantes # 82 de convocatoria a actas de vecindad , predio a predio en la prioridad 34
- Se entregaron 19 Volantes # 92 de inicio de construcción de malla vial, predio a predio en la prioridad 20.
- Se instaló 1 volante #92 de inicio de construcción de malla vial en el punto satélite de información de la prioridad 20
- Se instaló 1 volante #99 de recolección de basuras en el punto satélite de información de la prioridad 20
- Se entregaron 19 Volantes # 101 de convocatoria de actas de vecindad, predio a predio en la prioridad 35
- Se instaló 1 afiche de inicio de obra en el punto satélite de información de la prioridad 20.
- Se instaló 1 volante de inicio de obra en el punto satélite de información de la prioridad 20.
- Se instaló 1 volante PMT #6 en el punto satélite de información de la prioridad 20.
- Se instalaron 2 vallas informativas móviles en la prioridad 20.
- El 3 agosto se realiza la instalación de 1 punto satélite de información en - Carrera 97F 42-14 Sur Luvin Rengifo (prioridad 20)
- El porcentaje de avance de obra es el 36% y faltan 56 días para terminación de las mismas el cual fue registrado en las vallas informativas móviles.

4.7 Comités

- Se participó en el comité interno No 36, el 2 de agosto a través de la plataforma teams a las 2 p.m
- Se realizó el comité de seguimiento social No 43 en el punto de atención al ciudadano, el 8 de agosto.

4.8 Otros

- Se radicó por parte de la interventoría el comunicado U233-G1-614-23 de asunto: apremio por falencias en la divulgación e información de la comunidad, el 4 de agosto.
- Se revisó el informe mensual No 10 versión 0 y se proyecto memorando No 065 de observaciones, el 8 de agosto.
- Se revisó el informe semanal No 44 versión 0, al cual se hicieron observaciones, el 8 de agosto.
- La calificación de la gestión social para este periodo 2 al 8 de agosto, es de 100%.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los nueve (Día en letras) 9 (Día en número)

días del mes de agosto (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Cordialmente, Juan Manuel Silva Rojas
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 44 **DEL** 3 de agosto de 2023 **AL** 9 de agosto de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No.18- 8000839
Localización: KR 97F entre CL 40a SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 2.

CIV: No.13 - 8000772
Localización: KR 98 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 3.

CIV: No.28 - 8000929
Localización: KR 97 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 4.

CIV: No.29 - 8000996
Localización:KR 97 entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 5.

CIV: No.25 - 8000923.
Localización: KR 97B entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 6.

CIV: No.17 - 8000794.
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 7.

CIV: No.3 - 8000957
Localización: KR 97A entre CL 41 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 8.

CIV: No.14 - 8000794
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Instalación de monoblock PD200 costado oriente 9ML.



Descripción Foto 9.

CIV: No.32 - 8000979.
Localización: KR 96A entre CL 40 SUR y CL 40 BIS SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 10.

CIV: No.24 - 8000871.
Localización: KR 97B entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 11.

CIV: No.27 - 8001052
Localización: KR 97B entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Instalación de fresado en anden



Descripción Foto 12.

CIV: No.33 - 80001041.
Localización: KR 96A entre CL 40A SUR y CL 40B SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 13.

CIV: No.30 - 8001058
Localización: KR 97 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 14.

CIV: No.31 - 8001125.
Localización: KR 97 entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción:Instalación de concreto de 3000psi para acceso peatonal.



Descripción Foto 15.

CIV: No.12 - 8000849
Localización: KR 98B entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Acabados en cajas de inspección.



Descripción Foto 16.

CIV: No.15 - 8000856.
Localización: KR 98 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Instalación de bordillo A-80 provisional como formaleta.



Descripción Foto 17.

CIV: No.21 - 8000821
Localización: KR 97D entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Instalación de tapa para cámara de Movistar.



Descripción Foto 18.

CIV: No.4 - 8001069
Localización: KR 96A entre CL 41 SUR y CL 40b SUR
Descripción: Sin actividad

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 19.

CIV: No.16 - 8000907
Localización: KR 98 entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Demolición manual de andenes costado oriente



Descripción Foto 20.

CIV: No.26 - 8000988
Localización: KR 97B entre CL 41 SUR Y 42 SUR
Descripción: Nivelación y compactación de fresado



Descripción Foto 21.

CIV: No.8 - 8002417
Localización: KR 91C entre CL 42F SUR y CL 42G SUR
Descripción: Excavación parcial para instalación de sumidero.



Descripción Foto 22.

CIV: No.9 - 8002500
Localización: KR 91C entre CL 42G SUR y CL 43 SUR
Descripción: Instalación de geo-celda en calzada



Descripción Foto 23.

CIV: No.22 - 8000864
Localización: KR 97D entre CL 41A SUR Y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



CIV: No.20 – 8000938
Localización: KR 97F entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Instalación de geo-celda y geotextil en calzada.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

nueve (9) días del mes de agosto de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Juan Manuel Alba Roja

Director de Interventoría.

Nombre de la firma interventora


CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 1

SEGUIMIENTO AL 8-AGOSTO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
28	8000929	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 245.857.650,18	2,03%	70,30%	-0,33%
29	8000996	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 230.017.742,59	1,90%	83,06%	-0,10%
24	8000871	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 316.914.989,22	2,61%	112,19%	0,39%
25	8000923	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 253.700.358,60	2,09%	63,64%	-0,76%
13	8000772	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 289.278.735,33	2,39%	96,84%	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 287.652.796,01	2,37%	67,11%	-1,05%
17	8000794	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 212.241.939,90	1,75%	58,06%	-0,77%
18	8000839	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 220.730.067,11	1,82%	49,62%	-1,60%
21	8000821	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 303.048.993,63	2,50%	76,54%	-0,63%
22	8000864	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 364.765.653,33	3,01%	76,80%	-0,35%
3	8000957	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 235.659.349,31	1,94%	67,92%	-0,73%
33	8001041	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 111.414.226,25	0,92%	67,71%	-0,31%
4	8001069	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 99.191.898,48	0,82%	53,95%	-0,45%
16	8000907	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 30.369.182,96	0,25%	8,02%	-2,73%
15	8000856	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 78.952.072,73	0,65%	24,77%	-1,95%
26	8000988	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 120.531.465,90	0,99%	38,62%	-1,06%
32	8000979	$ 384.241.540,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 91.553.491,94	0,75%	23,83%	-0,50%
30	8001058	$ 167.606.525,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 131.948.964,49	1,09%	78,73%	-1,44%
31	8001125	$ 347.840.618,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 118.681.697,32	0,98%	34,12%	-1,45%
27	8001052	$ 394.454.974,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 65.199.339,13	0,54%	16,53%	-2,63%
12	8000849	$ 353.440.216,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 86.238.897,70	0,71%	24,40%	-2,73%
8	8002417	$ 436.309.464,00	$ 433.765.201,90	3,58%	$ 48.698.543,10	0,40%	11,16%	-3,17%
9	8002500	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 41.319.887,58	0,34%	12,11%	-2,39%
23	8000916	$ 389.375.082,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,81%
5	8000655	$ 464.716.467,00	$ 454.907.485,31	3,75%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,75%
40	8011953	$ 462.079.926,00	$ 365.568.885,80	3,01%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,01%
10	8011960	$ 492.144.459,00	$ 380.184.171,31	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
35	8000743	$ 769.586.187,00	$ 16.265.658,50	0,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,13%
7	8000736	$ 492.144.459,00	$ 341.701.258,16	2,82%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,82%
2	8001595	$ 338.872.088,69	$ 111.224.258,09	0,92%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,92%
39	8000584	$ 443.145.175,39	$ 0,00	0,00%				0,00%
34	8000709	$ 220.339.030,13	$ 0,00	0,00%				0,00%
35	8000743	$ 291.903.288,68	$ 0,00	0,00%				0,00%
39	8000584	$ 443.145.176,00	$ 102.682.769,76	0,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,85%
6	8000977	$ 384.241.540,00	$ 313.656.771,99	2,59%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,59%
20	8000938	$ 394.454.974,00	$ 379.247.233,34	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
1	8000687	$ 461.620.649,00	$ 347.281.591,43	2,86%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,86%
TOTALES			**$ 10.382.831.070,01**	**85,61%**	**$ 3.983.967.942,80**	**32,85%**		**-52,76%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					

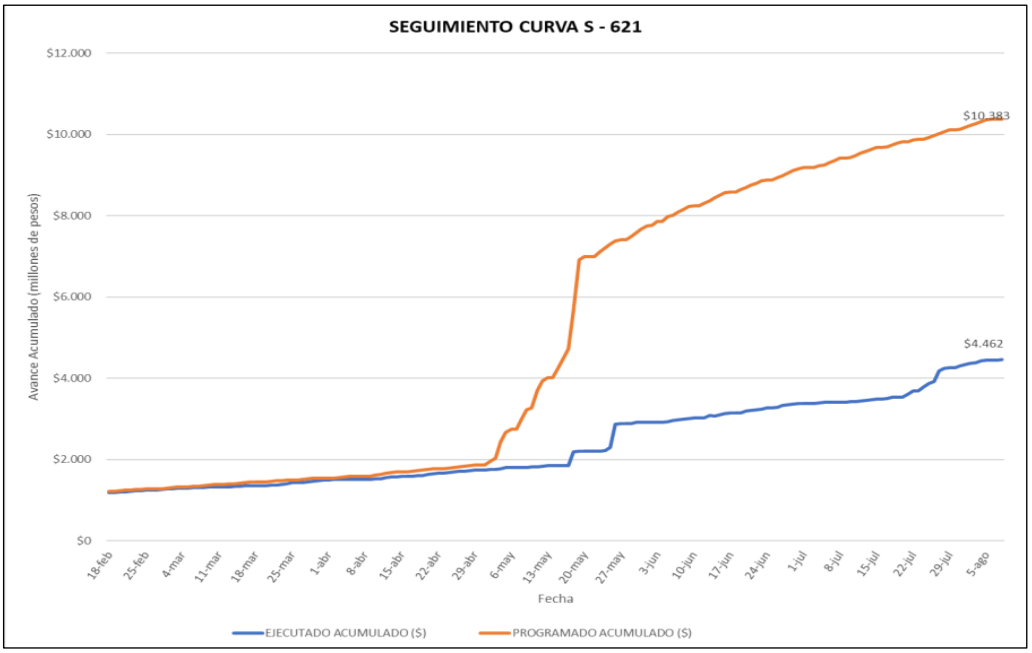



CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN POR CIV

FECHA EVALUACIÓN			11-jul	18-jul	25-jul	1-ago	8-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	37,44%	37,96%	54,33%	70,30%	70,30%
29	8000996	$ 276.918.878,00	60,12%	60,69%	61,86%	83,06%	83,06%
24	8000871	$ 282.489.045,00	100,66%	100,66%	111,85%	112,19%	112,19%
25	8000923	$ 398.643.978,00	55,03%	55,03%	63,64%	63,64%	63,64%
13	8000772	$ 298.711.275,00	62,10%	62,63%	89,76%	89,76%	96,84%
14	8000814	$ 428.629.368,00	60,68%	60,90%	60,90%	66,60%	67,11%
17	8000794	$ 365.563.428,00	52,80%	58,06%	58,06%	58,06%	58,06%
18	8000839	$ 444.842.291,00	49,11%	49,62%	49,62%	49,62%	49,62%
21	8000821	$ 395.944.862,00	57,57%	58,49%	68,37%	76,54%	76,54%
22	8000864	$ 474.960.513,00	69,89%	69,89%	76,45%	76,80%	76,80%
3	8000957	$ 346.941.971,00	58,61%	58,61%	67,92%	67,92%	67,92%
33	8001041	$ 164.541.658,00	65,34%	67,71%	67,71%	67,71%	67,71%
4	8001069	$ 183.856.740,00	39,81%	40,74%	40,74%	53,95%	53,95%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,80%	8,02%
15	8000856	$ 318.778.666,00	18,01%	18,37%	19,44%	21,71%	24,77%
26	8000988	$ 312.106.601,00	23,78%	26,55%	30,16%	34,04%	38,62%
32	8000979	$ 384.241.540,00	16,76%	17,44%	17,44%	20,60%	23,83%
30	8001058	$ 167.606.525,00	66,87%	78,73%	78,73%	78,73%	78,73%
31	8001125	$ 347.840.618,00	27,00%	32,13%	32,70%	33,02%	34,12%
27	8001052	$ 394.454.974,00	11,09%	13,04%	13,13%	15,58%	16,53%
12	8000849	$ 353.440.216,00	15,97%	19,37%	23,96%	24,21%	24,40%
8	8002417	$ 436.309.464,00	0,00%	0,00%	0,00%	7,37%	11,16%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	12,11%

FECHA EVALUACIÓN			8-ago
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	0,00%
29	8000996	$ 276.918.878,00	0,00%
24	8000871	$ 282.489.045,00	0,00%
25	8000923	$ 398.643.978,00	0,00%
13	8000772	$ 298.711.275,00	7,08%
14	8000814	$ 428.629.368,00	0,51%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	0,00%
21	8000821	$ 395.944.862,00	0,00%
22	8000864	$ 474.960.513,00	0,00%
3	8000957	$ 346.941.971,00	0,00%
33	8001041	$ 164.541.658,00	0,00%
4	8001069	$ 183.856.740,00	0,00%
16	8000907	$ 378.482.383,00	0,23%
15	8000856	$ 318.778.666,00	3,06%
26	8000988	$ 312.106.601,00	4,57%
32	8000979	$ 384.241.540,00	3,23%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	1,10%
27	8001052	$ 394.454.974,00	0,95%
12	8000849	$ 353.440.216,00	0,19%
8	8002417	$ 436.309.464,00	3,79%
9	8002500	$ 341.127.565,00	11,94%

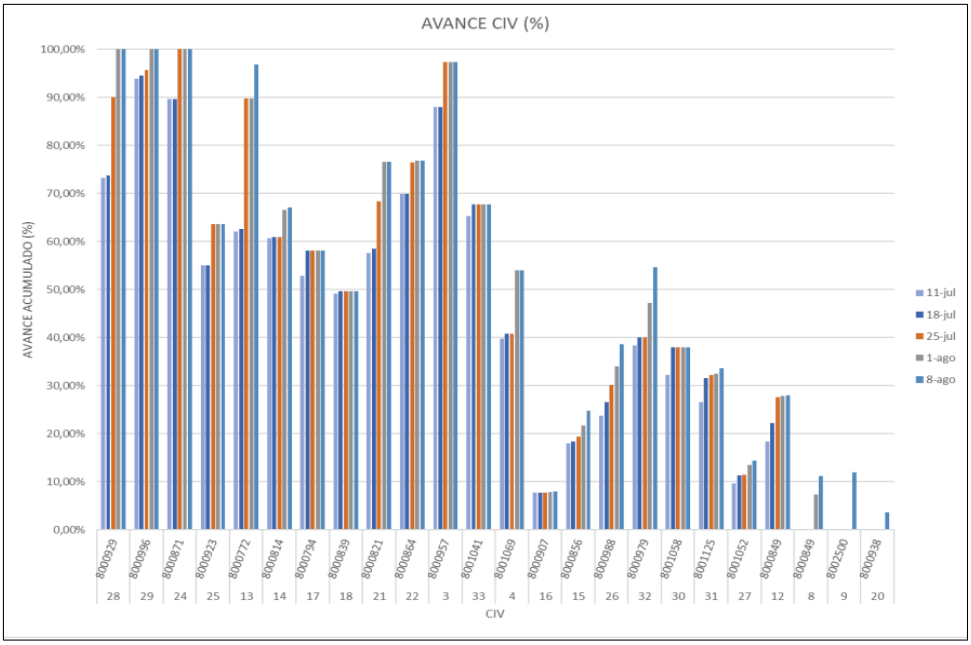

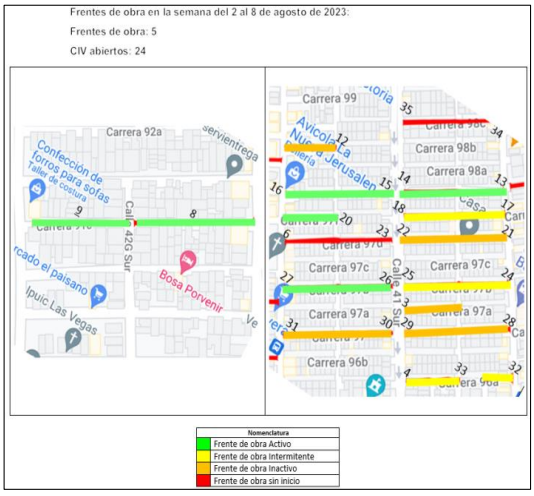

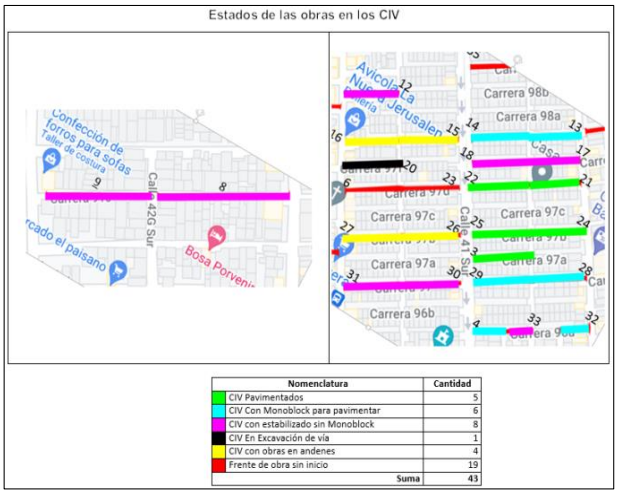

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 1 - CONTRATO COP-621-22
CONTRATISTA XIE S.A.

Periodo **3 de agosto al 8 de agosto de 2023**

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	82,65%	85,61%	82,65%
%Ejecutado	35,85%	32,85%	17,52%
%Desviación	-46,81%	-52,76%	-65,13%
