FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 45 (Número de semana) **DEL** 10 de agosto de 2023 (dd/mm/aa) **AL** 16 de agosto de 2023 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 717 de 2022 (Número del contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número del contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

CONTRATISTA XIE SA **NIT** 830061684-1 (Nombre de la persona natural o jurídica)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV **NIT** 900547145 (Nombre de la persona natural o jurídica)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 19.627.175.114,00	Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022	Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	4
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ** (Nombre completo del supervisor del contrato de obra)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: **ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO** (Nombre completo del profesional de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Número de radicado otorgado en ORFEO) **de fecha** (dd/mm/aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
CALZADA CIV	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43
TOTALES	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,53%	2,53%	Trabajo Ejecutado	7,21%	7,21%	4,68%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%	Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -	Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRÁFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,18%	1,10%
10	2,31%	1,10%
11	2,42%	7,21%
12	2,53%	7,21%
13	3,47%	7,21%
14	4,68%	8,25%
15	6,10%	8,39%
16	6,10%	9,00%
17	8,97%	9,63%
18	11,45%	10,42%
19	13,67%	10,61%
20	16,42%	11,38%
21	11,03%	10,73%
22	11,48%	10,73%
23	11,93%	10,73%
24	12,38%	10,73%
25	12,75%	10,73%
26	13,13%	10,73%
27	13,66%	10,73%
28	15,73%	10,73%
29	16,77%	10,73%
30	17,27%	10,71%
31	26,08%	10,71%
32	35,83%	10,71%
33	41,55%	10,71%
34	44,68%	10,71%
35	46,47%	10,71%
36	48,50%	17,52%
37	48,50%	17,52%
38	50,50%	17,52%
39	52,50%	17,52%
40	75,12%	17,52%
41	77,04%	17,52%
42	78,75%	17,52%
43	80,88%	17,52%
44	82,65%	17,52%
45	84,72%	40,64%

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
Estudios y Diseños Proram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Elecutado (m2)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Meta Física Proramada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%	
Meta Física Proramada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
Meta Física Proramada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%	0%
Meta Física Proramada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%	
Meta Física Proramada (%)				Meta Física Ejecutada (%)				
AVANCE PROJECT								%Atraso /%Avance
Avance Proramado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%			0%
Avance Proramado Mantenimiento oeródico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento oeródico	0%			0%
Avance Proramado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%			0%
Avance Proramado Mantenimiento Reconstrucción	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%			0%
Avance Proramado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%			0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

														INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERF	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Estado	Fecha de inicio programada	Motivos por los cuales no ha iniciado	Acciones		
1	8000687	156049	29664	29665	KR 98B BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	46,42	6	CALZADA	4,2	91,12	382,69	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT			
2	8001035	156010	29588	29589	KR 95A	CL 42F SUR	CL 42G SUR	50,07	6	CALZADA	3,72	76,75	285,18	Sin iniciar	4-jul-23	SIN PMT			
3	8000957	156201	29896	29897	KR 97A	CL 41 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,53	67,8	307,36	SIN ACTIVIDADES	28-mar-23				
4	8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	47,61	6	CALZADA	4,35	34,72	150,9	Cabada: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock por ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividades	24-feb-23				
5	8000655	156051	29668	29669	KR 98C BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	47,12	6	CALZADA	3,86	90,24	347,99	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT			
6	8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	47,61	6	CALZADA	5,07	65,69	333,12	Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geo-celda, geotextil y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	16-dic-22				
7	8000736	156045	29656	29657	KR 98	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	4,04	93,14	376	Sin iniciar	23-may-23	SIN PMT			
8	8000417	155940	29448	29449	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	29,9	6	CALZADA	2,57	88,02	226,36	SIN ACTIVIDADES	27-abr-23				
9	8002500	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	29,41	6	CALZADA	2,54	69,79	177,24	SIN ACTIVIDADES	4-may-23				
10	8011960	156950	30692	30983	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	6	CALZADA	2,93	136,9	401,1	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT			
11	8011955	156945	30972	30973	KR 97A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	1	CALZADA	4,38	140,7	616,78	Sin iniciar	No se tiene				
12	8000849	156231	29956	29957	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,07	62,44	316,88	Calzada: Instalación de solado 1500psi de base para sumideros y re nivelación de pozos. Andén oriental: Instalación de concreto MR41 para rampa acceso vehicular. Andén occidental: Sin actividad	21-abr-23				
13	8000772	156220	29934	29935	KR 98	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,54	56,87	201,43	SIN ACTIVIDADES	16-ene-23				
14	8000814	156221	29936	29937	KR 98	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,54	67,69	307,42	Calzada: Instalación de cargue de pozo, de tubería corrugada 12" de pozo a sumidero y de arena de pella para recubrimiento de tubería. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	20-ene-23				
15	8000856	156222	29938	29939	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	46,42	6	CALZADA	4,61	67,45	310,79	Cabada: Instalación de bordillo A-80 en ambos costados y excavación manual para sumideros. Andén oriental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal y de bordillo A-80. Andén occidental: Instalación de fresado 2da capa en anden, de bordillo A-80 y de concreto 3000psi para acceso peatonal.	9-mar-23				
16	8000907	156223	29940	29941	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,81	64,09	308,44	Cabada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geotextil y de fresado. Andén occidental: Demolición de concreto y excavación manual.	2-mar-23				
17	8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,93	58,12	228,25	SIN ACTIVIDADES	26-ene-23				
18	8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	3,86	67,37	260,04	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.	2-feb-23				
19	8000583	156052	29670	29671	KR 99A BIS	CL 38C SUR	CL 38 SUR	47,12	6	CALZADA	4,66	80,91	376,93	Sin iniciar	No se tiene				
20	8000938	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,62	64,75	299,09	Calzada: Instalación de geotextil, geo-celda y fresado, nivelación y compactación de fresado en geo-celda, instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	29-dic-22				
21	8000821	156212	29918	29919	KR 97D	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,16	59,22	246,61	SIN ACTIVIDADES	8-feb-23				
22	8000864	156213	29920	29921	KR 97D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,05	67,76	274,11	SIN ACTIVIDADES	14-feb-23				
23	8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,42	67,76	299,83	Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geotextil, geo-celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	22-dic-23				
24	8000871	156204	29902	29903	KR 97B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,1	6	CALZADA	4,45	60,94	271,42	SIN ACTIVIDADES	4-ene-23				
25	8000923	156205	29904	29905	KR 97B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,92	67,68	332,77	SIN ACTIVIDADES	10-ene-23				
26	8000988	156206	29906	29907	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,32	68,54	295,77	Cabada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal y de bordillo A-80. Andén occidental: Instalación de fresado y de bordillo A-80.	15-mar-23				
27	8001052	156207	29908	29909	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,12	66,41	340,23	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación y compactación de fresado. Andén occidental: Instalación de fresado, nivelación y compactación de fresado.	22-mar-23				
28	8000929	156196	29886	29887	KR 97	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,95	6	CALZADA	4,2	63,56	266,84	Calzada: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock por ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	5-dic-22				
29	8000996	156197	29888	29889	KR 97	CL 40A SUR	CL 41 SUR	47,26	6	CALZADA	4,24	67,58	286,62	Cabada: Instalación monoblock PO100. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	12-dic-22				
30	8001058	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,12	66,8	274,89	SIN ACTIVIDADES	10-abr-23				
31	8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	50,91	6	CALZADA	5,14	68,89	354,19	Cabada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en fachada parte inferior. Andén occidental: Remates en fachada parte inferior.	3-abr-23				
32	8000979	156186	29866	29867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	49,66	6	CALZADA	5,14	34,54	177,45	Cabada: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock por ambos costados. Andén oriental: Remates en cajas de inspección. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.	15-abr-23				
33	8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	48,3	6	CALZADA	5,11	32,2	164,5	Cabada: Instalación de monoblock costado oriente. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	20-feb-23				
34	8000709	156232	29958	29959	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,09	53,43	218,4	Sin iniciar	10-ago-23				
35	8000743	156233	29960	29961	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,68	67,2	314,77	Sin iniciar	27-jul-23	SIN PMT			
36	8000619	156053	29672	29673	KR 99A BIS	CL 40 SUR	CL 38 C SUR	47,12	6	CALZADA	4,78	90,92	434,69	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
37	8011974	156971	31024	31025	CL 42A BIS SUR	KR 94A	KR 95	29,9	6	CALZADA	2,52	81,18	204,44	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
38	8011973	156970	31022	31023	CL 42A BIS SUR	KR 93C	KR 94A	29,9	6	CALZADA	2,18	89,41	194,58	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
39	8000584	156058	29682	29683	KR 99C BIS	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	3,87	85,64	331,62	Sin iniciar	10-jul-23	SIN PMT			
40	8011953	156943	30968	30969	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	65,55	6	CALZADA	3,13	143,02	448,03	Sin iniciar	2-may-23	SIN PMT			
41	8011950	156942	30966	30967	KR 95B	CL 42B SUR	CL 42F SUR	29,06	6	CALZADA	3,94	81,9	322,33	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
42	8011949	156941	30964	30965	KR 95A	CL 42B SUR	CL 42F SUR	27,35	6	CALZADA	3,28	83,12	272,55	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
43	8002595	155838	29246	29247	CL 42B SUR	KR 91	KR 90A BIS	33,9	6	CALZADA	3,04	104,89	319,35	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1. COMPONENTE TÉCNICO:

1.1. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA

• Calificación diaria del PMT instalado acorde con la aprobación de la SDM, la calificación para el presente período es de 89%
• Mesas de trabajo internas con el director de Interventoría para definir los lineamientos de revisión de documentos del contratista. Coordinación con las áreas SST, Social y Ambiental, para la elaboración de los documentos entregados por la Interventoría en el Periodo.
• Elaboración de memorandos para comunicaciones internas y otras dirigidas al Contratista con los productos revisados en el periodo.
• Revisión de los informes diarios de inspección y memorias de cálculo de las cantidades de obra, diligenciamiento de la bitácora.
• Reporte diario de cantidades para el seguimiento de la programación
• Revisión y aprobación del informe de cuenta del contratista, del periodo No. 9 correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023.
• Revisión y aprobación del informe mensual técnico del contratista No 9 , del periodo correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023.
• Elaboración del informe mensual de Interventoría No.9 correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023.
• Mesa de trabajo el 14 de agosto de 2023, para revisión de APU-NP.

1.2 Seguimiento a las actividades del contratista

La Interventoría realizó el seguimiento de:

• **P4:**Calzada: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock por ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividades
• **P32:**Calzada: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock por ambos costados. Andén oriental: Remates en cajas de inspección. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.
• **P33:**Calzada: Instalación de monoblock costado oriente. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P28:**Calzada: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock por ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P29:**Calzada: Instalación monoblock PD100. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P24:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
• **P25:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P21:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P22:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P3:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P13:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P14:**Calzada: Instalación de cargue de pozo, instalación de tubería corrugada 12 pulgadas de pozo a sumidero, instalación de arena de peña para recubrimiento de tubería. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P17:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P18:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en cajas de inspección. Andén occidental: Remates en cajas de inspección.
• **P30:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
• **P31:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Remates en fachada parte inferior. Andén occidental: Remates en fachada parte inferior.
• **P12:**Calzada: Instalación de solado 1500psi de base para sumideros, se inicia re nivelación de pozos. Andén oriental: Instalación de concreto MR41 para rampa acceso vehicular. Andén occidental: Sin actividad.
• **P15:**Calzada: Instalación de bordillo A-80 y excavación manual para sumideros. Andén oriental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal y de bordillo A-80. Andén occidental: Instalación de fresado 2da capa en anden, de bordillo A-80 y de concreto 3000psi para acceso peatonal.
• **P16:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geotextil y de fresado. Andén occidental: Demolición de concreto y excavación manual.
• **P26:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal y de bordillo A-80. Andén occidental: Instalación de fresado y de bordillo A-80.
• **P27:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Nivelación y compactación de fresado. Andén occidental: Instalación de fresado, nivelación y compactación de fresado.
• **P8:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P9:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P20:**Calzada: Instalación de geotextil, geo-celda y fresado, nivelación y compactación de fresado en geo-celda, instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P23:**Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geotextil, geo-celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P6:**Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica, nivelación y compactación de sub-rasante, instalación de geo-celda, geotextil y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Revisión de la preacta de obra No. 10 correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2023.
• Participación del comité de seguimiento No 46.
• Seguimiento de las actividades que ejecute el Contratista en obra.
• Diligenciamiento de bitácora, revisión y aprobación de los informes diarios del inspector y calificación semanal del PMT.
• Evaluación diaria de cantidades para la respectiva evaluación de la programación

2. COMPONENTE AMBIENTAL

• El 9 de agosto, se realizo el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.
• El 15 de agosto, se realiza el comité de seguimiento ambiental y SST, llevado a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones alusivas al cerramiento ambiental y senderos peatonales, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros y se recalca sobre la calidad en la ejecución y presentación de los informes mensuales a la interventoría.
• Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 99,08% en todos los ítems de las fichas de seguimiento ambiental y SST. La calificación fue afectada por el orden, aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra.
• En la presente semana se dispuso 615m3 de material de excavación, con el gestor LAMD
• Se continua con el uso del material fresado, para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU 0m3 y de la Unidad de Mantenimiento vial: 93,58m3.
• Se utilizó concreto premezclado para los anclenes de la vía, en la semana se utilizaron 39m3.
• En la presente semana, no se utilizó asfalto para las diferentes prioridades,
• Se realiza la revisión del correspondiente informe semanal del contratista, se generan observaciones y una vez subsanadas, se da aprobación mediante correo electrónico a la residente ambiental del contratista.

El Contratista realizó las siguientes actividades:

• Recorrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 Y ACOPIO para verificar en obra que se esté cumpliendo con lo establecido en el MAO.
• Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
• Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
• Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20 y acopio.
• Inducción ambiental y socialización de política integral.
• Comité de seguimiento.
• Recolección de material escombro.
• Delimitación de senderos peatonales en P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27.
• Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.
• Cerramiento a los CIV P6 y P23.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
0	1. Consorcio SCLV = 23 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Vialidad Limitada = 13 4. Cerse Ingeniería Ltda = 1 5. J.V.R Estudios = 1 6. Geovial Limitada = 5	0	53

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 10 de agosto de 2023 al 16 de agosto de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría.

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El 11 de agosto de 2023 se realizó comité de seguimiento semanal en el FDLK, donde el componente SST revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
• El 15 de agosto de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
• Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

P52: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P53: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P4: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P28: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P29: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P30: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P31: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P5: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P24: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P25: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P26: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P27: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P21: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P22: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P23: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P6: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P17: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P18: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P20: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P13: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P14: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P15: Arreglo de cajas de inspección. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual. Se solicitó revisar los plafones ya que están descubiertos y deben ser señalizados.
P16: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P12: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P8: No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. Se solicitó revisar los plafones instalados ya que están inestables.
P9: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
• A nivel general se observa que la mayoría de frentes de obra están sin actividades dado que los trabajadores se encuentran parados y manifiestan que es por falta de pago. De igual manera se observó que se requiere orden, aseo y limpieza en las diferentes prioridades intervenidas. Por lo anterior se realizó comité de seguimiento Ambiental-SST presencial, donde se revisó la gestión SST y las actividades que ejecuto el contratista en la semana y se realizó registro en el formato FOAC 32.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 10 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con el personal información sobre estilos de vida saludables como prevenir hiper e hipoglucemias
• El 11 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares
• El 14 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de SST socializó con el personal información sobre estilos de vida saludables enfocado en la hidratación, ya que esta va de la mano con la salud, pues beber agua permite al cuerpo el correcto funcionamiento de los órganos, células, articulaciones, músculos, entre otros
• El 16 de agosto de 2023 se realizó comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
• Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
INGCONOR SAS = 2	1. XIE S.A = 46 2. NOVA TOPOSMAR S.A.S = 8 3. PLANEACIÓN EN INGENIERÍA S.A.S = 1 4. JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S = 1 5. DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S = 1 6. JOSE ARGEON MORA SERRANO = 11 7. R.A.C PETREOS S.A.S = 1 8. INFASUELC LTDA = 2 9. INGCONOR S.A.S = 5 10. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 19 11. AGL CONSTRUCCION SAS = 12 12. Construcciones Obras Civiles y Transportes SAS = 1	1. XIE SA = 1 2. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 1	112

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 10 de agosto de 2023 al 16 de agosto de 2023, el contratista reportó el ausentismo de 57 trabajadores.
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 10 de agosto de 2023 al 16 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de días de ausencia = 85
N° de días de trabajo programados = 6
N° Trabajadores en la semana = 44
% de ausentismo = 32,20%
Es así como se evidencia que el 32,20% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El contratista realizó inducción al personal que ingreso a laborar en el periodo del presente informe donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la SST. Condiciones de salud y medicinal laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de EPP; Matriz de peligros entre otros.
• El contratista hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo
• El Contratista realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingreso a laborar al contrato COP 621-2022, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra.
• El Contratista mediante comunicación KNXE23-621-863 remite Informe semanal 44 del 3 al 9 de agosto de 2023 Componente SST. Sin embargo este ya había sido revisado por la Interventoría, teniendo en cuenta que fue insumo para el informe semanal SST del Consorcio SCLV.
• El Contratista en cumplimiento del cronograma de actividades SG-SST realizó inspección de EPP, del Kit de emergencia, capacitación investigación de accidente e incidente análisis de causas (COPASST), identificación de sustancias químicas, capacitación levantamiento carga y posturas
• El Contratista realizo cerramiento de áreas de trabajo y elaboración de escalones para garantizar el ingreso a las viviendas y seguimiento y revisión al uso adecuado de la dotación y EPP de todo el personal vinculado al contrato de obra

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• Se evidencia que durante el periodo el contratista, continua con la Atención del punto PAC en el horario de lunes a viernes de 8.00 am a 4.00 pm, así como la línea telefónica y correo electrónico.
• El 15 de agosto del 2023 se realizó seguimiento al derecho de petición No 5 del señor Diego López quien solicita *"1.se me allegue de manera digital y/o física el soporte de paz y salvo del contrato adjunto al presente correo, con el fin de verificar la autenticidad del documento en mención; lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no he firmado ningún documento que acredite que la firma Xie a.,se encuentra a paz y salvo 2. se me indique porque la señalla a dado frente a los pagos del contratista sin encontrarse a paz y salvo"* Respecto al cual el área administrativa de la compañía informa que se encuentra para trámite de respuesta por parte del área jurídica. Se encuentra abierto dentro de los días hábiles para dar cierre.
• El 15 de agosto se recibió la PQRSD No 23 interpuesta por la señora María Pérez informa que el medidor del agua de su predio se encuentra ubicado en el predio colindante, solicita que al realizar la intervención de espacio público, sea ubicado en su predio. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles establecidos para el cierre.
• Se realizó recorrido urbano el 15 de agosto en las prioridades 28,29,24,25,22,21,13,14, 3, 17,18,4,32, 33, 31, 32, 12, 15, 16,26,27,8,9 y 20. Se solicito actualizar volantes de inicio de malla vial e inicio de espacio publico por encontrarse incumplidos en las prioridades 28,29,17, 18,13,14,4,32,33,30 y31.
• Fin visita al punto de atención al ciudadano se revisó y firmó soportes de la gestión social y se actualizo la bitácora social.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• Se recibió por parte del contratista la presentación para el comité FDLK No 8.

4.3 Programa de acompañamiento técnico

• Levantamiento de 3 actas de compromisos sociales en el tema de custodia de medidores polo a tierra o cajillas de contador que son entregados al propietario o persona encargada de la prioridad 15, del 9 al 15 de agosto.
• Levantamiento de 26 actas de vecindad en la prioridad 42 del tramo de la carrera 95 A desde la calle 42 B sur hasta la calle 42 f sur del 9 de al 15 de agosto.
• Levantamiento de 6 actas de vecindad en la prioridad 34 del tramo de la carrera 98 C desde la calle 40 a sur hasta la calle 40 A sur del 9 de al 15 de agosto.
• Levantamiento de 19 actas de vecindad en la prioridad 35 del tramo de la carrera 98 C desde la calle 40 A sur hasta la calle 41 sur del 9 de al 15 de agosto.
• Levantamiento de 10 actas de vecindad en la prioridad 19 del tramo de la carrera 95 A desde la calle 42 B sur hasta la calle 42 F sur del 9 de al 15 de agosto
• Se realizo entrega de 141 copias de actas de vecindad a la comunidad de las prioridades1, 2,37,38,39,43 del 9 al 15 de agosto.
• Se realizó entrega de 20 de copias de actas de compromiso a la comunidad de las prioridades 8 y 9 del 9 al 15 de agosto.

4.4 Programa de cultura ciudadana

• Se aprobó la metodología para la capacitación a personal de obra.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

• Se cumple con el porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de la localidad y de contratación de mujeres de acuerdo a lo requerido por la minuta del contrato.
• Se recibieron 6 hojas de vida en el punto de atención al ciudadano

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

• El 10 agosto se realiza la instalación de 2 puntos satélites de información en: - Calle 42 A Sur # 97 C-16 Martha Velázquez (prioridad 23) - Carrera 97 D # 41-61 Sur Flor Alba Rojas (prioridad 6)
• El porcentaje de avance de obra es el 36% y faltan 49 días para terminación de las mismas el cual fue registrado en las vallas informativas móviles.

4.7 Comités

• Se participó en el comité interno No 37, el 9 de agosto a través de la plataforma teams a las 2 p.m.
• Se realizó el comité de seguimiento social No 44 en el punto de atención al ciudadano, el 15 de agosto.

4.8 Otros

• Se aprobó por parte de la interventoría el volante # 67 de inicio de espacio público versión 3 el 10 de agosto.
• Se aprobó por parte de la interventoría el volante # 57 de inicio de obra versión 3 el 10 de agosto
• Se aprobó por parte de la interventoría el volante # 58 de inicio de obra versión 2 el 11 de agosto
• Se aprobó por parte de la interventoría el volante #31 de inicio de obra el 11 de agosto.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los diecisés (Dia en letras) días del mes de agosto (Mes en letras) de 2023 (Año en letras del informe)

16 (Dia en numeros)

Juan Manuel Silva Rojas
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 45 **DEL** 10 de agosto de 2023 **AL** 16 de agosto de 2023


CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No.18- 8000839
Localización: KR 97F entre CL 40a SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad

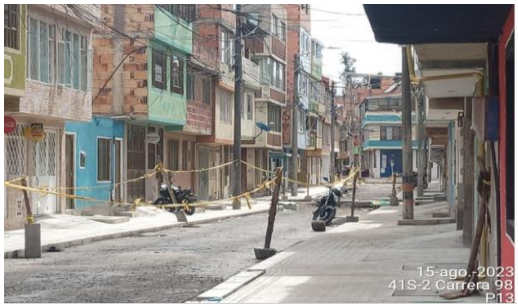

Descripción Foto 2.

CIV: No.13 - 8000772
Localización: KR 98 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 3.

CIV: No.28 - 8000929
Localización: KR 97 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock



Descripción Foto 4.

CIV: No.29 - 8000996
Localización:KR 97 entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 5.

CIV: No.25 - 8000923.
Localización: KR 97B entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 6.

CIV: No.17 - 8000794.
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad.



Descripción Foto 7.

CIV: No.3 - 8000957
Localización: KR 97A entre CL 41 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 8.

CIV: No.14 - 8000794
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Construcción de pozo



Descripción Foto 9.

CIV: No.32 - 8000979.
Localización: KR 96A entre CL 40 SUR y CL 40 BIS SUR
Descripción: Instalación parcial de monoblock..



Descripción Foto 10.

CIV: No.24 - 8000871.
Localización: KR 97B entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 11.

CIV: No.27 - 8001052
Localización: KR 97B entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Instalación de bordillo A-80 en esquina de intersección.



Descripción Foto 12.

CIV: No.33 - 80001041.
Localización: KR 96A entre CL 40A SUR y CL 40B SUR
Descripción: Instalación de monoblock PD200 en costado occidente de calzada.



Descripción Foto 13.

CIV: No.30 - 8001058
Localización: KR 97 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 14.

CIV: No.31 - 8001125.
Localización: KR 97 entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción:Sin actividad



Descripción Foto 15.

CIV: No.12 - 8000849
Localización: KR 98B entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Excavación manual para instalación de sumidero.



Descripción Foto 16.

CIV: No.15 - 8000856.
Localización: KR 98 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Instalación de bordillo A-80 en escalon para acceso a predio



Descripción Foto 17.

CIV: No.21 - 8000821
Localización: KR 97D entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 18.

CIV: No.4 - 8001069
Localización: KR 96A entre CL 41 SUR y CL 40b SUR
Descripción: Demolición de estabilizado para instalación y nivelación de monoblock

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 19.

CIV: No.16 - 8000907
Localización: KR 98 entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Excavación manual en anden



Descripción Foto 20.

CIV: No.26 - 8000988
Localización: KR 97B entre CL 41 SUR Y 42 SUR
Descripción: Instalación de concreto de 3000 psi



Descripción Foto 21.

CIV: No.8 - 8002417
Localización: KR 91C entre CL 42F SUR y CL 42G SUR
Descripción: Sin actividad.



Descripción Foto 22.

CIV: No.9 - 8002500
Localización: KR 91C entre CL 42G SUR y CL 43 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 23.

CIV: No.22 - 8000864
Localización: KR 97D entre CL 41A SUR Y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 24.

CIV: No.20 – 8000938
Localización: KR 97F entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Instalación de geo-celda y geotextil en calzada.



Descripción Foto 25.

CIV: No.6 - 8000977
Localización: KR 97D entre CL 42A SUR Y CL 42 SUR
Descripción: Instalación de geotextil, geo-celda y fresado para lleno de geo-celda en calzada



Descripción Foto 26.

CIV: No.23 – 8000916
Localización: KR 97D entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Excavación mecánica en calzada

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

dieciséis (Día en letras) (16) (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Juan Manuel Alba Rojas

Director de Interventoría.

Nombre de la firma interventora


CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 1

SEGUIMIENTO AL 15-AGOSTO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
28	8000929	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 245.857.650,18	2,03%	70,30%	-0,33%
29	8000996	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 230.017.742,59	1,90%	83,06%	-0,10%
24	8000871	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 316.914.989,22	2,61%	112,19%	0,39%
25	8000923	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 253.700.358,60	2,09%	63,64%	-0,76%
13	8000772	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 289.278.735,33	2,39%	96,84%	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 288.084.304,60	2,38%	67,21%	-1,04%
17	8000794	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 212.241.939,90	1,75%	58,06%	-0,77%
18	8000839	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 220.730.067,11	1,82%	49,62%	-1,60%
21	8000821	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 303.048.993,63	2,50%	76,54%	-0,63%
22	8000864	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 364.765.653,33	3,01%	76,80%	-0,35%
3	8000957	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 235.659.349,31	1,94%	67,92%	-0,73%
33	8001041	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 111.414.226,25	0,92%	67,71%	-0,31%
4	8001069	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 99.191.898,48	0,82%	53,95%	-0,45%
16	8000907	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 34.395.903,89	0,28%	9,09%	-2,70%
15	8000856	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 91.415.625,95	0,75%	28,68%	-1,84%
26	8000988	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 130.283.923,81	1,07%	41,74%	-0,98%
32	8000979	$ 384.241.540,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 91.553.491,94	0,75%	23,83%	-0,50%
30	8001058	$ 167.606.525,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 131.948.964,49	1,09%	78,73%	-1,44%
31	8001125	$ 347.840.618,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 118.681.697,32	0,98%	34,12%	-1,45%
27	8001052	$ 394.454.974,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 65.775.586,11	0,54%	16,68%	-2,63%
12	8000849	$ 353.440.216,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 87.068.322,93	0,72%	24,63%	-2,72%
8	8002417	$ 436.309.464,00	$ 433.765.201,90	3,58%	$ 48.698.543,10	0,40%	11,16%	-3,17%
9	8002500	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 41.319.887,58	0,34%	12,11%	-2,39%
23	8000916	$ 389.375.082,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,81%
5	8000655	$ 464.716.467,00	$ 454.907.485,31	3,75%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,75%
40	8011953	$ 462.079.926,00	$ 395.184.593,00	3,26%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,26%
10	8011960	$ 492.144.459,00	$ 414.198.784,96	3,42%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,42%
35	8000743	$ 769.586.187,00	$ 48.133.071,08	0,40%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,40%
7	8000736	$ 492.144.459,00	$ 377.630.415,64	3,11%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,11%
2	8001595	$ 338.872.088,69	$ 141.472.214,97	1,17%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,17%
39	8000584	$ 443.145.176,00	$ 138.790.996,48	1,14%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,14%
6	8000977	$ 384.241.540,00	$ 313.656.771,99	2,59%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,59%
20	8000938	$ 394.454.974,00	$ 379.247.233,34	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
1	8000687	$ 461.620.649,00	$ 380.855.642,57	3,14%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,14%
TOTALES			**$ 10.614.188.195,66**	**87,51%**	**$ 4.012.047.855,65**	**33,08%**		**-54,43%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					

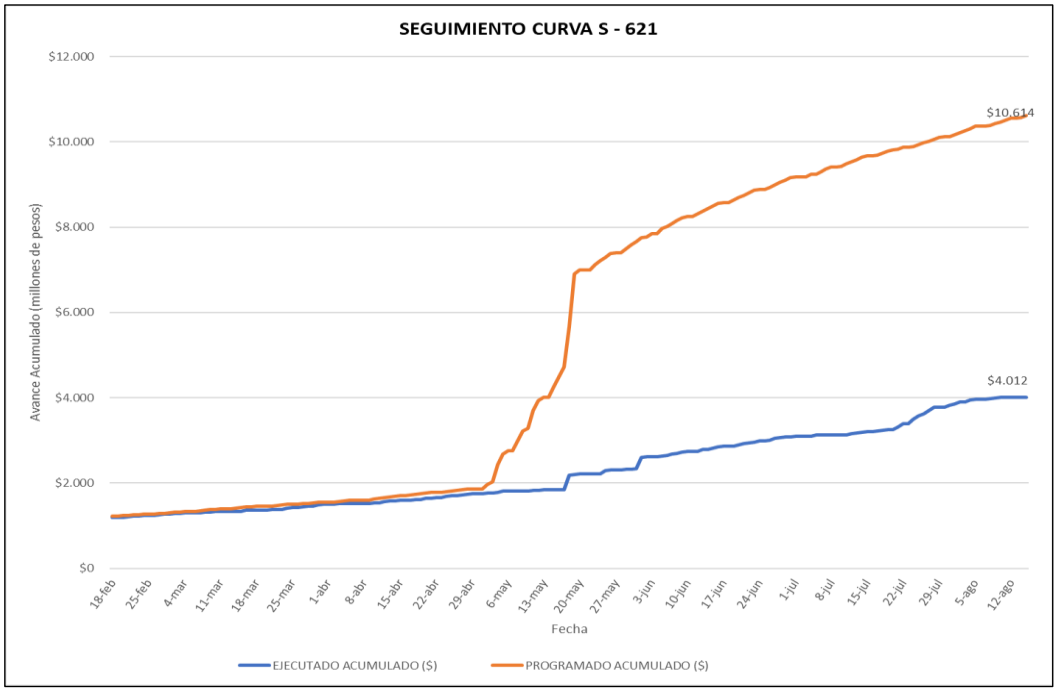


CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN POR CIV

FECHA EVALUACIÓN			18-jul	25-jul	1-ago	8-ago	15-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	37,96%	54,33%	70,30%	70,30%	70,30%
29	8000996	$ 276.918.878,00	60,69%	61,86%	83,06%	83,06%	83,06%
24	8000871	$ 282.489.045,00	100,66%	111,85%	112,19%	112,19%	112,19%
25	8000923	$ 398.643.978,00	55,03%	63,64%	63,64%	63,64%	63,64%
13	8000772	$ 298.711.275,00	62,63%	89,76%	89,76%	96,84%	96,84%
14	8000814	$ 428.629.368,00	60,90%	60,90%	66,60%	67,11%	67,21%
17	8000794	$ 365.563.428,00	58,06%	58,06%	58,06%	58,06%	58,06%
18	8000839	$ 444.842.291,00	49,62%	49,62%	49,62%	49,62%	49,62%
21	8000821	$ 395.944.862,00	58,49%	68,37%	76,54%	76,54%	76,54%
22	8000864	$ 474.960.513,00	69,89%	76,45%	76,80%	76,80%	76,80%
3	8000957	$ 346.941.971,00	58,61%	67,92%	67,92%	67,92%	67,92%
33	8001041	$ 164.541.658,00	67,71%	67,71%	67,71%	67,71%	67,71%
4	8001069	$ 183.856.740,00	40,74%	40,74%	53,95%	53,95%	53,95%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,68%	7,68%	7,80%	8,02%	9,09%
15	8000856	$ 318.778.666,00	18,37%	19,44%	21,71%	24,77%	28,68%
26	8000988	$ 312.106.601,00	26,55%	30,16%	34,04%	38,62%	41,74%
32	8000979	$ 384.241.540,00	17,44%	17,44%	20,60%	23,83%	23,83%
30	8001058	$ 167.606.525,00	78,73%	78,73%	78,73%	78,73%	78,73%
31	8001125	$ 347.840.618,00	32,13%	32,70%	33,02%	34,12%	34,12%
27	8001052	$ 394.454.974,00	13,04%	13,13%	15,58%	16,53%	16,68%
12	8000849	$ 353.440.216,00	19,37%	23,96%	24,21%	24,40%	24,63%
8	8002417	$ 436.309.464,00	0,00%	0,00%	7,37%	11,16%	11,16%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%	0,00%	0,18%	12,11%	12,11%

FECHA EVALUACIÓN			15-ago
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	0,00%
29	8000996	$ 276.918.878,00	0,00%
24	8000871	$ 282.489.045,00	0,00%
25	8000923	$ 398.643.978,00	0,00%
13	8000772	$ 298.711.275,00	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	0,10%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	0,00%
21	8000821	$ 395.944.862,00	0,00%
22	8000864	$ 474.960.513,00	0,00%
3	8000957	$ 346.941.971,00	0,00%
33	8001041	$ 164.541.658,00	0,00%
4	8001069	$ 183.856.740,00	0,00%
16	8000907	$ 378.482.383,00	1,06%
15	8000856	$ 318.778.666,00	3,91%
26	8000988	$ 312.106.601,00	3,12%
32	8000979	$ 384.241.540,00	0,00%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	0,00%
27	8001052	$ 394.454.974,00	0,15%
12	8000849	$ 353.440.216,00	0,23%
8	8002417	$ 436.309.464,00	0,00%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%

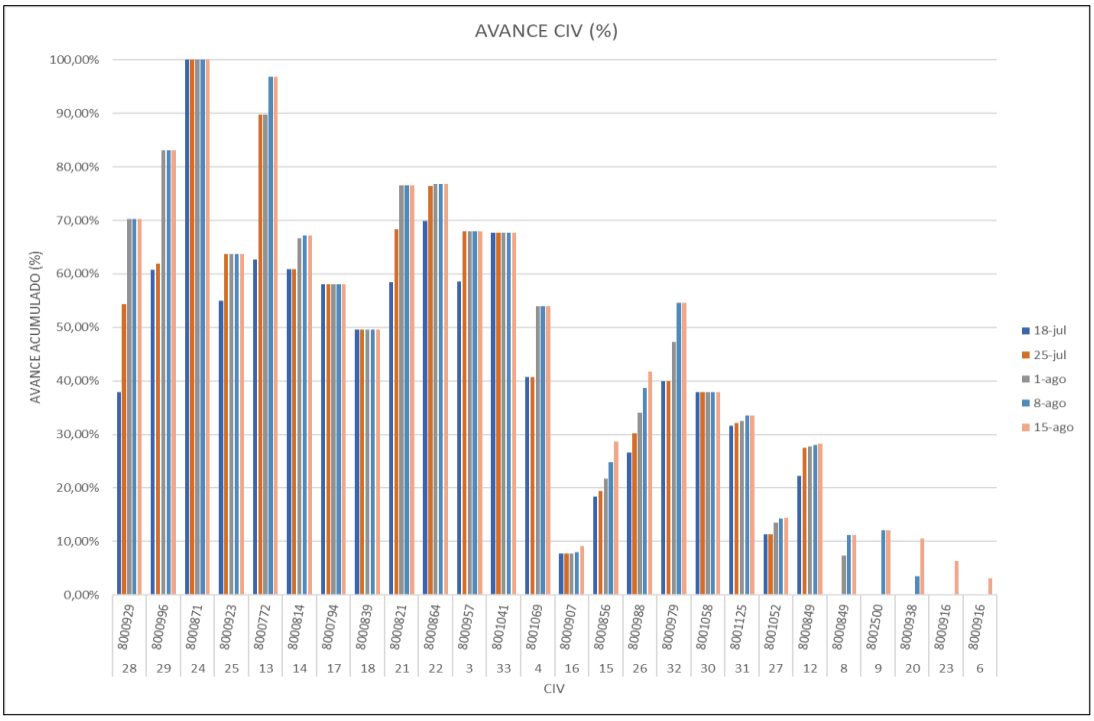

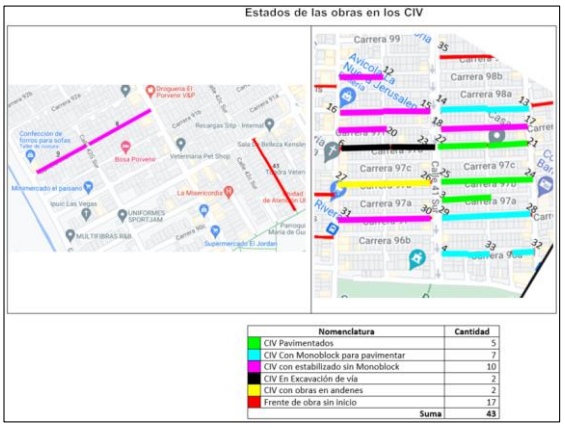





CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2



REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 1 - CONTRATO COP-621-22
CONTRATISTA XIE S.A.

Periodo **10 de agosto al 16 de agosto de 2023**

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	84,72%	87,51%	84,72%
%Ejecutado	36,08%	33,08%	40,64%
%Desviación	-48,64%	-54,43%	-44,08%
