FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 46 (número) **DEL** 17 de agosto de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 23 de agosto de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 717 de 2022 (Número con 3 dígitos) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número con 3 dígitos)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

CONTRATISTA	XIE SA	**NIT**	830061684-1 (dígito de verificación)
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV (Nombre del consorcio o unión temporal)	**NIT**	900547145 (dígito de verificación)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 19.627.175.114,00	Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022	Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ** (Nombre(s) y Apellido(s) del supervisor(a))

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: **ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO** (Nombre(s) y Apellido(s) del profesional de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Número de radicado otorgado en ORFEO) **de fecha** (dd-mm-aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
CALZADA CIV	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43
TOTALES	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,53%	2,53%		Trabajo Ejecutado	7,21%	7,21%	4,68%
Valor del Trabajo Programado	$	$ 0,00		Valor del Trabajo Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%		Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -		Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRÁFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO	ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,18%	1,10%
10	2,31%	1,10%
11	2,42%	7,21%
12	2,53%	7,21%
13	3,47%	7,21%
14	4,68%	8,25%
15	6,10%	8,39%
16	6,10%	9,00%
17	8,97%	9,63%
18	11,45%	10,42%
19	13,67%	10,61%
20	16,42%	11,38%
21	11,03%	10,73%
22	11,48%	10,73%
23	11,93%	10,73%
24	12,30%	10,73%
25	12,75%	10,73%
26	13,13%	10,73%
27	13,66%	10,73%
28	15,73%	10,73%
29	16,77%	10,73%
30	17,27%	10,71%
31	26,69%	10,71%
32	35,83%	10,71%
33	41,56%	10,71%
34	44,08%	10,71%
35	46,47%	10,71%
36	48,50%	17,52%
37	48,50%	17,52%
38	50,50%	17,52%
39	52,50%	17,52%
40	75,12%	17,52%
41	77,04%	17,52%
42	78,75%	17,52%
43	80,86%	17,52%
44	82,65%	17,52%
45	84,72%	40,64%
46	86,87%	40,64%

AVANCE FÍSICO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
Estudios y Diseños Proram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Proramada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%
Meta Física Proramada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%
Meta Física Proramada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%
Meta Física Proramada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%
Meta Física Proramada (%)				Meta Física Ejecutada (%)			
AVANCE PROJECT							
Avance Programado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%		
Avance Programado Mantenimiento periódico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%		
Avance Programado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%		
Avance Programado Mantenimiento Reconstrucción	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%		
Avance Programado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%		

%Atraso /%Avance
0%
%Atraso /%Avance
0%
%Atraso /%Avance
0%
0%
0%
0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERF	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Estado	INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA			
															Fecha de inicio programada	Motivos por los cuales no ha iniciado	Acciones	
1	8000887	156049	29664	29665	KR 98B BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	46,42	6	CALZADA	4,2	91,12	382,69	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT		
2	8001595	156010	29588	29589	KR 96A	CL 42F SUR	CL 42G SUR	50,07	6	CALZADA	3,72	78,75	285,18	Sin iniciar	4-jul-23	SIN PMT		
3	8000957	156201	29896	29897	KR 97A	CL 41 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,53	67,8	307,36	SIN ACTIVIDADES	28-mar-23			
4	8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	47,61	6	CALZADA	4,35	34,72	150,9	Calzada: Labores de limpieza, demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividades.	24-feb-23			
5	8000805	156051	29668	29669	KR 98C BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	47,12	6	CALZADA	3,86	90,24	347,99	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT		
6	8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	47,61	6	CALZADA	5,07	65,69	333,12	Calzada: Instalación de geotextil, gaceolda y fresado, excavación manual para instalación de sumideros ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	16-dic-22			
7	8000736	156045	29656	29657	KR 98	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	4,04	93,14	376	Sin iniciar	23-may-23	SIN PMT		
8	8002417	155940	29448	29449	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	29,9	6	CALZADA	2,57	88,02	226,36	SIN ACTIVIDADES	27-abr-23			
9	8002500	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	29,41	6	CALZADA	2,54	69,79	177,24	SIN ACTIVIDADES	4-may-23			
10	8011960	156950	30682	30683	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	6	CALZADA	2,93	136,9	401,1	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT		
11	8011955	156945	30072	30973	KR 97A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	1	CALZADA	4,38	140,7	616,78	Sin iniciar	No se tiene			
12	8000849	156231	29956	29957	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,07	62,44	316,88	Calzada: Excavación manual alrededor de pozos para realizar nivelación de los mismos. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	21-abr-23			
13	8000772	156220	29934	29935	KR 98	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,54	56,87	201,43	Calzada: Instalación de fresado segunda capa. Andén occidental: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad.	16-ene-23			
14	8000814	156221	29936	29937	KR 98	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,54	67,69	307,42	Calzada: Instalación de base estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	20-ene-23			
15	8000856	156222	29938	29939	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	46,42	6	CALZADA	4,61	67,45	310,79	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4.5". Andén occidental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4.5" y de concreto 4000psi para acceso vehicular con asentamiento de 4".	9-mar-23			
16	8000907	156223	29940	29941	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,81	64,09	308,44	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y construcción de cajas de inspección 7unidades. Andén occidental: Demolición de concreto y excavación manual.	2-mar-23			
17	8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,93	58,12	228,25	SIN ACTIVIDADES	26-ene-23			
18	8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	3,86	67,37	260,04	Calzada: Excavación y demolición manual de estabilizado para instalación de monoblock ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	2-feb-23			
19	8000563	156052	29670	29671	KR 99A BIS	CL 38C SUR	CL 38 SUR	47,12	6	CALZADA	4,66	80,91	376,93	Sin iniciar	No se tiene			
20	8000938	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,62	64,75	299,09	Calzada: Instalación de base estabilizada, excavación manual para instalación de sumideros en ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	29-dic-22			
21	8000821	156212	29918	29919	KR 97D	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,16	59,22	246,61	SIN ACTIVIDADES	8-feb-23			
22	8000864	156213	29920	29921	KR 97D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,05	67,76	274,11	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Corte de concreto para dilatación de concreto. Andén occidental: Corte de concreto para dilatación de concreto.	14-feb-23			
23	8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,42	67,76	299,83	Calzada: Excavación manual para instalación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	22-dic-23			
24	8000871	156204	29902	29903	KR 97B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,1	6	CALZADA	4,45	60,94	271,42	SIN ACTIVIDADES	4-ene-23			
25	8000923	156205	29904	29905	KR 97B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,92	67,68	332,77	SIN ACTIVIDADES	10-ene-23			
26	8000888	156206	29906	29907	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,32	68,54	295,77	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi acceso vehicular y acabados en cajas de inspección. Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y acabados en cajas de inspección	15-mar-23			
27	8001052	156207	29908	29909	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,12	66,41	340,23	Calzada: Instalación de bordillo A80 en intersección ambos costados. Andén oriental: Instalación de fresado 2da capa y de concreto 4000psi para acceso vehicular. Andén occidental: Instalación de fresado 2da capa y de concreto 4000psi para acceso vehicular.	22-mar-23			
28	8000929	156196	29886	29887	KR 97	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,95	6	CALZADA	4,2	63,56	266,84	SIN ACTIVIDADES	5-dic-22			
29	8000996	156197	29888	29889	KR 97	CL 40A SUR	CL 41 SUR	47,26	6	CALZADA	4,24	67,58	286,62	SIN ACTIVIDADES	12-dic-22			
30	8001058	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,12	66,8	274,89	SIN ACTIVIDADES	10-abr-23			
31	8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	50,91	6	CALZADA	5,14	68,89	354,19	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto MR41 costado oriente. Andén occidental: Remates en fachada parte inferior.	3-abr-23			
32	8000979	156186	29866	29867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	49,66	6	CALZADA	5,14	34,54	177,45	Calzada: Labores de limpieza, demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	15-abr-23			
33	8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	48,3	6	CALZADA	5,11	32,2	164,5	Calzada: Instalación de monoblock PD200 costado occidente. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	20-feb-23			
34	8000709	156232	29958	29959	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,09	53,43	218,4	Sin iniciar	10-ago-23			
35	8000743	156233	29960	29961	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,68	67,2	314,77	Sin iniciar	27-jul-23	SIN PMT		
36	8000619	156053	29672	29673	KR 99A BIS	CL 40 SUR	CL 38 C SUR	47,12	6	CALZADA	4,78	90,92	434,69	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
37	8011974	156971	31024	31025	CL 42A BIS SUR	KR 94A	KR 95	29,9	6	CALZADA	2,52	81,18	204,44	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
38	8011973	156970	31022	31023	CL 42A BIS SUR	KR 93C	KR 94A	29,9	6	CALZADA	2,18	89,41	194,58	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
39	8000584	156058	29682	29683	KR 99C BIS	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	3,87	85,64	331,62	SIN INICIAR	10-jul-23	SIN PMT		
40	8011953	156943	30968	30969	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	65,55	6	CALZADA	3,13	143,02	448,03	Sin iniciar	2-may-23	SIN PMT		
41	8011950	156942	30966	30967	KR 95B	CL 42B SUR	CL 42F SUR	29,06	6	CALZADA	3,94	81,9	322,33	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
42	8011949	156941	30964	30965	KR 95A	CL 42B SUR	CL 42F SUR	27,35	6	CALZADA	3,28	83,12	272,55	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV			
43	8002595	155838	29246	29247	CL 42B SUR	KR 91	KR 90A BIS	33,9	6	CALZADA	3,04	104,89	319,35	Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica, retiro de material, sub-terranización de manguera ½" en costado oriente 6 un. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1. COMPONENTE TÉCNICO:

1.1. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA

- Calificación diaria del PMT instalado acorde con la aprobación de la SDM, la calificación para el presente período es de 90%
- Mesas de trabajo internas con el director de Interventoría para definir los lineamientos de revisión de documentos del contratista. Coordinación con las áreas SST, Social y Ambiental, para la elaboración de los documentos entregados por la Interventoría en el Periodo.
- Elaboración de memorandos para comunicaciones internas y otras dirigidas al Contratista con los productos revisados en el periodo.
- Revisión de los informes diarios de inspección y memorias de cálculo de las cantidades de obra, diligenciamiento de la bitácora.
- Reporte diario de cantidades para el seguimiento de la programación
- Revisión y concepto de los APU-NP 31, 32, 33 y 34.

1.2 Seguimiento a las actividades del contratista

La Interventoría realizó el seguimiento de:

- **P4:**Calzada: Labores de limpieza, demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividades.
- **P32:**Calzada: Labores de limpieza, demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P33:**Calzada: Instalación de monoblock PO200 23Ml, costado occidente. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P28:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P29:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P24:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
- **P25:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P21:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P22:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Corte de concreto para dilatación de concreto. Andén occidental: Corte de concreto para dilatación de concreto.
- **P3:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P13:**Calzada: Instalación de fresado segunda capa. Andén occidental: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad.
- **P14:**Calzada: Instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P17:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P18:** Calzada: Excavación y demolición manual de estabilizado para instalación de monoblock ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P30:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P31:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto MR41 costado oriente. Andén occidental: Remates en fachada parte inferior.
- **P12:**Calzada: Excavación manual alrededor de pozos para realizar nivelación de los mismos. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P15:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4.5". Andén occidental: Instalación de concreto 3000psi para acceso peatonal con asentamiento de 4.5" y de concreto 4000psi para acceso vehicular con asentamiento de 4"
- **P16:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y construcción de cajas de inspección 7unidades. Andén occidental: Demolición de concreto y excavación manual.
- **P26:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y acabados en cajas de inspección. Andén occidental: Instalación de concreto 4000psi para acceso vehicular y acabados en cajas de inspección
- **P27:**Calzada: Instalación de bordillo A-80 en intersección ambos costados. Andén oriental: Instalación de fresado 2da capa y de concreto 4000psi para acceso vehicular. Andén occidental: Instalación de fresado 2da capa y de concreto 4000psi con asentamiento de 4" para acceso vehicular.
- **P8:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P9:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P20:** Calzada: Instalación de base estabilizada, excavación manual para instalación de sumideros en ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P23:**Calzada: Excavación manual para instalación de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P6:**Calzada: Instalación de geotextil, geo-celda y de fresado, excavación manual para instalación de sumideros ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P43:** Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica, retiro de material, sub-terranización de manguera ½ pulgada en costado oriente 6 unidades. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Elaboración del informe mensual técnico No.10 de la Interventoría correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2023.
- Participación del comité de seguimiento No.46 e integral
- Seguimiento de las actividades que ejecute el Contratista en obra.
- Diligenciamiento de bitácora, revisión y aprobación de los informes diarios del inspector y calificación semanal del PMT.
- Evaluación diaria de cantidades para la respectiva evaluación de la programación

2. COMPONENTE AMBIENTAL

- El 16 de agosto, se realiza en el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.
- El 22 de agosto, se realiza el comité de seguimiento ambiental y SST, llevado a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones alusivas al cerramiento ambiental y senderos peatonales, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros y se recalca sobre la calidad en la ejecución y presentación de los informes mensuales a la interventoría.
- Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 98,48% en todos los ítems de las fichas de seguimiento ambiental y SST. La calificación fue afectada por el orden, aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra.
- En la presente semana se dispuso 240m3 de material de excavación, con el gestor LAMD.
- Se continua con el uso del material fresado, para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU 0m3 y de la Unidad de Mantenimiento vial: 205,32m3.
- Se utilizó concreto premezclado para los anclenes de la vía, en la semana se utilizaron 13m3.

El Contratista realizó las siguientes actividades:

- Recorrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6 Y P 23 Y P43 ACOPIO para verificar en obra, que se está cumpliendo con lo establecido en el MAO.
- Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6 Y P 23 y P43 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
- Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
- Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20 y acopio.
- Inducción ambiental y socialización de política integral.
- Comité de seguimiento.
- Recolección de material escombro.
- Delimitación de senderos peatonales en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9 Y P20, P43.
- Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.
- Manejo senderos peatonales, plafones, orden y aseo en los frentes de obra
- Comité de seguimiento con FDLK 17 de agosto de 2023.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL. PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
0	1. Consorcio SCLV = 23 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Vialidad Limitada = 13 4. Carse Ingeniería Ltda = 1 5. J.V R Estudios = 1 6. Geovial Limitada = 5	0	53

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 17 de agosto de 2023 al 23 de agosto de 2023, se presentó ausentismo del personal de la Interventoría que se relaciona a continuación:

Nombre	Cargo	Días de incapacidad	Descripción
Carmen Elvira Hernández	Cadeniera 1	1	M235: Incapacidad enfermedad general 23/08/2023 al 24/08/2023

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El 17 de agosto de 2023 se llevó a cabo recorrido de obra donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, en las diferentes prioridades intervenidas se observaron equipos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla) e información de conformación de brigada de emergencias.
- El 17 de agosto de 2023 se realizó comité de seguimiento semanal en el FDLK donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
- El 22 de agosto de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
- Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

P52: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P33: Se evidenció un trabajador arreglando un sumidero. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit de emergencias. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P4: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P28: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P29: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P50: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P31: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P5: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P24: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P25: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P26: Arreglo de cajas de inspección. Se evidencia punto de hidratación, kit de emergencias. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P27: Instalación de concreto en espacio público. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas). El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P21: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.

P22: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P23: No se encuentran desarrollando actividades de obra. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencias
P6: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P17: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P18: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P20: Se observó un trabajador realizando excavación manual para sumidero. Se evidencia punto de hidratación, kit de emergencias. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P13: Se observaron dos trabajadores realizando nivelación en vía. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas). El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P14: No se encuentran desarrollando actividades de obra. Se evidencia punto de hidratación, kit de emergencias.
P15: Instalación de concreto en rampas de espacio público. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), de hidratación, kit de emergencia, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual. Se solicitó revisar los plafones ya que están descubiertos y deben ser señalizados.
P16: Excavación manual en andenes. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual
P12: No se encuentran desarrollando actividades de obra. Se observa recolección de material RCD acopiado.
P8: No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.
P9: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P43: Excavación mecánica en vía, sendero peatonal definido. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas), kit de emergencias, señalización a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.

- A nivel general se solicitó revisar los plafones de los sumideros y garantizar que el material de estos sea resistente. Revisar que en los senderos peatonales no haya condiciones inseguras, como cajas de medidores sin señalizar.
- Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
- El 18 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
- El 22 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con el personal información sobre estilos de vida saludables
- El 23 de agosto de 2023 se realizó comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
- Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
AGL CONSTRUCCIÓN SAS = 1	1. XIE S.A = 45 2. NOVA TOPOSMAR S.A.S = 8 3. PLANEACIÓN EN INGENIERIA S.A.S = 1 4. JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S = 1 5. DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S = 1 6. JOSE ARGEON MORA SERRANO = 11 7. R.A.C PETREOS S.A.S = 1 8. INPASUELC LTDA = 2 9. INGCONOR S.A.S = 6 10. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 19 11. AGL CONSTRUCCION SAS = 7 12. Construcciones Obras Civiles y Transportes SAS = 1	1. XIE SA = 1 2. AGL CONSTRUCCION SAS = 5 3. INGCONOR S.A.S = 1	111

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 17 de agosto de 2023 al 23 de agosto de 2023, el contratista reportó el ausentismo del siguiente personal , el contratista reportó el ausentismo de 17 trabajadores.
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 17 de agosto de 2023 al 23 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de días de ausencia = 25
N° de días de trabajo programados = 5
N° Trabajadores en la semana = 45
% de ausentismo = 11,11%
Es así como se evidencia que el 11,11% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El contratista realizó inducción al personal que ingreso a laborar en el periodo del presente informe donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la SST. Condiciones de salud y medicina laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de EPP, Matriz de peligros entre otros.
- El contratista hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo
- El Contratista realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingreso a laborar al contrato COP 621-2022, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra.
- El Contratista mediante comunicación KN00E22-621-883 remite el Informe semanal No. 45 del 10 al 16 de agosto de 2023 Componente SST. Sin embargo este ya había sido revisado por la Interventoría, teniendo en cuenta que fue insumo para el informe semanal SST del Consorcio SCLV
- El Contratista en cumplimiento del cronograma de actividades SG-SST realizó capacitación comunicación asertiva (COPASST), inspección de infraestructura, capacitación manejo seguro de herramientas, inspección de herramientas y capacitación trabajo en excavaciones.
- El Contratista realizo cerramiento de áreas de trabajo y elaboración de escaleras para garantizar el ingreso a las viviendas y seguimiento y revisión al uso adecuado de la dotación y EPP de todo el personal vinculado al contrato de obra.
- Durante la semana del presente informe el Contratista reportó la siguiente novedad: Carmen Patricia Latorre Tarazona estuvo en aislamiento preventivo por COVID-19 desde el 13 de agosto de 2023 hasta el 19 de agosto de 2023, tiene un certificado por siete (07) días

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

- Se evidencia que durante el periodo el contratista, continua con la Atención del punto PAC en el horario de lunes a viernes de 8.00 am a 4.00 pm, así como la línea telefónica y correo electrónico.
- El 22 de agosto del 2023 la gestión social del contratista mediante correo electrónico, informa que en horas de la tarde, se realizara una reunión entre el director de obra Ing. Manuel Mazabuel y el señor Diego López a fin de dar cierre al derecho de petición No 5. Por parte de la interventoría se respondió el correo electrónico a la gestión social del contratista, recordando el compromiso adquirido en el comité de seguimiento No 45 del 17 de agosto, respecto a la respuesta al derecho de petición No 5 del señor Diego López Montero. El derecho de petición se encuentra abierto dentro de los días hábiles para dar cierre.
- El 22 de agosto se realizó seguimiento a la PQRSD No 17 de la señora Luz Estela Díaz, en el cual se le solicita la factura del acueducto para el pago, en la cual se ve reflejado el cobro del medidor a fin de realizar el pago por parte de Xie S.A Esta PQRSD continúa abierta.
- El 22 de agosto se realizó seguimiento a la PQRSD No 23, de la señora María Pérez, en el cual se informa al área técnica que el medidor del agua del predio ubicado en la dirección Carrera 91 C # 42 F 10 sur, se encuentra ubicado en el predio colindante y se solicita que sea ubicado en el predio de la peticionaria, a lo cual informan que en la intervención de espacio público se realizara la reubicación.
- El 22 de agosto se recibió la PQRSD No 24 interpuesta por el señor Bernardino Vela de la prioridad 31, quien se queja por la intervención realizada en la caja de inspección de su predio ubicado en la carrera 97 # 42 -14. Manifiesta que el tubo de conexión a la caja está roto y que los acabados internos de la caja no se han realizado, y que al frente del predio se inunda, debido al desnivel de la vía. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles establecidos para el cierre.
- Se realizó recorrido urbano el 22 de agosto en las prioridades 28,29,24,25,22,21,13,14,3,17,18,4,32,33,31, 32 ,12,15,16,26,27,8,9,20 y 43, en el cual se evidencio los puntos satélites de información y las vallas informativas móviles actualizadas.
- En visita al punto de atención al ciudadano se revisó y firmó soportes de la gestión social y se actualizo la bitácora social.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

- Se revisa por parte de la interventoría la presentación para el comité FDLK No 8.

4.3 Programa de acompañamiento técnico

- Levantamiento de 21 actas de vecindad en la prioridad 36 del tramo de la carrera 95 A desde la carrera 95 B entre 42 B sur hasta la calle 42 f sur del 16 de al 22 de agosto.
- Se realizó entrega de 31 de copias de actas suspensión de garajes a la comunidad de las prioridades 23 y 6 del 16 al 22 de agosto.

4.4 Programa de cultura ciudadana

- Se realizó capacitación a personal de obra en el tema trabajo en equipo el 19 de agosto y se conto con la asistencia de 32 trabajadores.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

- Se cumple con el porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de la localidad y de contratación de mujeres de acuerdo a lo requerido por la minuta del contrato.
- Se recibieron 7 hoja de vida en el punto de atención al ciudadano

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Durante este periodo se divulgaron las siguientes piezas informativas:

- Se entrego predio a predio 45 Volantes # 64 de recomendaciones de espacio público en las prioridades 8, 9.
- Se instalo 2 Volantes # 64 de recomendaciones de espacio público, en los puntos satélites de información de las prioridades 8,9.
- Se entrego predio a predio 24 Volantes # 98 de convocatoria a actas de vecindad, en la prioridad 41.
- Se instalo 1 volante #104 de avance del contrato del mes de junio, en el punto satélite de información de la prioridad 43.
- Se entrego predio a predio 32 Volantes # 107 de inicio de malla vial en la prioridad 43 y se instalo 1 Volante # 107 de inicio de malla vial en en el punto satélite de información de la prioridad 43.
- Se instalo 1 Volante # 108 de inicio de recolección de basuras en el punto satélite de información de la prioridad 43.
- Se entrego predio a predio 47 Volantes # 109 de inicio de espacio público en las prioridades 8,9.
- Se instalo 1 Volante y un afiche de inicio de obra en el punto satélite de información en la prioridad 43.
- Se instalo 1 volante PMT #10 en el punto satélite de información de la prioridad 43.
- Se instalaron 2 vallas informativas móviles en la prioridad 43.
- El 16 agosto se realiza la instalación de 1 puntos satélite de información en: · Calle 42 BIS Sur # 95-06 Giovanny Rojas (prioridad 33)
- El porcentaje de avance de obra es el 37% y faltan 42 días para terminación de las mismas el cual fue registrado en las vallas informativas móviles.

4.7 Comités

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

1. Cronograma en Ms Project
2. Registro Fotográfico
3. Avance

	SI	NO
	X	
	X	
	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los veintitrés (Día en letras) 23 (Día en número)

días del mes de agosto (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Omar Javier Alba Ayala
Residente Social Manuel Mazabuel
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 46 **DEL** 17 de agosto de 2023 **AL** 23 de agosto de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No.18- 8000839
Localización: KR 97F entre CL 40a SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 2.

CIV: No.13 - 8000772
Localización: KR 98 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Nivelación de fresado estabilizado en vía.



Descripción Foto 3.

CIV: No.28 - 8000929
Localización: KR 97 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 4.

CIV: No.29 - 8000996
Localización:KR 97 entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 5.

CIV: No.25 - 8000923.
Localización: KR 97B entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 6.

CIV: No.17 - 8000794.
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad.



Descripción Foto 7.

CIV: No.3 - 8000957
Localización: KR 97A entre CL 41 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 8.

CIV: No.14 - 8000794
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Instalación de base estabilizado en calzada.



Descripción Foto 9.

CIV: No.32 - 8000979.
Localización: KR 96A entre CL 40 SUR y CL 40 BIS SUR
Descripción: Demolición y nivelación de estabilizado en calzada.



Descripción Foto 10.

CIV: No.24 - 8000871.
Localización: KR 97B entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 11.

CIV: No.27 - 8001052
Localización: KR 97B entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Instalación de concreto de 4000psi para acceso vehicular ambos costados



Descripción Foto 12.

CIV: No.33 - 80001041.
Localización: KR 96A entre CL 40A SUR y CL 40B SUR
Descripción: Demolición parte superior de sumidero.



Descripción Foto 13.

CIV: No.30 - 8001058
Localización: KR 97 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 14.

CIV: No.31 - 8001125.
Localización: KR 97 entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción:Sin actividad



Descripción Foto 15.

CIV: No.12 - 8000849
Localización: KR 98B entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Excavación manual alrededor de pozos para nivelación.



Descripción Foto 16.

CIV: No.15 - 8000856.
Localización: KR 98 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Instalación de concreto de 4000psi para acceso vehicular.



Descripción Foto 17.

CIV: No.21 - 8000821
Localización: KR 97D entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 18.

CIV: No.4 - 8001069
Localización: KR 96A entre CL 41 SUR y CL 40b SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 19.

CIV: No.16 - 8000907
Localización: KR 98 entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Construcción de cajas de inspección en predios.



Descripción Foto 20.

CIV: No.26 - 8000988
Localización: KR 97B entre CL 41 SUR Y 42 SUR
Descripción: Instalación de concreto de 4000 psi para acceso vehicular costado occidente.



Descripción Foto 21.

CIV: No.8 - 8002417
Localización: KR 91C entre CL 42F SUR y CL 42G SUR
Descripción: Sin actividad.



Descripción Foto 22.

CIV: No.9 - 8002500
Localización: KR 91C entre CL 42G SUR y CL 43 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 23.

CIV: No.22 - 8000864
Localización: KR 97D entre CL 41A SUR Y CL 41 SUR
Descripción: Corte de concreto en anden para dilatación.



Descripción Foto 24.

CIV: No.20 – 8000938
Localización: KR 97F entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Excavación manual para instalación de sumidero.



Descripción Foto 25.

CIV: No.6 - 8000977
Localización: KR 97D entre CL 42A SUR Y CL 42 SUR
Descripción: Instalación de geotextil, geo-celda y fresado para lleno de geo-celda en calzada



Descripción Foto 26.

CIV: No.23 – 8000916
Localización: KR 97D entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Nivelación y compactación de base estabilizada en calzada.



Descripción Foto 27.

CIV: No.43 - 8002595
Localización: CL 42B SUR entre KR 91 Y KR 90A BIS
Descripción: Sub-terranización de manguera de ½ para agua potable costado oriente.

Descripción Foto 28.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintitrés (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Alba Roja
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 1


SEGUIMIENTO AL 22-AGOSTO-2023

P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
28	8E+06	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 245.857.650,18	2,03%	70,30%	-0,33%
29	8E+06	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 230.017.742,59	1,90%	83,06%	-0,10%
24	8E+06	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 316.914.989,22	2,61%	112,19%	0,39%
25	8E+06	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 167.580.111,58	1,38%	42,04%	-1,47%
13	8E+06	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 181.117.015,69	1,49%	60,63%	-0,90%
14	8E+06	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 219.798.023,51	1,81%	51,28%	-1,61%
17	8E+06	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 118.644.242,33	0,98%	32,46%	-1,54%
18	8E+06	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 113.561.807,94	0,94%	25,53%	-2,48%
21	8E+06	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 288.468.430,28	2,38%	72,86%	-0,75%
22	8E+06	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 291.893.541,98	2,41%	61,46%	-0,95%
3	8E+06	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 235.659.349,31	1,94%	67,92%	-0,73%
33	8E+06	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 106.542.888,69	0,88%	64,75%	-0,35%
4	8E+06	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 99.191.898,48	0,82%	53,95%	-0,45%
16	8E+06	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 37.891.608,27	0,31%	10,01%	-2,67%
15	8E+06	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 101.721.942,96	0,84%	31,91%	-1,76%
26	8E+06	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 132.284.837,60	1,09%	42,38%	-0,96%
32	8E+06	$ 384.241.540,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 81.779.319,46	0,67%	21,28%	-0,58%
30	8E+06	$ 167.606.525,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 115.616.492,38	0,95%	68,98%	-1,58%
31	8E+06	$ 347.840.618,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 127.724.877,75	1,05%	36,72%	-1,38%
27	8E+06	$ 394.454.974,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 73.656.560,34	0,61%	18,67%	-2,56%
12	8E+06	$ 353.440.216,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 87.604.041,13	0,72%	24,79%	-2,72%
8	8E+06	$ 436.309.464,00	$ 433.765.201,90	3,58%	$ 48.698.543,10	0,40%	11,16%	-3,17%
9	8E+06	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 41.319.887,58	0,34%	12,11%	-2,39%
20	8E+06	$ 389.375.082,00	$ 379.247.233,34	3,13%	$ 43.030.721,51	0,35%	11,05%	-2,77%
23	8E+06	$ 464.716.467,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,81%
6	8E+06	$ 462.079.926,00	$ 313.656.771,99	2,59%	$ 10.880.195,93	0,09%	2,35%	-2,50%
43	8E+06	$ 492.144.459,00	$ 0,00	0,00%	$ 9.081.451,38	0,07%	1,85%	0,07%
37	8E+06	$ 769.586.187,00	$ 80.000.483,66	0,66%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,66%
38	8E+06	$ 404.402.566,00	$ 413.559.573,13	3,41%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,41%
2	8E+06	$ 338.872.088,69	$ 171.720.171,85	1,42%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,42%
39	8E+06	$ 443.145.176,00	$ 174.899.223,21	1,44%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,44%
1	8E+06	$ 461.620.649,00	$ 414.429.693,70	3,42%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,42%
10	8E+06	$ 725.200.480,00	$ 448.213.398,61	3,70%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,70%
34	8E+06	$ 220.339.032,00	$ 17.529.402,64	0,14%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,14%
5	8E+06	$ 463.799.391,00	$ 454.907.485,31	3,75%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,75%
40	8E+06	$ 768.669.110,00	$ 424.800.300,21	3,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,50%
7	8E+06	$ 491.684.934,00	$ 491.684.934,00					
TOTALES			**$ 10.863.074.723,97**	**89,57%**	**3526538171**	**29,08%**		**-60,49%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					


CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN POR CIV

FECHA EVALUACION			25-jul	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	54,33%	70,30%	70,30%	70,30%	70,30%
29	8000996	$ 276.918.878,00	61,86%	83,06%	83,06%	83,06%	83,06%
24	8000871	$ 282.489.045,00	111,85%	112,19%	112,19%	112,19%	112,19%
25	8000923	$ 398.643.978,00	63,66%	63,66%	63,66%	42,04%	42,04%
13	8000772	$ 298.711.275,00	89,76%	89,76%	96,84%	59,90%	60,63%
14	8000814	$ 428.629.368,00	60,90%	66,60%	67,11%	50,35%	51,28%
17	8000794	$ 365.563.428,00	58,06%	58,06%	58,06%	32,46%	32,46%
18	8000839	$ 444.842.291,00	49,62%	49,62%	49,62%	25,53%	25,53%
21	8000821	$ 395.944.862,00	68,37%	76,54%	76,54%	72,86%	72,86%
22	8000864	$ 474.960.513,00	76,45%	76,80%	76,80%	61,46%	61,46%
3	8000957	$ 346.941.971,00	67,92%	67,92%	67,92%	67,92%	67,92%
33	8001041	$ 164.541.658,00	67,71%	67,71%	67,71%	47,66%	64,75%
4	8001069	$ 183.856.740,00	40,74%	53,95%	53,95%	53,95%	53,95%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,68%	7,80%	8,02%	9,09%	10,01%
15	8000856	$ 318.778.666,00	19,44%	21,71%	24,77%	28,68%	31,91%
26	8000988	$ 312.106.601,00	30,16%	34,04%	38,62%	41,74%	42,38%
32	8000979	$ 384.241.540,00	17,44%	20,60%	23,83%	21,28%	21,28%
30	8001058	$ 167.606.525,00	78,73%	78,73%	78,73%	68,98%	68,98%
31	8001125	$ 347.840.618,00	32,70%	33,02%	34,12%	36,46%	36,72%
27	8001052	$ 394.454.974,00	13,13%	15,58%	16,53%	16,68%	18,67%
12	8000849	$ 353.440.216,00	23,96%	24,21%	24,40%	24,63%	24,79%
8	8000849	$ 436.309.464,00	0,00%	7,37%	11,16%	11,16%	11,16%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%	0,18%	12,11%	12,11%	12,11%
20	8000938	$ 389.375.082,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,05%
6	8000916	$ 462.079.926,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%
43	8002595	$ 492.144.459,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,85%

FECHA EVALUACIÓN			22-ago
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	0,00%
29	8000996	$ 276.918.878,00	0,00%
24	8000871	$ 282.489.045,00	0,00%
25	8000923	$ 398.643.978,00	0,00%
13	8000772	$ 298.711.275,00	0,73%
14	8000814	$ 428.629.368,00	0,93%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	0,00%
21	8000821	$ 395.944.862,00	0,00%
22	8000864	$ 474.960.513,00	0,00%
3	8000957	$ 346.941.971,00	0,00%
33	8001041	$ 164.541.658,00	17,10%
4	8001069	$ 183.856.740,00	0,00%
16	8000907	$ 378.482.383,00	0,92%
15	8000856	$ 318.778.666,00	3,23%
26	8000988	$ 312.106.601,00	0,64%
32	8000979	$ 384.241.540,00	0,00%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	0,26%
27	8001052	$ 394.454.974,00	2,00%
12	8000849	$ 353.440.216,00	0,15%
8	8002417	$ 436.309.464,00	0,00%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%
20	8000916	$ 389.375.082,00	11,05%
6	8011953	$ 462.079.926,00	2,35%
43	8011960	$ 492.144.459,00	1,85%

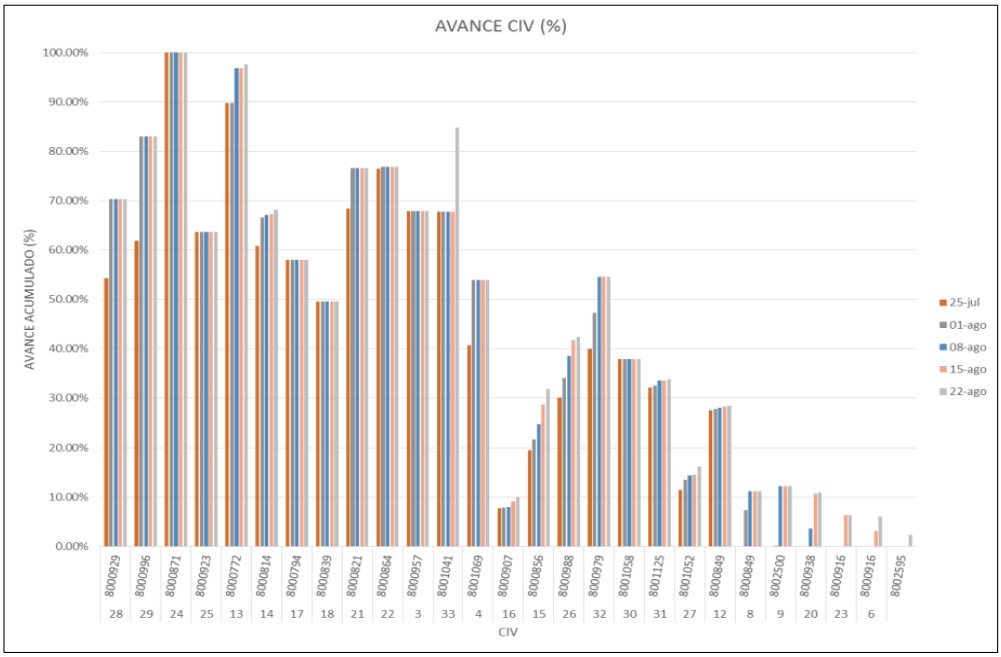



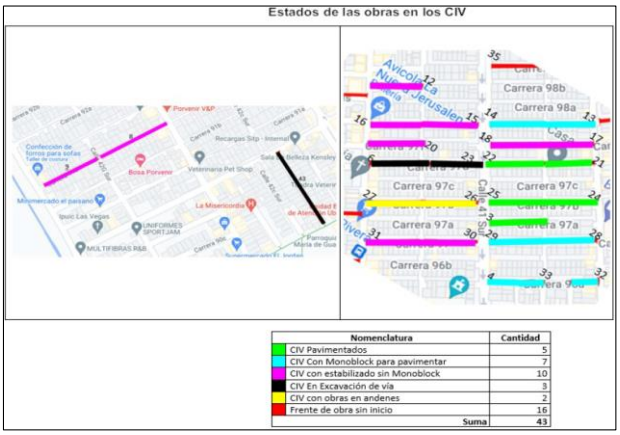

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 1 - CONTRATO COP-621-22
CONTRATISTA XIE S.A.

Periodo **17 de agosto al 22 de agosto de 2023**

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	86,87%	89,57%	86,87%
%Ejecutado	32,08%	29,08%	40,64%
%Desviación	-54,79%	-60,49%	-46,23%
