POSMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24 de agosto de 2023 (dd mm aa) **AL** 30 de agosto de 2023 (dd mm aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

CONTRATISTA XIE SA **NIT** 830061684-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra.) (Escriba el No. del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV **NIT** 900547145 (Escriba el nombre o razón social del interventor.) (Escriba el No. del interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 19.627.175.114,00	Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022	Fecha de Iniciación	05 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	04 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ** (Escriba el nombre del supervisor SDH)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN **ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO** (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión.)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Escriba el número del radicado SDH.) **de fecha** (dd mm aa)

TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
CALZADA CIV	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43
TOTALES	$ 19.627.175.114,00	12860,18	3,67	43


A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	2,53%	2,53%	Trabajo Ejecutado	7,21%	7,21%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!

OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%	Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -	Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

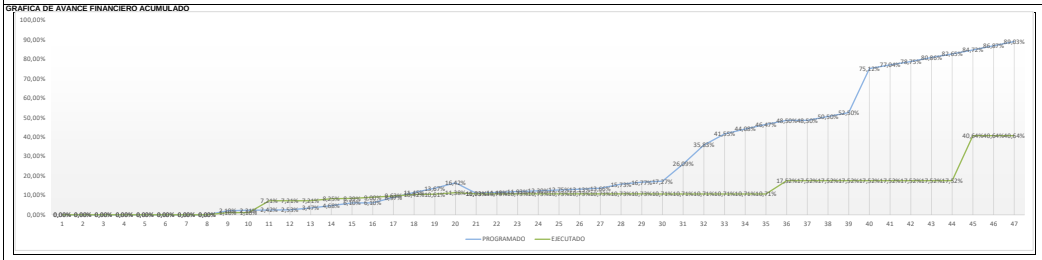

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,10%	1,10%
10	2,31%	1,16%
11	2,42%	7,21%
12	2,53%	7,21%
13	3,47%	7,21%
14	4,68%	8,25%
15	6,10%	8,39%
16	6,10%	9,00%
17	8,97%	9,83%
18	11,45%	10,42%
19	13,67%	10,61%
20	16,42%	11,38%
21	11,03%	10,73%
22	11,48%	10,73%
23	11,93%	10,73%
24	12,30%	10,73%
25	12,75%	10,73%
26	13,13%	10,73%
27	13,66%	10,73%
28	15,73%	10,73%
29	16,77%	10,73%
30	17,27%	10,71%
31	26,09%	10,71%
32	35,83%	10,71%
33	41,95%	10,71%
34	44,08%	10,71%
35	46,47%	10,71%
36	48,50%	17,52%
37	48,50%	17,52%
38	50,50%	17,52%
39	52,50%	17,52%
40	75,12%	17,52%
41	77,04%	17,52%
42	78,75%	17,52%
43	80,86%	17,52%
44	82,65%	17,52%
45	84,72%	40,64%
46	86,87%	40,64%
47	89,03%	40,64%

AVANCE FÍSICO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
Estudios y Diseños Program. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Peso. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Proramada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%
Meta Física Proramada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%
Meta Física Proramada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%
Meta Física Proramada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%
Meta Física Proramada (%)				Meta Física Ejecutada (%)			

AVANCE PROJECT			
Avance Programado (%)	0%	Avance Ejecutado (%)	0%
Avance Programado Mantenimiento periódico	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%
Avance Programado Mantenimiento Rutinario	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%
Avance Programado Mantenimiento Reconstrucción	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%
Avance Programado Mantenimiento Rehabilitación	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%

%Atraso /%Avance

0%

0%

0%

0%

0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1 (Sur)	PK_ID ANDEN 2 (Norte)	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERF	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	Estado	INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: Fecha de inicio programada	Motivos por los cuales no ha iniciado	Acciones		
1	8000687	156049	29664	29665	KR 98B BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	46,42	6	CALZADA	4,2	91,12	382,89	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT			
2	8001595	156010	29588	29589	KR 95A	CL 42F SUR	CL 42G SUR	50,07	6	CALZADA	3,72	76,75	285,18	Sin iniciar	4-jul-23	SIN PMT			
3	8000957	156201	29886	29897	KR 97A	CL 41 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,53	67,8	307,36	SIN ACTIVIDADES	28-mar-23				
4	8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	47,61	6	CALZADA	4,35	34,72	150,9	Calzada: Demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	24-feb-23				
5	8000655	156051	29668	29669	KR 98C BIS	CL 38C SUR	CL 40 SUR	47,12	6	CALZADA	3,86	90,24	347,99	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT			
6	8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	47,61	6	CALZADA	5,07	65,69	333,12	Calzada: Instalación de solado 1500psi base de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	16-dic-22				
7	8000736	156045	29656	29657	KR 98	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	4,04	93,14	376	Sin iniciar	23-may-23	SIN PMT			
8	8002417	155940	29448	29449	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	29,9	6	CALZADA	2,57	88,02	226,36	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de concreto, excavación manual. Andén occidental: Demolición de concreto, excavación manual.	27-abr-23				
9	8002500	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	29,41	6	CALZADA	2,54	69,79	177,24	SIN ACTIVIDADES	4-may-23				
10	8011960	156950	30982	30983	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	6	CALZADA	2,93	136,9	401,1	Sin iniciar	10-may-23	SIN PMT			
11	8011955	156945	30972	30973	KR 97A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	29,9	1	CALZADA	4,38	140,7	616,78	Sin iniciar	No se tiene programación				
12	8000849	156231	29956	29957	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,07	62,44	316,88	Calzada: Instalación de sumidero, excavación de sumidero a pozo, instalación de solado 1500psi base de sumidero ambos costados, de tubería de 12" y arena de peña como recubrimiento de la misma, nivelación de pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	21-abr-23				
13	8000772	156220	29934	29935	KR 98	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,54	56,87	201,43	SIN ACTIVIDADES	16-ene-23				
14	8000814	156221	29936	29937	KR 98	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,54	67,69	307,42	Calzada: Instalación de bordillo A80. Andén oriental: Retiro de adoquín y reinstalación del mismo, nivelación con arena de peña, arena de sello, concreto de 3000psi. Andén occidental: Sin actividad.	20-ene-23				
15	8000856	156222	29938	29939	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	46,42	6	CALZADA	4,61	67,45	310,79	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Acabados e instalación de tapas cajas de inspección. Andén occidental: Acabados e instalación de tapas cajas de inspección.	9-mar-23				
16	8000907	156223	29940	29941	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,81	64,09	308,44	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado 2da capa, acabados en cajas de inspección. Andén occidental: Demolición y construcción de cajas de inspección 6un.	2-mar-23				
17	8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	3,93	58,12	228,25	SIN ACTIVIDADES	26-ene-23				
18	8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	3,86	67,37	260,04	Calzada: Instalación de monobloc PD200 ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	2-feb-23				
19	8000563	156062	29670	29671	KR 99A BIS	CL 38C SUR	CL 38 SUR	47,12	6	CALZADA	4,66	80,91	376,93	Sin iniciar	No se tiene programación				
20	8000938	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	4,62	64,75	299,09	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de concreto y excavación manual. Andén occidental: Demolición de concreto y excavación manual, nivelación y compactación de sub rasante.	29-dic-22				
21	8000821	156212	29918	29919	KR 97D	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,16	59,22	246,61	SIN ACTIVIDADES	8-feb-23				
22	8000864	156213	29920	29921	KR 97D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,05	67,76	274,11	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Corte de concreto para dilatación de concreto. Andén occidental: Corte de concreto para dilatación de concreto.	14-feb-23				
23	8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,42	67,76	299,83	Calzada: Instalación de fresado estabilizado y de solado 1500psi base de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	22-dic-23				
24	8000871	156204	29902	29903	KR 97B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,1	6	CALZADA	4,45	60,94	271,42	SIN ACTIVIDADES	4-ene-23				
25	8000923	156205	29904	29905	KR 97B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,92	67,68	332,77	SIN ACTIVIDADES	10-ene-23				
26	8000988	156206	29906	29907	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,32	68,54	295,77	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Acabados en cajas de inspección. Andén occidental: Acabados en cajas de inspección	15-mar-23				
27	8001052	156207	29908	29909	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	47,26	6	CALZADA	5,12	66,41	340,23	Calzada: Instalación bordillo A80 ambos costados. Andén oriental: Instalación concreto 3000psi con asentamiento 5" y de fresado 2da capa. Andén occidental: Instalación de concreto 3000psi con asentamiento 5", de concreto 4000psi con asentamiento 5", de fresado 2da capa.	22-mar-23				
28	8000929	156196	29886	29887	KR 97	CL 40 SUR	CL 40A SUR	47,95	6	CALZADA	4,2	63,56	266,84	Calzada: Instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	5-dic-22				
29	8000996	156197	29888	29889	KR 97	CL 40A SUR	CL 41 SUR	47,26	6	CALZADA	4,24	67,58	286,62	SIN ACTIVIDADES	12-dic-22				
30	8001058	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	47,26	6	CALZADA	4,12	66,8	274,89	SIN ACTIVIDADES	10-abr-23				
31	8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	50,91	6	CALZADA	5,14	68,89	354,19	SIN ACTIVIDADES	3-abr-23				
32	8000979	156186	29866	29867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	49,66	6	CALZADA	5,14	34,54	177,45	Calzada: Demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	15-abr-23				
33	8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	48,3	6	CALZADA	5,11	32,2	164,5	Calzada: Demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	20-feb-23				
34	8000709	156232	29958	29959	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	46,42	6	CALZADA	4,09	53,43	218,4	Sin iniciar	10-ago-23				
35	8000743	156233	29960	29961	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	46,42	6	CALZADA	4,68	67,2	314,77	Sin iniciar	27-jul-23	SIN PMT			
36	8000619	156053	29672	29673	KR 99A BIS	CL 40 SUR	CL 38 C SUR	47,12	6	CALZADA	4,78	90,92	434,69	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV				
37	8011974	156971	31024	31025	CL 42A BIS SUR	KR 94A	KR 95	29,9	6	CALZADA	2,52	81,18	204,44	Calzada: Apertura de prioridad, se inicia excavación mecánica y retiro de material y sub-terranización de agua potable costado occidente 6un. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.					

38	8011973	156970	31022	31023	CL 42A BIS SUR	KR 93C	KR 94A	29,9	6	CALZADA	2,18	89,41	194,58	Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica y retiro de material. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.						
39	8000584	156058	29682	29683	KR 99C BIS	CL 40 SUR	CL 38C SUR	46,42	6	CALZADA	3,87	85,64	331,62	Sin iniciar	10-jul-23	SIN PMT				
40	8011953	156943	30968	30969	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	65,55	6	CALZADA	3,13	143,02	448,03	Sin iniciar	2-may-23	SIN PMT				
41	8011950	156942	30966	30967	KR 95B	CL 42B SUR	CL 42F SUR	29,06	6	CALZADA	3,94	81,9	322,33	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV					
42	8011949	156941	30964	30965	KR 95A	CL 42B SUR	CL 42F SUR	27,35	6	CALZADA	3,28	83,12	272,55	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV					
43	8002595	155838	29246	29247	CL 42B SUR	KR 91	KR 90A BIS	33,9	6	CALZADA	3,04	104,89	319,35	Calzada: Excavación en calzada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.						

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1. COMPONENTE TÉCNICO:

1.1. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA

• Verificación diaria del PMT instalado y calificación semanal del mismo, acorde con la aprobación de la SDM, la calificación para el presente periodo es de 65%. La disminución en la calificación se debe a que el Contratista no tiene senderos apropiados para los peatones, en algunos CIV de intervención los anuló al realizar excavaciones a través de los senderos, ausencia de señales verticales y barricadas, cerramiento de frentes de obra diferente a los propuestos en el PMT aprobado, señales de canalización con flechas de dirección incorrectas, indicación de desvíos por vías cerradas, entre otras.
• Mesas de trabajo internas con el director de Interventoría para definir los lineamientos de revisión de documentos del contratista. Coordinación con las áreas SST, Social y Ambiental, para la elaboración de los documentos entregados por la Interventoría en el Periodo.
• Elaboración de memorandos para comunicaciones internas y otras dirigidas al Contratista con los productos revisados en el periodo.
• Revisión de los informes diarios de inspección y memorias de cálculo de las cantidades de obra, diligenciamiento de la bitácora.
• Reporte diario de cantidades para el seguimiento de la programación
• Observaciones de la preacta de obra No.10, correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2023.
• Revisión y concepto de los informes semanales 39 a 45 del Contratista, correspondientes a los periodos de julio y agosto de 2023.

1.2 Seguimiento a las actividades del contratista

La Interventoría realizó el seguimiento de:
• **P4:**Calzada: Demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P32:**Calzada: Demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P33:**Calzada: Demolición y nivelación de estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P28:**Calzada: Instalación de base estabilizada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P29:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
• **P24:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental Sin actividad.
• **P25:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P21:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P22:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Corte de concreto para dilatación de concreto. Andén occidental: Corte de concreto para dilatación de concreto.
• **P3:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P13:**Calzada: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad.
• **P14:**Calzada: Instalación de bordillo A-80, Andén oriental: Retiro de adoquín y reinstalación del mismo, nivelación con arena de peña, arena de sello, concreto de 3000psi (cintas). Andén occidental: Sin actividad.
• **P17:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P18:** Calzada: Instalación de monoblock de PD200 ambos costados. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P30:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P31:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P12:**Calzada: Instalación de sumidero, excavación de sumidero a pozo ambos costados, instalación de solado 1500psi base de sumidero ambos costados, de tubería de 12" y de arena de peña como recubrimiento de tubería 12" ambos costados, nivelación de pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P15:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Acabados e instalación de tapas en cajas de inspección. Andén occidental Acabados e instalación de tapas en cajas de inspección.
• **P16:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado 2da capa, acabados en cajas de inspección. Andén occidental: Demolición y construcción de cajas de inspección 6un.
• **P26:**Calzada: Sin actividad. Andén occidental: Acabados en cajas de inspección . Andén occidental: Acabados en cajas de inspección
• **P27:**Calzada: Instalación bordillo A-80 ambos costados. Andén oriental: Instalación concreto 3000psi con asentamiento 5" y de fresado 2da capa. Andén occidental: Instalación de concreto 3000psi con asentamiento 5", de concreto 4000psi con asentamiento 5", de fresado 2da capa
• **P8:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición en concreto espesor 10cm, excavación manual. Andén occidental: Demolición en concreto espesor 10cm, excavación manual.
• **P9:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P20:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de concreto espesor 10cm, excavación manual. Andén occidental: Demolición de concreto espesor 10cm, excavación manual, nivelación y compactación de sub-rasante.
• **P23:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado y de solado 1500psi base de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P6:**Calzada: Instalación de solado 1500psi base de sumideros. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P43:**Calzada: Excavación en calzada. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P37:**Calzada: Apertura de prioridad, se inicia excavación mecánica y retiro de material y subrasantización de agua potable costado occidente 6un. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P38:** Calzada: Apertura de la prioridad, se inicia excavación mecánica y retiro de material. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.

1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Elaboración del informe mensual técnico No.10 de la Interventoría correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2023.
• Participación del comité de seguimiento semanal No.48
• Seguimiento de las actividades que ejecute el Contratista en obra.
• Diligenciamiento de bitácora, revisión y aprobación de los informes diarios del inspector y calificación semanal del PMT.
• Evaluación diaria de cantidades para la respectiva evaluación de la programación

2. COMPONENTE AMBIENTAL

• El 23 de agosto, se realiza en el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.
• El 29 de agosto, se realiza el comité de seguimiento ambiental y SST, recorrido a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones relativas al cerramiento ambiental y senderos peatonales, orden, aseo y limpieza general de los frentes de obra, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros, se trató el tema del aprovechamiento del fresado ,con base en la respuesta dada por la SDA, de acuerdo a lo cual, se concluye que el proyecto no se enmarca dentro de las obligaciones de cumplimiento de las metas de aprovechamiento de RCD. Por tanto esta obligación no aplica para el proyecto, dado que este no genera RCD para aprovechamiento.
• Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 100% en todos los Ítems de las fichas de seguimiento ambiental y SST. La calificación fue afectada por el orden, aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra.
• En la presente semana se dispuso 225m3 de material de excavación, con el gestor LAMD.
• Se continua con el uso del material fresado, para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU: 0m3 y de la Unidad de Mantenimiento vial: 282,53m3.
• Se utilizó concreto premezclado para los andenes de la vía, en la semana se utilizaron 18m3.
• Se realiza la revisión del correspondiente informe semanal del contratista, se generan observaciones y una vez subsanadas, se da aprobación mediante correo electrónico a la residente ambiental del contratista.

El Contratista realizó las siguientes actividades:

• Recorrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6, P23, P43, P37, P38, ACOPIO para verificar en obra que se esté cumpliendo con lo establecido en el MAO.
• Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6 Y P 23 y P43, P37, P38 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
• Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
• Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6, P23, P43, P37, P38 y acopio.
• Inducción ambiental y socialización de política integral.
• Comité de seguimiento ambiental y SST.
• Comité Participación ciudadana con FDLK 25 de agosto de 2023.
• Recolección de material escombro.
• Delimitación de senderos peatonales en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9 Y P20, P43, P37, P38.
• Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
0	1. Consorcio SCLV = 23 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Vialidad Limitada = 13 4. Cersa Ingeniería Ltda = 1 5. J.V.R Estudios = 1 6. Geovial Limitada = 5	0	53

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 24 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2023, se presentó ausentismo del personal de la Interventoría que se relaciona a continuación:

Nombre	Cargo	Días de incapacidad	Descripción
Carmen Elvira Hernández	Cadenera 1	1	M235: Incapacidad enfermedad general 23/08/2023 al 24/08/2023
Jhenifer Díaz Narváez	Cadenero 1	1	A083: Incapacidad enfermedad general 29/08/2023, un (1) día.

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El 24 de agosto de 2023 se llevó a cabo comité de seguimiento integral en el FDLK donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
• El 25 de agosto de 2023 se llevó a cabo Comité de participación ciudadana N°8 con el FDLK, Interventoría, Contratista y personas de la comunidad en donde el componente SST expuso el avance de las actividades realizadas en las prioridades intervenidas en el mes de julio de 2023, entrega de dotación al personal de obra, plan de Emergencia, inducciones y cumplimiento de los apéndices E del contrato COP 621-2022.
• El 29 de agosto de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
• Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

P32: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P33: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P4: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P28: Adecuaciones en las cajas de inspección.
P29: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P30: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P31: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P3: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P24: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P25: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P26: Excavación para instalación de monoblock, el contratista cuenta con punto ecológico (3 bolsas) y Kit para la atención de emergencias (Botiquín, camilla y extintor)
P27: Conformación de andenes, el contratista cuenta con punto ecológico (3 bolsas). Se solicitó revisar los plafones ya que están descubiertos y deben ser señalizados.
P21: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P22: No se encuentran desarrollando actividades de obra, CIV con asfalto y espacio público instalado, PMT y cerramiento retirado.
P23: No se encuentran desarrollando actividades de obra. Se evidencia punto ecológico (3 Bolsas)
P6: Instalación de 1RA capa de base estabilizada, el personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual. Se recomendó tener precaución con la excavación que se encuentra entre el sumidero y la zanja que conecta al pozo para que esta no quede totalmente expuesta.
P17: Adecuación en los sumideros. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual. Se solicitó revisar los plafones ya que están descubiertos y deben ser señalizados.
P18: Instalación de monoblock. El contratista cuenta con kit de emergencias, punto de hidratación y punto ecológico (3 bolsas), se solicita la recarga del extintor ya que se encuentra despresurizado.
P20: Excavación manual en andenes y construcción de cajas de inspección. El contratista cuenta con punto ecológico (3 bolsas), de hidratación y kit de emergencias. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.
P13: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P14: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P15: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P16: Excavación manual y compactación de fresado en andenes. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual. El contratista cuenta con punto ecológico (3 bolsas), punto de hidratación y Kit de emergencias.
P12: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P8: Se observa excavación manual en andenes. Se solicitó revisar el sendero peatonal y los accesos a las viviendas. El contratista cuenta con punto ecológico (3 bolsas), Kit para la atención de emergencias (botiquín, extintor, camilla)
P9: No se encuentran desarrollando actividades de obra.
P43: No se encuentran desarrollando actividades de obra. El contratista cuenta con punto ecológico.
P37: No se encuentran desarrollando actividades de obra. Se solicito completar el cerramiento al final del CIV ya que se evidencia excavación expuesta.
P38: Actividades de excavación mecánica en vía, cuenta con punto ecológico (3 bolsas), punto de hidratación y Kit de emergencias. El personal hace uso de EPP y elementos de identidad visual.

• A nivel general se solicitó revisar los plafones de los sumideros y garantizar que el material de estos sea resistente. Revisar que en los senderos peatonales no haya condiciones inseguras, como cajas de medidores sin señalizar.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 25 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
• El 28 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con la personal información sobre prevención del consumo de alcohol, donde se dio a conocer lo perjudicial que es para el cuerpo humano
• El 30 de agosto de 2023 se realizó comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
• Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
AGL CONSTRUCCIÓN SAS = 3 XIE S.A = 1 INGCONOR S.A.S = 1 Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 2	1. XIE S.A = 44 2. NOVA TOPOSMAR S.A.S = 7 3. PLANEACIÓN EN INGENIERIA S.A.S = 1 4. JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S = 1 5. DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S = 1 6. JOSE ARGEON MORA SERRANO = 11 7. R.A.C PETREOS S.A.S = 1 8. INPASUELC LTDA = 2 9. INGCONOR S.A.S = 6 10. Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S = 19 11. AGL CONSTRUCCION SAS = 8 12. Construcciones Obras Civiles y Transportes SAS = 1	1. XIE SA = 1 2. NOVA TOPOSMAR S.A.S = 1	111

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 24 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2023, el contratista reportó el ausentismo de 4 trabajadores.
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 24 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de días de ausencia = 2
N° de días de trabajo programados = 6
N° Trabajadores en la semana = 45
% de ausentismo = 0,74%
Es así como se evidencia que el 0,74% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El contratista realizó inducción al personal que ingreso a laborar en el periodo del presente informe donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la SST. Condiciones de salud y medicinal laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de EPP, Matriz de peligros entre otros.
• El contratista hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo
• El Contratista realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingreso a laborar al contrato COP 621-2022, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra.
• El Contratista mediante comunicación KNXIE22-621-896 remite el Informe semanal No. 46 del 17 al 23 de agosto de 2023 Componente SST. Sin embargo, este ya había sido revisado por la Interventoría, teniendo en cuenta que fue insumo para el informe semanal SST del Consorcio SCLV.
• El Contratista en cumplimiento del cronograma de actividades del SG-SST realizo reunión mensual (COPASST)
• El Contratista realizo cerramiento de áreas de trabajo y elaboración de escalones para garantizar el ingreso a las viviendas y seguimiento y revisión al uso adecuado de la dotación y EPP de todo el personal vinculado al contrato de obra.

ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• Se evidencia que durante el periodo el contratista, continua con la Atención del punto PAC en el horario de lunes a viernes de 8.00 am a 4.00 pm, así como la línea telefónica y correo electrónico.
• EL 23-agto-23 el contratista mediante comunicado KNXIE22-621-886 dio respuesta al derecho de petición No 5 del señor Diego López, en el cual adjuntan el paz y salvo y soporte de pago realizado al mismo. Por parte de la interventoría se radica el comunicado U233-G1-636-23 a la Alcaldía Local de Kennedy en el que se anexa el paz y salvo entregado por el contratista. Por lo anterior se cerró este derecho de petición
• El 24-agto-23 se recepciono la PQRSD No 24 de la señora Silvia Galeano quien solicita la realización de la rampa peatonal, teniendo en cuenta que tiene una hija en condición de discapacidad. El 25-agto-23 se realiza recorrido con los especialistas en espacio público y se define que se realizara la rampa vehicular. Esta solicitud se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta
• El 25-agto-23 se realizó seguimiento a la PQRSD No. 23, de la señora María Pérez, el área técnica del contratista responde mediante correo electrónico: *"Buena tarde, se ratifica en la respuesta emitida el día 15 de agosto en recorrido conjunto, donde se presentó la inquietud, quedando como compromiso entre áreas que en el evento de intervención y adecuación del espacio público se le reubicaría la cajilla frente al predio del peticionario"*. Esta PQRSD continúa abierta.
• El 25-agto-23 se recepcionó la PQRSD No 26 a la Señora María Ruiz quien manifiesta que en el predio se encuentra la caja de inspección colmatada. El componente social le solicita que se comunique a la línea de la empresa de acueducto, sin embargo la señora informa que en el momento no tiene los datos del propietario del predio, pero que los gestionara para realizar el reporte. El 29 de agosto se realiza seguimiento en el cual la señora informa que no tiene los datos del propietario del predio, por lo tanto se verifica en el acta de vecindad No AVI-LA-287 que nunca permitieron el ingreso, es decir que se encuentra sin información, se envía por medio de WhatsApp la solicitud de información para realizar la solicitud del vactor, el cual no tiene funcionamiento. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta.
• El 26-agto-23 se recepcionó PQRSD No 27 la persona encargada se acerca al PAC reclamando la instalación de 2 tapas de las cajas de inspección, e informa el daño de las baldosas en su predio, el cual ya fue arreglado por ella y solicita la devolución del dinero, lo cual costo $170.000. El 29 de agosto se realiza recorrido con el área técnica los cuales informan que en el transcurso de la próxima semana, se realizara la instalación de las tapas de las cajas de inspección. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para dar respuesta
• El 29-agto-23 se recepcionó PQRSD No 28, señor Misael Gamboa informa del apozamiento de agua el cual es un vector de olores que puede generar enfermedades a la comunidad. Se realiza recorrido con el área técnica y se hace limpieza del tramo y se rellena con el fresado y se compacta y de esta manera se cierra esta PQRSD a satisfacción del peticionario.
• El 29-agto-23 se recepcionó PQRSD, señora Marisol Mayorga quien se queja por los terminados de acceso a la vivienda, se realiza recorrido con el área técnica y se informa a la propietaria que la próxima semana se realizara el corte de la baldosa y la nivelación en concreto y así culminar los acabados. Esta PQRSD se encuentra abierta dentro de los días hábiles para el cierre.
• El 29-agto-23 se realizó seguimiento a la PQRSD No 17 de la señora Luz Estela Díaz, en el que la peticionaria radico un derecho de petición a la empresa de acueducto y de alcantarillado de Bogotá, teniendo en cuenta que a la fecha no le han entregado la factura del cobro del medidor de agua. Esta PQRSD continúa abierta.
• Se realizó recorrido urbano el 29 de agosto en las prioridades 28,29,24,25,22,21,13,14,3,17,18,4,32,33,31,32,12,15,16,26,27,8,9,20, 43, 37 y 38 en el cual se evidencio los puntos satélites de información y las vallas informativas móviles actualizadas.
• En visita al punto de atención al ciudadano se revisó y firmó soportes de la gestión social y se actualizo la bitácora social.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• Se realizo el comité FDLK No 8 en el cual se socializaron los avances del contrato correspondientes al mes de julio y se contó con la participación de 13 miembros del comité, el 25 de agosto.

4.3 Programa de acompañamiento técnico

• Levantamiento de 23 actas de vecindad en la prioridad 41 del tramo de la carrera 98 A entre la calle 42 A sur hasta la calle 42 F sur, del 23 al 29 de agosto

4.4 Programa de cultura ciudadana

• Se aprobó por parte de la interventoría el acta de la capacitación a personal de obra sobre el tema trabajo en equipo, el 24 de agosto.
• Se realizó capacitación sobre acciones de formación en espacios públicos sobre prevención de accidentes, en el jardín de las ovejas del rey prioridad 43, con la participación de 12 padres de familia, el 28 de agosto.
• Se reviso por parte de interventoría la metodología para el taller en el tema de patrimonio cultural a la cual se realizó observaciones el 28 de agosto.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

• Se cumple con el porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de la localidad y de contratación de mujeres de acuerdo a lo requerido por la minuta del contrato.

• Se recibieron 2 hojas de vida en el punto de atención al ciudadano.
• El 25-agto se ejecutó una socialización con una comerciante de la prioridad 37 en el cual se le informa, el tiempo de ejecución del contrato y las medidas a tomar durante la ejecución del mismo tanto con la clientela, al igual con que con los trabajadores del proyecto enfatizando en los créditos.

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto
Durante este periodo se divulgaron las siguientes piezas informativas:
• Se entrego predio a predio 57 Volantes # 64 de recomendaciones de espacio público en las prioridades 6,23,20 y se instalaron 3 Volantes en los puntos satélites de información de las prioridades 6,23,20.
• Se entrego 1 Volante # 110 de convocatoria al comité FDLK No 8 vía WhatsApp a los miembros del comité.
• Se entregaron 13 volantes #111 de avance del contrato del mes de julio a miembros del comité FDLK y se instalaron 25 volantes en los puntos satélites de información.
• Se entrego predio a predio 47 volantes #112 de inicio de malla vial en las prioridades 37,38 y se instalaron 2 Volantes en los puntos satélites de información de la prioridades 37,38.
• Se instalo 2 Volantes # 113 de recolección de basuras en los puntos satélites de informacion de la prioridades 37,38.
• Se entrego 1 Volante # 114 de convocatoria a taller de prevención vial en el jardín infantil las orejas del rey
• Se entrego predio a predio 19 volantes #115 de inicio de espacio público en la prioridad 20.
• Se instaló 1 volante #119 de inicio de espacio público en el punto satélite de informacion de la prioridad 20.
• Se entrego predio a predio 38 volantes #116 de inicio de espacio público en las prioridades 23,6 y se instalaron 2 volantes en los puntos satélites de informacion de las prioridades 23,6.
• Se instaló 2 volantes de inicio de inicio de obra en los puntos satélites de informacion de las prioridades 37,38.
• Se instaló 2 afiches de inicio de obra en los puntos satélites de informacion de las prioridades 37,38.
• Se instaló 2 volantes del PMT#1en los puntos satélites de informacion de las prioridades 37,38
• Se instaló 2 vallas informativas móviles en las prioridades 37,38
• El 26 agosto se realiza la instalación de 2 puntos satélites de información en: -Calle 42 A BIS Sur # 93 C – 80 Ana Ospina (prioridad 37) -Calle 42 A Sur # 42 A-20 Élber Olarte (prioridad 38)
• El porcentaje de avance de obra es el 37% y faltan 37 días para terminación de las mismas el cual fue registrado en las vallas informativas móviles.

4.7 Comités
• Se participó en el comité interno No 39, el 23 de agosto a través de la plataforma teams a las 2 p.m.
• Se participo en el comité integral No 11 y de seguimiento No 46, el 24de agosto en la alcaldía local de Kennedy a las 7 a.m.
• Se realizó el comité de seguimiento social No 46 en el punto de atención al ciudadano, el 29 de agosto

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	Si	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los treinta (Día en letras) 30 (Día en números)

días del mes de agosto (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

(Nombre y Apellidos del Profesional Designado por el Consorcio o Unión Temporal)
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 47 **DEL** 24 de agosto de 2023 **AL** 30 de agosto de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 621 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No.18- 8000839
Localización: KR 97F entre CL 40a SUR y CL 41 SUR
Descripción: Instalación de monoblock en ambos costados.



Descripción Foto 2.

CIV: No.13 - 8000772
Localización: KR 98 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Acabados en andén



Descripción Foto 3.

CIV: No.28 - 8000929
Localización: KR 97 entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 4.

CIV: No.29 - 8000996
Localización:KR 97 entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 5.

CIV: No.25 - 8000923.
Localización: KR 97B entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 6.

CIV: No.17 - 8000794.
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 7.

CIV: No.3 - 8000957
Localización: KR 97A entre CL 41 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 8.

CIV: No.14 - 8000794
Localización: KR 97F entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 9.

CIV: No.32 - 8000979.
Localización: KR 96A entre CL 40 SUR y CL 40 BIS SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 10.

CIV: No.24 - 8000871.
Localización: KR 97B entre CL 40 SUR y CL 40A SUR
Descripción: Sin actividad

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 11.
CIV: No.27 - 8001052
Localización: KR 97B entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Instalación de fresado en andén



Descripción Foto 12.
CIV: No.33 - 80001041.
Localización: KR 96A entre CL 40A SUR y CL 40B SUR
Descripción: Demolición de estabilizado para nivelación



Descripción Foto 13.
CIV: No.30 - 8001058
Localización: KR 97 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 14.
CIV: No.31 - 8001125.
Localización: KR 97 entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción:Sin actividad



Descripción Foto 15.
CIV: No.12 - 8000849
Localización: KR 98B entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Instalación de tubería corrugada de 12 pulgadas.



Descripción Foto 16.
CIV: No.15 - 8000856.
Localización: KR 98 entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 17.
CIV: No.21 - 8000821
Localización: KR 97D entre CL 40A SUR y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 18.
CIV: No.4 - 8001069
Localización: KR 96A entre CL 41 SUR y CL 40b SUR
Descripción: Instalación de sumidero



Descripción Foto 19.
CIV: No.16 - 8000907
Localización: KR 98 entre CL 42 SUR Y 42 A SUR
Descripción: Instalación parcial de fresado segunda capa costado oriente.



Descripción Foto 20.
CIV: No.26 - 8000988
Localización: KR 97B entre CL 41 SUR Y 42 SUR
Descripción: Demolición y excavación de estabilizado para instalación de monoblock.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 21.

CIV: No.8 - 8002417
Localización: KR 91C entre CL 42F SUR y CL 42G SUR
Descripción: Retiro de material de excavación



Descripción Foto 22.

CIV: No.9 - 8002500
Localización: KR 91C entre CL 42G SUR y CL 43 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 23.

CIV: No.22 - 8000864
Localización: KR 97D entre CL 41A SUR Y CL 41 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 24.

CIV: No.20 – 8000938
Localización: KR 97F entre CL 42 SUR y CL 42A SUR
Descripción: Demolición y excavación en andén



Descripción Foto 25.

CIV: No.6 - 8000977
Localización: KR 97D entre CL 42A SUR Y CL 42 SUR
Descripción: Instalación de estabilizado en vía



Descripción Foto 26.

CIV: No.23 – 8000916
Localización: KR 97D entre CL 41 SUR y CL 42 SUR
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 27.

CIV: No.43 - 8002595
Localización: CL 42B SUR entre KR 91 Y KR 90A BIS
Descripción: Excavación en calzada



Descripción Foto 28.

CIV: No.38 – 8011974
Localización: CL 42ª BIS SUR KR 93C KR 94A
Descripción: Excavación mecánica en calzada.



Descripción Foto 29.

CIV: No.37 - 8011974
Localización: CL 42A BIS SUR KR 94A KR 95
Descripción: Excavación mecánica en calzada

Descripción Foto 30.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

treinta (30) días del mes de agosto de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Alba
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora


CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN CON PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 1

SEGUIMIENTO AL 29-AGOSTO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
28	8000929	$ 349.737.154,00	$ 286.285.298,00	2,36%	$ 249.571.510,06	2,06%	71,36%	-0,30%
29	8000996	$ 276.918.878,00	$ 242.229.956,95	2,00%	$ 230.017.742,59	1,90%	83,06%	-0,10%
24	8000871	$ 282.489.045,00	$ 269.517.473,15	2,22%	$ 316.914.989,22	2,61%	112,19%	0,39%
25	8000923	$ 398.643.978,00	$ 345.626.779,89	2,85%	$ 167.580.111,58	1,38%	42,04%	-1,47%
13	8000772	$ 298.711.275,00	$ 289.860.253,15	2,39%	$ 181.117.015,69	1,49%	60,63%	-0,90%
14	8000814	$ 428.629.368,00	$ 414.590.745,60	3,42%	$ 219.841.522,71	1,81%	51,29%	-1,61%
17	8000794	$ 365.563.428,00	$ 305.729.990,38	2,52%	$ 118.644.242,33	0,98%	32,46%	-1,54%
18	8000839	$ 444.842.291,00	$ 414.390.409,14	3,42%	$ 160.035.541,94	1,32%	35,98%	-2,10%
21	8000821	$ 395.944.862,00	$ 379.185.734,00	3,13%	$ 288.468.430,28	2,38%	72,86%	-0,75%
22	8000864	$ 474.960.513,00	$ 407.701.220,24	3,36%	$ 291.893.541,98	2,41%	61,46%	-0,95%
3	8000957	$ 346.941.971,00	$ 324.515.767,59	2,68%	$ 235.659.349,31	1,94%	67,92%	-0,73%
33	8001041	$ 164.541.658,00	$ 148.920.206,67	1,23%	$ 106.542.888,69	0,88%	64,75%	-0,35%
4	8001069	$ 183.856.740,00	$ 154.073.695,45	1,27%	$ 99.191.898,48	0,82%	53,95%	-0,45%
16	8000907	$ 378.482.383,00	$ 361.864.228,92	2,98%	$ 45.139.844,65	0,37%	11,93%	-2,61%
15	8000856	$ 318.778.666,00	$ 314.966.117,90	2,60%	$ 101.721.942,96	0,84%	31,91%	-1,76%
26	8000988	$ 312.106.601,00	$ 248.815.938,04	2,05%	$ 132.284.837,60	1,09%	42,38%	-0,96%
32	8000979	$ 384.241.540,00	$ 151.794.191,30	1,25%	$ 81.779.319,46	0,67%	21,28%	-0,58%
30	8001058	$ 167.606.525,00	$ 307.025.458,10	2,53%	$ 115.616.492,38	0,95%	68,98%	-1,58%
31	8001125	$ 347.840.618,00	$ 295.012.954,84	2,43%	$ 127.724.877,75	1,05%	36,72%	-1,38%
27	8001052	$ 394.454.974,00	$ 384.495.380,79	3,17%	$ 96.112.900,63	0,79%	24,37%	-2,38%
12	8000849	$ 353.440.216,00	$ 417.435.434,91	3,44%	$ 89.809.802,86	0,74%	25,41%	-2,70%
8	8000849	$ 436.309.464,00	$ 0,00	0,00%	$ 52.577.779,36	0,43%	12,05%	0,43%
9	8002500	$ 341.127.565,00	$ 331.158.979,28	2,73%	$ 41.319.887,58	0,34%	12,11%	-2,39%
20	8000938	$ 389.375.082,00	$ 379.247.233,34	3,13%	$ 57.722.627,10	0,48%	14,82%	-2,65%
23	8000916	$ 464.716.467,00	$ 341.149.570,13	2,81%	$ 14.944.272,69	0,12%	3,22%	-2,69%
6	8000916	$ 462.079.926,00	$ 313.656.771,99	2,59%	$ 24.366.339,32	0,20%	5,27%	-2,39%
43	8002595	$ 492.144.459,00	$ 0,00	0,00%	$ 9.081.451,38	0,07%	1,85%	0,07%
37	8011974	$ 769.586.187,00	$ 111.867.896,23	0,92%	$ 10.746.302,73	0,09%	1,40%	-0,83%
38	8011973	$ 404.402.566,00	$ 449.488.730,61	3,71%	$ 7.088.470,50	0,06%	1,75%	-3,65%
2	8001595	$ 338.872.088,69	$ 201.968.128,72	1,67%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,67%
39	8000584	$ 443.145.176,00	$ 211.007.449,94	1,74%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,74%
1	8000687	$ 461.620.649,00	$ 442.058.339,95	3,64%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,64%
10	8011960	$ 725.200.480,00	$ 482.228.012,26	3,98%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,98%
34	8000709	$ 220.339.032,00	$ 43.418.981,91	0,36%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,36%
5	8000655	$ 463.799.391,00	$ 454.907.485,31	3,75%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,75%
40	8011953	$ 768.669.110,00	$ 454.416.007,41	3,75%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,75%
7	8000736	$ 491.684.934,00	$ 433.765.201,90	3,58%			0,00%	-3,58%
TOTALES			**$ 11.114.376.023,99**	**91,64%**	**$ 3.673.515.933,82**	**30,29%**		**-61,35%**
TOTAL DE OBRA			**$ 12.128.504.795,27**					

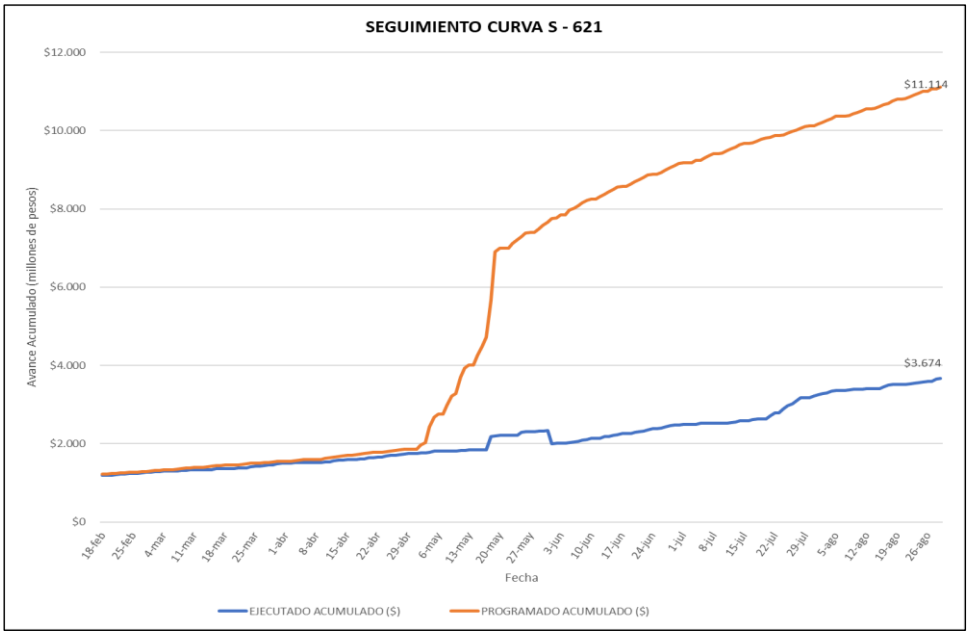



CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN POR CIV

FECHA EVALUACION			1-ago	8-ago	15-ago	22-ago	29-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	70,30%	70,30%	70,30%	70,30%	71,36%
29	8000996	$ 276.918.878,00	83,06%	83,06%	83,06%	83,06%	83,06%
24	8000871	$ 282.489.045,00	112,19%	112,19%	112,19%	112,19%	112,19%
25	8000923	$ 398.643.978,00	42,04%	42,04%	42,04%	42,04%	42,04%
13	8000772	$ 298.711.275,00	52,82%	59,90%	59,90%	60,63%	60,63%
14	8000814	$ 428.629.368,00	49,74%	50,25%	50,35%	51,28%	51,29%
17	8000794	$ 365.563.428,00	32,46%	32,46%	32,46%	32,46%	32,46%
18	8000839	$ 444.842.291,00	25,53%	25,53%	25,53%	25,53%	35,98%
21	8000821	$ 395.944.862,00	72,86%	72,86%	72,86%	72,86%	72,86%
22	8000864	$ 474.960.513,00	61,46%	61,46%	61,46%	61,46%	61,46%
3	8000957	$ 346.941.971,00	67,92%	67,92%	67,92%	67,92%	67,92%
33	8001041	$ 164.541.658,00	47,66%	47,66%	47,66%	64,75%	64,75%
4	8001069	$ 183.856.740,00	53,95%	53,95%	53,95%	53,95%	53,95%
16	8000907	$ 378.482.383,00	7,80%	8,02%	9,09%	10,01%	11,93%
15	8000856	$ 318.778.666,00	21,71%	24,77%	28,68%	31,91%	31,91%
26	8000988	$ 312.106.601,00	34,04%	38,62%	41,74%	42,38%	42,38%
32	8000979	$ 384.241.540,00	18,06%	21,28%	21,28%	21,28%	21,28%
30	8001058	$ 167.606.525,00	68,98%	68,98%	68,98%	68,98%	68,98%
31	8001125	$ 347.840.618,00	35,36%	36,46%	36,46%	36,72%	36,72%
27	8001052	$ 394.454.974,00	15,58%	16,53%	16,68%	18,67%	24,37%
12	8000849	$ 353.440.216,00	24,21%	24,40%	24,63%	24,79%	25,41%
8	8000849	$ 436.309.464,00	7,37%	11,16%	11,16%	11,16%	12,05%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,18%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%
20	8000938	$ 389.375.082,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,05%	14,82%
23	8000916	$ 464.716.467,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,22%
6	8000916	$ 462.079.926,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%	5,27%
43	8002595	$ 492.144.459,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,85%	1,85%
37	8011974	$ 769.586.187,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%
38	8011973	$ 404.402.566,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%

FECHA EVALUACIÓN			29-ago
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
28	8000929	$ 349.737.154,00	1,06%
29	8000996	$ 276.918.878,00	0,00%
24	8000871	$ 282.489.045,00	0,00%
25	8000923	$ 398.643.978,00	0,00%
13	8000772	$ 298.711.275,00	0,00%
14	8000814	$ 428.629.368,00	0,01%
17	8000794	$ 365.563.428,00	0,00%
18	8000839	$ 444.842.291,00	10,45%
21	8000821	$ 395.944.862,00	0,00%
22	8000864	$ 474.960.513,00	0,00%
3	8000957	$ 346.941.971,00	0,00%
33	8001041	$ 164.541.658,00	0,00%
4	8001069	$ 183.856.740,00	0,00%
16	8000907	$ 378.482.383,00	1,92%
15	8000856	$ 318.778.666,00	0,00%
26	8000988	$ 312.106.601,00	0,00%
32	8000979	$ 384.241.540,00	0,00%
30	8001058	$ 167.606.525,00	0,00%
31	8001125	$ 347.840.618,00	0,00%
27	8001052	$ 394.454.974,00	5,69%
12	8000849	$ 353.440.216,00	0,62%
8	8000849	$ 436.309.464,00	0,89%
9	8002500	$ 341.127.565,00	0,00%
20	8000938	$ 389.375.082,00	3,77%
23	8000916	$ 464.716.467,00	3,22%
6	8000916	$ 462.079.926,00	2,92%
43	8002595	$ 492.144.459,00	0,00%
37	8011974	$ 769.586.187,00	1,40%
38	8011973	$ 404.402.566,00	1,75%

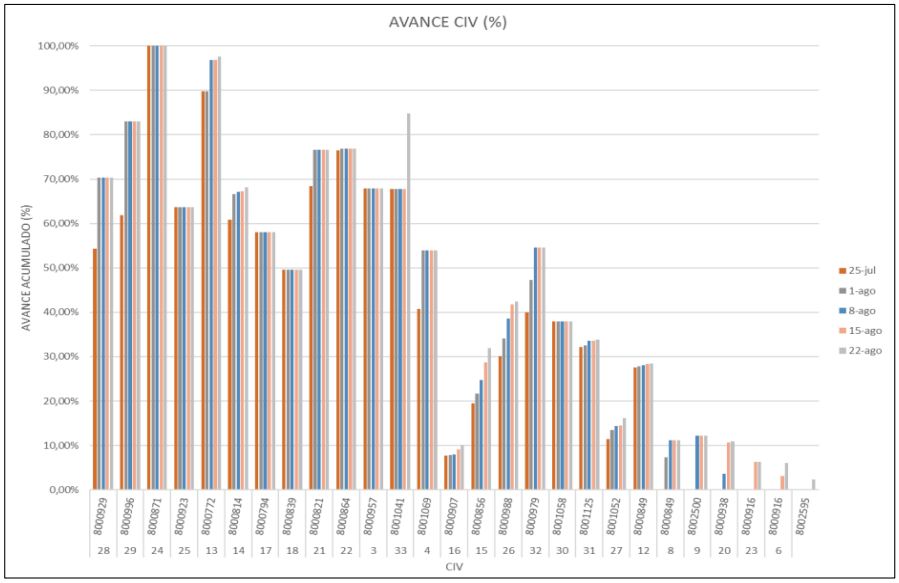

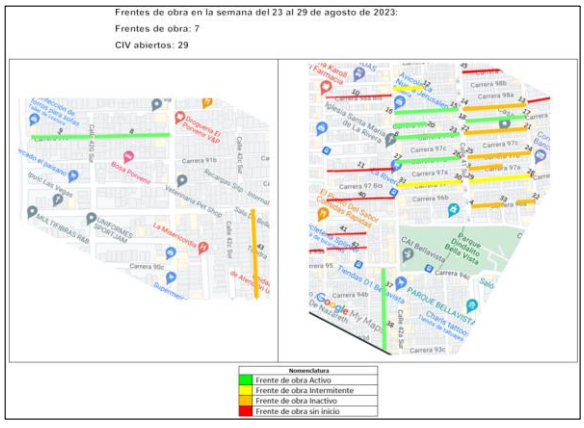

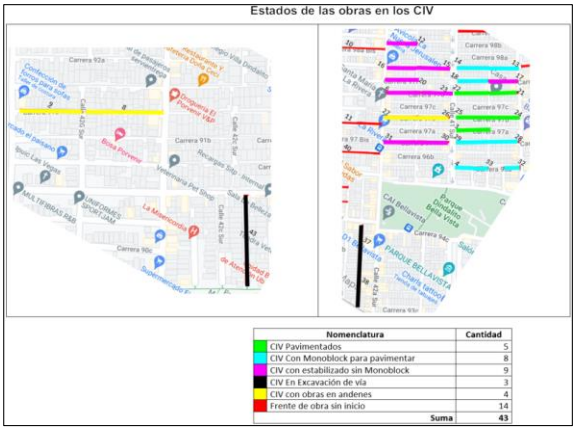

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 1 - CONTRATO COP-621-22
CONTRATISTA XIE S.A.

Periodo **24 de agosto al 29 de agosto de 2023**

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	89,03%	91,64%	89,03%
%Ejecutado	33,29%	30,29%	40,64%
%Desviación	-55,74%	-61,35%	-48,40%
