FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 43 **DEL** 27 de julio de 2023 **AL** 2 de agosto de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No No 717 de 2022 (número de contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **COP 690 de 2022** (número de contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 (nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.628.933-1

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV (nombre o razón social del interventor) **NIT** 900.547.145-2

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor	$ 19.621.435.784,00	Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022	Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (nombre y cargo del supervisor)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO (nombre y cargo del profesional del Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Anexo al informe del mismo radicado No.) **de fecha** (dd-mm-aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	AREA (M2)	km/carril	Unidad
Calzada CIV	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50
TOTALES	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,54%	2,54%		Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%	-2,54%
Valor del Trabajo Programado	$	$ 0,00		Valor del Trabajo Ejecutado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Fase preliminar Programada (%)	0,12%	0,26%		Fase preliminar Ejecutada (%)	0,12%	0,26%	0,26%
Fase preliminar Programada ($)	$ 23.972.839,46	$ 47.947.678,89		Fase preliminar Ejecutada ($)	$ 23.972.839,46	$ 47.947.678,89	$ 0,00
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%		Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$	$		Obra Ejecutada ($)	$	$	$

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



Semana No.	ACUMULADO FINANCIERO Programado	Ejecutado
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,00%	7,21%
10	2,10%	7,21%
11	1,73%	7,21%
12	2,54%	7,22%
13	2,66%	7,22%
14	4,62%	8,21%
15	8,07%	8,21%
16	7,47%	8,22%
17	9,07%	8,57%
18	11,53%	8,93%
19	13,64%	9,14%
20	6,41%	10,01%
21	3,91%	7,22%
22	3,87%	7,22%
23	4,77%	7,22%
24	5,62%	7,22%
25	6,41%	7,22%
26	6,88%	7,22%
27	16,19%	7,22%
28	14,09%	7,22%
29	16,03%	7,22%
30	19,35%	7,22%
31	23,09%	7,22%
32	26,73%	9,52%
33	46,36%	9,52%
34	53,13%	9,52%
35	55,84%	9,52%
36	57,95%	9,52%
37	59,96%	9,52%
38	62,68%	9,52%
39	64,49%	9,52%
40	66,67%	17,78%
41	70,47%	17,78%
42	72,95%	17,78%
43	76,67%	17,78%

Análisis de la Gráfica:
No se cuenta con monograma

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
Fase preliminar	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	%Atraso /%Avance
Fase preliminar programada (m²)	1542,91	3085,82	23%	Fase preliminar Ejecutada (m2)	1542,91	3085,82	23%	
Fase preliminar programada (Und)	0	0	24%	Fase preliminar Ejecutada (Und)	0	0	24%	0%
Fase preliminar programada (Km/carril)	0,001714286	0,003428571	0,09%	Fase preliminar Ejecutada (Km/carril)	0,001714286	0,003428571	0,09%	
Estudios y Diseños Program. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Meta Física Programada (m²)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%	
Meta Física Programada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
Meta Física Programada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%	0%
Meta Física Programada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%	
Meta Física Programada (%)				Meta Física Ejecutada (%)				
AVANCE PROJECT								%Atraso /%Avance
Avance Programado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento periódico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento Reconstrucción	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%			0%
Avance Programado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%			0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERFICIE	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	ESTADO	INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DESBERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA	MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO	Acciones a seguir
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33,44	6	CALZADA	3,19	82,04	261,84	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi y MR-41. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi y MR-41	1-abr-23		
45	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51,58	6	CALZADA	4,38	129,94	569,35	Sin iniciar	8-jul-23	SIN PMT	
46	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29,06	6	CALZADA	3,83	62,8	240,73	Sin iniciar	7-jul-23	SIN PMT	
47	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33,55	6	CALZADA	2,93	100,38	294,44	Sin iniciar	17-jul-23	SIN PMT	
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	4,74	144,13	683,05	Calzada: Instalación de fresado estabilizado con cemento al 4% y solid sol. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	15-jun-23		
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32,6	6	CALZADA	2,7	82,01	221,4	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición y excavación manual.	24-jul-23		
50	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	5,25	136,17	714,24	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de caja de inspección. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado.	10-may-23		
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28,88	6	CALZADA	2,59	88,19	228,81	Sin iniciar	No se tiene programación		
52	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28,19	6	CALZADA	2,35	72,08	170,02	Sin iniciar	No se tiene programación		
53	8003995	155822	29214	29215	CL 43F BIS SUR	KR 89C	KR 89F	30,14	6	CALZADA	2,82	41,45	169,22	Sin iniciar	No se tiene programación		
54	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37,56	6	CALZADA	4,88	88,18	430,2	Sin iniciar	No se tiene programación		
55	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81 T	KR 81J	29,06	6	CALZADA	3,74	27,95	104,45	Sin iniciar	25-jul-23	SIN PMT	
56	8004947	153152	24347	92062885	KR 93	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29,78	6	CALZADA	4,24	71,14	301,74	SIN ACTIVIDADES	25-feb-23		
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,45	27,73	95,75	Sin iniciar	18-ago-23	SIN PMT	
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33,55	6	CALZADA	4,63	80,45	372,11	Sin iniciar	23-feb-23	SIN PMT	
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32,51	6	CALZADA	4,32	66,67	288,2	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52,62	6	CALZADA	5	79,19	395,73	Calzada: Instalación de asfalto. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	22-dic-22		
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51,58	6	CALZADA	4,54	65,92	299,32	SIN ACTIVIDADES	6-ene-23		
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48,97	6	CALZADA	4,54	76,23	345,98	SIN INICIAR	4-mar-23		
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63,03	6	CALZADA	4,41	66,53	293,12	SIN INICIAR	No se tiene programación por CIV		
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,93	69,19	272,04	Calzada: Instalación de asfalto. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	21-mar-23		
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29,06	6	CALZADA	3,5	67,82	237,35	SIN ACTIVIDADES	28-feb-23		
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,84	67,47	259,4	Calzada: Instalación geotextil, geocelda y fresado para terminación vía esquina sur. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	9-mar-23		
67	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	3,79	66,96	253,67	Sin iniciar	3-abr-23	SIN PMT	
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,15	68,59	284,73	Calzada: Instalación geocelda. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.	18-mar-23		
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,26	67,66	288,51	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de fresado y geotextil	8-abr-23		
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	3,87	62,49	241,97	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación mecánica y excavación manual. Andén occidental: Construcción cajas de inspección.	4-abr-23		
71	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,04	67,46	272,75	SIN ACTIVIDADES	21-abr-23		
72	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48,97	6	CALZADA	3,4	67,15	228,19	Sin iniciar	6-jun-23	SIN PMT	
73	8001148	155917	92062824	92062917	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49,32	6	CALZADA	4,21	55,04	231,7	SIN ACTIVIDADES	26-ene-23		
74	8001164	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50,01	6	CALZADA	4,18	62,56	261,7	Calzada: Instalación sumideros. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad			
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 39C SUR	49,32	6	CALZADA	3,56	29,93	106,54	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación concreto 3000 psi	24-ene-23		
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49,32	6	CALZADA	3,92	31,84	124,92	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Sin actividad.	24-ene-23		
77	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	30,59	6	CALZADA	4,17	84,31	351,16	Calzada: Apertura CIV e inician con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	16-may-23		
78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,47	27,72	96,23	Sin iniciar	12-sep-23	SIN PMT	
79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31,4	6	CALZADA	4,09	96,82	395,99	SIN ACTIVIDADES	9-may-23		
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	2	CALZADA	4,06	96,35	391,11	Calzada: Excavación mecánica para instalación tubería de aguas lluvias. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	6-jun-23		
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28,95	6	CALZADA	4,3	73,09	314,48	SIN ACTIVIDADES	16-dic-22		
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28,54	6	CALZADA	4,89	72,7	355,66	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi	3-ene-23		
83	8005258	153095	24272	24274	CL 43F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31,84	6	CALZADA	3,21	27,69	88,78	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
84	8005192	153096	24275	24276	CL 43F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50,91	6	CALZADA	2,87	27,86	79,87	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
85	8005126	153097	24277	24278	CL 43F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50,91	6	CALZADA	3,11	27,9	86,74	Sin iniciar	10-ago-23	SIN PMT	
86	8005053	153098	24279	24280	CL 43F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47,26	2	CALZADA	3,53	27,59	97,43	Sin iniciar	19-ago-23	SIN PMT	
87	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29,06	6	CALZADA	3,59	55,42	199,15	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28,04	6	CALZADA	4,28	53,74	230,06	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	6	CALZADA	4,34	99,91	433,99	Calzada: Instalación de fresado estabilizado con cemento al 4% y solid sol. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	21-jun-23		
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31,84	6	CALZADA	3,23	27,95	90,26	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29,06	6	CALZADA	4,1	27,99	114,7	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
92	8004910	153106	24295	92062824	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	49,21	6	CALZADA	2,22	112,12	248,59	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
93	8001427	155869	29268	29269	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29,06	6	CALZADA	2,95	56,74	167,56	Sin iniciar	16-jun-23	SIN PMT	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1.COMPONENTE TECNICO

1.1. Actividades Técnicas de Interventoría

• Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
• Se cuenta con PMT aprobados de los CIV 8004757-8004599-8004616-8004663-8002162-8002265-8001931-2002008-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947 - 8001641 - 8001390 - 8001285
• Seguimiento en la conformación de espacio público 44-49-50-85-86-69-70, a la instalación de asfalto en P69-P64, mejoramiento de vía y excavación mecánica 89-77-79. Seguimiento a la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 psi P44-P66-P65. Seguimiento a la apertura de CIV 8001285 - 77

1.2 Seguimiento de las actividades del contratista

• **P63:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P62:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi
• **P60:**Calzada: Instalación de asfalto. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P61:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P64:**Calzada: Instalación de asfalto. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P65:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P72:**Calzada: Sin actividad. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
• **P73:**Calzada: Instalación bordillos. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
• **P75:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación concreto 3000 psi
• **P76:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi.. Andén occidental: Sin actividad.
• **P66:**Calzada: Instalación geotextil, geocelda y fresado para terminación vía esquina sur. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P46:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi y MR-41. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi y MR-41
• **P50:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado.
• **P68:**Calzada: Instalación geocelda. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P69:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de fresado y geotextil
• **P70:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación mecánica y excavación manual. Andén occidental: Construcción cajas de inspección.
• **P71:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P48:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición y excavación manual.
• **P49:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado con cemento al 4% y solid soil. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P56:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P59:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado con cemento al 4% y solid soil. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P79:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P80:**Calzada: Excavación mecánica para instalación tubería de aguas lluvias. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P77:** Calzada: Apertura CIV e inician con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

1.5 Actividades a realizar la siguiente semana

• Excavación mecánica y transporte de material proveniente de excavación.

2. COMPONENTE AMBIENTAL

• La calificación fue de 100%
• RCD GENERADO. Para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 555m3.
• Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial 180 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (64) - Descargue concreto 3000 psi - Estampado espacio público - Conformacion espacio público Rampas - Descargue concreto MR41 Microfibra - Fundida Rampas vehiculares - Estampado Rampas vehiculares
CIV 8004699 (48) - Instalación y compactación de fresado Estabilisado RAP 1a capa - Conformacion y Nivelación Fresado Estabilisado RAP 1a capa - Compactación Fresado capa de Geocelda
CIV 8004616 (49) - Demolición y excavación Andén - Estampado toponal - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén - Demolición y construcción Cajas de inspección.
CIV 8004663 (50) - Demolición y construcción Cajas de inspección - Conformacion andén en Fresado espacio público - Instalación Bordillo A-80 - Conformacion Andén espacio público
CIV 8002162 (60) - Retiro de PMT - Remates de retiro de PMT
CIV 8002265 (61) - Conexión cajas de inspección monoblock 320 a sumidero - Arreglo de Cañuela y sifones en predio
CIV 8001931 (64) - Sin actividades
CIV 8002008 (65) - Instalación de cabezal sumidero ambos costados - Instalación de canal monoblock 320 con accesorios 6" - Conformacion de anden
CIV 8001876 (66) - Lleno con fresado en anden - Compactacion y humectacion de 2capa fresado en anden - Estampado en anden ambos costados - Corte en anden dilataciones - Instalación de geotextil , geocelda y lleno con fresado - Compactacion de fresado capa geocelda
CIV 8001823 (59) - Nivelación 2da capa de Fresado andén - Excavación para instalación bordillo A-80 - Excavación para filtro y mejoramiento predio - Compactación con canguro andén - Corte en vía para remate espacio público - Instalación geotextil para andén - Instalación geoteen y mejoramiento en andén - Riego con agua para vaciado concreto - Extendido concreto 3000 psi andén - Estampado andén - Dilataciones en losas de concreto andén oriental - Lleno con fresado andén occidental - Compactación y nivelación 2da capa de Fresado andén occidental - Lleno con fresado andén oriental
CIV 8001657 (70) - Demolición cajas de inspección - Retiro material excavación - Instalación tapa concreto pozo - Demolición cimientos andén costado occidental - Instalación geotextil andén - Lleno con fresado andén - Lleno alrededor cajas de inspección andén occidental - Riego con agua en andén oriental - Compactación con canguro andén costado oriental - Excavación para instalación Monoblock 320 costado occidental
CIV 8001771 (71) - Demolición andén costado occidental
CIV 8001148 (73) - Sin actividades
CIV 8001184 (74) - Instalación sumidero andén sector sur y norte - Colilla tubería sumidero andén norte y sur
CIV 8005000 (81) - Sin actividades
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Compactacion y nivelación de fresado capa geocelda - Cereo de estabilizado 1ra capa - Compactacion de estabilizado - Mezcla de estabilizado Rap - Compactacion de estabilizado Rap 1ra capa.

En recorrido realizado en forma conjunta Residente ambiental de Interventoría con el residente ambiental del contratista se evidenció lo siguiente:

• Se solicita al contratista el retiro de los residuos de las excavaciones que se encuentran acopiados
• Los frentes de obra se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo, varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de excavación, donde se realiza acopio de residuos para ser retirados cuando se compete la capacidad de la volqueta.
• Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y baños fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.
• El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.
• Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.
• En la misma visita se evidenció "Ausencia de Personal y de actividades" en algunos CIV's.

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
1. Consorcio SCLV = 1	1. Consorcio SCLV = 22 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Vialidad Limitada = 13 4. Cense Ingeniería Ltda = 1 5. J.V.R Estudios = 1 6. Geovial Limitada = 5	0	53

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 27 julio de 2023 al 2 de agosto de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• La Interventoría realizó inducción al personal que ingresó, donde se socializaron temas como reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo, sistema de gestión de SST, identificación de peligros, plan de emergencia, responsabilidades generales en SST, entre otros temas. De igual manera se le notificó los peligros a los que se encuentran expuestos, también el derecho a participar en el proceso de retiro, una vez finalicen sus actividades con el Consorcio SCLV.
•El 27 de julio de 2023 se realizó comité de integral N° 10 presencial, donde el componente SST revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales N°9, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
•El 28 de julio de 2023 se realizó capacitación ciudadana con personas de la comunidad en donde el componente SST expuso el avance de las actividades realizadas en las prioridades intervenidas, entrega de dotación al personal de obra, plan de Emergencia, inducciones y cumplimiento de los apéndices E del contrato CDP 690-2022.
•El 1 de agosto de 2023 los componentes SST ,Ambiental, social y ambiental y técnico de la Interventoría realizaron recorrido de obra por los CIV en ejecución al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, adicional a esto el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual así mismo hace los elementos de Protección Personal (EPP) para las actividades de obra.
•Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

UPZ CORABASTOS:

P61: No se encuentran desarrollando actividades
P62: No se encuentran desarrollando actividades
P44: Actividades de excavación de sumidero, el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con punto ecológico.
P48: No se encuentran desarrollando actividades
P49: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con, kit de emergencia y punto ecológico.
P55: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con baño portátil, kit de emergencia
P56: No se encuentran desarrollando actividades.

UPZ PATIO BONITO:

P62: No se encuentran desarrollando actividades.
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P64: No se encuentran desarrollando actividades
P65: No se encuentran desarrollando actividades
P66: Actividades extendida de fresado estabilizado este CIV cuenta con kit de emergencia. punto ecológico, kit anti derrame y cartelera informativa.
P68: Instalación de geocelda
P69: Actividades de conformación de espacio público, este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico.
P70: Actividades de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico.
P73: No se encuentran desarrollando actividades.
P73: No se encuentran desarrollando actividades.
P74: No se encuentran desarrollando actividades
P75: Actividades de remates de predios, este CIV cuenta con kit de emergencia, kit anti derrame y punto ecológico, estos insumos están compartidos con los CIV 73,74 y 76.
P76: No se encuentran desarrollando actividades.
P77: Actividades de excavación, este CIV cuenta carpa punto ecológico, una (1) unidad sanitaria, kit de emergencia y kit antiderrame.
P78: Actividades de extendida de estabilizado, este CIV Cuenta con punto ecológico, kit de emergencia y kit antiderrame.
P80: Actividades de excavación de tubería este CIV cuenta con carpa punto ecológico, una (1) unidad sanitaria, cartelera informativa, kit de emergencia y kit antiderrame
P80: Compactación de estabilizado

• De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista revisar los pasos peatonales y donde haya tapas de medidores dañadas ajustarlas. Adicional a eso donde haya sumideros bajitos, señalizar mejor ya que no están a nivel de la vía y el sendero peatonal.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 31 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó al personal información sobre la prevención del consumo de cigarrillo, donde se informó los daños que genera en el cuerpo humano
• El 2 de agosto de 2023 se realizó comité interno de interventoría donde el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
• El 2 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios oleomusculares.
• Con la comunicación U233-G2-583-23 FDLK RTA 584 se aprobaron los Documentos de ingreso del inspector laboratorista.
• Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO.

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 27 julio de 2023 al 2 de agosto, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
AKA HUMANA = 7 MMAPV SAS = 1	1. CVK22 = 9 2. AKA HUMANA = 84 3. MMAPV SAS = 6 4. MR GROUP COL SAS = 1 5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1 6. MABERK = 1 7. WITS = 1 8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1 9. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 11 10. CONSTRUBERNAL = 1 11. SAM INGENIERIA = 10 12. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1 13. CARLOS ALDEMAR DIAZ CASAS = 1 14. HA CIVILES = 3 15. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1 16. PROURBANICS = 2	1. CARLOS ALDEMAR DIAZ CASAS = 1 2. AKA HUMANA SAS = 6	135

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 27 julio de 2023 al 2 de agosto de 2023, el contratista reporto ausentismo de siete (7) trabajadores, cinco (5) generados por enfermedad general, y tres (3) que no asistieron. De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 27 julio de 2023 al 2 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación
N° de días de ausencia = 6
N° de días de trabajo programados = 6
N° Trabajadores en la semana = 56
% de ausentismo 1,79%

Es así como se evidencia que el 1,79% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
• Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Público y Fenómenos naturales
• Se realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato CDP 690-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra
• El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
• El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra
• Se llevo a cabo inspecciones de maquinaria y EPP en los frentes de obra.

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• En este periodo el PAC es atendido de acuerdo con el horario aprobado previamente por la interventoría; lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Adicionalmente, el contratista realizó recorridos sociales para atender inquietudes de la comunidad y acercar la atención a la ciudadanía en el área de intervención, los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo anterior, para completar 40 horas de atención según lo requerido contractualmente.
• En el corte reportado se atendió el PAC de acuerdo con el horario aprobado por la interventoría. En este periodo no se reportaron solicitudes de veeduríias ciudadanas.

PQRSD

A la fecha el contratista cuenta con 28 PQRSD; de las cuales 2 se encuentra pendiente de cierre, a continuación, se realiza la trasabilidad por cada una
• PQRSD 39: El 25/07/23 Ciudadano manifiesta incomformidad debido a que su predio se inunda. El 31/07/2023 el contratista realiza acercamiento a predio y le indica a la ciudadana que una vez elevada la queja aperturada en el comité integral (Fondo de desarrollo Local, interventoría y contratista) el día 27/072023, la indicación brindada por parte de interventoría es realizar una media caña de aproximadamente 5 Cm de ancho que da hacia el sitio, con este mejoramiento del espacio público, se atiende la queja ciudadana. Luego, el día 01/08/23 se realiza acercamiento a cierre para firma de la PQRSD, sin embargo, no se encuentra propietaria
• PQRSD 40: El 31/07/2023 se realiza apertura de la PQRSD, ciudadano manifiesta que el inspector de interventoría Pedro Montenegro ha solicitado crédito en su negocio y no ha recibido pago, el día 01 de agosto la interventoría emite correo electrónico al contratista en el cual hace algunas indican gestiones realizadas internamente para el cierre de la misma.

Recorridos Urbanos:

• El 27 de julio y 01 de agosto 2023 se realiza recorrido por los frentes de obra activos, en los cuales se verifica las vallas informativas, se atienden solicitudes de información de la comunidad y se realizan gestiones tendientes a cerrar actas de compromiso o de reunión aperturadas.
• El 01/08/23 interventoría brinda observaciones del recorrido realizado en campo por los frentes activos, los cuales quedan socializados en el acta de comité social de la presente semana.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• El 28/07/23 se ejecutan las reuniones de los comités veedores; en la UPZ 80 asistieron un total de 25 ciudadanos y en la UPZ 82 asistieron un total de 38 ciudadanos. Las actas de reunión a la fecha se encuentran en proceso de elaboración.

4.3 Programa de acompañamiento técnico

Actas de vecindad y rampas vehiculares

• Se continua con el levantamiento y edición de actas de vecindad del CIV 8001427 P. 93
• Se continúa realizando las actas de vecindad de cierre en las P. 81,82, 60,61,65 y 73 algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.
• El 28/07/23 se recibe la Radicación U233-G2-571-23 Aprobación de actas de vecindad – Prioridad 77 (CIV 8001285) por parte de la interventoría
Total, de actas realizadas en el contrato: 673

• Se continúa con el levantamiento de actas de acceso vehicular del CIV 8001427 P. 93
• Se continúa realizando las actas de acceso vehicular de cierre en las P. 81,82, 60,61,73, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.
• En las prioridades 60,61,73 algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.
• El 28/07/23 se recibe la Radicación U233-G2-571-23 Aprobación de actas de vecindad – Prioridad 77 (CIV 8001285) por parte de la interventoría
Total, de actas realizadas en el contrato: 423

Cierres de Actas de Vecindad:
• Se continúa realizando las actas de vecindad y actas de acceso vehicular de cierre en las P. 60, 73, 81 y 82, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.

Actas de compromiso:
• La interventoría realiza firma de las actas de compromiso de suspensión de acceso vehicular de las prioridades asfaltadas hasta la fecha; P81,82, 61,73 y 65.
• La interventoría realiza firma de las actas de compromiso de adecuación de bajantes de las prioridades asfaltadas hasta la fecha y de las actas de compromiso con comunidades cerradas en el periodo.

4.4 Programa de cultura ciudadana

• El 1/08/23 el contratista remite a la interventoría METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA Y DESARROLLO URBANO, para su revisión y aprobación, este mismo día la interventoría emite observaciones al documento y lo remitirá en V2.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

• A la fecha el contrato cuenta con 69 personas de MONC; de las cuales 12 de ellos residen en la localidad, 05 de estos trabajadores son mujeres y 07 son hombres, sus cargos dentro de la obra son de auxiliares de tráfico, BOAL y ayudantes de obra. El porcentaje de contratación general a la fecha es de 17.39 % correspondiente a trabajadores residentes en la localidad de Kennedy, de ellos 7,24 % son mujeres

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Vallas informativas

• Para el periodo reportado, los frentes de obra actuales cuentan con su valla informativa de inicio a fin y cuentan con el porcentaje de obra actual.
• El contratista realiza retiro de las vallas informativas en los tramos en los cuales se han instalado el asfalto, referente al CIV 8004947 P. 56 la valla se encuentra en custodia en bodega, ya que se instala únicamente cuando hay personal que pueda cuidar de ella, teniendo en cuenta la inseguridad de este sector.
• A corte de este periodo el avance de obra se encuentra en el 29.43% con 65 días para finalización de obra, se le notifica a la interventoría en comité de seguimiento, que esta información será actualizada los días de corte de entrega de informe semanal del área técnica.

Volantes de información:

• El 26/07/23 se realiza la distribución del volante 109 notificación de las actividades nocturnas en la Prioridades 80 y 64.
• El 28/07/23 se realiza distribución del volante 100 en las prioridades 60 y 64; distribución del volante 116 levantamiento de actas de vecindad, tercera visita de las prioridades 72 y 93.
• El 01/08/23 se remite a la interventoría el volante N. 123 construcción de espacio público en la prioridad 56, para revisión y aprobación.
• El 26/07/23 se inició la convocatoria al step mmo comité de participación FDLK UPZ 80, en esta UPZ se convocaron un total de 145 ciudadanos, y en la UPZ 82 se convocaron un total de 270 ciudadanos.

Puntos Satélites de información:

• El 25/07/23 se realiza actualización de PSI de las UPZ 80 y 82 con los últimos volantes aprobados por parte de la interventoría, respecto a inicio de actividades constructivas de malla vial, espacio público, puntos de recolección, convocatoria comité FDLK UPZ 80 Y 82.
• Se envía a través de la aplicación WhatsApp la convocatoria al comité FDLK No 7 a través de los grupos de cada UPZ.

4.7 Gestión

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

No se presentaron

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	CC	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los 03 (día del mes) de 2 (mes de informe)

días del mes de agosto (Mes del informe) de 2023 (Año de ejecución del informe)

Ingeniero - José Manuel Silva Cely
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 43 **DEL** 27 de julio de 2023 **AL** 2 de agosto de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No. 64 - 8001931
Descripción: Instalación de asfalto



Descripción Foto 2.

CIV: No.60 - 8002162
Descripción: Instalación de asfalto



Descripción Foto 3.

CIV: No.66 - 8001876
Descripción: Instalación fresado estabilizado



Descripción Foto 4.

CIV: No.69 - 8001823
Descripción: Conformación espacio público



Descripción Foto 5.

CIV: No.50 - 8004663
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 6.

CIV: No.49 - 8004816
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 7.

CIV: No.73 - 8001148
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 8.

CIV: No.44 - 8004757
Descripción: Instalación concreto 3000 psi

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 9.

CIV: No.68 - 8001715
Descripción: Instalación de geocelda



Descripción Foto 10.

CIV: No.79 - 8001390
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 11.

CIV: No.75 - 8001223
Descripción: Instalación de concreto 3000 psi



Descripción Foto 12.

CIV: No.70 - 8001657
Descripción: Construcción de cajas de inspección



Descripción Foto 13.

CIV: No.89 - 8001841
Descripción: Instalación de fresado estabilizado con cemento al 4% y solid soil



Descripción Foto 14.

CIV: No.74 - 8001184
Descripción: Instalación de sumideros



Descripción Foto 15.

CIV: No.71 - 8001771
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 16.

CIV: No.76 - 8001183
Descripción: Conformación de espacio público

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 17.

CIV: No.56 - 8004947
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 18.

CIV: No.80 - 8001581
Descripción: Excavacaión para instalación de tubería



Descripción Foto 19.

CIV: No.48 - 8004699
Descripción: Instalación de fresado estabilizado



Descripción Foto 20

CIV: No.77 - 8001285
Descripción: Excavacaión mecanica



Descripción Foto 21.

CIV: No.81 - 8005000
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 22.

CIV: No.61 - 8002265
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 23.

CIV: No.65 - 8002008
Descripción: Sin actividad

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

dos (Día en letras) (2) (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)


(Nombre) Juan Manuel Alba Rojas

Director de Interventoría.

Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2
SEGUIMIENTO AL 1-AGOSTO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 295.480.241,35	1,69%	89,25%	-1,14%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 235.122.369,51	1,35%	68,53%	-1,40%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 288.156.250,27	1,65%	89,85%	-1,30%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 314.420.891,92	1,80%	88,52%	-0,84%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 343.497.863,58	1,97%	95,26%	-0,51%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 365.422.481,56	2,09%	97,09%	-0,45%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 238.533.146,07	1,37%	83,49%	-0,57%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 67.875.208,86	0,39%	46,49%	-0,95%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 111.050.826,03	0,64%	77,01%	-0,41%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 244.634.805,10	1,40%	70,42%	1,40%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 37.073.678,35	0,21%	10,82%	-2,05%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 198.203.723,36	1,14%	62,29%	-1,33%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 207.922.675,40	1,19%	38,17%	-1,20%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 94.913.730,01	0,54%	27,00%	-1,83%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 69.339.454,86	0,40%	19,18%	-2,06%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 168.411.309,53	0,97%	49,31%	-1,57%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 653.738.872,60	3,75%	$ 171.627.186,43	0,98%	22,28%	-2,76%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 60.930.398,22	0,35%	16,14%	-2,20%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 45.794.285,95	0,26%	$ 119.778.980,92	0,69%	24,99%	0,42%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 387.288.818,16	2,22%	$ 82.252.716,83	0,47%	8,37%	-1,75%
89	8001841	$ 580.698.248,00	$ 304.298.356,84	1,74%	$ 60.119.747,33	0,34%	10,35%	-1,40%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 593.145.037,00	3,40%	$ 59.660.733,51	0,34%	9,48%	-3,06%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 449.045.683,53	2,57%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,57%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 521.618.723,00	2,99%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,99%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,85%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,50%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
77	8001285	$ 564.687.707,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 371.859.293,42	2,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,13%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 262.379.451,20	1,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,50%
45	8002718	$ 739.233.204,00	$ 229.656.786,16	1,32%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,32%
46	8005377	$ 280.055.154,00	$ 224.464.690,00	1,29%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,29%
47	8005506	$ 625.940.380,00	$ 99.787.929,60	0,57%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,57%
83	8005258	$ 124.373.507,00	$ 65.943.771,75	0,38%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,38%
84	8005192	$ 119.547.602,00	$ 6.890.949,70	0,04%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,04%
55	8005471	$ 136.685.140,00	$ 46.055.967,60	0,26%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,26%
TOTALES								
TOTAL DE OBRA			**$ 13.684.251.975,51**	78,44%	**$ 3.834.428.418,97**	21,98%		-56,46%
			$ 17.445.442.250,00					

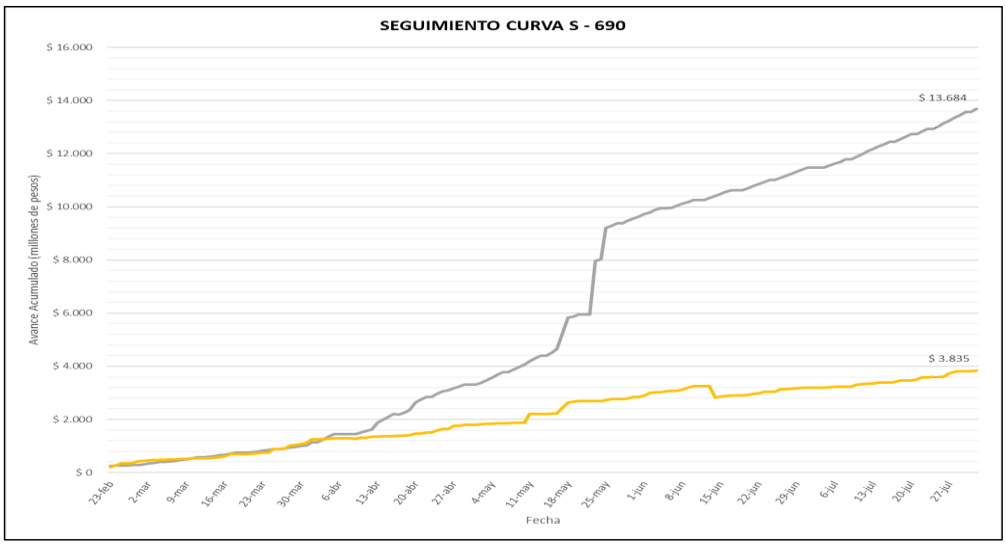



CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN CIV

FECHA EVALUACIÓN			4-jul	11-jul	18-jul	25-jul	1-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	89,25%	89,25%	89,25%	89,25%	89,25%
82	8005078	$ 343.085.920,00	68,53%	68,53%	68,53%	68,53%	68,53%
60	8002162	$ 320.721.252,00	76,00%	76,00%	77,21%	77,21%	89,85%
61	8002265	$ 355.199.128,00	87,40%	87,40%	88,52%	88,52%	88,52%
65	8002008	$ 360.580.405,00	94,00%	94,27%	95,26%	95,26%	95,26%
64	8001931	$ 376.367.569,00	78,94%	80,31%	83,25%	87,88%	97,09%
73	8001148	$ 285.710.532,00	83,49%	83,49%	83,49%	83,49%	83,49%
76	8001183	$ 146.013.903,00	41,65%	43,93%	43,93%	45,15%	46,49%
75	8001223	$ 144.206.710,00	61,94%	62,46%	65,22%	68,45%	77,01%
74	8001184	$ 347.413.004,00	69,14%	69,88%	69,88%	70,42%	70,42%
70	8001657	$ 342.553.149,00	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	10,82%
66	8001876	$ 318.216.103,00	47,43%	51,67%	54,67%	54,78%	62,29%
44	8004757	$ 544.689.706,00	29,61%	29,61%	30,02%	31,50%	38,17%
68	8001715	$ 351.516.714,00	13,36%	16,49%	18,12%	24,46%	27,00%
71	8001771	$ 361.446.034,00	19,18%	19,18%	19,18%	19,18%	19,18%
69	8001823	$ 341.507.411,00	41,87%	42,74%	43,44%	44,33%	49,31%
50	8004663	$ 770.232.864,00	16,06%	18,46%	18,46%	18,46%	22,28%
56	8004947	$ 377.475.477,00	7,07%	8,93%	14,22%	16,14%	16,14%
49	8004816	$ 479.216.394,00	7,57%	19,09%	24,84%	24,84%	24,99%
48	8004699	$ 983.197.315,00	4,71%	4,71%	8,10%	8,10%	8,37%
89	8001841	$ 580.698.248,00	2,31%	4,13%	6,22%	9,94%	10,35%
79	8001390	$ 443.969.911,00	0,00%	0,00%	0,25%	8,37%	9,48%
80	8001581	$ 584.822.489,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
77	8001285	$ 564.687.707,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FECHA EVALUACIÓN			1-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	12,64%
61	8002265	$ 355.199.128,00	0,00%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,00%
64	8001931	$ 376.367.569,00	9,21%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	1,33%
75	8001223	$ 144.206.710,00	8,56%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,00%
70	8001657	$ 342.553.149,00	1,47%
66	8001876	$ 318.216.103,00	7,50%
44	8004757	$ 544.689.706,00	6,67%
68	8001715	$ 351.516.714,00	2,54%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	4,98%
50	8004663	$ 770.232.864,00	3,82%
56	8004947	$ 377.475.477,00	0,00%
49	8004816	$ 479.216.394,00	0,16%
48	8004699	$ 983.197.315,00	0,27%
89	8001841	$ 580.698.248,00	0,41%
79	8001390	$ 443.969.911,00	1,11%
80	8001581	$ 301.695.957,00	0,00%
77	8001285	$ 370.268.458,00	0,00%

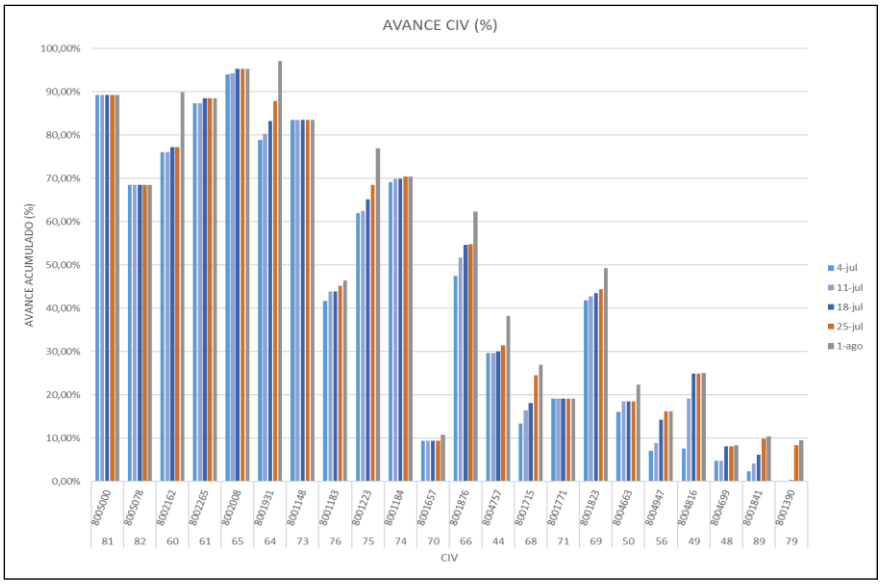

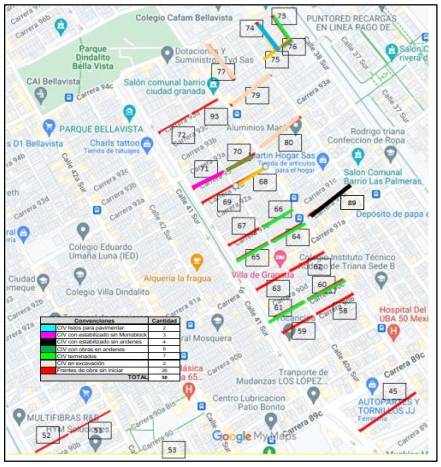

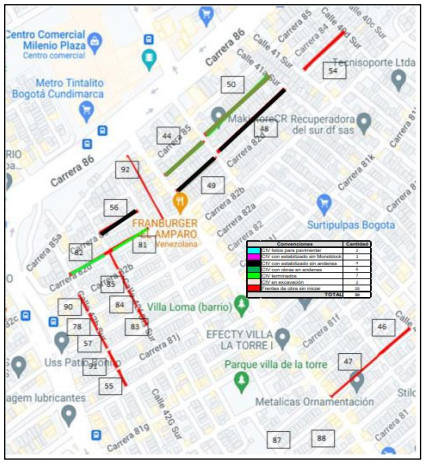

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Periodo 27 de julio al 1 de agosto de 2023

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	76,07%	78,44%	76,07%
%Ejecutado	24,23%	23,93%	17,78%
Atraso(-)/Adelanto(+)	-51,84%	-54,51%	-58,29%
