**FORMATO**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**SEMANA No.** 45 **DEL** 10 de agosto de 2023 **AL** 16 de agosto de 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** No 717 de 2022 (Número de contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** COP 690 de 2022 (Número de contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

**CONTRATISTA** CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 (Unidos o consorcio o unión temporal, de ser el caso) **NIT** 901.628.933-1

**INTERVENTOR** CONSORCIO SCLV (Unidos o consorcio o unión temporal, de ser el caso) **NIT** 900.547.145-2

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| Valor | $ 19.621.435.784,00 |
| Valor Adicional 1 | |
| Valor Actualizado | |
| Plazo Inicial | 12 meses |
| Plazo Prórroga 1 | |
| Plazo Actualizado | |
| Fecha de Iniciación | 5 de octubre de 2022 |
| Fecha de Terminación Inicial | 4 de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Actual | |
| No. de empleos generados | 30 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 4.897.418.342,00 |
| Valor Adicional 1 | |
| Valor Actualizado | |
| Plazo Inicial | 12 meses |
| Plazo Prórroga 1 | |
| Plazo Actualizado | |
| Fecha de Iniciación | 5 de octubre de 2022 |
| Fecha de Terminación Inicial | 4 de octubre de 2023 |
| Fecha de Terminación Actual | |
| No. De empleos generados | 45 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (Cargo y nombre del supervisor del IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO (Cargo y nombre del profesional del Equipo de apoyo a la supervisión)

## 2. AVANCES DEL CONTRATO

**META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO**

**Número de radicado de remisión de parte de interventoria del alcance físico del contrato de obra** (Anexar el número del oficio radicado IDU) **de fecha** (Fecha de radicado IDU)

| TIPO DE ELEMENTO | VALOR TOTAL ($) | ÁREA (M2) | km/carril | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Calzada CIV | $ 19.621.435.784,00 | 13224,93 | 3,78 | 50 |
| TOTALES | $ 19.621.435.784,00 | 13224,93 | 3,78 | 50 |


**A. AVANCE GENERAL**

**AVANCE FINANCIERO**

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO | Atraso Avance |
| Trabajo Programado | 2,64% | 2,64% | Trabajo Ejecutado | 0,00% | 0,00% | -2,64% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | $ 0,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FASE PRELIMINAR** | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO | Atraso Avance |
| Fase preliminar Programada (%) | 0,12% | | 0,12% | 0,24% | 0,48% |
| Fase preliminar Programada ($) | $ 23.973.809,48 | $ 47.947.478,99 | $ 23.973.809,48 | $ 47.947.478,99 | $ 0,00 |
| **OBRA** | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO | Atraso Avance |
| Obra Programada (%) | 0% | 0% | Obra Ejecutada (%) | 0% | 0% |
| Obra Programada ($) | $ | $ | Obra Ejecutada ($) | $ | $ |

**GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO**




| SEMANA No. | ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO | ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO |
|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | 2,00% | 7,21% |
| 10 | 2,35% | 7,21% |
| 11 | 1,73% | 7,21% |
| 12 | 2,54% | 7,22% |
| 13 | 3,46% | 7,23% |
| 14 | 4,62% | 8,01% |
| 15 | 6,07% | 8,47% |
| 16 | 7,47% | 8,55% |
| 17 | 9,07% | 8,57% |
| 18 | 11,12% | 8,58% |
| 19 | 13,98% | 9,13% |
| 20 | 9,41% | 10,01% |
| 21 | 3,92% | 7,22% |
| 22 | 3,87% | 7,22% |
| 23 | 4,77% | 7,22% |
| 24 | 5,92% | 7,24% |
| 25 | 8,40% | 7,25% |
| 26 | 6,88% | 7,25% |
| 27 | 10,33% | 7,25% |
| 28 | 13,99% | 7,25% |
| 29 | 18,03% | 7,22% |
| 30 | 19,35% | 7,22% |
| 31 | 23,20% | 7,22% |
| 32 | 26,73% | 9,02% |
| 33 | 46,36% | 9,52% |
| 34 | 53,23% | 9,52% |
| 35 | 55,94% | 9,53% |
| 36 | 57,95% | 9,57% |
| 37 | 59,95% | 9,59% |
| 38 | 62,48% | 9,52% |
| 39 | 64,49% | 9,52% |
| 40 | 66,82% | 17,78% |
| 41 | 70,47% | 17,78% |
| 42 | 72,95% | 17,78% |
| 43 | 76,07% | 17,78% |
| 44 | 78,98% | 17,78% |
| 45 | 82,43% | 25,12% |

**Análisis de la Gráfica:**

No se cuenta con cronograma

**AVANCE FISICO**

| PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase preliminar** | SEMANAL | ACUMULADO | %Prog. Acum. | | SEMANAL | ACUMULADO | % Ejec. Acum. | %Atraso /%Avance | |
| Fase preliminar programada (m²) | 1542,91 | 3065,82 | 23% | Fase preliminar Ejecutada (m2) | 1542,91 | 3065,82 | 23% | | |
| Fase preliminar programada (Und) | 5 | 10 | 24% | Fase preliminar Ejecutada (Und) | 5 | 10 | 23% | | 0% |
| Fase preliminar cronramada (Km/carril) | 0,000714286 | 0,001636571 | 0,09% | Fase preliminar Ejecutada (Km/carril) | 0,000714286 | 0,001636571 | 0,09% | | |
| Estudios y Diseños Program. (m2) | 0 | 0 | 0% | Estudios y Diseños Ejecutado (m2) | 0 | 0 | 0% | %Atraso /%Avance | |
| **OBRA** | SEMANAL | ACUMULADO | %Prog. Acum. | | SEMANAL | ACUMULADO | % Ejec. Acum. | | |
| Meta Física Programada (m2) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (m2) | 0 | 0 | 0% | | |
| Meta Física Programada (Km/carril) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (Km/carril) | 0 | 0 | 0% | %Atraso /%Avance | |
| Meta Física Programada (und) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (und) | 0 | 0 | 0% | | 0% |
| Meta Física Programada (km) | 0 | 0 | 0% | Meta Física Ejecutada (km) | 0 | 0 | 0% | | |
| Meta Física Programada (%) | | | | Meta Física Ejecutada (%) | | | | | |
| **AVANCE PROJECT** | | | | | | | | %Atraso /%Avance | |
| Avance Programado (%) | 0% | | | Avance Ejecutado (%) | 0% | | | | 0% |
| Avance Proyramado Mantenimiento cerrático | 0% | | | Avance Ejecutado Mantenimiento cerrático | 0% | | | | 0% |
| Avance Proyramado Mantenimiento Rutinario | 0% | | | Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario | 0% | | | | 0% |
| Avance Proyramado Mantenimiento Reconstrucción | 0% | | | Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción | 0% | | | | 0% |
| Avance Programado Mantenimiento Rehabilitación | 0% | | | Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación | 0% | | | | 0% |

## B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

| No | CIV | PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | IPR | TIPO SUPERFICIE | TIPO DE ELEMENTO | ANCHO CALZADA (m) | LONGITUD (m) | AREA CALZADA (m²) | ESTADO | INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBERÍAN INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA | MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO | Acciones a seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8004757 | 152907 | 23937 | 23938 | KR 84 | CL 42B SUR | CL 42A SUR | 33,44 | 6 | CALZADA | 3,19 | 82,04 | 261,84 | SIN ACTIVIDADES | 1-abr-23 | | |
| 45 | 8002718 | 155148 | 29227 | 29238 | KR 89B | CL 41B SUR | CL 41 SUR | 51,59 | 6 | CALZADA | 4,38 | 129,94 | 569,35 | Sin iniciar | 9-jul-23 | SIN PMT | |
| 46 | 8005877 | 152793 | 23725 | 23726 | KR 81C | CL 42 SUR | CL 41F SUR | 29,06 | 6 | CALZADA | 3,83 | 62,8 | 240,73 | Sin iniciar | 7-jul-23 | SIN PMT | |
| 47 | 8005506 | 152794 | 23727 | 23728 | KR 81C | CL 42 SUR | DG 42A SUR | 33,53 | 6 | CALZADA | 2,93 | 100,38 | 294,44 | Sin iniciar | 17-jul-23 | SIN PMT | |
| 48 | 8004699 | 152904 | 23931 | 23932 | KR 83 | CL 42A SUR | CL 41A SUR | 52,51 | 6 | CALZADA | 4,74 | 144,13 | 683,05 | SIN ACTIVIDADES | 31-jul-23 | | |
| 49 | 8004816 | 152905 | 23933 | 23934 | KR 83 | CL 42B SUR | CL 42A SUR | 32,6 | 6 | CALZADA | 2,7 | 82,01 | 221,4 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado. Andén occidental: Instalación de fresado y construcción de cajas. | 24-jul-23 | | |
| 50 | 8004663 | 152906 | 23935 | 23936 | KR 84 | CL 42A SUR | CL 41A SUR | 52,51 | 6 | CALZADA | 5,25 | 136,17 | 714,24 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi. | 10-may-23 | | |
| 51 | 8002727 | 155809 | 29188 | 29189 | KR 90C | CL 42F SUR | CL 42G SUR | 28,88 | 6 | CALZADA | 2,59 | 88,19 | 228,81 | Sin iniciar | No se tiene programación | | |
| 52 | 8002795 | 155810 | 29190 | 29191 | KR 90C | CL 42G SUR | CL 43 SUR | 28,19 | 6 | CALZADA | 2,36 | 72,09 | 170,02 | Sin iniciar | No se tiene programación | | |
| 53 | 8002995 | 155822 | 29214 | 29215 | CL 42F BIS SUR | KR 89C | KR 89F | 30,16 | 6 | CALZADA | 2,63 | 41,49 | 109,22 | Sin iniciar | No se tiene programación | | |
| 54 | 8004508 | 152883 | 23891 | 23892 | KR 83 | CL 40D SUR | CL 41 SUR | 37,56 | 6 | CALZADA | 4,88 | 88,16 | 430,2 | Sin iniciar | No se tiene programación | | |
| 55 | 8005671 | 153124 | 24331 | 24332 | CL 42H SUR | KR 81J | KR 81J | 29,06 | 6 | CALZADA | 3,74 | 27,95 | 104,45 | Sin iniciar | 31-jul-23 | SIN PMT | |
| 56 | 8004947 | 153132 | 24347 | 92062895 | KR 83 | CL 42C SUR | CL 42F BIS SUR | 29,79 | 6 | CALZADA | 4,24 | 71,14 | 301,74 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Instalación de geotextil, fresado. | 25-feb-23 | | |
| 57 | 8005351 | 153126 | 24335 | 24336 | CL 42H SUR | KR 81L | KR 82 | 28,19 | 6 | CALZADA | 3,45 | 27,73 | 95,75 | Sin iniciar | 18-ago-23 | SIN PMT | |
| 58 | 8002225 | 155774 | 29118 | 29119 | KR 90B | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 33,56 | 6 | CALZADA | 4,63 | 80,45 | 372,11 | Sin iniciar | 23-feb-23 | SIN PMT | |
| 59 | 8002331 | 155775 | 29120 | 29121 | KR 90B | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 32,51 | 6 | CALZADA | 4,32 | 66,67 | 288,2 | Sin iniciar | 18-may-23 | SIN PMT | |
| 60 | 8002162 | 155776 | 29122 | 29123 | KR 90C | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 52,62 | 6 | CALZADA | 5 | 79,19 | 395,73 | Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos. | 22-dic-22 | | |
| 61 | 8002265 | 155777 | 29124 | 29125 | KR 90C | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 51,58 | 6 | CALZADA | 4,54 | 65,92 | 299,32 | Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos. | 6-ene-23 | | |
| 62 | 8002055 | 155780 | 29130 | 29131 | KR 91 | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 48,97 | 6 | CALZADA | 4,54 | 76,23 | 345,98 | SIN INICIAR | 4-mar-23 | | |
| 63 | 8002132 | 155781 | 29132 | 29133 | KR 91 | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 43,03 | 6 | CALZADA | 4,41 | 66,53 | 293,12 | SIN INICIAR | No se tiene programación por CIV | | |
| 64 | 8001931 | 155852 | 29274 | 29275 | KR 91B | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 27,35 | 6 | CALZADA | 3,93 | 69,19 | 272,04 | Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos. | 21-mar-23 | | |
| 65 | 8002008 | 155853 | 29276 | 29277 | KR 91B | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 29,66 | 6 | CALZADA | 3,5 | 67,82 | 237,35 | Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos. | 28-feb-23 | | |
| 66 | 8001876 | 155860 | 29290 | 29291 | KR 91C | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 27,35 | 6 | CALZADA | 3,84 | 67,47 | 259,4 | SIN ACTIVIDADES | 9-mar-23 | | |
| 67 | 8001968 | 155861 | 29292 | 29293 | KR 91C | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 27,35 | 6 | CALZADA | 3,79 | 66,96 | 253,67 | Sin iniciar | 3-abr-23 | SIN PMT | |
| 68 | 8001715 | 155875 | 29320 | 29321 | KR 90B | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 28,19 | 6 | CALZADA | 4,15 | 68,59 | 284,73 | SIN ACTIVIDADES | 18-mar-23 | | |
| 69 | 8001823 | 155876 | 29322 | 29323 | KR 92B | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 27,35 | 6 | CALZADA | 4,26 | 67,66 | 288,51 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de concreto MR-41 | 8-abr-23 | | |
| 70 | 8001657 | 155878 | 29326 | 29327 | KR 93 | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 28,19 | 6 | CALZADA | 3,87 | 62,49 | 241,97 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi. | 4-abr-23 | | |
| 71 | 8001771 | 155879 | 29328 | 29329 | KR 93 | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 27,35 | 6 | CALZADA | 4,04 | 67,46 | 272,75 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Conformación espacio público demolición y construcción de cajas de inspección. Andén occidental: Conformación espacio público demolición y construcción de cajas de inspección. | 21-abr-23 | | |
| 72 | 8001545 | 155900 | 29370 | 29371 | KR 93D | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 48,97 | 6 | CALZADA | 3,4 | 67,15 | 228,19 | Sin iniciar | 6-jun-23 | SIN PMT | |
| 73 | 8001148 | 155917 | 92062684 | 92062817 | CL 38A SUR | KR 93D | KR 94C | 49,32 | 6 | CALZADA | 4,21 | 55,04 | 231,7 | Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos. | 26-ene-23 | | |
| 74 | 8001184 | 155918 | 92062720 | 92062828 | CL 38B SUR | KR 93D | KR 94C | 50,01 | 6 | CALZADA | 4,18 | 62,56 | 261,7 | SIN ACTIVIDADES | | | |
| 75 | 8001223 | 155893 | 29356 | 29357 | KR 93D | CL 38B SUR | CL 38A SUR | 49,32 | 6 | CALZADA | 3,56 | 29,93 | 106,54 | Calzada: Instalación de geotextil en empalme de exquina norte. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad. | 24-ene-23 | | |
| 76 | 8001183 | 155892 | 29354 | 29355 | KR 93D | CL 38A SUR | CL 38B SUR | 49,32 | 6 | CALZADA | 3,92 | 31,84 | 124,92 | Calzada: Instalación de geotextil en empalme de exquina sur. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad. | 24-ene-23 | | |
| 77 | 8001285 | 155920 | 29410 | 29411 | CL 39A SUR | KR 93D | KR 94C | 30,59 | 6 | CALZADA | 4,17 | 84,31 | 351,16 | SIN ACTIVIDADES | | | |
| 78 | 8005282 | 153127 | 24337 | 24338 | CL 42H SUR | KR 82A | KR 82 | 28,19 | 6 | CALZADA | 3,47 | 27,72 | 96,23 | Calzada: Apertura CIV e inician con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad | 12-sep-23 | SIN PMT | |
| 79 | 8001390 | 155890 | 29350 | 29351 | KR 93C | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 31,4 | 6 | CALZADA | 4,09 | 96,82 | 395,99 | Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: excavación manual, demolición. Andén occidental: Sin actividad | 6-may-23 | | |
| 80 | 8001581 | 155877 | 29324 | 29325 | KR 93 | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 28,54 | 2 | CALZADA | 4,06 | 96,35 | 391,11 | SIN ACTIVIDADES | 6-jun-23 | | |
| 81 | 8005000 | 153026 | 24149 | 92062836 | KR 82D | CL 42C SUR | CL 42F BIS SUR | 28,95 | 6 | CALZADA | 4,3 | 73,09 | 314,48 | Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos. | 16-dic-22 | | |
| 82 | 8005078 | 153027 | 24151 | 24152 | KR 82D | CL 42F BIS SUR | CL 42H SUR | 28,54 | 6 | CALZADA | 4,89 | 72,7 | 355,66 | Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos. | 3-ene-23 | | |
| 83 | 8005258 | 153095 | 24273 | 24274 | CL 42F BIS SUR | KR 81L | KR 82 | 31,84 | 6 | CALZADA | 3,21 | 27,68 | 88,78 | Sin iniciar | 31-jul-23 | SIN PMT | |
| 84 | 8005132 | 153096 | 24275 | 24276 | CL 42F BIS SUR | KR 82 | KR 82A | 30,91 | 6 | CALZADA | 2,87 | 27,86 | 79,87 | Sin iniciar | 31-jul-23 | SIN PMT | |
| 85 | 8005126 | 153097 | 24277 | 24278 | CL 42F BIS SUR | KR 82A | KR 82B | 50,91 | 6 | CALZADA | 3,11 | 27,9 | 86,74 | Sin iniciar | 10-sep-23 | SIN PMT | |
| 86 | 8005055 | 153098 | 24279 | 24280 | CL 42F BIS SUR | KR 82B | KR 82D | 47,28 | 2 | CALZADA | 3,53 | 27,59 | 97,43 | Sin iniciar | 19-ago-23 | SIN PMT | |
| 87 | 8013930 | 902162 | 902163 | 902164 | CL 42A BIS SUR | KR 80D | KR 80F | 29,06 | 6 | CALZADA | 3,59 | 55,42 | 199,15 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | |
| 88 | 8006231 | 152956 | 24009 | 24010 | CL 42B SUR | KR 80D | KR 80F | 28,04 | 6 | CALZADA | 4,28 | 53,74 | 230,06 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | |
| 89 | 8001841 | 155851 | 29272 | 29273 | KR 91B | CL 38C SUR | CL 40 SUR | 28,54 | 6 | CALZADA | 4,34 | 99,91 | 433,99 | Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Conformación espacio público demolición y excavación. Andén occidental: Conformación espacio público demolición y excavación. | 21-jun-23 | | |
| 90 | 8005210 | 153128 | 24339 | 24340 | CL 42H SUR | KR 82B | KR 82A | 31,84 | 6 | CALZADA | 3,23 | 27,95 | 90,26 | Calzada: Apertura CIV e inician con excavación mecánica e instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad | No se tiene programación por CIV | | |
| 91 | 8005408 | 153125 | 24333 | 24334 | CL 42H SUR | KR 81J | KR 81L | 29,06 | 6 | CALZADA | 4,1 | 27,99 | 114,7 | Sin iniciar | No se tiene programación por CIV | | |
| 92 | 8004810 | 153106 | 24295 | 92062824 | CL 42B BIS SUR | KR 80A | KR 80D | 49,21 | 6 | CALZADA | 2,22 | 112,12 | 248,99 | Sin iniciar | 16-mar-23 | SIN PMT | |
| 93 | 8001427 | 155899 | 29368 | 29369 | KR 93D | CL 40A SUR | CL 40 SUR | 29,08 | 6 | CALZADA | 2,95 | 56,74 | 167,56 | Sin iniciar | 16-jun-23 | SIN PMT | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**1.COMPONENTE TECNICO**

**1.1. Actividades Tecnicas de Interventoría**

• Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
• Se cuenta con PMT aprobadas de los CIV 8004757-8004859-8004816-8004863-8002162-8002265-8001931-8002006-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947 - 8001841 - 8001390 - 8001285 - 8005282 - 8005210
• Seguimiento en la conformación de espacio público 89-56-69-71-70-79-50-49, mejoramiento de vía y excavación mecánica 78-90. Seguimiento a la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 psi P69-P85. Seguimiento a la apertura de CIV 78-90

**1.2 Seguimiento de las actividades del contratista**

**• P81:** Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
**• P82:** Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
**• P83:** Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
**• P61:** Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
**• P84:** Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
**• P85:** Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
**• P73:** Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
**• P74:** Calzada: Sin actividad. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad.
**• P75:** Calzada: Instalación de geotextil en empalme de esquina norte. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
**• P76:** Calzada: Instalación de geotextil en empalme de esquina sur. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
**• P66:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
**• P44:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
**• P50:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: sin actividad. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi.
**• P69:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
**• P89:** Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de bordillo A-80.
**• P70:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi.
**• P71:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Conformación espacio público demolición y construcción de cajas de inspección. Andén occidental: Conformación espacio público demolición y construcción de cajas de inspección.
**• P49:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado. Andén occidental: Instalación de fresado y construcción de cajas.
**• P48:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
**• P56:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Instalación de geotextil, fresado.
**• P88:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Conformación espacio público demolición y excavación.Andén occidental: Conformación espacio público demolición y excavación
**• P79:** Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: excavación manual, demolición. Andén occidental: Sin actividad
**• P80:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
**• P77:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
**• P90:** Calzada: Apertura CIV e inician con excavación mecánica e instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
**• P78:** Calzada: Apertura CIV e inician con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

**1.3 Actividades a realizar la siguiente semana**

• Excavación mecánica y transporte de material proveniente de excavación.
• Instalación de bordillo A-80, instalación de concreto estabilizado, de cemento y arenillado.

**2. COMPONENTE AMBIENTAL**

• El calificación fue de 100%
• RCD GENERADO. Para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 510m3.
• Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial 300 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (44) - Sin actividades
CIV 8004859 (48) - Sin actividades
CIV 8004816 (49) - Construcción cajas de inspección - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén - Demolición y excavación Andén
CIV 8004863 (50) - Descargue concreto 3000 espacio público - Estampado espacio público - Instalación Monoblock espacio público - Descargue Concreto MR-41 Microfibra - Estampado Rampas vehiculares - Conformación espacio público
CIV 8004947 (56) - Excavación lleno fresado Andén - Cargué y retiro de material de excavación - Descargue Fresado - Demolición y excavación manual espacio publico - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén
CIV 8002162 (60) - Ordenamiento conexión medidores predio y arreglo fuga de agua
CIV 8002265 (61) - Sin actividades
CIV 8001931 (64) - Sin actividades
CIV 8002008 (65) - Sin actividades
CIV 8001876 (66) - Sin actividades
CIV 8001715 (68) - Descargue de Fresado - Mezcla fresado estabilizado punta sur - Compactación fresado estabilizado punta sur
CIV 8001823 (69) - Instalación Monoblock 320 - Conexión monoblock 320 a sumidero con accesorios de 6" - Lleno con fresado 2da capa andén - Compactación con canguro andén - Instalación bordillo A-80 - Estampado en rampas - Mezcla fresado estabilizado punta norte
CIV 8001657 (70) - Vaciado y vibrado concreto MR 41 - Aislado concreto MR 41 rampas - Estampado topenil en rampas - Compactación con canguro andén costado occidental - Instalación tapas en cajas de inspección - Inicio estampado tipo adoquín andén
CIV 8001771 (71) - Extendido geotextil andén - Lleno con fresado 1ra capa andén - Instalación geoceldá y geotextil punta norte - Fundida cañuela pozo - Instalación placa superior pozo - Compactación con canguro andén - Instalación bordillo A-80 punta norte - Instalación Monoblock 320
CIV 8001148 (73) - Sin actividades
CIV 8001184 (74) - Preparación estabilizado (RAP) con cemento intersección - Compactación con vibrocompactador de 1ra capa de estabilizado intersección P74, P75 y P76
CIV 8001223 (75) - Excavación para instalar fresado con geoceldá y geotextil - Excavación para instalación de pozo - Mezclado de solado para pozo - Preparación estabilizado (RAP) con cemento - Compactación con vibrocompactador de 1ra capa de estabilizado intersección P74, P75 y P76
CIV 8001183 (76) - Compactación con canguro capa de fresado con geoceldá - Riego con agua de 2da capa fresado para andén oriental - Preparación estabilizado (RAP) con cemento - Compactación con vibrocompactador de 1ra capa de estabilizado intersección P74, P75 y P76
CIV 8001285 (77) - Excavación para pozo - Excavación para tubería 12" - Cargue de Volqueta con material de excavación - Excavación manual de zanja para ajustar tubería agua sanitaria
CIV 8005282 (78) - Excavación Mecánica vía - Excavación manual para instalación Manguera 1/2" - Cargué y retiro de material de excavación - Compactación Subrasante
CIV 8001390 (79) - Cargue de Volqueta con material de excavación - excavación manual para nivelar caja de andén - Excavación manual para perfilar caja de anderes - Construcción caja de inspección 0.60 * 0.60 - Lleno Fresado Andén - Excavación de zanja para filtro con geodren
CIV 8001841 (80) - Conformada y limpieza de vía - Instalación de placa superior de pozo ALL - Descargue de fresado - Instalación de geotextil, geoceldá y lleno con fresado - Nivelacion y Compactacion de subrasante - Excavacion para tubería 12" - Cama de arena de peña para tubería 12" ALL
CIV 8005000 (81) - Sin actividades
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Demolición de caja sanitaria - Demolición de anden en concreto - Instalación de cargue superior pozo ALL - Mezcla de estabilizado RAP 1ra capa - Extendida y cereo de estabilizado - Compactacion 1ra capa estabilizado - Extendida y cereo de estabilizado RAP 1ra capa
CIV 8005210 (90) - Compactación Subrasante - Excavación Mecánica vía - Cargué y retiro de material de excavación - Instalación Geotextil y Geoceldá vía - Lleno Fresado Geoceldá - Fresado Estabilizado RAP 1a capa

En recorrido realizado en forma conjunta Residente ambiental de Interventoría con el residente ambiental del contratista se evidenció lo siguiente:

• Varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de excavación, donde se realiza acopio de residuos para ser retirados cuando se complete la capacidad de la volqueta. Se realizó observación por desorden en algunos puntos y por evidencia de derrame de cemento y residuos sobre el paso peatonal.
• Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y bafños fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.
• El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.
• Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.

**3. COMPONENTE SST**

**3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST**

**INFORMACIÓN DEL PERSONAL**

| Ingreso | Antiguos | Retiros | TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA |
|---|---|---|---|
| 1. Consorcio SCLV = 0 | 1. Consorcio SCLV = 23 | 0 | 53 |
| | 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 | | |
| | 3. La Viatidad Limitada = 13 | | |
| | 4. Cense Ingeniería Ltda = 1 | | |
| | 5. J.V.R Estudios = 1 | | |
| | 6. Geovial Limitada = 5 | | |

**3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL**

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 10 de agosto de 2023 al 16 de agosto de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría.

**3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

• El 11 de agosto de 2023 se realizó comité de seguimiento semanal en el FDLK donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista Consorcio Vías Kennedy 22, donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales N° 9, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
El 15 de agosto de 2023 los componentes SST, Ambiental, social y ambiental y técnico de la Interventoría realizaron recorrido de obra por los CIV en ejecución al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, adicional a esto el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual así mismo hace uso de los elementos de Protección Personal (EPP) para las actividades de obra.
•At momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

**UPZ CORABASTOS:**

**P81:** No se encuentran desarrollando actividades
**P82:** No se encuentran desarrollando actividades
**P64:** No se encuentran desarrollando actividades
**P48:** No se encuentran desarrollando actividades
**P49:** Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con, kit de emergencia y punto ecológico.
**P50:** Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con baño portátil, kit de emergencia.
**P56:** Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, así mismo hace uso de los EPP. Este CIV cuenta con kit de emergencia y punto ecológico.

**UPZ PATIO BONITO:**

**P60:** No se encuentran desarrollando actividades.
**P61:** No se encuentran desarrollando actividades
**P64:** No se encuentran desarrollando actividades
**P65:** No se encuentran desarrollando actividades
**P66:** No se encuentran desarrollando actividades
**P68:** No se encuentran desarrollando actividades
**P69:** Actividades de estampado en espacio público, este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico.
**P70:** Actividades de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico.
**P71:** No se encuentran desarrollando actividades.
**P72:** No se encuentran desarrollando actividades.
**P74:** No se encuentran desarrollando actividades
**P75:** No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico, estos insumos están compartidos con los CIV 73,74 y 76.
**P76:** No se encuentran desarrollando actividades.
**P77:** Actividades de excavación manual para tubería el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP.
**P78:** Actividades de excavación el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y cartelera informativa.
**P79:** Actividades de conformación espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV Cuenta con punto ecológico.
**P80:** No se encuentran desarrollando actividades, sin embargo este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y cartelera informativa.
**P89:** Actividades de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico, unidad sanitaria, cartelera informativa y carpa vestier
**P90:** No se encuentran desarrollando actividades.

• De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista revisar los pasos peatonales y donde haya tapas de mediciones dañadas ajustarlas. Adicional a eso donde haya sumideros bajitos, señalizar mejor ya que no están a nivel de la vía y el sendero peatonal.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (APP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 10 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de SST socializó información sobre estilos de vida saludables como prevenir hipe e hipoglucemias
• El 11 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de SST realizó pausas activas con ejercicios calesmusculares.
• El 14 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de SST socializó información sobre estilos de vida saludables enfocado en la hidratación, ya que esta va de la mano con la salud, beber agua permite al cuerpo el correcto funcionamiento de los órganos,células,articulaciones, músculos, entre otros
• El 16 de agosto de 2023 realizó a cabo comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
•Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de Interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

**3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO.**

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 10 de agosto de 2023 al 16 de agosto 2023, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

**3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST**

**INFORMACIÓN DEL PERSONAL**

| Ingreso | Antiguos | Retiros | PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA: |
|---|---|---|---|
| CVK22 = 1 | 1. CVK22 = 9 | | 1. AIKA HUMANA = 1 139 |
| CONCRETAMP = 2 | 2. AIKA HUMANA = 84 | | |
| | 3. MMAPV SAS = 7 | | |
| | 4. MR GROUP COL SAS = 1 | | |
| | 5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1 | | |
| | 6. MABERIK = 1 | | |
| | 7. WITS = 1 | | |
| | 8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1 | | |
| | 9. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 13 | | |
| | 10. CONSTRUBERNAL = 1 | | |
| | 11. SAM INGENIERIA = 9 | | |
| | 12. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1 | | |
| | 13. HA CIVILES = 5 | | |
| | 14. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1 | | |
| | 15. PROURBANOS = 2 | | |
| | 16. TRANSUMINISTRO PEREZ =1 | | |

**3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL**

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 10 de agosto de 2023 al 16 de agosto de 2023, el contratista reporto ausentismo de siete (7) trabajadores, seis (6) generados por enfermedad general, y uno (1) por AT. De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 10 de agosto de 2023 al 16 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:
**N° de días de ausencia** = 15
**N° de días de trabajo programados** = 6
**N° Trabajadores en la semana** = 59
**% de ausentismo** 4,24%
Es así como se evidencia que el 4,24% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

**3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

• Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
• Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Publico y Fenómenos naturales
• Se realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato COP 630-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra
• El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
• El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra
• Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.

**4.COMPONENTE SOCIAL**

**4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía**

• En este periodo el PAC es atendido de acuerdo con el horario aprobado previamente por la interventoría; lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Adicionalmente, el contratista realizó recorridos sociales para atender inquietudes de la comunidad y acercar la atención a la ciudadanía en el área de intervención, los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo anterior, para completar 40 horas de atención según lo requerido contractualmente.
• En el corte reportado se atendió el PAC de acuerdo con el horario aprobado por la interventoría. En este periodo no se reportaron solicitudes de veedurías ciudadanas.
• El15/08/2023 interventoría le solicita al contratista actualizar la cartelera informativa que se encuentra en el PAC y realizar mantenimiento al letrero del punto de atención.

**PQRSD:**

A la fecha el contratista cuenta con 41 PQRSD cerradas y 1 PQRSD abierta
• PQRSD 42: El 15/08/2023 el contratista se acerca a predio para informarle al propietario que desde el área técnica del contratista ya se realizaron los procesos de limpieza en este predio cumpliendo así, con las actividades propias para atender esta solicitud, sin embargo, no se encuentra para cierre de PQRSD.

**Derechos de Petición:**

• El 10/08/2023 el contratista proyecta a la interventoría respuesta para el derecho de petición del ciudadano Edgar Novoa. El 11/08/23 la Interventoría da a aprobación a este respuesta para entrega al ciudadano, este mismo día, el contratista realiza entrega de la respuesta de manera presencial; el ciudadano Edgar Novoa autoriza a la señora Ángela Hernández para recibir el documento, así mismo, se remite vía correo electrónico suministrado por parte del ciudadano. Dando cierre a este derecho de petición. El 15/08/2023 por solicitud del FDLK, nuevamente se remite por correo electrónico la respuesta al ciudadano con copia al FDLK.

**Recorridos Urbanos:**

• El 10 y 15 de agosto 2023 el contratista realiza recorrido por los frentes de obra activos de Corabastos y Patio Bonito en los cuales se verifica las vallas informativas de los frentes de obra, además de PSI y se atienden solicitudes de información de algunas personas de la comunidad.
• El 15/08/23 interventoría brinda observaciones del recorrido realizado en campo por los frentes activos, los cuales quedan registrados en la bitácora social y se socializarán en el comité social del corte siguiente.

**4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana**

• La Interventoría la solicita al contratista la remisión de la presentación del comité FDLK para el 21 de agosto de 2023.

**4.3 Programa de acompañamiento técnico**

**Actas de vecindad y ramas vehiculares**

• El contratista continua con la edición de actas de vecindad del CIV 8001545 P. 72
• El 09/08/23 contratista realiza envío del oficio CE-CVK22-ADM-660 Radicación actas de vecindad CIV 8001427 a la interventoría para su revisión y aprobación.
• El 15/08/2023 interventoría realiza revisión de las actas de vecindad del CIV 8001427 sin encontrar observaciones, por lo tanto, proyectará oficio de aprobación. **Total, de actas realizadas en el contrato: 673**
• El contratista continúa la edición de actas de acceso vehicular del CIV 8008154S P. 72
• El 09/08/23 contratista realiza envío del oficio CE-CVK22-ADM-660 Radicación actas de vecindad CIV 8001427 a la interventoría para su revisión y aprobación.
• El 15/08/2023 la interventoría realiza revisión de las actas de acceso vehicular del CIV 8001427, sin encontrar observaciones, por lo tanto, proyectará oficio de aprobación. **Total, de actas realizadas en el contrato: 423**
**Cierres de Actas de Vecindad:** Se continúa realizando las actas de vecindad y actas de acceso vehicular de cierre en las P. 60, 73, 81 y 82, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.
**Suspensión de Carajo:**
• El 11/08/2023 el contratista realiza notificación y actas de compromiso de suspensión de acceso vehicular en las prioridades 57 y 91.
• El 15/08/2023 Interventoría realiza la verificación de las actas de compromiso levantadas evidenciando el cumplimiento de este ítem.
**Actas de compromiso:**
• El 11/08/2023 el contratista realiza actas de compromiso de adecuación de bajantes de aguas lluvias y cubiertas de las prioridades 57 y 91
• El 15/08/23 el contratista realiza mesa de trabajo de revisión de actas de compromiso con comunidad junto con interventoría, además, se realiza recorrido por solicitud de la Alcaldía para verificación de las bajantes aguas lluvias

**4.4 Programa de cultura ciudadana**

• El día 12/08/2023 el contratista ejecuta el primer taller de formación en cultura ciudadana y desarrollo urbano en el salón comunal San Carlos, se contó con la participación de 11 niños y niñas de este sector.

**4.5 Programa de gobernanza para la movilidad**

• A la fecha el contrato cuenta con 56 personas de MONC; de las cuales 7 de ellos residen en la localidad, 04 de estos trabajadores son mujeres y 03 son hombres, sus cargos dentro de la obra son de auxiliares de tráfico, BOAL y ayudantes de obra. El porcentaje de contratación general a la fecha es de 13 % correspondiente a trabajadores residentes en la localidad de Kennedy, de ellos 7,14 % son mujeres.
• El 15/08/2023 la interventoría solicita al contratista iniciar gestiones para la contratación de personal de la localidad con el fin de aumentar el % requerido contractualmente.

**4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto**

**Vallas informativas**

• Para el periodo reportado, los frentes de obra actuales cuentan con su valla informativa de inicio a fin y cuentan con el porcentaje de obra actual.
• A corte de este periodo el avance de obra se encuentra en el 30,09% con 55 días para finalización de obra, se le notifica a la interventoría en comité de seguimiento, que esta información será actualizada los días de corte de entrega de informe semanal del área técnica.

**Volantes de información:**

• El 10/08/2023 el contratista remite a la interventoría el volante N. 130 notificación a comerciantes, la interventoría remite observaciones al documento, el contratista este mismo día realiza ajuste para aprobación del volante por parte de la interventoría.
• El 14/08/2023 contratista realiza socialización del volante N.130 a 05 comerciantes del sector de la UPZ 82 y 02 comerciantes de la UPZ 80.
• El 10/08/2023 contratista remite a la interventoría el volante N. 131 inicio de actividades de obra PST-P91, el 11/08/2023 la interventoría remite observaciones las cuales fueron atendidas este mismo día. Por consiguiente, el contratista inicia con la socialización de este volante en las prioridades 57 y 91.
• El 14/08/2023 el contratista remite los volantes 132. Volante informativo punto de recolección de basura. CIV 8005210, volante 133. informativo punto de recolección de basura. CIV 8005282-8005351 y volante 134 informativo punto de recolección de basura. CIV 8005408
• El 15/05/2023 se recibe aprobación por parte de la interventoría para distribución a la comunidad de los volantes 132, 133 y 134

**Puntos Satélites de información:**

• El 14/08/2023 el contratista realiza actualización de los PSI de la UPZ 80 con el volante 130 notificación a comerciantes y volante 131 inicio de actividades P. 57 y 91, revisan los volantes en estos PSI.
• El 15/08/2023 el contratista realiza actualización de los PSI de la UPZ 82 con el volante 130 notificación a comerciantes, se revisan los volantes en estos PSI.

**Medios de comunicación:** Los días 11 y 15 de agosto de 2023 el contratista realiza envío por medio de correo electrónico la respuesta del derecho de petición del ciudadano Edgar Novoa, con copia a la interventoría y al FDLK.

**4.6 Comités**

• Se brinda en el comité de seguimiento la calificación semanal la cual es de 100% de cumplimiento.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES**

No se presentaron

## 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:**

## 5. ANEXOS

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Cronograma en Ms Project | X | |
| 2. Registro Fotográfico | X | |
| 3. Avance | X | |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

días del mes de agosto (Escurrir letra) de 2023 (día de firma del informe)

diecisés (día en letras) 16 (día en numeros)

(Nombre) Jose Manuel Silva Rojas
Director de Interventoría

**FORMATO**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**
**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**SEMANA No.** 45 **DEL** 10 de agosto de 2023 **AL** 16 de agosto de 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




Descripción Foto 1.

**CIV: No. 64 - 8001931**
**Descripción:** Finalizan proceso constructivo




Descripción Foto 2.

**CIV: No.60 - 8002162**
**Descripción:** Finalizan proceso constructivo




Descripción Foto 3.

**CIV: No.66 - 8001876**
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 4.

**CIV: No.69 - 8001823**
**Descripción:** Conformación espacio público




Descripción Foto 5.

**CIV: No.50 - 8004663**
**Descripción:** Instalación de concreto espacio público




Descripción Foto 6.

**CIV: No.49 - 8004816**
**Descripción:** Conformación espacio público




Descripción Foto 7.

**CIV: No.73 - 8001148**
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 8.

**CIV: No.44 - 8004757**
**Descripción:**Sin actividades

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**
**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**




Descripción Foto 9.

**CIV: No.68 - 8001715**
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 10.

**CIV: No.79 - 8001390**
**Descripción:** Conformación espacio publico




Descripción Foto 11.

**CIV: No.75 - 8001223**
**Descripción:** Conformación vía esquina sur




Descripción Foto 12.

**CIV: No.70 - 8001657**
**Descripción:** Conformación de espacio público




Descripción Foto 13.

**CIV: No.89 - 8001841**
**Descripción:** Conformación espacio publico




Descripción Foto 14.

**CIV: No.74 - 8001184**
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 15.

**CIV: No.71 - 8001771**
**Descripción:** Conformación espacio público




Descripción Foto 16.

**CIV: No.76 - 8001183**
**Descripción:** Conformación espacio público

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**
**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**




Descripción Foto 17.

**CIV: No.56 - 8004947**
**Descripción:** Conformación de espacio público




Descripción Foto 18.

**CIV: No.80 - 8001581**
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 19.

**CIV: No.48 - 8004699**
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 20

**CIV: No.77 - 8001285**
**Descripción:** Sin actividad





Descripción Foto 21.

**CIV: No.81 - 8005000**
**Descripción:** Sin actividad




Descripción Foto 22.

**CIV: No.61 - 8002265**
**Descripción:** Finalizan proceso constructivo

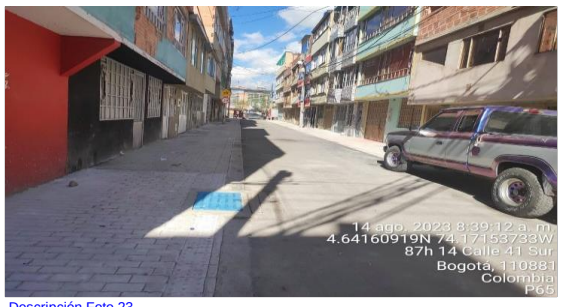


Descripción Foto 23.

**CIV: No.65 - 8002008**
**Descripción:** Finalizan proceso constructivo




Descripción Foto 24.

**CIV: No.82 - 8005078**
**Descripción:** Finalizan proceso constructivo

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**
**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**




Descripción Foto 25.

**CIV: No.90 - 8005210**
**Descripción:** Instalación fresado estabilizado




Descripción Foto 26.

**CIV: No.78 - 8005282**
**Descripción:** Excavación mecánica


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

dieciséis (Día en letras) ( 16 ) (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Alba Roja
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

**CONSORCIO SCLV**
**NIT 900.547.145-2**
**EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2**
**SEGUIMIENTO AL 15-AGOSTO-2023**


| P | CIV | VALOR CIV | PROG-ACUM ($) | PROG-ACUM (%) | EJEC-ACUM ($) | EJEC-ACUM (%) | PESO EJEC PROG (%) | ATRASO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 8005000 | $ 331.062.908,00 | $ 493.706.016,00 | 2,83% | $ 295.480.241,35 | 1,69% | 89,25% | -1,14% |
| 82 | 8005078 | $ 343.085.920,00 | $ 479.749.662,00 | 2,75% | $ 235.122.369,51 | 1,35% | 68,53% | -1,40% |
| 60 | 8002162 | $ 320.721.252,00 | $ 514.640.546,00 | 2,95% | $ 288.156.250,27 | 1,65% | 89,85% | -1,30% |
| 61 | 8002265 | $ 355.199.128,00 | $ 460.559.675,00 | 2,64% | $ 314.420.891,92 | 1,80% | 88,52% | -0,84% |
| 65 | 8002008 | $ 360.580.405,00 | $ 432.646.968,00 | 2,48% | $ 348.645.503,40 | 2,00% | 96,69% | -0,48% |
| 64 | 8001931 | $ 376.367.569,00 | $ 443.114.233,00 | 2,54% | $ 365.422.481,56 | 2,09% | 97,09% | -0,45% |
| 73 | 8001148 | $ 285.710.532,00 | $ 338.441.580,00 | 1,94% | $ 238.533.146,07 | 1,37% | 83,49% | -0,57% |
| 76 | 8001183 | $ 146.013.903,00 | $ 233.768.926,00 | 1,34% | $ 70.929.734,80 | 0,41% | 48,58% | -0,93% |
| 75 | 8001223 | $ 144.206.710,00 | $ 183.177.144,00 | 1,05% | $ 111.219.598,83 | 0,64% | 77,13% | -0,41% |
| 74 | 8001184 | $ 347.413.004,00 | $ 0,00 | 0,00% | $ 246.231.577,81 | 1,41% | 70,88% | 1,41% |
| 70 | 8001657 | $ 342.553.149,00 | $ 394.266.995,00 | 2,26% | $ 75.408.848,91 | 0,43% | 22,01% | -1,83% |
| 66 | 8001876 | $ 318.216.103,00 | $ 430.902.424,00 | 2,47% | $ 207.927.703,10 | 1,19% | 65,34% | -1,28% |
| 44 | 8004757 | $ 544.689.706,00 | $ 416.946.070,00 | 2,39% | $ 208.035.653,54 | 1,19% | 38,19% | -1,20% |
| 68 | 8001715 | $ 351.516.714,00 | $ 413.456.981,00 | 2,37% | $ 104.526.889,01 | 0,60% | 29,74% | -1,77% |
| 71 | 8001771 | $ 361.446.034,00 | $ 429.157.879,00 | 2,46% | $ 76.611.855,14 | 0,44% | 21,20% | -2,02% |
| 69 | 8001823 | $ 341.507.411,00 | $ 443.114.233,00 | 2,54% | $ 192.705.688,41 | 1,10% | 56,43% | -1,44% |
| 50 | 8004663 | $ 770.232.864,00 | $ 762.695.351,37 | 4,37% | $ 191.862.696,62 | 1,10% | 24,91% | -3,27% |
| 56 | 8004947 | $ 377.475.477,00 | $ 444.858.777,00 | 2,55% | $ 69.944.410,05 | 0,40% | 18,53% | -2,15% |
| 49 | 8004816 | $ 479.216.394,00 | $ 117.756.735,30 | 0,68% | $ 126.865.510,38 | 0,73% | 26,47% | 0,05% |
| 48 | 8004699 | $ 983.197.315,00 | $ 502.428.737,07 | 2,88% | $ 96.197.316,83 | 0,55% | 9,78% | -2,33% |
| 89 | 8001841 | $ 580.698.248,00 | $ 405.731.142,46 | 2,33% | $ 72.902.297,49 | 0,42% | 12,55% | -1,91% |
| 79 | 8001390 | $ 629.262.662,00 | $ 593.145.037,00 | 3,40% | $ 83.309.284,20 | 0,48% | 13,24% | -2,92% |
| 80 | 8001581 | $ 584.822.489,00 | $ 561.307.104,42 | 3,22% | $ 28.109.983,82 | 0,16% | 4,81% | -3,06% |
| 77 | 8001285 | $ 564.687.707,00 | $ 521.618.723,00 | 2,99% | $ 11.445.205,05 | 0,07% | 2,03% | -2,92% |
| 62 | 8002055 | $ 443.969.911,00 | $ 497.195.104,00 | 2,85% | $ 13.219.656,57 | 0,08% | 2,98% | -2,77% |
| 63 | 8002132 | $ 301.695.957,00 | $ 436.136.056,00 | 2,50% | $ 6.570.152,80 | 0,04% | 2,18% | -2,46% |
| 58 | 8002225 | $ 370.268.458,00 | $ 523.363.268,00 | 3,00% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -3,00% |
| 59 | 8002331 | $ 360.017.625,00 | $ 439.625.145,00 | 2,52% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,52% |
| 67 | 8001968 | $ 386.650.290,00 | $ 427.413.335,00 | 2,45% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,45% |
| 92 | 8004910 | $ 456.639.023,00 | $ 546.042.342,00 | 3,13% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -3,13% |
| 72 | 8001545 | $ 348.655.292,00 | $ 380.310.641,00 | 2,18% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,18% |
| 93 | 8001427 | $ 321.630.570,00 | $ 327.974.314,00 | 1,88% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1,88% |
| 45 | 8002718 | $ 739.233.204,00 | $ 362.615.978,14 | 2,08% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2,08% |
| 46 | 8005377 | $ 280.055.154,00 | $ 336.697.035,00 | 1,93% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1,93% |
| 47 | 8005506 | $ 625.940.380,00 | $ 191.260.198,40 | 1,10% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1,10% |
| 83 | 8005258 | $ 124.373.507,00 | $ 146.541.715,00 | 0,84% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,84% |
| 84 | 8005192 | $ 119.547.602,00 | $ 82.691.396,40 | 0,47% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,47% |
| 55 | 8005471 | $ 136.685.140,00 | $ 130.491.908,20 | 0,75% | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,75% |
| 85 | 8005126 | $ 144.960.620,00 | **$ 28.610.525,20** | **0,16%** | | | **0** | **-0,16%** |
| **TOTALES** | | | **$ 14.874.159.900,96** | **85,26%** | **$ 4.079.804.947,44** | **23,39%** | | **-61,87%** |
| **TOTAL DE OBRA** | | | **$ 17.445.442.250,00** | | | | | |

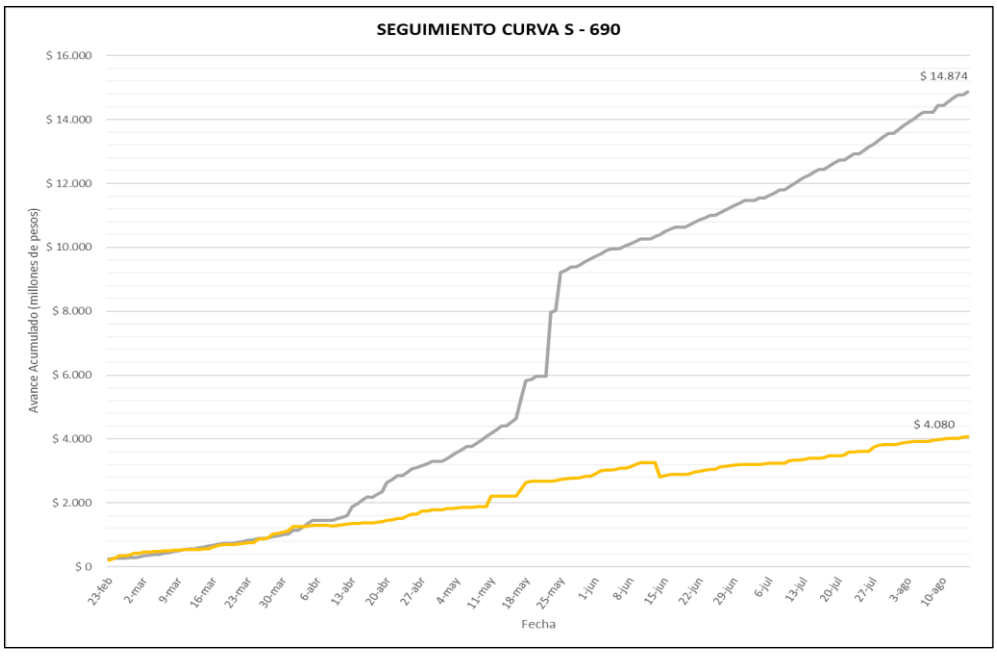



**CONSORCIO SCLV**
**NIT 900.547.145-2**
**EVALUACIÓN CIV**

| FECHA EVALUACIÓN | | | 18-jul | 25-jul | 1-ago | 8-ago | 15-ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV | % AVANCE DEL CIV |
| 81 | 8005000 | $ 331.062.908,00 | 89,25% | 89,25% | 89,25% | 89,25% | 89,25% |
| 82 | 8005078 | $ 343.085.920,00 | 68,53% | 68,53% | 68,53% | 68,53% | 68,53% |
| 60 | 8002162 | $ 320.721.252,00 | 77,21% | 77,21% | 89,85% | 89,85% | 89,85% |
| 61 | 8002265 | $ 355.199.128,00 | 88,52% | 88,52% | 88,52% | 88,52% | 88,52% |
| 65 | 8002008 | $ 360.580.405,00 | 95,26% | 95,26% | 95,26% | 96,69% | 96,69% |
| 64 | 8001931 | $ 376.367.569,00 | 83,25% | 87,88% | 97,09% | 97,09% | 97,09% |
| 73 | 8001148 | $ 285.710.532,00 | 83,49% | 83,49% | 83,49% | 83,49% | 83,49% |
| 76 | 8001183 | $ 146.013.903,00 | 43,93% | 45,15% | 46,49% | 48,58% | 48,58% |
| 75 | 8001223 | $ 144.206.710,00 | 65,22% | 68,45% | 77,01% | 77,01% | 77,13% |
| 74 | 8001184 | $ 347.413.004,00 | 69,88% | 70,42% | 70,42% | 70,88% | 70,88% |
| 70 | 8001657 | $ 342.553.149,00 | 9,36% | 9,36% | 10,82% | 13,44% | 22,01% |
| 66 | 8001876 | $ 318.216.103,00 | 54,67% | 54,78% | 62,29% | 65,34% | 65,34% |
| 44 | 8004757 | $ 544.689.706,00 | 30,02% | 31,50% | 38,17% | 38,19% | 38,19% |
| 68 | 8001715 | $ 351.516.714,00 | 18,12% | 24,46% | 27,00% | 29,19% | 29,74% |
| 71 | 8001771 | $ 361.446.034,00 | 19,18% | 19,18% | 19,18% | 19,89% | 21,20% |
| 69 | 8001823 | $ 341.507.411,00 | 43,44% | 44,33% | 49,31% | 54,19% | 56,43% |
| 50 | 8004663 | $ 770.232.864,00 | 18,46% | 18,46% | 22,28% | 22,78% | 24,91% |
| 56 | 8004947 | $ 377.475.477,00 | 14,22% | 16,14% | 16,14% | 16,14% | 18,53% |
| 49 | 8004816 | $ 479.216.394,00 | 24,84% | 24,84% | 24,99% | 26,47% | 26,47% |
| 48 | 8004699 | $ 983.197.315,00 | 8,10% | 8,10% | 8,37% | 9,78% | 9,78% |
| 89 | 8001841 | $ 580.698.248,00 | 6,22% | 9,94% | 10,35% | 11,55% | 12,55% |
| 79 | 8001390 | $ 443.969.911,00 | 0,25% | 8,37% | 9,48% | 11,33% | 13,24% |
| 80 | 8001581 | $ 584.822.489,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 4,81% |
| 77 | 8001285 | $ 564.687.707,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,03% | 2,03% |

| FECHA EVALUACIÓN | | | 15-ago |
|---|---|---|---|
| P | CIV | VALOR TOTAL CIV | %AVANCE DEL CIV |
| 81 | 8005000 | $ 331.062.908,00 | 0,00% |
| 82 | 8005078 | $ 343.085.920,00 | 0,00% |
| 60 | 8002162 | $ 320.721.252,00 | 0,00% |
| 61 | 8002265 | $ 355.199.128,00 | 0,00% |
| 65 | 8002008 | $ 360.580.405,00 | 0,00% |
| 64 | 8001931 | $ 376.367.569,00 | 0,00% |
| 73 | 8001148 | $ 285.710.532,00 | 0,00% |
| 76 | 8001183 | $ 146.013.903,00 | 0,00% |
| 75 | 8001223 | $ 144.206.710,00 | 0,12% |
| 74 | 8001184 | $ 347.413.004,00 | 0,00% |
| 70 | 8001657 | $ 342.553.149,00 | 8,57% |
| 66 | 8001876 | $ 318.216.103,00 | 0,00% |
| 44 | 8004757 | $ 544.689.706,00 | 0,00% |
| 68 | 8001715 | $ 351.516.714,00 | 0,54% |
| 71 | 8001771 | $ 361.446.034,00 | 1,30% |
| 69 | 8001823 | $ 341.507.411,00 | 2,24% |
| 50 | 8004663 | $ 770.232.864,00 | 2,13% |
| 56 | 8004947 | $ 377.475.477,00 | 2,39% |
| 49 | 8004816 | $ 479.216.394,00 | 0,00% |
| 48 | 8004699 | $ 983.197.315,00 | 0,00% |
| 89 | 8001841 | $ 580.698.248,00 | 1,00% |
| 79 | 8001390 | $ 443.969.911,00 | 1,91% |
| 80 | 8001581 | $ 301.695.957,00 | 2,80% |
| 77 | 8001285 | $ 370.268.458,00 | 0,00% |

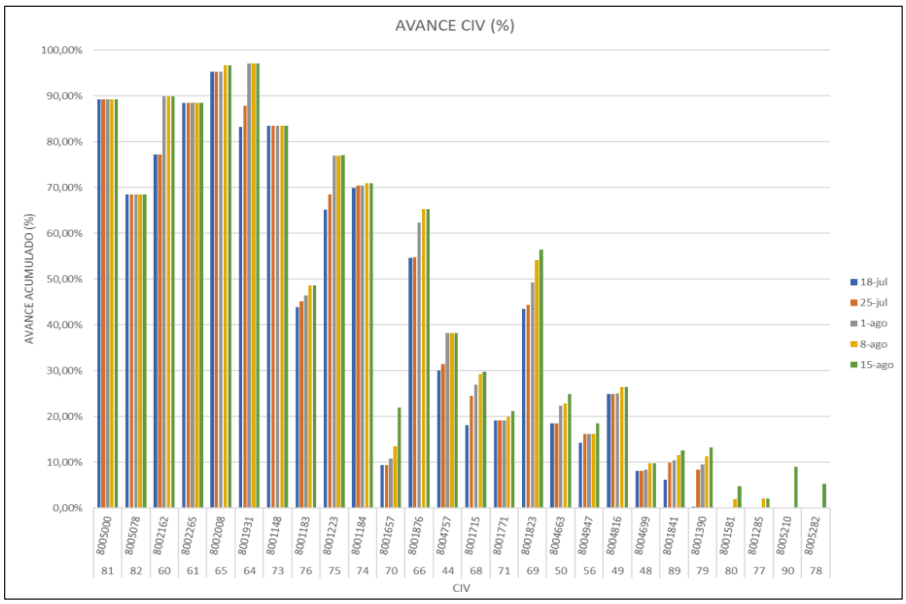
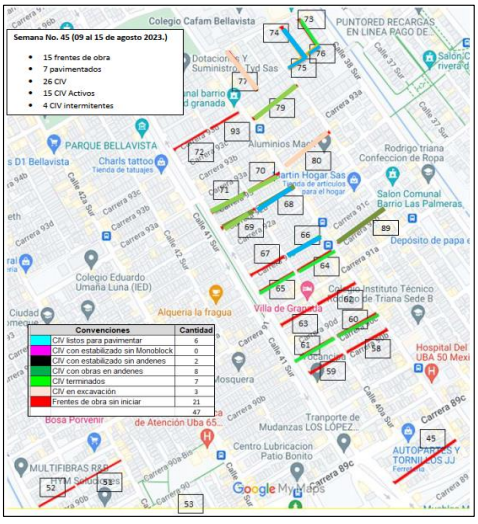
# CONSORCIO SCLV
# NIT. 900.547.145-2
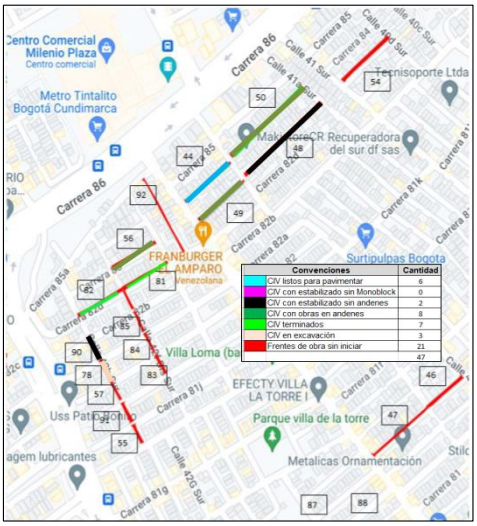
## REPORTE AVANCE SEMANAL
## GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
## CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

**Periodo** 10 de agosto al 15 de agosto de 2023

| AVANCE | %General | %Físico | %Financiero |
|---|---|---|---|
| %Programado | 82,43% | 85,26% | 82,43% |
| %Ejecutado | 23,69% | 23,39% | 25,12% |
| Atraso(-)/Adelanto(+) | -58,74% | -61,87% | -57,31% |
