FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 46 (Semana Mes) **DEL** 17 de agosto de 2023 (dd mm aa) **AL** 23 de agosto de 2023 (dd mm aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No No 717 de 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. COP 690 de 2022 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 **NIT** 901.628.933-1 (Número de NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV (Persona Natural o Jurídica Consorcio o Unión Temporal que ejecutara el objeto del contrato) **NIT** 900.547.145-2 (Número de NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor	$ 19.621.435.784,00	Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022	Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (Profesional designado por supervisión para el seguimiento del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO (Escribir el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (No radica el numero del oficio radicado Ejm) **de fecha** (dd mm aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
Calzada CIV	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50
TOTALES	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,54%	2,54%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%	-2,54%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Fase preliminar Programada (%)	0,12%	0,24%	Fase preliminar Ejecutada (%)	0,12%	0,24%	0,49%
Fase preliminar Programada ($)	$ 23.973.839,44	$ 47.947.678,89	Fase preliminar Ejecutada ($)	$ 23.973.839,44	$ 47.947.678,89	$ 0,00
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%	Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -	Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO	ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,00%	7,21%
10	2,10%	7,21%
11	1,73%	7,21%
12	2,54%	7,22%
13	3,46%	7,23%
14	4,62%	8,21%
15	8,07%	8,27%
16	7,67%	8,35%
17	9,07%	8,57%
18	11,53%	8,95%
19	13,68%	9,14%
20	8,41%	10,01%
21	3,00%	7,22%
22	3,87%	7,22%
23	4,77%	7,22%
24	5,52%	7,22%
25	6,41%	7,22%
26	8,88%	7,22%
27	10,10%	7,22%
28	14,04%	7,22%
29	18,03%	7,22%
30	19,26%	7,22%
31	23,20%	7,22%
32	26,73%	9,52%
33	46,38%	9,52%
34	53,73%	9,52%
35	55,94%	9,52%
36	57,95%	9,52%
37	59,96%	9,52%
38	62,48%	9,52%
39	64,49%	9,52%
40	66,97%	17,78%
41	70,47%	17,78%
42	72,55%	17,78%
43	76,07%	17,78%
44	78,98%	17,78%
45	82,43%	25,12%
46	84,85%	25,12%

Análisis de la Gráfica:

No se cuenta con cronograma

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
Fase preliminar	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Fase preliminar programada (m²)	1542,91	3085,82	23%	Fase preliminar Ejecutada (m2)	1542,91	3085,82	23%	%Atraso /%Avance
Fase preliminar programada (Und)	0	12	24%	Fase preliminar Ejecutada (Und)	0	12	24%	0%
Fase preliminar crooramada (Km/carril)	0,001714286	0,003428571	0,09%	Fase preliminar Ejecutada (Km/carril)	0,001714286	0,003428571	0,09%	
Estudios y Diseños Prooram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Meta Física Proaramada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%	
Meta Física Proaramada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
Meta Física Proaramada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%	0%
Meta Física Proaramada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%	
Meta Física Proaramada (%)				Meta Física Ejecutada (%)				
AVANCE PROJECT								%Atraso /%Avance
Avance Programado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%			0%
Avance Proaramado Mantenimiento periódico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%			0%
Avance Proaramado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%			0%
Avance Proaramado Mantenimiento Reconstrucción	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%			0%
Avance Proaramado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%			0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERFICIE	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	ESTADO	INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA: FECHA DE INICIACION PROGRAMADA	MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO	Acciones a seguir
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33,44	6	CALZADA	3,19	82,04	261,84	SIN ACTIVIDADES	1-abr-23		
45	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51,58	6	CALZADA	4,38	129,04	569,35	Sin iniciar	8-jul-23	SIN PMT	
46	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29,06	6	CALZADA	3,83	62,8	240,73	Sin iniciar	7-jul-23	SIN PMT	
47	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33,55	6	CALZADA	2,93	100,38	294,44	Sin iniciar	17-jul-23	SIN PMT	
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	4,74	144,13	683,05	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Demolición y excavación	15-jun-23		
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32,6	6	CALZADA	2,7	82,01	221,4	Calzada: Sin actividad. Andén ambos costados: Excavación, instalación de geotextil y fresado.	24-jul-23		
50	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	5,25	136,17	714,24	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Instalación bordillo, cajillas, fresado y concreto 3000 psi	10-may-23		
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28,88	6	CALZADA	2,59	88,19	228,81	Sin iniciar	No se tiene programación		
52	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28,19	6	CALZADA	2,36	72,08	170,02	Sin iniciar	No se tiene programación		
53	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 89F	KR 89F	30,14	6	CALZADA	2,63	41,49	109,22	Sin iniciar	No se tiene programación		
54	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37,56	6	CALZADA	4,88	88,16	430,2	Sin iniciar	No se tiene programación		
55	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81J	29,06	6	CALZADA	3,74	27,95	104,45	Sin iniciar	25-jul-23	SIN PMT	
56	8004947	153132	24347	92062895	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29,79	6	CALZADA	4,24	71,14	301,74	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación e instalación de geotextil. Andén occidental: Instalación de geotextil, fresado.	25-feb-23		
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,45	27,73	95,75	Calzada: Apertura a CIV e inicia excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad			
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33,55	6	CALZADA	4,83	80,45	372,11	Sin iniciar	23-feb-23	SIN PMT	
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32,51	6	CALZADA	4,32	66,67	288,2	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52,62	6	CALZADA	5	79,19	395,73	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	22-dic-22		
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51,58	6	CALZADA	4,54	65,92	299,32	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	6-ene-23		
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48,97	6	CALZADA	4,54	76,23	345,98	SIN INICIAR	4-mar-23		
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63,03	6	CALZADA	4,41	66,53	293,12	SIN INICIAR	No se tiene programación por CIV		
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,93	69,19	272,04	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	21-mar-23		
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29,06	6	CALZADA	3,5	67,82	237,35	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	28-feb-23		
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,84	67,47	259,4	SIN ACTIVIDADES	9-mar-23		
67	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	3,79	66,96	253,67	Sin iniciar	3-abr-23	SIN PMT	
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,15	68,59	284,73	Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	16-mar-23		
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,26	67,66	288,51	Calzada: Instalación de bordillo A80. Andén ambos costados: Vaciado de concreto 3000 psi.	8-abr-23		
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	3,87	62,49	241,97	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Cortes de concreto	4-abr-23		
71	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,04	67,46	272,75	Calzada: Instalación de monoblock. Anden ambos costados: Instalación de geotextil, fresado e instalación de bordillo A80.	21-abr-23		
72	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48,97	6	CALZADA	3,4	67,15	228,19	Sin iniciar	6-jun-23	SIN PMT	
73	8001148	155917	92062684	92062817	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49,32	6	CALZADA	4,21	55,04	231,7	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	26-ene-23		
74	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50,01	6	CALZADA	4,18	62,56	261,7	Calzada: Sin actividad. Andén ambos costados: Vaciado de concreto 3000 psi.			
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49,32	6	CALZADA	3,56	29,93	106,54	Calzada: Instalación de geotextil de arena de peña, tubo Novafort y construcción pozo. Andén ambos costados: Vaciado de concreto 3000 psi.	24-ene-23		
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49,32	6	CALZADA	3,92	31,84	124,92	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Vaciado de concreto 3000 psi. Andén occidental: Sin actividad	24-ene-23		
77	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	30,59	6	CALZADA	4,17	84,31	351,16	Calzada: Instalación de tubería Novafort e instalación de arena de peña. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad			
78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,47	27,72	96,23	Calzada: Excavación mecánica, instalación de geotextil geocinta y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	12-sep-23	SIN PMT	

79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31,4	6	CALZADA	4,09	96,82	395,99	Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén ambos costados: Instalación de geotextil y fresado 1ra capa.	6-may-23		
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	2	CALZADA	4,06	96,35	391,11	Calzada: Instalación de tubería Novafort, arena de peña geocelda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	6-jun-23		
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 43F BIS SUR	28,95	6	CALZADA	4,3	73,09	314,48	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	16-dic-22		
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28,54	6	CALZADA	4,89	72,7	355,66	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	3-ene-23		
83	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31,84	6	CALZADA	3,21	27,68	88,78	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
84	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50,91	6	CALZADA	2,87	27,86	79,87	Sin iniciar	31-jul-23	SIN PMT	
85	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50,91	6	CALZADA	3,11	27,9	86,74	Sin iniciar	10-ago-23	SIN PMT	
86	8005065	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47,26	2	CALZADA	3,53	27,59	97,43	Sin iniciar	19-ago-23	SIN PMT	
87	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29,06	6	CALZADA	3,59	55,42	199,15	Sin iniciar	No se tiene programación del CIV		
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28,04	6	CALZADA	4,28	53,74	230,06	Sin iniciar	No se tiene programación del CIV		
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	6	CALZADA	4,34	99,91	433,99	Calzada: Sin actividad. Andén ambos costados: Conformación espacio público demolición, excavación y construcción de cajas.	21-jun-23		
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31,84	6	CALZADA	3,23	27,95	90,26	SIN ACTIVIDADES			
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29,06	6	CALZADA	4,1	27,99	114,7	Calzada: Apertura a CIV e inicia excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad			
92	8004910	153106	24295	92062924	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	46,21	6	CALZADA	2,22	112,12	248,59	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
93	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29,26	6	CALZADA	2,05	56,74	167,58	Sin iniciar	16-jun-23	SIN PMT	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1.COMPONENTE TECNICO

1.1. Actividades Técnicas de Interventoría
- Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
- Se cuenta con PMT aprobados de los CIV 8004757-8004699-8004816-8004663-8002162-8002265-8001931-8002008-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947 - 8001841 - 8001390 - 8001285 - 8005282 - 8005210 - 8005351 - 8005408
- Seguimiento en la conformación de espacio público 56-48-49-50-89-71-79, mejoramiento de vía y excavación mecánica 57-91. Seguimiento a la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 psi P76-75-74-P69. Seguimiento a la apertura de CIV 57-91

1.2 Seguimiento de las actividades del contratista
- **P81:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P82:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P60:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P61:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P64:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P65:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P73:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P74:**Calzada: Sin actividad. Andén norte: Vaciado de concreto 3000 psi. Andén sur: Vaciado de concreto 3000 psi.
- **P75:**Calzada: Instalación de geotextil de arena de peña, tubo Novafort y construcción pozo. Andén oriental: Vaciado de concreto 3000 psi. Andén occidental: Vaciado de concreto 3000 psi
- **P76:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Vaciado de concreto 3000 psi. Andén occidental: Sin actividad
- **P66:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P44:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P50:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: sin actividad. Andén occidental: Instalación bordillo, cajillas, fresado y concreto 3000 psi
- **P68:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P69:**Calzada: Instalación de bordillo A-80. Andén oriental: Vaciado de concreto 3000 psi. Andén occidental: Vaciado de concreto 3000 psi
- **P70:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Cortes de concreto
- **P71:**Calzada: Instalación de monoblock. Andén oriental: Instalación de geotextil, fresado primera y segunda capa e instalación de bordillo A-80. Anden occidental: Instalación de geotextil, fresado primera y segunda capa e instalación de bordillo A-80
- **P49:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Se realiza excavación, instalación de geotextil y fresado. Andén occidental: Se realiza excavación, instalación de geotextil, fresado y demolición.
- **P48:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Se realiza demolición y excavación
- **P56:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Se realiza demolición y excavación e instalación de geotextil. Andén occidental: Instalación de geotextil, fresado.
- **P89:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Conformación espacio público demolición, excavación y construcción de cajas. Andén occidental: Conformación espacio público demolición, excavación y construcción de cajas.
- **P79:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Instalación de geotextil y fresado primera capa. Andén occidental: Instalación de geotextil y fresado primera capa.
- **P80:**Calzada: Instalación de tubería Novafort, arena de peña geo celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P77:** Calzada: Instalación de tubería Novafort e instalación de arena de peña. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P90:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P78:**Calzada: Se realiza excavación mecánica, instalación de geotextil geo celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P57**: Calzada: Se realiza Apertura a CIV e inician con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P91**: Calzada: Se realiza Apertura a CIV e inician con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

1.5 Actividades a realizar la siguiente semana
- Excavación mecánica y transporte de material proveniente de excavación.
- Nivelación y compactación de la subrasante. Instalación del fresado estabilizado, de sumidero y monoblock

2. COMPONENTE AMBIENTAL
- La calificación fue de 96%
- RCD GENERADO. Para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 510m3.
- Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial 300 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (44) - Sin actividades
CIV 8004699 (48) - Cargué y retiro de material de excavación Andenes - Lleno Fresado Andén C/ occidental - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén C/ occidental
CIV 8004816 (49) - Demolición y excavacion manual y construcción Cajas de inspección - Demolición y excavacion Andén C/oriental
CIV 8004663 (50) - Descargue Concreto MR-41 Microfibra Rampas vehiculares CIV Cciocidental - Conformacion espacio público - Estampado espacio público - Demolición y excavacion Andén C/ oriental
CIV 8004947 (56) - Demolición y excavacion manual Andén C/occidental - Construcción cajas de inspección C/occidental - Excavacion para instalación Monoblock C/ Occidental
CIV 8002162 (60) - Sin actividades
CIV 8002265 (61) - Sin actividades
CIV 8001931 (64) - Sin actividades
CIV 8002008 (65) - Sin actividades
CIV 8001876 (66) - Sin actividades
CIV 8001715 (68) - Descargue de Fresado - Mezcla fresado estabilizado - Compactación fresado estabilizado - Extendido última capa fresado estabilizado - Instalación bordillo A-80 confinamiento en vía
CIV 8001823 (69) - Instalación bordillo A-80 punta sur oriental
CIV 8001657 (70) - Corte en losas de concreto - Mezcla fresado estabilizado punta sur
CIV 8001771 (71) - Instalación bordillo A-80 - Excavación manual para ajustar manguera agua potable 3/4" - Compactación primera capa de Fresado estabilizado andén costado occidental y oriental
CIV 8001148 (73) - Sin actividades
CIV 8001184 (74) - Fundida de andenes 3000 psi - Estampado de andenes - Resanado con mortero de tubería que conecta sumidero y cajilla de monoblock
CIV 8001123 (75) - Construcción del pozo y relleno con fresado - Estampado de andenes - Solado 0.05 m para carcamo entre sumidero y pozo - Instalación fresado con geoceldla - Compactación con canguro de fresado y geoceldla
CIV 8001183 (76) - Fundida andenes - Se inicia con el estampado de andenes
CIV 8001285 (77) - Nivelación de excavación para tubería agua pluvial – Cama de arena para instalar tubería 12" - Instalación tubería 12" y relleno con arena de peña - Lleno con fresado zanja tubería 12" ALL
CIV 8005282 (78) - Instalación Geotextil -Geoceldla y Fresado
CIV 8001390 (79) - Extendido de geotextil y fresado 1ra capa para andén - Compactación con canguro de la subrasante - Construcción caja de inspección andén - Compactación con canguro 1ra capa de fresado andén - Instalación de geodren para filtrar aguas negras - Instalación Monoblock 320
CIV 8001581 (80) - Instalación de tubería 12" domiciliaria - Instalación de base inferior sumidero - Lleno con fresado para sumideros - Lleno con arena de peña para tubería 12" - Recubrimiento con arena de peña para tubería 12" - Lleno con fresado paara tuberia ambos costados - Compactacion y Nivelacion de la sub rasante - Instalación de geotextil y geoceldla - Lleno con fresado capa geoceldla - Cereo y compactacion de fresado capa geoceldla
CIV 8005000 (81) - Sin actividades
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Excavación en anden costado occidental - Cargue de escombro - Demolición de caja sanitaria existente - Excavacion en anden costado oriental - Conformacion en anden costado occidental - Pisos para cajas sanitaria
CIV 8005210 (90) - Sin actividades
CIV 8005408 (91) - Cargué y retiro de material de excavación

Durante la semana se evidenciaron situaciones donde se afectó la vía por residuos de construcción de la obra, y por residuos dejados por el paso de las volquetas sobrecargadas, monoblock contaminado por material fresado acopiado. Estas situaciones se indicaron al contratista y fueron atendidas en hora de la tarde, satisfactoriamente.

Se indicaron las observaciones relacionadas con la revisión del informe N° 10 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio como son:
- Cambiar en la trazabilidad el nombre de quien agruaba el informe mensual.
- En la pág. 57 aparece la calificación de junio como 100% y fue de 98,75%, por lo mismo cambiar este porcentaje.
- Se aclara que Prefacon hace parte de CONCRETARTE.
- Ajustar el numeral 4.4.2.2 instalación de granulo de caucho.
- Se debe indicar en el mes correspondiente al informe las cantidades de materiales ingresadas a la obra
a fecha de corte. El contratista informa que no es posible.
- Presentar las certificaciones que se tienen relacionadas con material fresado ingresado a la obra.

1. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
1. Consorcio SCLV = 0	1. Consorcio SCLV = 23 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Validad Limitada = 13 4. Cerse Ingeniería Ltda = 1 5. J.V.R Estudios = 1 6. Geovial Limitada = 5	0	53

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 17 de agosto de 2023 al 23 de agosto de 2023, se presentó ausentismo del personal de la Interventoría que se relaciona a continuación:

Nombre	Dias de incapacidad	Descripción
Carmen Elvira Hernández Cadenera 1	1	M235: Incapacidad enfermedad general 23/08/2023 al 24/08/2023

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
- El 17 de agosto de 2023 se llevó a cabo recorrido de obra donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista Consorcio Vías de Kennedy 22, donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, en las diferentes prioridades intervenidas se observaron equipos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla) e información de conformación de brigada de emergencias.
- El 17 de agosto de 2023 se llevó a cabo comité de seguimiento semanal en el FDLK donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista Consorcio Vías de Kennedy 22, donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
- El 22 de agosto de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
- Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

UP2 CORABASTOS:
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P82: No se encuentran desarrollando actividades
P44: No se encuentran desarrollando actividades
P48: Actividades en espacio público
P49: Actividades de demolición de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con, kit de emergencia y punto ecológico.
P50: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con baño portátil, kit de emergencia.
P56: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, así mismo hace uso d ellos EPP, este CIV cuenta con kit de emergencia y punto ecológico.

UP2 PATIO BONITO:
P60: No se encuentran desarrollando actividades.
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P64: No se encuentran desarrollando actividades
P65: No se encuentran desarrollando actividades
P66: No se encuentran desarrollando actividades
P68: No se encuentran desarrollando actividades
P69: Actividades de estampado en espacio público, este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico.
P70: Actividades de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico
P71: No se encuentran desarrollando actividades.
P73: No se encuentran desarrollando actividades.
P74: No se encuentran desarrollando actividades.
P75: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico, estos insumos están compartidos con los CIV 73,74 y 76.
P76: No se encuentran desarrollando actividades.
P77: Actividades de excavación manual para tubería el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP.
P78: Actividades de excavación el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y cartelera informativa.
P79: Actividades de conformación espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV Cuenta con punto ecológico.
P80: No se encuentran desarrollando actividades sin embargo este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y cartelera informativa.
P89: Actividades de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP. este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico, unidad sanitaria, cartelera informativa y carpa vestier.
P90: No se encuentran desarrollando actividades.

- De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista revisar los pasos peatonales y donde haya tapas de medidores dañadas ajustarlas. Adicional a eso donde haya sumideros bajitos, señalizar mejor ya que no están a nivel de la vía y el andenes peatonal.
- Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
- El 18 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
- El 11 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de SST realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
- El 22 de agosto de 2023 la Interventoría como como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó información sobre estilos de vida saludables
- El 23 de agosto de 2023 se realizó comité interno de Interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
- Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO.

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 17 de agosto de 2023 al 23 de agosto 2023, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
AIKA HUMANA = 7 CONSTRUBERNAL = 3	1. CVK22 = 9 2. AIKA HUMANA = 84 3. MMAPV SAS = 7 4. MR GROUP COL SAS = 1 5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1 6. MABERK = 1 7. WITS = 1 8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1 9. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 13 10. CONSTRUBERNAL = 1 11. SAM INGENIERIA = 9 12. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1 13. HA CIVILES = 5 14. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1 15. PROURBANOS = 2 16. TRANSUMINISTRO PEREZ =1	1. AIKA HUMANA = 5 2. SAM INGENIERIA = 2 3. HA CIVILES = 1	140

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 17 de agosto de 2023 al 23 de agosto de 2023, el contratista reporto ausentismo de siete (7) trabajadores, tres (3) generados por enfermedad general, uno (1) por AT, dos (2) no asistieron, y uno (1) con permiso no remunerado. De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 17 de agosto de 2023 al 23 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de dias de ausencia = 7
N° de dias de trabajo programados = 5
N° Trabajadores en la semana = 61
% de ausentismo 2,30%
Es así como se evidencia que el 2,30% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
- Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
- Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Público y Fenómenos naturales
- Se realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato COP 690-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra
- El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
- El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra
- Se llevo a cabo inspecciones de maquinaria y EPP en los frentes de obra.

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• En este periodo el PAC es atendido de acuerdo con el horario aprobado previamente por la interventoría; lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Adicionalmente, el contratista realizó recorridos sociales para atender inquietudes de la comunidad y acercar la atención a la ciudadanía en el área de intervención, los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo anterior, para completar 40 horas de atención según lo requerido contractualmente.

PQRSD:

A la fecha el contratista cuenta con 41 PQRSD cerradas y 1 PQRSD abierta

• **PQRSD 42:** El 17/08/2023 el contratista y la interventoría realizan acercamiento a predio y diálogo con esposa de propietario señora Miriam, para informarle que desde el área técnica del contratista ya se realizaron los procesos de limpieza con Vactor en este predio cumpliendo así, con las actividades propias para atender esta solicitud. Se recomienda que internamente desde el predio se tomen las medidas preventivas para evitar el taponamiento, ya que durante el proceso constructivo se evidenció residuos de grasas de cocina que pueden generar problemáticas a futuro, este mismo día en horas de la tarde el contratista realiza una nueva inspección a la tubería a través de un sondeo y limpieza con agua, con el cual se evaluó las condiciones de la tubería y de la caja de aguas residuales, dando como resultado que presenta flujo libre sin ningún taponamiento.

El 22/08/2023 se envía vía WhapApp al señor Montañez registro fílmico soporte de la limpieza y verificación del estado de la tubería. De acuerdo a lo manifestado por el ciudadano, se corrobora que el presunto taponamiento de acuerdo a la revisión del registro fílmico realizado por el área técnica; se observa que no hay presencia de material de concreto a lo largo de la tubería, en el video se puede concluir dos hipótesis: 1.- se observa un accesorio en concreto de redireccionamiento de aguas residuales y 2- no es existente dicho taponamiento ya que se evidencia que la sombra es el codo de la tubería del predio. Esta información se le sumista al ciudadano vía WhatsApp para dar por finalizada la gestión. Por lo cual se da por cerrada esta PQRSD, esposa del propietario la señora Nubia Agudelo realiza firma del documento por poder.

Recorridos Urbanos:

• El 17 y 22 de agosto 2023 se realiza recorrido por los frentes de obra activos de las UPZ 80 Corabastos y la UPZ 82 Patio Bonito en los cuales se verifica las vallas informativas de los frentes de obra, además de PSI y se atienden solicitudes de información de algunas personas de la comunidad, la interventoría manifiesta que un ciudadano de la UPZ 82 manifiesta que la tapa de su caja de pozo de inspección se encuentra pequeña, por lo cual, se están propagando olores de la misma, el contratista manifiesta que realizará verificación del ciudadano.

• El 22/08/23 interventoría brinda observaciones del recorrido realizado en campo por los frentes activos, los cuales quedan registrados en la bitácora social y se socializarán en el comité social del corte siguiente.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• El 22/08/2023 se remiten las primeras versiones de las presentaciones del comité veedor N. 8 de la UPZ 80 y 82 para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

4.3 Programa de acompañamiento técnico

Actas de vecindad y rampas vehiculares

• Se continúa realizando las actas de vecindad de cierre en las P. 81, 82, 60, 61, 65 y 73 algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates

• El 22/08/23 se realiza envío del oficio CE-CVK22-ADM- 686 Radicación actas de vecindad CIV 8001545 a la interventoría para su revisión y aprobación.n.

Total, de actas realizadas en el contrato: 703

• Se continúa realizando las actas de acceso vehicular de cierre en las P. 81,82, 60,61, 65 y 73, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.

• El 22/08/23 se realiza envío del oficio CE-CVK23-ADM- 686 Radicación actas de vecindad CIV 8001545 a la interventoría para su revisión y aprobación.

Total, de actas realizadas en el contrato: 443

Cierres de Actas de Vecindad: Se continúa realizando las actas de vecindad y actas de acceso vehicular de cierre en las P. 60, 73, 81 y 82, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.

Suspensión de Garaje: El 17/08/2023 se realiza seguimiento a las actas de compromiso de suspensión de acceso vehicular en las prioridades 57 y 91.

Actas de compromiso:

• El 18/08/2023 el contratista remite la primera versión del oficio que será radicado a la Alcaldía Local de Kennedy para notificación de incumplimiento de adecuación de bajantes, el día 19/08/2023 la interventoría remite observaciones las cuales son atendidas por parte del contratista el día 22/08/2023 quién realiza el envío del oficio CE-CVK22-ADM-684 REMISIÓN BAJANTES ALCALDIA LOCAL KENNEDY.

• El 22/08/2023 la interventoría realiza firma de las actas de compromiso con comunidad y bajantes de aguas lluvias las cuales ya tienen cierre por parte del contratista.

4.4 Programa de cultura ciudadana

• El 17/08/2023 se ejecuta el primer taller de formación en cultura ciudadana y desarrollo urbano en el salón comunal Ciudad Granada, se contó con la participación de 24 niños y niñas de este sector, el día 22/08/2023 se remiten las actas de ejecución de este taller de las UPZ 80 y 82.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

• A la fecha el contrato cuenta con 58 personas de MONC, de las cuales 7 de ellos residen en la localidad, 4 de estos trabajadores son mujeres y 3 son hombres, sus cargos dentro de la obra son de auxiliares de tráfico, BOAL y ayudantes de obra. El porcentaje de contratación general a la fecha es de 13 % correspondiente a trabajadores residentes en la localidad de Kennedy, de ellos 7,14 % son mujeres.

• El 16/08/2023 se presentó afectación en el cable de alta tensión del CIV 8001390 P. 79 lo que ocasionó la suspensión temporal del servicio de la luz del predio ubicado en la Carrera 93 C N. 39 C – sur, el contratista inicia con el reporte a la institución prestadora de servicio Enel Codensa con el N. radicado 487493229, además de seguimiento continuo para la re instalación del servicio de luz, el día 18/08/2023 se reestablece el servicio y se da cumplimiento a esta afectación.

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Vallas informativas

• Para el periodo reportado, los frentes de obra actuales cuentan con su valla informativa de inicio a fin y cuentan con el porcentaje de obra actual.

• A corte de este periodo el avance de obra se encuentra en el 30.58% con 48 días para finalización de obra, esta información se actualiza los días de corte de entrega de informe semanal del área técnica.

Volantes de información:

• El 16/08/2023, se realizó la distribución de 08 Volantes N. 132 Recolección de basuras CIV 8005210.

• Se realizó la distribución de 08 Volantes N. 134 Recolección de basuras CIV 8005210.

• Se realizó la distribución de 16 volantes N. 133 Recolección de basuras en los CIV 8005282 y 8005351

• El 18/08/2023 se remite el volante 135 levantamiento de actas de vecindad de cierre CIV 8005000 Visita 3, la cual fue aprobada por parte de la interventoría y distribución a la comunidad este mismo día.

• El 22/08/2023 se remiten los volantes N. 136 y 137 invitación al comité veedor N. 8 de la UPZ 80 y 82 para revisión, la interventoría emite aprobación al documento

Puntos Satélites de información:

• El 22/08/2023 la interventoría reporta daño en el PSI de la Jac de villa Loma, la cual fue atendida este mismo día por parte del contratista.

Afiches

• El 22/08/2023 la interventoría solicita que los Afiches informativos de los PSI sean cambiado 1 vez al mes para que cuenten con un adecuado mantenimiento.

Medios de comunicación: El 19 y 22 de agosto de 2023 se realiza envío por medio de WhatsApp las actas de compromiso con comunidad y actas con comunidad ejecutadas en el contrato, para dar cumplimiento a lo contractual.

4.8 Comités

• Se brinda en el comité de seguimiento la calificación semanal la cual es de 100% de cumplimiento.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

No se presentaron

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los veintitrés (Día en letras) 23 (Día en números)

días del mes de agosto (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

(Nombre) Jose Manuel Silva Rojas
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 46 **DEL** 17 de agosto de 2023 **AL** 23 de agosto de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No. 64 - 8001931
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 2.

CIV: No.60 - 8002162
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 3.

CIV: No.66 - 8001876
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 4.

CIV: No.69 - 8001823
Descripción: Instalación de concreto de 3000 psi



Descripción Foto 5.

CIV: No.50 - 8004663
Descripción: Instalación de concreto de 3000 psi



Descripción Foto 6.

CIV: No.49 - 8004816
Descripción: Excavación manual de andén



Descripción Foto 7.

CIV: No.73 - 8001148
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 8.

CIV: No.44 - 8004757
Descripción: Sin actividades

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 9.

CIV: No.68 - 8001715
Descripción: Instalación fresado estabilizado



Descripción Foto 10.

CIV: No.79 - 8001390
Descripción: Conformación espacio publico



Descripción Foto 11.

CIV: No.75 - 8001223
Descripción: Conformación de pozo



Descripción Foto 12.

CIV: No.70 - 8001657
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 13.

CIV: No.89 - 8001841
Descripción: Conformación espacio publico



Descripción Foto 14.

CIV: No.74 - 8001184
Descripción: Instalación de concreto de 3000 psi



Descripción Foto 15.

CIV: No.71 - 8001771
Descripción: Instalación de fresado espacio público



Descripción Foto 16.

CIV: No.76 - 8001183
Descripción: Conformación espacio público

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 17.

CIV: No.56 - 8004947
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 18.

CIV: No.80 - 8001581
Descripción: Instalación de fresado



Descripción Foto 19.

CIV: No.48 - 8004699
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 20.

CIV: No.77 - 8001285
Descripción: Instalación arena de peña



Descripción Foto 21.

CIV: No.91 - 8005408
Descripción: Excavación mecánica



Descripción Foto 22.

CIV: No.61 - 8002265
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 23.

CIV: No.65 - 8002008
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 24.

CIV: No.82 - 8005078
Descripción: Finalizan proceso constructivo

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 25.

CIV: No.90 - 8005210
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 26.

CIV: No.78 - 8005282
Descripción: Instalación de geotextil, geocelda y fresado


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintitrés (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Alba Roja
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2
SEGUIMIENTO AL 22-AGOSTO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 295.480.241,35	1,69%	89,25%	-1,14%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 235.122.369,51	1,35%	68,53%	-1,40%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 288.156.250,27	1,65%	89,85%	-1,30%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 314.420.891,92	1,80%	88,52%	-0,84%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 348.645.503,40	2,00%	96,69%	-0,48%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 365.422.481,56	2,09%	97,09%	-0,45%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 238.533.146,07	1,37%	83,49%	-0,57%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 75.288.254,03	0,43%	51,56%	-0,91%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 113.749.231,77	0,65%	78,88%	-0,40%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 247.374.561,19	1,42%	71,20%	1,42%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 86.358.124,14	0,50%	25,21%	-1,76%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 207.927.703,10	1,19%	65,34%	-1,28%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 208.035.653,54	1,19%	38,19%	-1,20%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 118.556.523,50	0,68%	33,73%	-1,69%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 76.660.257,64	0,44%	21,21%	-2,02%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 200.250.759,32	1,15%	58,64%	-1,39%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 812.221.023,53	4,66%	$ 201.834.526,26	1,16%	26,20%	-3,50%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 121.394.605,15	0,70%	32,16%	-1,85%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 150.466.939,55	0,86%	$ 129.408.235,57	0,74%	27,00%	-0,12%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 554.765.063,84	3,18%	$ 96.197.316,83	0,55%	9,78%	-2,63%
89	8001841	$ 580.698.248,00	$ 451.836.954,10	2,59%	$ 78.276.778,14	0,45%	13,48%	-2,14%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 593.145.037,00	3,40%	$ 83.394.625,45	0,48%	13,25%	-2,92%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 612.335.023,00	3,51%	$ 47.937.055,96	0,27%	8,20%	-3,24%
77	8001285	$ 564.687.707,00	$ 521.618.723,00	2,99%	$ 16.621.044,03	0,10%	2,94%	-2,89%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 13.219.656,57	0,08%	2,98%	-2,77%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 6.570.152,80	0,04%	2,18%	-2,46%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 380.310.641,00	2,18%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,18%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 327.974.314,00	1,88%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,88%
45	8002718	$ 739.233.204,00	$ 423.051.974,50	2,42%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,42%
46	8005377	$ 280.055.154,00	$ 336.697.035,00	1,93%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,93%
47	8005506	$ 625.940.380,00	$ 232.838.502,40	1,33%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,33%
83	8005258	$ 124.373.507,00	$ 146.541.715,00	0,84%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,84%
84	8005192	$ 119.547.602,00	$ 117.146.144,90	0,67%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,67%
55	8005471	$ 136.685.140,00	$ 153.519.892,00	0,88%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,88%
85	8005126	$ 144.960.620,00	$ 64.373.681,70	0,37%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,37%
86	8005065		$ 7.937.676,20	0,05%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,05%
57	8005351		$ 14.654.171,50	0,08%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,08%
TOTALES			**$ 15.323.717.871,22**	**87,84%**	**$ 4.214.835.949,06**	**24,16%**		**-63,68%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17.445.442.250,00**					

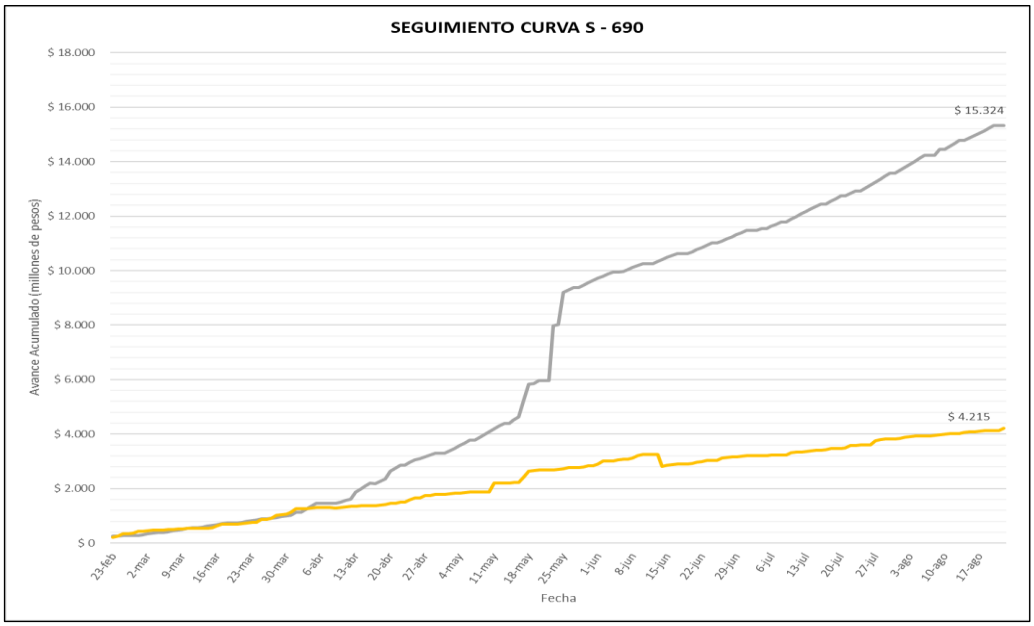


CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN CIV

FECHA EVALUACIÓN			25-jul	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	89,25%	89,25%	89,25%	89,25%	89,25%
82	8005078	$ 343.085.920,00	68,53%	68,53%	68,53%	68,53%	68,53%
60	8002162	$ 320.721.252,00	77,21%	89,85%	89,85%	89,85%	89,85%
61	8002265	$ 355.199.128,00	88,52%	88,52%	88,52%	88,52%	88,52%
65	8002008	$ 360.580.405,00	95,26%	95,26%	96,69%	96,69%	96,69%
64	8001931	$ 376.367.569,00	87,88%	97,09%	97,09%	97,09%	97,09%
73	8001148	$ 285.710.532,00	83,49%	83,49%	83,49%	83,49%	83,49%
76	8001183	$ 146.013.903,00	45,15%	46,49%	48,58%	48,58%	51,56%
75	8001223	$ 144.206.710,00	68,45%	77,01%	77,01%	77,13%	78,88%
74	8001184	$ 347.413.004,00	70,42%	70,42%	70,88%	70,88%	71,20%
70	8001657	$ 342.553.149,00	9,36%	10,82%	13,44%	22,01%	25,21%
66	8001876	$ 318.216.103,00	54,78%	62,29%	65,34%	65,34%	65,34%
44	8004757	$ 544.689.706,00	31,50%	38,17%	38,19%	38,19%	38,19%
68	8001715	$ 351.516.714,00	24,46%	27,00%	29,19%	29,74%	33,73%
71	8001771	$ 361.446.034,00	19,18%	19,18%	19,89%	21,20%	21,21%
69	8001823	$ 341.507.411,00	44,33%	49,31%	54,19%	56,43%	58,64%
50	8004663	$ 770.232.864,00	18,46%	22,28%	22,78%	24,91%	26,20%
56	8004947	$ 377.475.477,00	16,14%	16,14%	16,14%	18,53%	32,16%
49	8004816	$ 479.216.394,00	24,84%	24,99%	26,47%	26,47%	27,00%
48	8004699	$ 983.197.315,00	8,10%	8,37%	9,78%	9,78%	9,78%
89	8001841	$ 580.698.248,00	9,94%	10,35%	11,55%	12,55%	13,48%
79	8001390	$ 443.969.911,00	8,37%	9,48%	11,33%	13,24%	13,25%
80	8001581	$ 584.822.489,00	0,00%	0,00%	2,01%	4,81%	8,20%
77	8001285	$ 564.687.707,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%	2,94%

FECHA EVALUACIÓN			22-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	0,00%
61	8002265	$ 355.199.128,00	0,00%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,00%
64	8001931	$ 376.367.569,00	0,00%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	2,99%
75	8001223	$ 144.206.710,00	1,75%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,33%
70	8001657	$ 342.553.149,00	3,20%
66	8001876	$ 318.216.103,00	0,00%
44	8004757	$ 544.689.706,00	0,00%
68	8001715	$ 351.516.714,00	3,99%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,01%
69	8001823	$ 341.507.411,00	2,21%
50	8004663	$ 770.232.864,00	1,29%
56	8004947	$ 377.475.477,00	13,63%
49	8004816	$ 479.216.394,00	0,53%
48	8004699	$ 983.197.315,00	0,00%
89	8001841	$ 580.698.248,00	0,93%
79	8001390	$ 443.969.911,00	0,01%
80	8001581	$ 301.695.957,00	3,39%
77	8001285	$ 370.268.458,00	0,92%

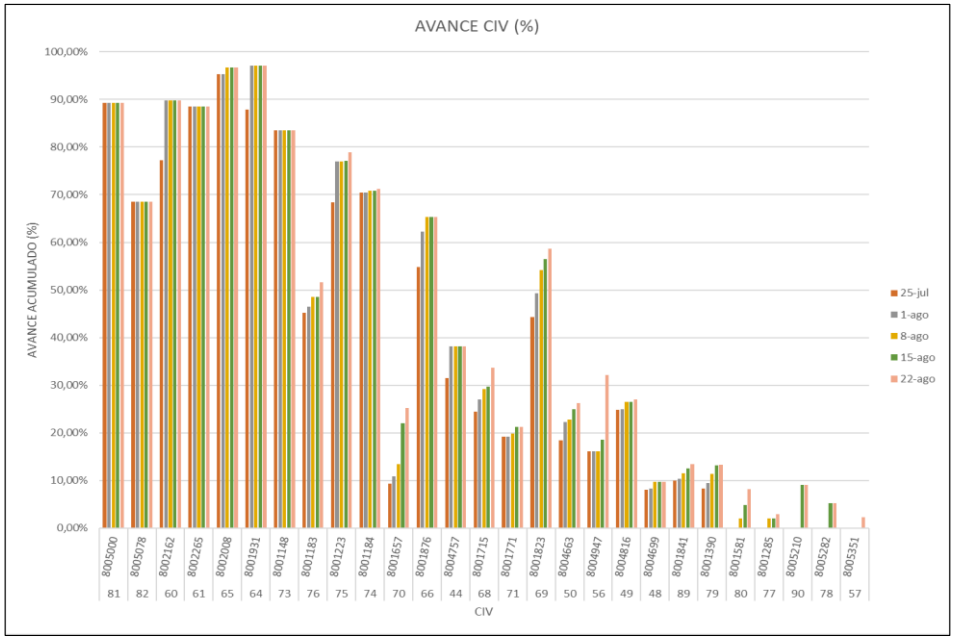

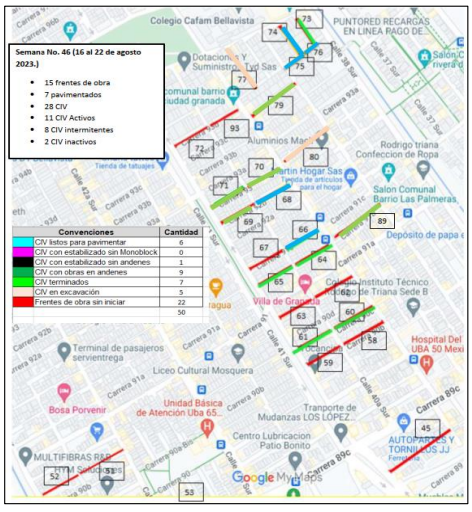



CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Periodo 17 de agosto al 22 de agosto de 2023

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	84,86%	87,84%	84,86%
%Ejecutado	24,46%	24,16%	25,12%
Atraso(-)/Adelanto(+)	-60,40%	-63,68%	-59,74%
