FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 47 (consecutivo) **DEL** 24 de agosto de 2023 (dd mm aa) **AL** 30 de agosto de 2023 (dd mm aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **COP 690 de 2022** (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 (Escribir el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.628.933-1 (Escribir el No. del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV (Escribir el nombre o razón social del interventor) **NIT** 900.547.145-2 (Escribir el No. del interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor	$ 19.621.435.784,00	Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses	Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022	Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023	Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual		Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30	No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (Escribir el nombre del supervisor del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO (Escriba el nombre del profesional del Grupo de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (No. Radicado Interno de Entrada radicado Bta) **de fecha** (dd mm aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
Calzada CIV	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50
TOTALES	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO				
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,54%	2,54%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%	-2,54%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Fase preliminar Programada (%)	0,12%	0,24%	Fase preliminar Ejecutada (%)	0,12%	0,24%	0,49%
Fase preliminar Programada ($)	$ 23.973.839,44	$ 47.947.678,89	Fase preliminar Ejecutada ($)	$ 23.973.839,44	$ 47.947.678,89	$ 0,00
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%	Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -	Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,00%	7,21%
10	2,10%	7,21%
11	1,73%	7,21%
12	2,54%	7,22%
13	3,46%	7,23%
14	4,62%	8,21%
15	6,07%	8,27%
16	7,67%	8,35%
17	9,07%	8,57%
18	11,53%	8,95%
19	13,68%	9,14%
20	8,41%	10,01%
21	3,00%	7,22%
22	3,87%	7,22%
23	4,77%	7,22%
24	5,52%	7,22%
25	6,41%	7,22%
26	8,88%	7,22%
27	10,10%	7,22%
28	14,04%	7,22%
29	18,03%	7,22%
30	19,26%	7,22%
31	23,20%	7,22%
32	26,73%	9,52%
33	46,36%	9,52%
34	53,73%	9,52%
35	55,94%	9,52%
36	57,95%	9,52%
37	59,96%	9,52%
38	62,48%	9,52%
39	64,49%	9,52%
40	66,97%	17,78%
41	70,47%	17,78%
42	72,55%	17,78%
43	76,07%	17,78%
44	78,98%	17,78%
45	82,43%	25,12%
46	84,86%	25,12%
47	87,97%	25,12%

Análisis de la Gráfica:
No se cuenta con cronograma

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO				
Fase preliminar	SEMANAL	ACUMULADO	%Peso. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	%Atraso /%Avance
Fase preliminar programada (m²)	1542,91	3085,82	23%	Fase preliminar Ejecutada (m2)	1542,91	3085,82	23%	
Fase preliminar programada (Und)	12	12	24%	Fase preliminar Ejecutada (Und)	12	12	24%	0%
Fase preliminar programada (Km/carril)	0,0001714286	0,0003428571	0,09%	Fase preliminar Ejecutada (Km/carril)	0,0001714286	0,0003428571	0,09%	
Estudios y Diseños Prooram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	
Meta Física Programada (m²)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%	
Meta Física Programada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%	%Atraso /%Avance
Meta Física Programada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%	0%
Meta Física Programada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%	
Meta Física Programada (%)				Meta Física Ejecutada (%)				
AVANCE PROJECT								%Atraso /%Avance
Avance Programado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%			0%
Avance Proorramado Mantenimiento periódico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%			0%
Avance Proorramado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%			0%
Avance Proorramado Mantenimiento Reconstrucción	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%			0%
Avance Proorramado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%			0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

														INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERFICIE	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	ESTADO	FECHA DE INICIACION PROGRAMADA	MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO	Acciones a seguir
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33,44	6	CALZADA	3,19	82,04	261,84	SIN ACTIVIDADES	1-abr-23		
45	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51,58	6	CALZADA	4,38	129,94	569,35	Sin iniciar	9-jul-23	SIN PMT	
46	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29,06	6	CALZADA	3,83	62,8	240,73	Sin iniciar	7-jul-23	SIN PMT	
47	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33,55	6	CALZADA	2,93	100,38	294,44	Sin iniciar	17-jul-23	SIN PMT	
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	4,74	144,13	683,05	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado, construcción cajas. Andén occidental: Demolición y excavación.	15-jun-23		
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32,6	6	CALZADA	2,7	82,01	221,4	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado, construcción cajas. Andén occidental: Instalación de fresado, construcción cajas	24-jul-23		
50	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	5,25	136,17	714,24	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación manual. Andén occidental: Instalación bordillo, cajillas, fresado y concreto 3000 psi	10-may-23		
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28,88	6	CALZADA	2,59	88,19	228,81	Sin iniciar	No se tiene programación		
52	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28,19	6	CALZADA	2,36	72,08	170,02	Sin iniciar	No se tiene programación		
53	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 89C	KR 89F	30,14	6	CALZADA	2,63	41,49	109,22	Sin iniciar	No se tiene programación		
54	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37,56	6	CALZADA	4,88	88,16	430,2	Sin iniciar	No se tiene programación		
55	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81 I	KR 81J	29,06	6	CALZADA	3,74	27,95	104,45	Calzada: Se hace apertura a CIV y se inicia con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad			
56	8004947	153132	24347	92062895	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29,79	6	CALZADA	4,24	71,14	301,74	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación. Andén occidental: Instalación de geotextil, fresado.	25-feb-23		
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,45	27,73	95,75	Calzada: Se realiza excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad			
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33,55	6	CALZADA	4,83	80,45	372,11	Sin iniciar	23-feb-23	SIN PMT	
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32,51	6	CALZADA	4,32	66,67	288,2	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52,62	6	CALZADA	5	79,19	395,73	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	22-dic-22		
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51,58	6	CALZADA	4,54	65,92	299,32	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	6-ene-23		
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48,97	6	CALZADA	4,54	76,23	345,98	SIN INICIAR	4-mar-23		
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63,01	6	CALZADA	4,41	66,53	293,12	SIN INICIAR	No se tiene programación por CIV		
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,93	69,19	272,04	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	21-mar-23		
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29,06	6	CALZADA	3,5	67,82	237,35	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	28-feb-23		
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,84	67,47	259,4	SIN ACTIVIDADES	9-mar-23		
67	8001868	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	3,79	66,96	253,67	Sin iniciar	3-abr-23	SIN PMT	
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,15	68,59	284,73	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Sin actividad.	18-mar-23		
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,26	67,66	288,51	Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Vaciado de concreto 3000 psi	8-abr-23		
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	3,87	62,49	241,97	Calzada: Construcción pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	4-abr-23		
71	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,04	67,46	272,75	Calzada: Instalación de monoblock Anden oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Anden occidental: Instalación de segunda capa de fresado e instalación de bordillo A-80	21-abr-23		
72	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48,97	6	CALZADA	3,4	67,15	228,19	Sin iniciar	6-jun-23	SIN PMT	
73	8001148	155917	92062684	92062817	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49,32	6	CALZADA	4,21	55,04	231,7	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	26-ene-23		
74	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50,01	6	CALZADA	4,18	62,56	261,7	Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén norte: Instalación de concreto 3000 psi. Andén sur: Sin actividad			
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49,32	6	CALZADA	3,56	29,93	106,54	Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad	24-ene-23		
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49,32	6	CALZADA	3,92	31,84	124,92	SIN ACTIVIDADES	24-ene-23		
77	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	30,59	6	CALZADA	4,17	84,31	351,16	Calzada: Instalación de geotextil, geo celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad			

78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,47	27,72	96,23	Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	12-sep-23	SIN PMT	
79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31,4	6	CALZADA	4,09	96,82	395,99	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de bordillo-80 y fresado. Andén occidental: Instalación de bordillo-80 y fresado	6-may-23		
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	2	CALZADA	4,06	96,35	391,11	Calzada: instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Inician con demolición. Andén occidental: Sin actividad	6-jun-23		
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28,95	6	CALZADA	4,3	73,09	314,48	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	16-dic-22		
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28,54	6	CALZADA	4,89	72,7	355,66	Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.	3-ene-23		
83	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31,84	6	CALZADA	3,21	27,68	88,78	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
84	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50,91	6	CALZADA	2,87	27,86	79,87	Sin iniciar	31-jul-23	SIN PMT	
85	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 83B	50,91	6	CALZADA	3,11	27,9	86,74	Sin iniciar	10-ago-23	SIN PMT	
86	8005065	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47,26	2	CALZADA	3,53	27,59	97,43	Sin iniciar	19-ago-23	SIN PMT	
87	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29,06	6	CALZADA	3,59	55,42	199,15	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV.		
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28,04	6	CALZADA	4,28	53,74	230,06	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV.		
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	6	CALZADA	4,34	99,91	433,99	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Conformación espacio público demolición, excavación y construcción de cajas. Andén occidental: Conformación espacio público demolición, excavación y construcción de cajas	21-jun-23		
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31,84	6	CALZADA	3,23	27,95	90,26	SIN ACTIVIDADES			
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29,06	6	CALZADA	4,1	27,99	114,7	Calzada: Se realiza excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad			
92	8004910	153106	24295	92062924	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	49,21	6	CALZADA	2,22	112,12	248,59	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
93	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29,06	6	CALZADA	2,95	56,74	167,56	Sin iniciar	16-jun-23	SIN PMT	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1.COMPONENTE TECNICO

1.1. Actividades Técnicas de Interventoria

- Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
- Se cuenta con PMT aprobados de los CIV 8004757-8004699-8004816-8004663-8002162-8002265-8001931-8002008-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947 - 8001841 - 8001390 - 8001285 - 8005282 - 8005210 - 8005351 - 8005408
- Seguimiento en la conformación de espacio público 56-48-49-50-89-71-79, mejoramiento de vía y excavación mecánica 57-91. Seguimiento a la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 psi P76-75-74-P69. Seguimiento a la apertura de CIV 55

1.2 Seguimiento de las actividades del contratista

- **P81:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P82:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P60:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P61:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P64:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P65:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P73:**Se finaliza proceso de construcción queda pendiente remates e instalación de bolardos.
- **P74:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén norte: Instalación de concreto 3000 psi. Andén sur: Sin actividad
- **P75:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
- **P76:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P66:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P44:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
- **P50:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación manual. Andén occidental: Instalación bordillo, cajillas, fresado y concreto 3000 psi
- **P68:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Sin actividad.
- **P69:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Vaciado de concreto 3000 psi
- **P70:**Calzada: Construcción pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P71:**Calzada: Instalación de monoblock. Andén oriental: Instalación de concreto 3000 psi. Andén occidental: Instalación de segunda capa de fresado e instalación de bordillo A-80
- **P49:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado, construcción cajas. Andén occidental: Instalación de fresado, construcción cajas
- **P48:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado, construcción cajas. Andén occidental: Demolición y excavación.
- **P56:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición y excavación. Andén occidental: Instalación de geotextil, fresado.
- **P89:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Conformación espacio público demolición, excavación y construcción de cajas. Andén occidental: Conformación espacio público demolición, excavación y construcción de cajas
- **P79:**Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de bordillo-80 y fresado. Andén occidental: Instalación de bordillo-80 y fresado
- **P80:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Inician con demolición. Andén occidental: Sin actividad
- **P77:** Calzada: Instalación de geotextil, geo celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P90**: Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P78:**Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P57**: Calzada: Se realiza excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P91**: Calzada: Se realiza excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
- **P55:** Calzada: Se hace apertura a CIV y se inicia con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

1.5 Actividades a realizar la siguiente semana

- Excavación mecánica y transporte de material proveniente de excavación.
- Nivelación y compactación de la subrasante. Instalación del fresado estabilizado, de sumidero y monoblock

2. COMPONENTE AMBIENTAL

- La calificación fue de 100%
- RCD GENERADO. Para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 390m3.
- Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial 345 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (44) - Sin actividades
CIV 8004699 (48) - Demolición - Excavacion y lleno Fresado Andén C/ occidental - Cargué y retiro de material de excavacion Andenes - Demolición y construcción Cajas de inspección C/ occidental
CIV 8004816 (49) - Conformacion Andén espacio público
CIV 8004663 (50) - Demolición manual de concreto andén oriental - Excavacion lleno Fresado Andén C oriental - Cargué y retiro de material de excavacion Andenes
CIV 8005471 (55) - Excavación mecanica - Cargue de Volqueta con material de excavación - Excavación de caja para la via
CIV 8004947 (56) - Excavación manual de andén occidental y limpieza - Cargué y retiro de material de excavacion Andenes - Instalación de bordillo, geotextil y fresado para andenes - Instalación de monoblock 320 andén occidental - Lleno de andén con fresado
CIV 8002162 (60) - Sin actividades
CIV 8002265 (61) - Sin actividades
CIV 8001931 (64) - Sin actividades
CIV 8002008 (65) - Sin actividades
CIV 8001876 (66) - Sin actividades
CIV 8001715 (68) - Sin actividades
CIV 8001823 (69) - Mezcla fresado estabilizado - Sello y compactación capa de Fresado estabilizado - Construcción mamposteria pozo e instalación tubería conexión a sumideros
CIV 8001657 (70) - Instalación prefabricados para sumideros - excavación manual para pozo - Fundida solado de limpieza para pozo - Instalación placa fondo - Construcción mamposteria pozo ALL
CIV 8001771 (71) - Estampado en rampas - Extendido concreto 3000 psi - Estampado tipo adoquin andén - Lleno con fresado andén oriental 2da capa - Instalación Monoblock 320 - Pañete capas de inspección - Instalación bordillo A-80 - Extendido 2da capa de Fresado andén occidental
CIV 8001148 (73) - Sin actividades
CIV 8001184 (74) - Mezcla fresado estabilizado - Extendido fresado estabilizado - Compactación con canguro fresado estabilizado
CIV 8001123 (75) - Instalación placa superior pozo - Compactación con canguro alrededor de pozo fresado estabilizado - Compactación y sello fresado estabilizado - Sello y compactación fresado estabilizado - Compactación con canguro 2da capa de Fresado estabilizado alrededor de pozo
CIV 8001183 (76) - Mezcla fresado estabilizado - Compactación con canguro segunda capa de Fresado estabilizado alrededor de pozo - Instalación cajillas de inspección monoblock 230 y conexión a sumidero - Extendido y chequeo segunda capa fresado estabilizado
CIV 8001285 (77) - Instalación de placa fondo - Conformada de subrasante con fresado mejoramiento - Compactacion de fresado mejoramiento - Perfilada de vía punta - Instalación de geotextil , geoceldá y lleno con fresado - Construcción de pozo ALL - Pañete para pozo
CIV 8005282 (78) - Instalación geotextil y geoceldá - Estabilizado RAP con cemento y solid soil
CIV 8001390 (79) - Compactación con canguro fresado andén ambos costados - Instalación Monoblock 320 costado oriental - Lleno con fresado andén ambos costados - Extendido geotextil Andén occidental - Construcción cajas sifón para desague - Instalación bordillo A80 en rampas
CIV 8001581 (80) - Mezcla de estabilizado RAP - Cerreo de estabilizado - Compactacion de estabilizado RAP - Extendido fresado estabilizado - Demolición de concreto en anden costado oriental - Desinstalacion de contadores costado oriental
CIV 8005000 (81) - Sin actividades
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Instalación de geotextil y lleno con fresado en anden oriental - Instalación de monoblock 320 y bordillo A80 costado occidental - Lleno con fresado 2da capa costado occidental- Instalación de bordillo A80 costado oriental - Excavacion manual para caja de 0.40=0.40 y tuberia 6" - Demolición y construcción de caja sanitaria existente
CIV 8005210 (90) - Sin actividades
CIV 8005408 (91) - Sin actividades

En recorrido realizado por parte de la interventoria, se evidenció lo siguientes:

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
1. Consorcio SCLV = 0	1. Consorcio SCLV = 23 2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10 3. La Validad Limitada = 13 4. Cansa Ingeniería Ltda = 1 5. J.V.R Estudios = 1 6. Geovial Limitada = 5	0	53

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 24 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2023, se presentó ausentismo del personal de la interventoría que se relaciona a continuación:

Nombre	Cargo	Días de incapacidad	Descripción
Carmen Elvira Hernández	Cadenera 1	1	M235: Incapacidad enfermedad general 23/08/2023 al 24/08/2023
Jhenifer Diaz Narvaez	Cadenero 1	1	A083: Incapacidad enfermedad general 29/08/2023, un (1) dia.

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El 24 de agosto de 2023 se llevó a cabo comité de seguimiento integral en el FDLK donde asistió el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista Consorcio Vías de Kennedy 22, donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado de los informes mensuales, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.
- El 28 /08/23 se realizó comité de participación ciudadana FDLK N°8, donde el componente SST expuso el avance de las actividades realizadas en los CIV intervenidos, entrega de dotación al personal de obra, plan de Emergencia, inducciones y cumplimiento del apéndice E del contrato.
- El 29 de agosto de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.
- Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

UPZ CORABASTOS:

P81: No se encuentran desarrollando actividades
P82: No se encuentran desarrollando actividades
P60: No se encuentran desarrollando actividades
P78: No se encuentran desarrollando actividades sin embargo este CIV cuenta con cartelera informativa y punto de acopo de materiales de fresado.
P57: No se encuentran desarrollando actividades
P91: No se encuentran desarrollando actividades sin embargo este CIV cuenta con punto ecológico y cerramiento perimetral.
P55: Actividades de excavación el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con kit de emergencia y kit antiderrame.
P56: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con, kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico
P44: No se encuentran desarrollando actividades
P48: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con punto ecológico.
P49: Actividades de instalación de monoblok en espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con, kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico.
P50: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con baño portátil, kit de emergencia, kit antiderrame, cartelera informativa y punto ecológico.

UPZ PATIO BONITO:

P60: No se encuentran desarrollando actividades.
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P64: No se encuentran desarrollando actividades
P65: No se encuentran desarrollando actividades
P66: No se encuentran desarrollando actividades
P68: No se encuentran desarrollando actividades
P69: No se encuentran desarrollando actividades
P70: Actividades de construcción de pozo, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP.
P71: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, cartelera informativa y punto ecológico.
P89: Actividades de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico, unidad sanitaria, cartelera informativa y carpa vester.
P80: No se encuentran desarrollando actividades de demolición en espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y cartelera informativa.
P79: Actividades de conformación espacio público, el personal cuenta con dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de EPP, este CIV cuenta con punto ecológico y kit antiderrame los cuales están ubicados en el campamento del contratista.
P76: Actividades de extendida de fresado estabilizado el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP.
P75: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecológico, estos insumos están compartidos con los CIV 73,74 y 76.
P73: No se encuentran desarrollando actividades.
P74: No se encuentran desarrollando actividades.
P77: Actividades de extendida de Geoceldá, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, unidad sanitaria y punto ecológico.
- De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista instalar puntos ecológicos, cartelera informativa y kit de emergencia en los CIV donde no haya y donde estén realizando actividades de obra así mismo mantener los senderos peatonales Adicional a eso donde haya materiales de disposición acopiarlo en un solo lugar y protegerlos
- Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
- El 25 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
- El 28 de agosto de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con la personal información sobre prevención del consumo de alcohol, donde se dio a conocer lo perjudicial que es para el cuerpo humano
- El 30 de agosto de 2023 se realizó comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra
- Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría. De igual manera se realizó entrega de EPP al personal.

3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO.

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 24 de agosto de 2023 al 30 de agosto 2023, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
SAM INGENIERÍA = 1	1. CVK22 = 9	1. AIKA HUMANA = 1	146
CONSTRUCCIONES OJEDA = 6	2. AIKA HUMANA = 86 3. MMAPV SAS = 7 4. MR GROUP COL SAS = 1 5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1 6. MABERK = 1 7. WITS = 1 8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1 9. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 13 10. CONSTRUBERNAL = 6 11. SAM INGENIERÍA = 7 12. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1 13. HA CIVILES = 4 14. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1 15. PROURBANOS = 1 16. TRANSUMINISTRO PEREZ = 1	2. SOLUCIONES TECMARQ = 1	

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 24 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2023, el contratista reporto ausentismo de siete (7) trabajadores, tres (3) generados por enfermedad general, uno (1) por AT, dos (2) no asistieron, y uno (1) con permiso no remunerado.De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 24 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de dias de ausencia = 19
N° de dias de trabajo programados = 6
N° Trabajadores en la semana = 68
% de ausentismo 4,66%

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
- Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Publico y Fenómenos naturales
- Se realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato COP-690-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra
- El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
- El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra
- Se aperturó la prioridad 55 CIV 8005471 el cual conto con los insumos necesarios para inicio de obra.
- Se lleva a cabo inspecciones de maquinaria y EPP en los frentes de obra.
- El frente de obra cuenta con los espacios requeridos en el apéndice D del MAO, con espacio para almacenamiento de ropa de cambio de los trabajadores, kit de emergencias y baños en cantidad suficiente conforme con el número y el género de los integrantes del frente de obra, se hace el mantenimiento requerido con el fin de mantener en óptimas condiciones.

4.1 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• En este periodo el PAC es atendido de acuerdo con el horario aprobado previamente por la interventoría; lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Adicionalmente, el contratista realizó recorridos sociales para atender inquietudes de la comunidad y acercar la atención a la ciudadanía en el área de intervención, los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo anterior, para completar 40 horas de atención según lo requerido contractualmente.

PQRSD:

A la fecha el contratista cuenta con 43 PQRSD cerradas:

• **PQRSD 43:** fue cerrada el 29/08/2023 con el retiro de fresado dispuesto en la vía cruce de la calle 38 B sur con Calle 93D.

Derechos de petición

El 28/08/23 la interventoría remite mediante correo electrónico el derecho de petición de la señora Ana Isabel Medina, ciudadana manifiesta inconformidad por el no inicio de las actividades constructivas en el sector del barrio la Concordia, el contratista se encuentra en proceso de trámite.

Recorridos Urbanos:

• El 24 y 29 de agosto 2023 se realiza recorrido por los frentes de obra activos de las UPZ 80 Corabastos y la UPZ 82 Patio Bonito en los cuales se verifica las vallas informativas de los frentes de obra, estos recorridos cuentan con el acompañamiento de la interventoría, en los mismos ésta brinda directrices acerca de la gestión en campo y realiza recomendaciones para la ejecución de la gestión social en general.

• El 30/08/23 interventoría brinda observaciones del recorrido realizado en campo por los frentes activos, los cuales quedan registrados en la bitácora social y se socializarán en el comité social del corte siguiente.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• El 28/08/2023, el contratista realiza el comité veedor N. 8 en cada UPZ se contó con la participación de 28 ciudadanos de la UPZ 80 y 33 ciudadanos de la UPZ 82, se aclara que el número reportado es soportado con planillas de asistencia a este espacio, las actas de esta reunión a la fecha de presentación de este informe se encuentran en proceso de elaboración por parte del contratista.

4.3 Programa de acompañamiento técnico

Actas de vecindad y rampas vehiculares

• El 29 de agosto se recibe en el punto PAC las actas de vecindad y rampa vehicular del CIV 8001545, sin encontrar observaciones.

• El 28/08/23 se inicia con el levantamiento de actas de vecindad de las prioridades 51 y 52.

• Se continúa realizando las actas de vecindad de cierre en las P. 81,82, 60,61,65 y 73 algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.

Total, de actas realizadas en el contrato: 703

• El 28/08/23 se inicia con el levantamiento de actas de acceso vehicular de las prioridades 51 y 52.

• Se continúa realizando las actas de acceso vehicular de cierre en las P. 81,82, 60,61, 65 y 73, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.

Total, de actas realizadas en el contrato: 443

Cierres de Actas de Vecindad: Se continúa realizando las actas de vecindad y actas de acceso vehicular de cierre en las P. 60, 73, 81 y 82, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.

Suspensión de Garaje: El 26/08/2023 se realiza apertura a las actas de compromiso de suspensión de acceso vehicular en las prioridades 92, los documentos referente a esta actividad fueron revisados por la interventoría en los seguimiento que ésta realiza.

Actas de compromiso:

• El 26/08/2023 se realiza apertura de las actas de compromiso de adecuación de bajantes de aguas lluvias de la prioridad 92., de igual manera semanalmente se verifica las fechas de seguimiento de cada uno de estos compromisos y se realiza la respectiva gestión o cierre a la mismas.

4.4 Programa de cultura ciudadana

• El 23/08/23 la interventoría remite observaciones a las actas del taller, las cuales fueron atendidas por parte del contratista, las cuales fueron aprobadas el mismo día.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

• A la fecha el contrato cuenta con 64 personas de MONC; de las cuáles 9 de ellos residen en la localidad, 4 de estos trabajadores son mujeres y 5 son hombres, sus cargos dentro de la obra son de auxiliares de tráfico, BOAL y ayudantes de obra. El porcentaje de contratación general a la fecha es de 14,06 % correspondiente a trabajadores residentes en la localidad de Kennedy, de ellos 6,25 % son mujeres.

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Vallas informativas

• Para el periodo reportado, los frentes de obra actuales cuentan con su valla informativa de inicio a fin y cuentan con el porcentaje de obra actual.

• A corte de este periodo el avance de obra es de 32,01% con 41 días para finalización de obra, esta información se actualiza los días de corte de entrega de informe semanal del área técnica. En recorrido del 29/08/2023 se evidencio que la valla de la prioridad 90 no se encontraba actualizada por lo que solicito su actualización, a lo cual inmediatamente el contratista realizó el respectivo ajuste.

Volantes de información:

• Previa revisión y aprobación de las piezas divulgativas por parte de la interventoría, el 23/08/2023, se inició con la distribución de los volantes de convocatoria N°136 en las UPZ para realización del comité veedor N°8. En la UPZ 80, se entregaron 217 volantes y en la UPZ 82 219 volantes.

• El 25/08/2023 se realiza la entrega de 38 volantes N. 98 de inicio de actividades constructivas de la Prioridad 92.

• El 26/08/2023, se realizó socialización de 08 volantes N°141 de punto de recolección de basura. CIV 8005471

• El 28/08/2023, se realizó la entrega de 25 volantes N° 140 construcción de espacio público P. 80, 25 volantes N° 76 recomendaciones de cuidado del espacio público de la P. 80 y 45 volantes N°113 levantamiento de actas de vecindad 1ra visita P. 51 y 52.

Puntos Satélites de información: El 24/08/2023 se realizó la actualización de los PSI activos en la dos UPZ.

Afiche: El 24/08/2023 se realizó actualización de afiches informativos en los PSI activos.

PMT: El 28/08/2023 se realiza socialización de PMT de espacio público de la prioridad 80.

4.6 Comités

• Se brinda en el comité de seguimiento la calificación semanal la cual es de 100% de cumplimiento.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

No se presentaron

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO*
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los treinta (Día en letras) días del mes de agosto (Mes en letras) de 2023 (Año de finalización del informe) (30 (Día en números))

(Nombre) Juan Manuel Ulloa Rojas
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 47 **DEL** 24 de agosto de 2023 **AL** 30 de agosto de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No. 64 - 8001931
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 2.

CIV: No.55 - 8005471
Descripción: Excavación mecánica en vía



Descripción Foto 3.

CIV: No.66 - 8001876
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 4.

CIV: No.69 - 8001823
Descripción: Instalación de fresado estabilizado



Descripción Foto 5.

CIV: No.50 - 8004663
Descripción: Demolición y excavación andén



Descripción Foto 6.

CIV: No.49 - 8004816
Descripción: Instalación de fresado espacio público



Descripción Foto 7.

CIV: No.73 - 8001148
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 8.

CIV: No.44 - 8004757
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 9.

CIV: No.68 - 8001715
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 10.

CIV: No.79 - 8001390
Descripción: Instalación de bordillo A80



Descripción Foto 11.

CIV: No.75 - 8001223
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 12.

CIV: No.70 - 8001657
Descripción: Construcción de pozo



Descripción Foto 13.

CIV: No.89 - 8001841
Descripción: Conformación espacio publico



Descripción Foto 14.

CIV: No.74 - 8001184
Descripción: Instalación de concreto de 3000 psi



Descripción Foto 15.

CIV: No.71 - 8001771
Descripción: Instalación de monoblock



Descripción Foto 16.

CIV: No.76 - 8001183
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 17.

CIV: No.56 - 8004947
Descripción: Demolición y excavación de espacio público



Descripción Foto 18.

CIV: No.80 - 8001581
Descripción: Demolición espacio público



Descripción Foto 19.

CIV: No.48 - 8004699
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 20

CIV: No.77 - 8001285
Descripción: Instalación geotextil, geocelda y fresado




Descripción Foto 21.

CIV: No.91 - 8005408
Descripción: Excavación mecánica



Descripción Foto 22.

CIV: No.57 - 8005351
Descripción: Excavación mecánica en vía

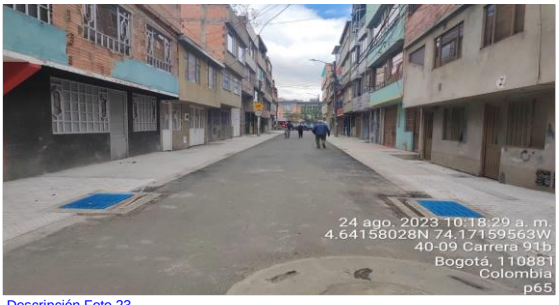

Descripción Foto 23.

CIV: No.65 - 8002008
Descripción: Finalizan proceso constructivo



Descripción Foto 24.

CIV: No.78 - 8005282
Descripción: Instalación de fresado estabilizado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 25.

CIV: No.90 - 8005210
Descripción: Sin actividad

Descripción Foto 26.


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

treinta (Día en letras) (30) (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2
SEGUIMIENTO AL 29-AGOSTO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 292.002.785,55	1,67%	88,20%	-1,16%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 302.700.760,11	1,74%	88,23%	-1,01%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 299.638.387,81	1,72%	93,43%	-1,23%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 312.830.027,32	1,79%	88,07%	-0,85%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 346.640.948,16	1,99%	96,13%	-0,49%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 309.190.878,22	1,77%	82,15%	-0,77%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 261.818.235,98	1,50%	91,64%	-0,44%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 92.555.618,21	0,53%	63,39%	-0,81%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 85.622.500,07	0,49%	59,37%	-0,56%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 196.795.939,03	1,13%	56,65%	1,13%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 183.147.941,84	1,05%	53,47%	-1,21%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 206.986.200,50	1,19%	65,05%	-1,28%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 285.131.399,54	1,63%	52,35%	-0,76%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 244.687.532,06	1,40%	69,61%	-0,97%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 100.211.356,69	0,57%	27,73%	-1,89%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 218.199.968,74	1,25%	63,89%	-1,29%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 871.651.830,13	5,00%	$ 328.080.631,86	1,88%	42,59%	-3,12%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 123.929.557,52	0,71%	32,83%	-1,84%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 189.719.184,65	1,09%	$ 212.669.733,85	1,22%	44,38%	0,13%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 617.568.655,98	3,54%	$ 108.416.086,30	0,62%	11,03%	-2,92%
89	8001841	$ 580.698.248,00	$ 507.163.928,07	2,91%	$ 81.366.796,64	0,47%	14,01%	-2,44%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 593.145.037,00	3,40%	$ 91.402.041,96	0,52%	14,53%	-2,88%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 612.335.023,00	3,51%	$ 59.906.171,12	0,34%	10,24%	-3,17%
77	8001285	$ 564.687.707,00	$ 521.618.723,00	2,99%	$ 36.991.713,43	0,21%	6,55%	-2,78%
90	8005210	$ 146.283.507,00	$ 0,00	0,00%	$ 13.219.656,57	0,08%	9,04%	0,08%
78	8005282	$ 124.373.507,00	$ 0,00	0,00%	$ 18.743.701,18	0,11%	15,07%	0,11%
57	8005351	$ 161.143.438,00	$ 58.616.686,00	0,34%	$ 3.591.321,71	0,02%	2,23%	-0,32%
91	8005408	$ 112.645.517,00	$ 0,00	0,00%	$ 1.800.750,10	0,01%	1,60%	0,01%
55	8005471	$ 136.685.140,00	$ 153.519.892,00	0,88%	$ 2.011.551,01	0,01%	1,47%	-0,87%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,85%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,50%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 380.310.641,00	2,18%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,18%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 327.974.314,00	1,88%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,88%
45	8002718	$ 739.233.204,00	$ 495.575.170,13	2,84%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,84%
46	8005377	$ 280.055.154,00	$ 336.697.035,00	1,93%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,93%
47	8005506	$ 625.940.380,00	$ 282.732.467,20	1,62%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,62%
83	8005258	$ 177.072.951,00	$ 146.541.715,00	0,84%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,84%
84	8005192	$ 119.547.602,00	$ 137.818.994,00	**0,79%**	**$ 0,00**	**0,00%**	0,00%	**-0,79%**
85	8005126	$ 144.960.620,00	$ 107.289.469,50	0,61%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,61%
86	8005065	$ 121.227.602,00	$ 55.563.733,40	0,32%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,32%
TOTALES			**$ 15.818.125.858,06**	**90,67%**	**$ 4.820.290.193,04**	**27,63%**		**-63,04%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17.445.442.250,00**					

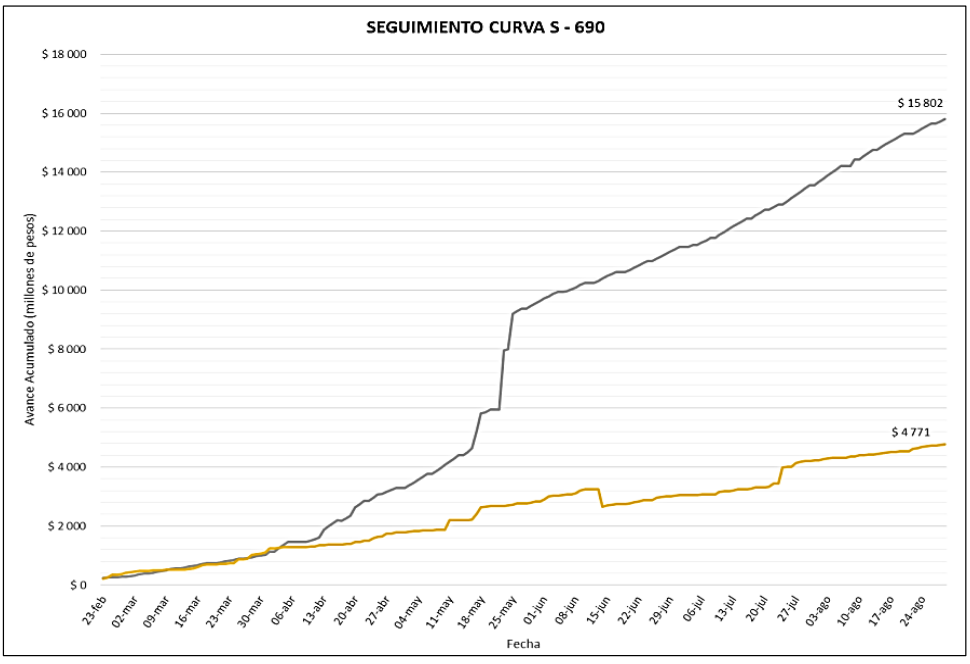



CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN CIV

FECHA EVALUACIÓN			25-jul	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago	29-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	88,20%	88,20%	88,20%	88,20%	88,20%	88,20%
82	8005078	$ 343.085.920,00	88,23%	88,23%	88,23%	88,23%	88,23%	88,23%
60	8002162	$ 320.721.252,00	80,79%	93,43%	93,43%	93,43%	93,43%	93,43%
61	8002265	$ 355.199.128,00	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%
65	8002008	$ 360.580.405,00	94,71%	94,71%	96,13%	96,13%	96,13%	96,13%
64	8001931	$ 376.367.569,00	72,94%	82,15%	82,15%	82,15%	82,15%	82,15%
73	8001148	$ 285.710.532,00	91,64%	91,64%	91,64%	91,64%	91,64%	91,64%
76	8001183	$ 146.013.903,00	55,73%	57,06%	59,15%	59,15%	62,13%	63,39%
75	8001223	$ 144.206.710,00	45,07%	53,63%	53,63%	53,75%	55,50%	59,37%
74	8001184	$ 347.413.004,00	55,39%	55,39%	55,85%	55,85%	56,18%	56,65%
70	8001657	$ 342.553.149,00	36,86%	38,33%	40,95%	49,52%	52,72%	53,47%
66	8001876	$ 318.216.103,00	57,82%	61,99%	65,05%	65,05%	65,05%	65,05%
44	8004757	$ 544.689.706,00	45,65%	52,33%	52,35%	52,35%	52,35%	52,35%
68	8001715	$ 351.516.714,00	59,97%	62,51%	64,70%	65,25%	69,24%	69,61%
71	8001771	$ 361.446.034,00	19,18%	19,18%	19,89%	21,20%	21,21%	27,73%
69	8001823	$ 341.507.411,00	44,33%	49,31%	54,19%	56,43%	58,64%	63,89%
50	8004663	$ 770.232.864,00	32,29%	36,11%	36,61%	38,73%	40,03%	42,59%
56	8004947	$ 377.475.477,00	16,14%	16,14%	16,14%	18,53%	32,16%	32,83%
49	8004816	$ 479.216.394,00	40,38%	40,54%	42,02%	42,02%	42,55%	44,38%
48	8004699	$ 983.197.315,00	8,10%	8,37%	9,78%	9,78%	9,78%	11,03%
89	8001841	$ 580.698.248,00	9,94%	10,35%	11,55%	12,55%	13,48%	14,01%
79	8001390	$ 629.262.662,00	8,37%	9,48%	11,33%	13,24%	13,25%	14,53%
80	8001581	$ 584.822.489,00	0,00%	0,00%	2,01%	4,81%	8,20%	10,24%
77	8001285	$ 564.687.707,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%	2,94%	6,55%
90	8005210	$ 146.283.507,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,04%
78	8005282	$ 124.373.507,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,07%
57	8005351	$ 161.143.438,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%
91	8005408	$ 112.645.517,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%
55	8005471	$ 136.685.140,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%

FECHA EVALUACIÓN			29-ago
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	0,00%
61	8002265	$ 355.199.128,00	0,00%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,00%
64	8001931	$ 376.367.569,00	0,00%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	1,25%
75	8001223	$ 144.206.710,00	3,87%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,47%
70	8001657	$ 342.553.149,00	0,75%
66	8001876	$ 318.216.103,00	0,00%
44	8004757	$ 544.689.706,00	0,00%
68	8001715	$ 351.516.714,00	0,37%
71	8001771	$ 361.446.034,00	6,52%
69	8001823	$ 341.507.411,00	5,26%
50	8004663	$ 770.232.864,00	2,57%
56	8004947	$ 377.475.477,00	0,67%
49	8004816	$ 479.216.394,00	1,83%
48	8004699	$ 983.197.315,00	1,24%
89	8001841	$ 580.698.248,00	0,53%
79	8001390	$ 629.262.662,00	1,27%
80	8001581	$ 584.822.489,00	2,05%
77	8001285	$ 564.687.707,00	3,61%
90	8005210	$ 146.283.507,00	9,04%
78	8005282	$ 124.373.507,00	15,07%
57	8005351	$ 161.143.438,00	2,23%
91	8005408	$ 112.645.517,00	1,60%
55	8005471	$ 136.685.140,00	1,47%

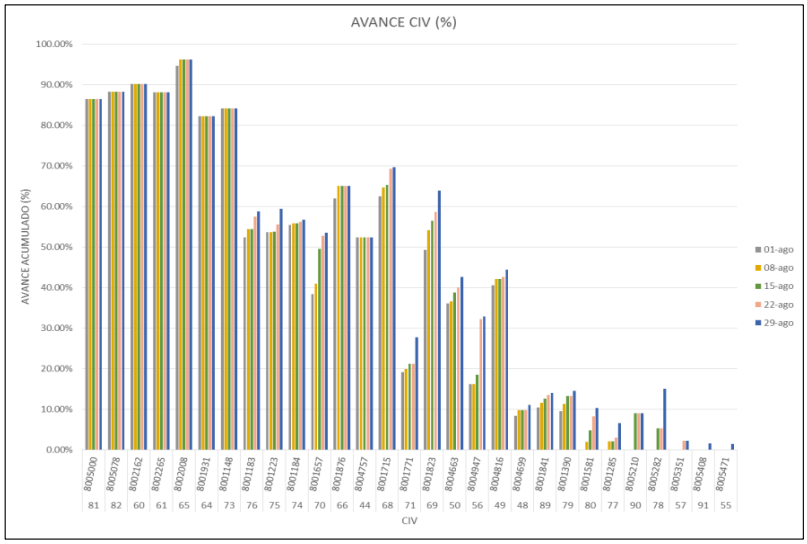

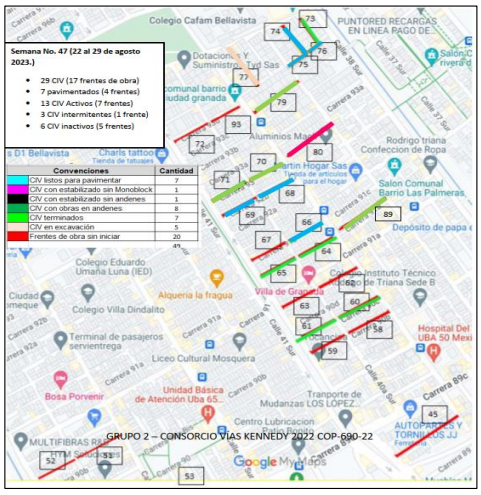

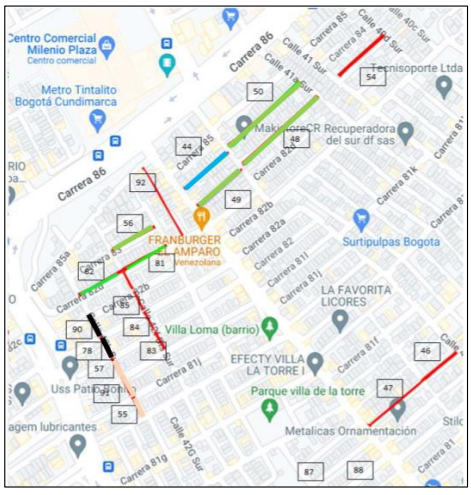

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Periodo 24 de agosto al 29 de agosto de 2023

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	87,97%	90,67%	87,97%
%Ejecutado	27,67%	27,37%	25,12%
Atraso(-)/Adelanto(+)	-60,30%	-63,30%	-62,85%
