BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

2023300-029068-1

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2023

Doctora
ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE
Directora de Infraestructura y Tecnología
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Carrera 32 No. 12 - 81
correspondenciadigital@saludcapital.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Radicado informe N° 25 Convenio 2806257 de 2021 suscrito entre la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur – ESE.

Respetada Arquitecta Adriana María.

Cordial saludo. Por medio del presente y en cumplimiento a la estipulación contractual "CLAUSULA OCTAVA".- COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA SUBRED, COMPROMISO N°17: "*Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del Convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo*", me permito hacer entrega del informe correspondiente al mes de octubre *2023, del Convenio 2806257 de 2021 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".*

Cordialmente.

2023-ER-39735

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Fecha y Hora: 21/11/2023 3:43:00 p. m. **Clave:** 6DkOLzDZxt
Folios: 30 **Anexos:** 1 **Recorrido:** 3
ORIGEN: 052200 SBBYS: 052200-SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DESTINO: ADRIANA CEBALLOS-043000
INGRESO: Ventanilla
TRAMITE: Solicitud correspondencia
ASUNTO: RADICADO INFORME NO. 25 CONVENIO NO: 2806257 DE 2021

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
Despacho del Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

22/11/2023

Anexo: 30 Folios y Un (1) CD con informe y documentos soporte

Proyectó: María Elena Restrepo García-Médico Especialista Proyectos
Reviso: Mónica R. Salguero C.- Referente Gestión de Proyectos
Reviso: Adriana Posada - Asesora financiera proyectos
Reviso: José Napoleón Posada Viana – Gerente Proyectos
Reviso: Gloria Libia Polanía Aguillón- Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

20233000025883

FECHA DE PRESENTACIÓN: noviembre 2023 **PERIODO: Desde** 1/10/2023 **al** 3|/10/2023

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 **Suscrito** entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021			
Objeto:	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".			
Valor del Convenio inicial:	$100.092.959.400	**Valor**	**Fuente**	**Registro Presupuestal**
		$99.101.940.000	FFDS	RP #3601 de 31/08/2021 por valor de $23.610.024.440 CDP VF 2023 por $75.491.915.560
		$991.019.400	ESE	
Adiciones: (1) - Fecha	$			
Valor actual del convenio:	$ 100.092.959.400			
Fecha Suscripción:	31/08/2021			
Fecha de inicio:	13/09/2021	**Plazo de ejecución Inicial:**		43 meses. Fase I: 20 meses Fase II: 18 meses Fase II: 5 meses
Fecha de terminación inicial:	12/04/2025	**Prórrogas acumuladas:**		**Fecha**
No meses	20 meses fase I	Del _____ Al _____		AA-MM-DD
Prorroga No 1				
Fecha de terminación actual:	12/04/2025 **(Fecha de terminación de la Fase I: 12/05/2023*)**			
Estado del convenio:	*Vigente*			
Descripción estado del Convenio.	El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase I: Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 5009 de 2022, el 20/05/2022 Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de obra No 5009 de 2022, el 20/05/2022			
Modificaciones / aclaraciones / otrosí				
*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 2021), se declaró desierto y debido a que el proceso de interventoría, es accesorio del proceso de obra: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", mediante la Resolución 0059 del 21 de enero de 2022 se suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para contratar la Interventoría. Posteriormente, se adelantó un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la				

Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.

Por lo descrito previamente, es necesario modificar los plazos de las fases de preconstrucción y construcción.

1.2 SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Luis Fernando Pineda Ávila	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	7300000
Adriana María Ceballos Calle	Asesora de Despacho	3649090

1.2.1 Conformación del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Luis Fernando Pineda Ávila	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	subredsur@saludcapital.gov.co
María Elena Restrepo García	Médico especialista proyectos-Subred Sur	Proyectos2@subredsur.gov.co
Adriana María Ceballos Calle	Asesora de Despacho	Amceballos@saludcapital.gov.coC
David Leonardo López Suescún	Referente del proyecto-Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS	dllopez@saludcapital.gov.co

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la subred

Enumerar cada una de las obligaciones generales descritas en el convenio	Cumplimiento				Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA		
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.	x				El cumplimiento del objeto del convenio se registra en el desarrollo de hitos y de las obligaciones específicas del Convenio	Informes de seguimiento mensual
2. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del convenio.	x				Las novedades se han reportado y gestionado oportunamente (entre otras Modificatorios, prórrogas)	Informes de seguimiento mensual
3. Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la Secretaria Distrital de Salud - Fonda	x				Se ha acatado las directrices que durante el desarrollo del convenio ha	Informes de seguimiento mensual

Enumerar cada una de las obligaciones generales descritas en el convenio	Cumplimiento				Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe- referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA		
Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor.					dado la Secretaria Distrital de Salud en Comités Operativos y mesas de trabajo	
4. Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.	x				Los aportes del convenio se realizaron en la forma pactada, y en su momento hasta completar lo pactado se adjuntó la matriz de cofinanciación en informes de seguimiento mensual. Es importante aclarar que esta matriz se alimenta con base en la información que aporta Talento Humano, debido a que el costo registrado en ella, corresponde al valor de las horas utilizadas por el personal correspondiente en el desarrollo de las actividades de apoyo al Convenio.	Informes de seguimiento mensual
5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente	x				El archivo documental del Convenio se encuentra organizado en medio magnético y físico, de acuerdo a las normas archivísticas. La estructura funcional del Subproceso Gestión de Proyectos, incluye a la Jefe del Subproceso y personal de apoyo como el Gerente de Proyectos, Líder de Proyectos y Gestores de Proyectos. Este equipo de trabajo maneja diferentes niveles de complejidad de la información que se archiva en equipos de cómputo con claves de acceso que siguen las directrices de seguridad de la información.	
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaria Distrital de Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del convenio, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.				x	No se han presentado peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley	
7. Pagar por su cuenta las salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social - EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en	X				El contratista de obra y la interventoría han cumplido con sus obligaciones parafiscales, se adjunta soporte correspondiente al mes de septiembre 2023, el soporte correspondiente al mes de octubre se entregará anexo al informe No 26, toda vez que este soporte es	Central de pagos de la Subred Sur

Enumerar cada una de las obligaciones generales descritas en el convenio	Cumplimiento				Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA		
especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificaci6n de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal - según el caso.					entregado los primeros días del mes siguiente.	
8. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.				X	No se han presentado los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	
9. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus compromisos, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del convenio.	x				Las actividades necesarias para el cumplimiento de compromisos del convenio, se registra en el desarrollo de hitos y de las obligaciones específicas del Convenio	Informes de seguimiento mensual
10. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar	x				El archivo documental del Convenio se encuentra organizado en medio magnético y físico, de acuerdo a las normas archivísticas	Archivo y equipos de cómputo de la Oficina Asesora Desarrollo Institucional Subred Sur
11. Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la correcta ejecución del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar.	x				Cada profesional cuenta con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la correcta ejecución del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar	Puestos de trabajo de la Oficina Asesora Desarrollo Institucional Subred Sur
12. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.	x				La ejecución del Convenio se realiza dando cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud ya las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor, como se registra en hitos y en las obligaciones específicas.	Informes de seguimiento mensual
13. Constituir la garantía única, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el convenio, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.	x				Se cuenta con Póliza de Responsabilidad Civil Profesionales de Instituciones Médicas la cual se ha estado actualizando desde 2017. Se anexa póliza vigente desde el 31/01/2023 al 04/10/2023	Archivo de Pólizas bajo custodia del área de inventarios de la Subred Sur

Enumerar cada una de las obligaciones generales descritas en el convenio	Cumplimiento				Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA		
14. Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.				x		

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar las fases precontractuales, contractual y post contractual para el desarrollo del proyecto	x				El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur. El 15/03/2022 con radicado de SDS No 2022EE30243 se emite Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión: Favorable. Se solicitó al FFDS giro de recursos al convenio, los recursos ingresan a la Subred el día 17 de julio de 2022, con recibo de caja No 286203 por valor de $6.487.805.450 y recibo de caja No 286175 por valor de $56.955.328.560.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
2. Adelantar la fase de pre construcción, construcción y alistamiento - puesta en funcionamiento.	x				El 31 de marzo de 2022, se realizó Audiencia Pública de determinación del orden de elegibilidad, revisión del sobre de la oferta económica y adjudicación del proceso de selección por convocatoria abierta ca-001-2022, cuyo objeto es "ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACION, AMPLIACIÓN CONSTRUCCION DEMOLICIÓN REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL". Se adjudica dicho proceso al proponente CONSORCIO TUNAL 2022, representado legalmente por el señor	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.820.653, conformada por C&C ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN REORGANIZACIÓN con un porcentaje de participación del 50%, ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS con un porcentaje de participación del 45% y YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ con un porcentaje de participación del 5% por un valor de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00) Incluido todos los costos directos e indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) Meses. El 31 de marzo de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Abierta No. CA-001-2022, al proponente CONSORCIO TUNAL 2022. El 05 de abril de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria meritoria No. CM-004-2021, recomienda adjudicar el proceso al proponente CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70%, representado legalmente por el señor LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado con cédula de extranjería No. 437.592, por un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos los costos directos e indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) meses.	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					El 6 de abril de 2022, se emite la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 y la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021.	
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del Comité Operativo dentro de las diez (1O) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del Convenio.	x				El 22 de junio de 2022 se realizó Comité Operativo Extraordinario del Convenio para presentación del Plan de Trabajo, se socializó respecto a los ajustes propuestos, sin embargo, se decide que una vez el contratista de obra entregue el cronograma del proyecto, se presentará nuevamente el plan de trabajo ante el Comité Operativo para su aprobación. En el informe No 20 se anexó Plan de Trabajo para revisión y aprobación en Comité Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el PMA tuvo que ser actualizado conforme a los requerimientos recibidos, para cubrir el área en m2 de espacio asistencial. Debido a esto la huella del edificio a diseñar por el consorcio tuvo que ser replanteada; huella que fue aprobada por la entidad mediante oficio 2022030000209701 con fecha 27 de septiembre de 2022.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.	X				Se incorporaron a los pliegos de licitación las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de inversiones) y se acataron las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad. Se anexan en el informe No. 8 copia de los pliegos y adendas. La Subred Sur, en comunicado del 01 de agosto del 2022, radicado en la SDS, registra que se ha cumplido con estas directrices, quedando pactado que los documentos de desempeño que fueron remitidos al constructor para su cumplimiento. Se adjunta: Soporte (10. octubre 2023 AMR)	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
5. Adelantar los procedimientos de selección de las contratistas, en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del Comité Operativo de Seguimiento al Proceso Contractual en lo que respecta a las pliegos,	X				Los documentos fueron elaborados de manera conjunta con EGAT para el proceso de Contratación para la Construcción del proyecto, se adelantaron teniendo en cuenta el dar cumplimiento a lo dispuesto Plan de Desarrollo Se firmó el contrato respectivo No 5008 de 2022, del día 21 de abril de 2022	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
evaluaciones y recomendaciones al Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente par la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".						cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.	X				Se firmó el contrato respectivo No 5009 de 2022, del día 21 de abril de 2022	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group).(https://www.worldbank.org/en/project ooperations/procuremenUdebarred-firm. s).	x				La EGAT dio cumplimiento a esta obligación en el proceso de contratación. La Subred Sur, en comunicado del 01 de agosto del 2022, radicado en la SDS, registra que se ha cumplido con estas directrices, quedando pactado que los documentos de desempeño que fueron remitidos al constructor para su cumplimiento.	
8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US$5.000.000), para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherente al proceso de selección. Sin dicha	X				Este paso se surtió con anterioridad al proceso de selección, la Secretaría Distrital de Salud-FFDS, validó, aprobó y asignó los recursos respectivos.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.						cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
9. La Subred notificará y garantizará a la SDS que el proceso de contratación se completó de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos indígenas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha aceptado acatarlas.	X				El proceso de contratación se encuentra debidamente surtido, notificado a la SDS y publicado en el SECOP II, atendiendo la normatividad para este tipo de contratación.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.	X				El contratista de obra y la interventoría han cumplido con sus obligaciones parafiscales, se adjunta soporte correspondiente al mes de septiembre 2023, el soporte del mes de octubre se adjuntará en el informe siguiente, toda vez que envían este soporte en el mes siguiente al periodo evaluado.	
11. Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social , "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y/o demás normas que la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.	X				Los estudios y diseños que se vienen ejecutando, cumplen con los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social Semanalmente se realizan mesas de trabajo con los especialistas del contratista e interventoría, donde se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente. El compromiso inicial del contratista era tener al 19 de enero la aprobación de los diseños de ingeniería por parte de interventoría, actualmente se tiene 9 productos aprobados de 40, se citó a una	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					audiencia de incumplimiento para el 10 de mayo, sin embargo, se dieron 30 días más para que el contratista cumpla con todos los diseños, dicha audiencia quedo citada para el 12 de junio. La audiencia fue aplazada para el 24 de julio de 2023, fecha en la cual se inicio con la declaración de la contratista, pero fue necesario suspenderla por falta de disponibilidad del abogado del contratista. Se agenda audiencia de incumplimiento para el día 4 de septiembre 2023. En el mes de septiembre 2023, se realizaron las audiencias en las cuales se escucharon los descargos del contratista y se tiene programada reanudar la audiencia el día 11 de octubre. En el mes de octubre 2023, se reanudó la audiencia, se realizaron descargos y se aplazó (entre otros por solicitud del apoderado del contratista) para el mes de noviembre.	
12. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMHES en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.	x				El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los manuales de contratación de la EGAT. Así mismo durante las siguientes etapas continuará realizando las acciones que sean necesarias para continuar garantizando la sujeción de las diferentes fases.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
13. Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos del Convenio.	x				El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 Davivienda, para recursos del presente convenio.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
14. No hacer unidad de caja con los recursos girados.	x				Se adjunta Certificado expedido por el Subgerente Corporativo, la Líder de Presupuesto, la Tesorera y el Profesional Universitario de Contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el cual se registra que Contabilidad evidenció que la cuenta aperturada de este convenio, no hace unidad de caja con los recursos girados.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
15. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente Convenio por parte de la Secretaria Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar al Fondo Financiero Distrital de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecución del Convenio.	x				Se adjunta Certificado expedido por el Subgerente Corporativo, la Líder de Presupuesto, la Tesorera y el Profesional Universitario de Contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el cual registra que se mantiene separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente Convenio por parte de la Secretaria Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Salud.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
16. Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente Convenio y de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión viabilizado y aprobado.				X	Los recursos destinados en el presente Convenio se han invertido de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto de dicho Convenio 2806257 de 2021.	
17. Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del Convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo.	x				El 13 de octubre de 2023, se radicó informe No. 24 correspondiente a la ejecución del mes de septiembre de 2023, con N° de salida 2023300-025935-1 A continuación, se presenta pantallazo del aplicativo de AGILSALUD: DR LUIS FERNANDO PINEDA AVILA 13/10/2023 12:25:07 Despacho del Gerente El documento 2023300-025935-1 fue entregado al servidor de SUBRED SUR con copia SUBRED SURCertificados para ser enviado al destinatario ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE al email antiki-ena@saludcapital.gov.co;saimaciena@saludcapital.gov.co con el asunto Informe No 24 CV 2806257 de 2021Notificaciones_SODEA Ventanilla Correspondencia	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del Convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.				X	No aplica para el periodo evaluado.	
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del Convenio por parte del FONDO dentro de las treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.				X	No aplica para el periodo evaluado.	
20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por EL FONDO.	x				El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa responsable del seguimiento a la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante oficio con N° de radicado 202103000036053 a la Médica Especialista de Gestión de Proyectos	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
21. Cumplir con las normas legales de protección al media ambiente vigente en Colombia, así coma con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al media ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales coma ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros.	X				En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han tenido en cuenta las normas legales vigente en Colombia, referentes a la protección al medio ambiente, así coma con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al medio ambiente Obligación incluida en pliegos del contrato de consultoría de estudios y diseños faltantes y de obra.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones del Comité Operativo Contractual	X				El 4 de abril de 2022, se realizó Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se realizó presentación de la Recomendaciones de adjudicación de obra	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					e interventoría, acatando las recomendaciones correspondientes. El último miércoles de cada mes se asiste a Comité de Convenios de Infraestructura y dotación de la Subred Sur, de forma virtual, y se acatan las recomendaciones que correspondan.	informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
23. Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente Convenio.	x				Gestión para autorización de vigencias futuras. El 30 de noviembre de 2021: El CONFIS autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur Gestión para Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión: El 15/03/2022 con radicado de SDS No 2022EE30243 se emite Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión: Favorable.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
24. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del Comité Operativo, subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del Convenio Interadministrativo.	x				En el marco del Comité Operativo y la ejecución del Convenio Interadministrativo, se han acatado las sugerencias por parte de la SDS- Secretaria Distrital de Salud y EGAT.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
25. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen	x				A la fecha se ha asistido a las reuniones virtuales que programa la Secretaría Distrital de Salud. El último miércoles de cada mes, se asiste a Comité de Convenios de Infraestructura y dotación de la Subred Sur, de forma virtual, y se acatan las recomendaciones que correspondan. Además, se realizan reuniones todos los días jueves a las 4:00 pm, de forma virtual, donde participan los profesionales delgados por la SDS y el apoyo a la supervisión por parte de la subred sur	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
26. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaria Distrital de Salud por conducto del Supervisor.	x				En atención del radicado 2023EE111176 del 30 de agosto, correspondiente a la solicitud de información del convenio interadministrativo No.2806257de 2021, cuyo objetivo es "Aunar esfuerzos ,recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación , ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias hospitalarios , quirúrgicos y de apoyo de diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud en tunal ; Se genera respuesta por medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de septiembre a cada uno de los puntos mencionados.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.	x				Se gestionó ante Curaduría No 1 la revalidación de la Licencia y el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual concede Revalidación de la Licencia de Construcción aprobada mediante Acto Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de enero de 2020. Se tienen pagas las expensas de la licencia a la espera de la emisión la licencia, ante la curaduría 1 se solicitó una modificación y revalidación a la licencia inicial. Se estima que, en el mes de noviembre 2023, se cuente con la licencia en mención.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.	x				La Subred Sur ha mantenido los niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del Convenio, por escrito.	x				En el periodo evaluado dado que no se presentan observaciones por parte del consorcio Tunal 2022, con las fichas técnicas realizadas por parte de la subred en conjunto con la interventoría de los equipos	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					contractuales, se da aval para iniciar estudio de mercado de los equipos contractuales. Debido a que en este periodo no se presentaron Observaciones o novedades, no se realizó reporte al Supervisor del Convenio por parte de la SDS.	informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del Convenio y del proyecto objeto del mismo.	x				El archivo documental del convenio se encuentra organizado en medio físico, de acuerdo a las normas archivísticas, así como de forma magnética.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
31. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el Convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.	x				En el periodo evaluado, respecto al radicado 2023REE111176 del 30 de agosto de 2023, como avances en el mes de octubre 2023, se programa mesa de trabajo para el mes de noviembre 2023, en la cual participará Prestación de Servicios de la Subred Sur y personal del Consorcio y de la Interventoría, con el fin de definir la dotación total de equipos biomédicos contractuales y no contractuales.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.	x				La Subred Sur ha dado cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
33. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaria Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	
34. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales coma Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Pianos arquitectónicos actualizados (Localización , plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Pianos de ingeniería coma: Pianos eléctricos, pianos de red contra incendio, pianos de red de voz y datos, pianos CCTV, y pianos de redes hidrosanitarias.	X				Para adelantar el proceso de contratación se dió cumplimiento a esta obligación, toda vez que se cuenta con los Estudios, Diseños, Licencia y Permisos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto. El contrato es de tipo llave en mano e incluye la totalidad de obligaciones descritas en este numeral.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo - según Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.	x				La subred da cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras contempladas en dicho instrumento de planeamiento. La fase 1 del PRM se venció el 9 de abril de 2023, y para la solicitud de la prórroga de esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 (Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, con No de Radicación	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 de febrero 2023 Por lo anterior en el informe siguiente (No 26), se describirán las actividades se hayan desarrollado respecto a las acciones de mitigación urbanísticas del PRM, si es del caso y/o aplica.	
36. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.	x				Durante el mes de octubre 2023, no se realizó reunión de veedores del proyecto	En el CD que se adjunta a cada informe de ejecución del Convenio, se anexa copia del acta de reunión con los veedores
37. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente Convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementara mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	X				La supervisión e interventoría de contratos amparados por el Convenio, realizan seguimiento mensual, sin recibir hasta el momento, quejas al respecto Se anexa soporte.	Informes de supervisión e interventoría
38. Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementara mecanismos tal coma buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	X				La supervisión e interventoría de contratos amparados por el Convenio, realizan seguimiento mensual, sin recibir hasta el momento, quejas al respecto En la revisión diaria de personal y reporte diario que entrega la interventoría a la Subred, en la obra no hay evidencia de trabajo infantil Se anexa soporte.	Informes de supervisión e interventoría
39. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	
40. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
para su revisión y aprobación y adelantar los procesos de contratación correspondientes.						
41. Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 - Plan de Contingencia - Traslado o Cierre de Servicios.	x				Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a observaciones por parte de SDS, radicado para su revisión y aval, con No. 2022ER17191 del 25 de abril de 2022. Actualmente el Plan de Contingencia se encuentra en ejecución. El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el radicado No. 2022EE71012, da respuesta al radicado 2022ER17191 del 25 de abril de 2022 en mención, en el cual registran que las observaciones fueron subsanadas. Se adjunta respuesta en el informe No 12 de seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.	
42. Recibir la totalidad de documentos que garanticen la paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	
43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del Convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.	x				El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-Contractual. (Acuerdo de adhesión No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco Interadministrativo No. 7407 de 2021, celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en: "REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."	
44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente Convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la Supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado,,, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de	X				La Subred instruyó al contratista e interventor para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta observación, la cual es revisada diariamente y registrada en el reporte que entrega la interventoría a la Subred.	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
las mujeres durante el periodo de ejecución del Convenio en los porcentajes indicados.						
45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X				La Subred instruyó al contratista e interventor para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta observación.	
46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente Convenio. En caso de ser testigo de / alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la Supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.	X				La Subred instruyó al contratista e interventor para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta observación. A la fecha la interventoría no ha reportado situaciones descritas en la presente obligación. Se anexa soporte.	
47. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO Nro.	FECHA	OBSERVACIONES
Giro No. 1	$23.610.024.440	3601	31/08/2021	
Giro No 2	$56.955.328.560	300	1/06/2022	
Giro No 3	$6.487.805.450	301	1/06/2022	
Giro No 4	$1.662.209.309	2810	7/12/2022	
	$1.708.659.857	2811	7/12/2022	
	$194.634.165	2812	7/12/2022	
	$800	5375	7/12/2022	
Total, Giro No 4	$3.565.504.131			
Giro No.5	$12.048.781.550		25/04/2023	
Giro No, 6	$2.578.551.214		22/08/2023	
Total, General	$ 105.245.995.345			

1.3.2 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
	$ 158.675.725	16,01
OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciación Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.		

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERIODO (%)	SUBTOTAL
EJECUTADO MES SEPTIEMBRE 2023	$ 7.869.537	0,79	$ 9.044.461
TOTAL	$ 7.869.537	0,79	$ 9.044.461
OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciación a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de enero de 2023.			

TOTAL ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
	$ 166.545.262	16,81
OBSERVACIONES: Se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados a partir de enero 2023		

Nota: Inicialmente se ajustó la cofinanciación del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldía de Bogotá, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciación de acuerdo con el incremento salarial para la vigencia 2023.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

1.4.1 Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Concepto técnico favorable e inscripción en el BPP de la SDS		Primera semana de julio de 2021		El proyecto se inscribe en el BPP de SDS con el código No. 2021 20 02 35, el 2 de julio de 2021.
Suscripción de Convenio	Primera semana de agosto 2021	Cuarta semana de agosto 2021		31/08/2021
Firma acta de inicio de convenio		Segunda semana de septiembre 2021		El 13 de septiembre de 2021
Perfeccionamiento del convenio (Pólizas- apertura de cuenta)	Tercera semana de septiembre 2021	Primera semana de octubre 2021	Tercera semana de septiembre 2021	El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 para recursos del presente convenio.
Presentación de Plan de Trabajo ante comité operativo del convenio y aprobación del mismo		Tercera semana de septiembre 2021		El 22 de septiembre de 2021, se aprobó el Plan de trabajo en Comité Operativo del Convenio

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Presentación del proyecto y el convenio ante Junta Directiva para aprobación de Solicitud de Vigencias Futuras		Tercera semana de octubre 2021	El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de 2021, para solicitud de apalancar 15%. La Secretaria Distrital de Hacienda no viabilizó	El 21/10/2021, Acuerdo 113 de 2021, para aprobación de solicitud de Vigencias Futuras Excepcionales.
Solicitud de Aval Fiscal ante CONFIS para Vigencias Futuras	Cuarta semana de octubre 2021	Segunda semana de noviembre 2021		El 01/10/2021, mediante el radicado No. 2021ER17294. Se radicó solicitud de aval fiscal para autorización de VF 2022-2023 por $99.101.940.000
Aval Fiscal del CONFIS para Vigencias Futuras		última semana de noviembre 2021		El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.
Suscripción de contrato con EGAT para etapa pre-contractual		Última semana de octubre 2021		05/10/2021 se firma Acuerdo Marco 7407 de 2021 El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-Contractual.
Elaboración de Estudios y Pliegos para Consultoría e Interventoría y aprobación de Estudios y Pliegos por SDS	Primera semana de noviembre 2021	Segunda semana de diciembre 2021	Última semana de noviembre 2021 se entrega a EGAT el borrador de Estudios y Pliegos para Consultoría e Interventoría	El 29 de diciembre de 2021 se realizó Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR. 2806257-2021, para la presentación y aprobación de los pliegos definitivos para la interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención. Se adjunta pantallazo de invitación al comité. Acta en firmas. Respecto a los pliegos definitivos para la Obra hubo modificación en dichos pliegos definitivos que se publicaron el 24 de diciembre y dichos cambios fueron avisados a la SDS de carácter informativo en el comité del 29 de diciembre 2021.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Apertura proceso pre contractual - recepción ofertas- Evaluación de ofertas, validación por comité operativo del convenio y comité de contratación	Primera semana de noviembre 2021	Última semana de marzo 2022	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a través de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT, realiza el proceso de selección EGAT-CA-001-2022, para la adjudicación del contrato de obra, por valor estimado de $90.401.149.745. El cronograma inicia con: •Publicación del Aviso: 28 de enero de 2022.	El cronograma continúa con: •Publicación de estudios previos: 28 de enero de 2022. •Plazo observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones: 04 de febrero de 2022. •Respuesta observaciones Pliego de Condiciones: 14 de febrero de 2022. •Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones: 15 de febrero de 2022. •Presentación de Ofertas: 07 de marzo de 2022. •Apertura del sobre 1: 07 de marzo de 1022. •Publicación del informe de verificación o evaluación: 15 de marzo de 2022.
Proceso de Adjudicación	Primera semana de noviembre 2021	Última semana de marzo 2022	El 31 de marzo de 2022, se adjudica proceso de selección por convocatoria abierta CA-001-2022, al proponente CONSORCIO TUNAL 2022, representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE, conformada por: *C&C ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN REORGANIZACIÓN con un porcentaje de participación del 50%, *ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS con un porcentaje de participación del 45% y * YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ con un porcentaje de participación del 5% por un valor de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00) Incluido todos los costos directos e indirectos, por	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto: 01 de abril de 2022. El 6 de abril de 2022, se emite la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 y la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Firma del Contrato obra No. 5008 de 2022: 21/04/2022 Firma de Acta de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022: 20/05/2022 Firma del Contrato Interventoría No. 5009 de 2022: 21/04/2022 Firma de Acta de inicio del Contrato Interventoría No. 5009 de 2022: 20/05/2022

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			un plazo inicial de veinte (20) Meses. El 31 de marzo de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Abierta No. CA-001-2022, al proponente CONSORCIO TUNAL 2022. El 05 de abril de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria meritoria No. CM-004-2021, recomienda adjudicar el proceso al proponente CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70%, representado legalmente por el señor LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado con cédula de extranjería No. 437.592, por un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos los costos directos e	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) meses.	
Legalización de contratos		Primera y segunda semana de abril 2022		20/05/2022
Apropiación de Estudios y Diseños	Última semana de mayo 2022	Tercera semana julio 2022	21 de mayo de 2022	31 mayo de 2022
Ejecución de Estudios y Diseños complementarios	Cuarta semana de mayo 2022	Última semana de mayo 2023	21 de mayo 2022	El porcentaje de ejecución de los diseños al 31 de julio es del 98,53% teniendo una preaprobación de los diseños con pendientes y en trámite la licencia de construcción y la acometida de gas natural con Vanti.
Licencias	Última semana de septiembre 2022	Última semana de junio 2023	El 15 de noviembre 2022, mediante el radicado No. 11001-1-22-3304, en Curaduría Urbana No 1, se presentó la solicitud de prórroga o revalidación de licencia y adicionalmente, solicitud de licencia nueva como lo pidió curaduría. El 10 de noviembre de 2022, mediante el radicado 11001-1-22-3256, en Curaduría Urbana No 1, se pagó expensas por valor de $1.131.523 el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual concede Revalidación de la Licencia de Construcción aprobada mediante Acto Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de enero de 2020.	. La licencia de construcción se encuentra radicada en la curaduría a la espera de observaciones. Se espera contar con la licencia el próximo mes de noviembre 2023.
Aprobación de Productos		Última semana junio 2023		La interventoría aprobó los diseños pendiente entrega de oficio de aprobación.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Inicio de Demoliciones *	Primera semana de julio 2022	Última semana de diciembre 2022	6 junio 2022	31 de diciembre de 2022
Ejecución de Obra Etapa 1 (Edificio A que Incluye entre otros: Urgencia, Hospitalización, UCI, QX. Obra e interventoría de obra	Cuarta semana de octubre 2022	Última semana de enero 2024	Durante el mes de octubre 2023, se realizó el armado de las vigas de cimentación, muros pantalla faltantes e inicios de columnas	NA
Entrega de Obra		Última semana de enero 2024		N/A para el periodo
Dotación	Primera semana de febrero 2023	Última semana de enero 2024	Se da aval para Iniciar estudio de mercado de los equipos contractuales, presentación de avances.	31 de diciembre 2023
Habilitación de los Servicios: Acreditar los documentos necesarios donde conste el cumplimiento de la norma	Primera semana de octubre 2023	Última semana de febrero 2024		N/A para el periodo


* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI __X__ NO Nota: Se ajusta Plan de Trabajo anexado en informe No 20, con prórrogas de contratos obra e interventoría de obra, solicitadas a la SDS, para revisión y aprobación en Comité Operativo. SDS.

Reporte gráfico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

"...o de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal"."

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

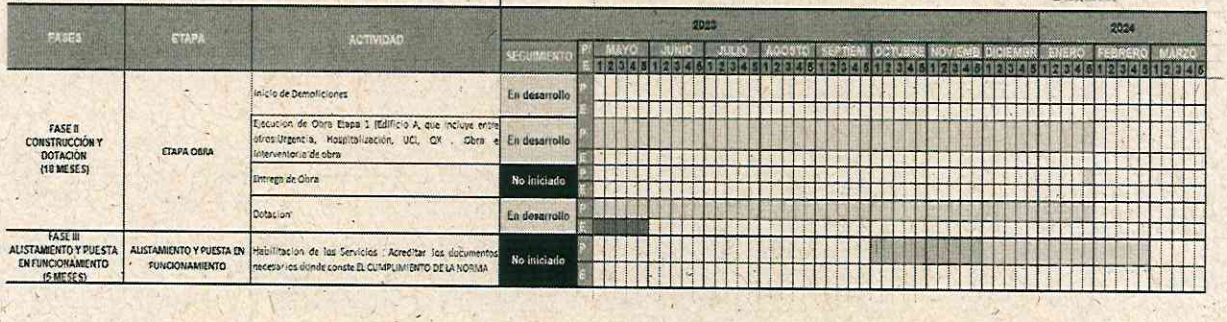

1.5 DESCRIPCIÓN

Acciones Realizadas en el Periodo
Obra: En el mes de octubre se realizaron las actividades de fundida del muro pantalla en el eje A´ y la mitad del eje 14, además entre los ejes 2 y 5 se realizó la instalación del acero de vigas de cimentación, zapatas y arranques de columnas. Además, se inició con la excavación de los tanques de almacenamiento de agua, PTAR y red contra incendios. Dotación: Biomédica: En el mes de octubre se realizan mesa de trabajo con el consorcio tunal 2022, Interventoría Tash y Subred sur para finalizar revisión de las fichas técnicas de los equipos contractuales y dar inicio al estudio de mercado de los equipos contractuales. Mobiliario: En el mes de octubre se realizó el levantamiento de la necesidad a ser usada en el proyecto, determinando las cantidades por área y por piso, esta información se ha revisado de manera conjunta con el constructor quien a su vez está realizando el estudio de mercado para dicha necesidad.
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
Obra: Para el mes de noviembre el plan de contingencia corresponde a la terminación del sótano y 360 m2 de la placa del primer piso entre los ejes 2 a 5 y A-E, además de las conexiones del sótano del proyecto. Dotación: Biomédica: Para el mes de noviembre se realizarán actividades en conjunto con el consorcio tunal 2022, Interventoría Tash y Subred sur para el seguimiento del estudio de mercado de los equipos contractuales y la finalización de las fichas técnicas de los equipos NO contractuales. Adicionalmente, a las actividades en mención, se realizará un cronograma de gestión para la dotación Biomédica. Mobiliario: En el mes de noviembre de 2023, se realizará revisión por parte del Consultor, respecto a mobiliario y cantidades de acuerdo a los ajustes hechos en los planos como a su vez se realizará la revisión del mobiliario fijo que corresponde a todos los mesones en acero inoxidable que serán requeridas en el proyecto, después de la revisión y aprobación por parte del proveedor se realizara un cronograma de seguimiento para el mobiliario fijo y no fijo.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente Periodo	$3.045.940.524,15	**Periodo Reportado**	
Cuenta No. 0550004800460919 Banco: **DAVIVIENDA**	**Tipo de Cuenta:** Ahorros	Mes: octubre 2023	Rendimiento: mes $378.401.453,93

2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO

2.1 Ejecución del Contrato Llave en Mano

2.1.1. Información básica del Contrato:

Proceso de selección No.	**Convocatoria Abierta- CA- 001-2022**
Número del contrato	**5008-2022**
Estado actual del Contrato:	*Vigente*
Objeto	Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

Proceso de selección No.	**Convocatoria Abierta- CA- 001-2022**		
Contratista	CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3. ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S NIT 822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3		
Supervisor	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		
Valor	$89.323.181.304	**Duración inicial (meses)**	20 meses
Fecha de iniciación: (Con fecha de suscripción 21/04/2022)	20/05/2022	**Fecha de terminación inicial:**	31/12/2023
Prórrogas	**NA**		
Suspensiones: (1) - Fecha			
Adiciones:1) - Fecha	**NA**		
Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) - Fecha			
Fecha Actual Terminación	19/01/2024		
Valor Actual Contrato	$89.323.181.304		

2.1.2. Relación de pagos e indicadores de avance

Valor contrato: $ 89.323.181.304

ACTA No	FECHA	FACTURA	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
1	29/09/2022	CT1	$ 1.154.233.376	$ 88.168.947.928	74,70%	16,06%
2	11/11/2022	CT4	$ 960.272.433	$ 87.208.675.495		
3	14/12/2022	CT5	$754.058.482	$ 86.454.617.013		
4	14/12/2022	CT6	$478.869.098	$ 85.975.747.915		
5	1/03/2023	CT7	$ 618.676.495	$ 85.357.071.420		
6	25/05/2023	CT10	$ 2.495.163.918	$ 82.861.907.502		
8	28/06/2023	CT12	$1.919.647.789	$ 80.942.259.713		
9	27/07/2023	CT13	$1.956.237.104	$ 78.986.022.609		
10	29/08/2023	CT15	$ 1.228.326.752	$ 77.757.695.857		
11	28/09/2023	CT17	$ 613.008.378	$ 77.144.687.479		
12	28/09/2023	CT18	$ 252.141.930	$ 76.892.545.549		
TOTAL			**$ 12.430.635.755**			

COMPROBANTE DE EGRESO	FACTURA	VALOR FINAL FACTURA	IVA	RETENCION	RETEIVA	RETEICA	TOTAL, GIRADO
416946	CT1	1.154.233.376	-	23.084.668	-	8.218.142	944.024.392
428596	CT4	960.272.433	-	19.205.449	-	6.837.140	35.993.624
428597							749.393.993
434806	CT5	754.058.482	-	15.081.170	-	5.368.896	616.729.352
435729	CT6	478.869.098	-	9.577.382	-	3.409.548	391.657.458
447848	CT7	618.676.495	-	61.867.650	12.373.530	-	505.854.649
467177	CT10	2.495.163.918	-	49.903.278	-	18.364.406	1.122.080.204
473265	CT10	EMBARGO	-	-	-	-	918.065.622
473260	CT12	1.919.647.789	-	38.392.956	-	14.128.608	1.569.580.818
479460	CT13	1.956.237.104	-	39.124.742	-	14.397.905	1.599.497.706
485698	CT 15	1.228.326.752	-	24.566.535	-	9.040.485	1.004.329.085
491954	CT 17	613.008.378	-	12.260.168	-	4.511.742	501.220.169

	CT 18	252.141.930	-	5.042.839	-	1.855.765	206.161.326

(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado)

2.1.3. Pólizas suscritas por el contratista *(Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones contractuales)*

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Calidad del servicio	Nacional de Seguros	400040130	22/12/2022	22/12/2025	$859.574.760,00		2/5/22	28/4/22
Cumplimiento del contrato			22/04/2022	22/06/2023	$573.049.840,00		2/5/22	28/4/22
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			22/04/2022	22/12/2025	$143.262.460,00		2/5/22	28/4/22
Póliza de Responsabilidad Civil		400040134	22/04/2022	22/12/2023	$141.896.900,62		2/5/22	28/4/22

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400040133	22/04/2022	22/06/2024	$20.376.403.531,20		2/5/22	28/4/22
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			22/04/2022	22/12/2026	$3.396.067.255,20		2/5/22	28/4/22
Suministro de repuestos			22/12/2023	22/12/2028	$3.707.317.400,00		2/5/22	28/4/22
Estabilidad de la obra			29/12/2023	22/12/2028	$33.960.672.552,00		2/5/22	28/4/22
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes y equipos suministrados			22/12/2023	22/12/2024	$3.707.317.400,00		2/5/22	28/4/22

OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios.

2.1.4. Cuadro de consolidación de información del Contrato Llave en Mano:

	OBJETO	VALOR	FÍSICA

CONTRATO NO.			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
5008 de 2022	Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.	$89.323.181.304	16.06%	83.94%
OBSERVACIONES: Avance **consolidado:** Programado:74.70% - Ejecutado: 16.06%				

2.1. 5. Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte
En el mes de octubre se continuaron las actividades de excavación en los taludes, excavación para zapatas y vigas, además del armado de los muros pantalla hasta el nivel +2,20 y fundida desde el eje 14 hasta el eje 8, además de los ensayos de laboratorio normales del proyecto, estas actividades hacen parte del plan de contingencia que se pacto con el compromiso de terminar el sótano para el 30 de noviembre
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
Para el mes de noviembre se espera ejecuten a cabalidad el plan de contingencia donde se relacionan todas las actividades para llegar al 30 de noviembre con el sótano terminado.

2.1.6. Información básica Interventoría:

Proceso de selección No.	**Invitación Pública Meritoria CM-004-2021**		
Número del contrato	**5009-2022**		
Estado actual del Contrato:	*Vigente*		
Objeto	Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.		
Contratista	CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701 PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ – HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%		
Supervisor	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		
Valor	$7.214.261.155	**Duración inicial (meses)**	20 meses
Fecha de iniciación: (Con fecha de suscripción 21/04/2022)	20/05/2022	**Fecha de terminación inicial:**	31/12/2023
Prórrogas			
Súspensiones: (1) - Fecha			
Adiciones			
Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) - Fecha			
Fecha Actual Terminación	19/01/2024		
Valor Actual Contrato	$7.214.261.155		

2.1.7. Relación de pagos e indicadores de avance

Valor: $7.214.261.155

ACTA No	FECHA	FACTURA	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
1	27/07/2022	FE 5	$ 132.261.459	$ 7.081.999.696	74,70%	16,06%
2	11/08/2022	FE 6	$ 360.713.059	$ 6.721.286.637		
3	30/08/2022	FE 7	$ 360.713.059	$ 6.360.573.578		
4	27/09/2022	FE 8	$ 360.713.059	$ 5.999.860.519		
5	1/11/2022	FE 9	$ 360.713.059	$ 5.639.147.460		
6	14/12/2022	FE 10	$ 312.954.648	$ 5.326.192.812		
7	14/12/2022	FE 12	$ 312.954.648	$ 5.013.238.164		
8	17/02/2023	FE 14	$ 297.663.988	$ 4.715.574.176		
9	24/02/2023	FE 17	$ 305.329.174	$ 4.410.245.002		
10	24/03/2023	FE 19	$ 330.372.707	$ 4.079.872.295		
11	28/04/2023	FE 20	$ 275.820.264	$ 3.804.052.031		
12	16/05/2023	FE 23	$ 231.696.853	$ 3.572.355.178		
13	28/06/2023	FE 24	$224.026.033	$3.348.329.145		
14	28/07/2023	FE 25	$224.869.345	$3.123459.800		
15	29/08/2023	FE 27	$ 216.966.601	$ 2.906.493.199		
16	28/09/2023	FE 28	$ 206.564.139	$ 2.699.929.060		
17	30/10/2023	FE29	$185.392.590	$ 2.514.536.470		
TOTAL			$ 4.699.724.685			

COMPROBANTE DE EGRESO	FACTURA	VALOR FINAL FACTURA	IVA	RETENCION	RETEIVA	RETEICA	TOTAL GIRADO
404985	FE-5	111.044.083	21.098.376	6.662.645	3.164.756	961.642	107.583.950
410029	FE-6	303.120.218	57.592.841	18.187.213	8.638.926	2.625.021	293.674.992
411064	FE-7	303.120.218	57.592.841	18.187.213	8.638.926	2.625.021	293.674.992
416935	FE-8	303.120.218	57.592.841	18.187.213	8.638.926	2.625.021	293.674.992
423748	FE-9	303.120.218	57.592.841	18.187.213	8.638.926	2.625.021	293.674.992
434784	FE-10	262.987.099	49.967.549	15.779.226	7.495.132	2.277.468	254.792.421
434805	FE-12	262.987.099	49.967.549	15.779.226	7.495.132	2.277.468	254.792.421
447005	FE-14	250.137.805	47.526.183	15.008.268	7.128.927	2,166.193	242.343.511
447807	FE-17	256.579.138	48.750.036	15.394.748	7.312.505	2.221.975	248.584.132
453935	FE-19	277.624.123	52.748.583	16.657.447	7.912.288	2.404.225	268.973.355
460213	FE-20	231.781.734	44.038.529	13.906.904	6.605.779	2.007.230	224.559.415
467169	FE-23	194.703.238	36.993.615	11.682.194	5.549.042	1.686.130	188.636.286
473261	FE-24	188.257.171	35.768.862	11.295.430	5.365.329	1.630.307	182.391.078
479485	FE25	188.965.836	35.903.509	11.337.950	5.385.526	1.636.444	183.077.661
485699	FE27	182.324.875	34.641.726	10.939.493	5.196.259	1.578.933	176.643.632
491992	FE28	173.583.310	32.980.829	10.414.999	4.947.124	1.503.231	168.174.454
498342	FE-29	155.792.092	29.600.498	11.475.646	4.440.075	1.349.160	150.937.609

(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado)

2.1.8. Pólizas suscritas por el contratista *(Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones*

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado	15-44-101261758	21/04/2022	21/06/2024	$2.164.278.346.50		2/5/22	30/4/22
Estabilidad y calidad de la obra			21/12/2023	21/12/2028	$1.607.130.577,50		2/5/22	30/4/22
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			21/04/2022	21/12/2026	$360.713.057,75		2/5/22	30/4/22
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes y equipos suministrados			21/12/2023	21/12/2024	$1.442.852231,00		2/5/22	30/4/22
Provisiones de Repuestos			21/12/2023	21/12/2028	$1.442.852231,00		2/5/22	30/4/22

RCE

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Predios laborales y operaciones	Seguros del Estado	15-40-101078316	21/04/2022	21/12/2023	$1.442.852.231,00		2/5/22	30/4/22
Contratistas y Subcontratistas			21/14/2022	21/12/2023	$1.442.852.231,00		2/5/22	30/4/22
Vehículos propios y no propio			21/04/2022	21/12/2023	$1.442.852.231,00		2/5/22	30/4/22
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)								

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios

2.1.9. Cuadro de consolidación de información del contrato de Interventoría del Contrato de obra Llave en Mano:

CONTRA-TO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICO	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
5009-2022	Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.	$7.214.261.155	16.06%	83.94%
OBSERVACIONES:				

2.1.10. Descripción actividades Interventoría

Acciones Realizadas en el Período
En el mes de Octubre se continuaron las actividades de excavación en los taludes, excavación para zapatas y vigas, además del armado de los muros pantalla hasta el nivel +2,20 y fundida desde el eje 14 hasta el eje 8, además de los ensayos de laboratorio normales del proyecto, estas actividades hacen parte del plan de contingencia que se pacto con el compromiso de terminar el sótano para el 30 de noviembre
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
Para el mes de noviembre se espera ejecuten a cabalidad el plan de contingencia donde se relacionan todas las actividades para llegar al 30 de noviembre con el sótano terminado.

Dotación

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte
Dotación Biomédica: Para el mes de octubre, se finaliza por parte del Consorcio los avances de las fichas técnicas de los equipos NO contractuales, sin embargo, estas siguen en revisión y aprobación, se establece un plazo del 22 de noviembre para la revisión de las mismas. El día 22 de octubre se genera mesa de trabajo con la interventoría Tash y el consorcio Tunal 2022 con dos fines específicos, el primero la presentación de la Ing. Monica pinilla la cual dará continuidad a las actividades que venía realizando el Ing.Jonny Rojas para la subred sur en el área de dotación Biomedica; como segundo fin el consorcio expone una problemática para llevar a cabo el estudio de mercado de los equipo contractuales ya que en una base de datos generada en conjunto por la subred sur y la interventoría, se realizó la agrupación de los equipos biomédicos contractuales a los que expone el consorcio que no es fácil identificar y realizar el cruce con el PMA, por ello la subred se compromete a realizar ajuste a la base de datos la cual les permita identificar nombre contractual y ficha técnica del equipo, la cual se presentara en una mesa de trabajo el día 2 de noviembre.(Se adjuntan dos ejemplos de los equipos que se encuentran agrupados). EQUIPO CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA 1 Imagen 1. Primer ejemplo de equipos agrupados MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR ANCLADO 7 Imagen 2. Segundo ejemplo de equipos agrupados Se propone realizar una nueva mesa de trabajo para el mes de noviembre con el grupo asistencial encabezado por el Dr. Martin Jaimes con el fin de que se evalué por ultima ves la necesidad de las áreas y realizar la presentación formal de la ingeniera Monica pinilla. A continuación se relaciona base de datos, en la cual se describen equipos a necesidad y su cantidad, hasta la fecha se mantiene esta relación sin ajustes desde el informe 24 (septiembre 2023): PISO / SERVICIO / AREA / EQUIPO / TOTAL PLANTA NIVEL 1 / URGENCIAS / SALA EDA / FLUJOMETRO / 4 VACUOMETRO / 4

				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	1
				FONENDOSCOPIO ADULTO	1
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	1
				POLTRONAS (MOBILIARIO)	3
			SALA ERA	FLUJOMETRO	4
				VACUOMETRO	4
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	1
				FONENDOSCOPIO ADULTO	1
				POLTRONAS (MOBILIARIO)	3
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	1
				LAVADOR DE HINOTERAPIA	0
				SECADOR DE HINOTERAPIA	0
			SALA TRANSICION	FLUJOMETRO	7
				VACUOMETRO	7
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO CON CARRO DE TRANSPORTE	1
				FONENDOSCOPIO ADULTO	1
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	1
				SILLA DE RUEDAS	1
				LLAMADO DE ENFERMERIA	7
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	1
			LAVADO DE EQUIPOS	LAVADOR DE PATOS	0
				SECADOR DE PATOS	0
			SALA DE PROCEDIMIENTOS	FLUJOMETRO	4
				VACUOMETRO	4
				FONENDOSCOPIO ADULTO	4
				CORTADOR DE YESO	0
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	1
				LAMPARA CUELLO DE CISNE EXAMEN	3
				PANELES DE GASES MEDICINALES	2
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				LAMPARA PIELITICA	1
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	3
				CALENTADOR DE HEMOCOMPONENTES (SANGRE)	1
				ELECTROCARDIOGRAFO	2
			SALA DE PROCEDIMIENTOS MATERNO	FLUJOMETRO	2
				VACUOMETRO	1
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	1
				MONITOR FETAL	0
				DOPPLER FETAL	1

				FONENDOSCOPIO ADULTO	1
				FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	1
				PESA PAÑAL	1
				LAMPARA PIELITICA	1
				INCUBADORA DUAL	1
				INCUBADORA DE TRANSPORTE	0
				RESUCITADOR NEONATAL	1
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				CAMILLA GINECOLOGICA PARA TPR CON ESACLERILLA Y ATRIL	1
				PANELES DE GASES MEDICINALES	1
			MEDICAMENTOS	NEVERA PARA MEDICAMENTOS	1
			LAVADO DE PATOS	LAVADOR DE PATOS	0
				FLUJOMETRO	1
				VACUOMETRO	1
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
			SALA DE YESO INMOVILIZACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	1
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	1
				LAMPARA CUELLO DE CISNE EXAMEN	1
				CORTADOR DE YESO	1
				FLUJOMETRO	5
				VACUOMETRO	5
				SUCCIONADOR PORTATIL	5
				MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (CON INVASIVAS) Y CENTRAL DE MONITOREO	5
				CAMA ELECTRICA CON RCP	5
				LAMPARA CIELITICAS DE UN SATELITE	5
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO CON CARRO DE TRANSPORTE	3
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	5
				FONENDOSCOPIO ADULTO	5
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	5
				VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	5
			SALA DE REANIMACION	LARINGOSCOPIO CON TODAS LAS HOJAS	0
				EQUIPO DE NASOFIBROLARINGOSCOPIO	0
				MARCAPASOS EXTRACUTANEOS BICAMERAL	2
				MARCAPASOS EXTRACUTANEO	2
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	1
				NEVERA PARA MEDICAMENTOS	1
				CAMILLA DE TRASNPORTE PARA MUERTO (ASERO INOXIDABLE)	1
				RX PORTATIL	0
				MONITOR PANTALLA DE GRADO MEDICO GRADO MEDICO VISUALIZACION	5
				PANELES DE GASES MEDICINALES	5
				VIDEOLARINGOSCOPIO	1
				ECOGRAFO	1

			DUCHA CAMILLAS	CAMILLA DE TRASLADO (SE PUEDA MOJAR)	2
				SILLA DE RUEDAS	2
			CAMILLAS	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	2
				SILLA DE RUEDAS	2
			SALA DE ESPERA ADULTO	DESFIBRILADOR DEA	1
			SALA DE RX	RX PORTATIL	1
				MONITOR PANTALLA DE GRADO MEDICO GRADO MEDICO VISUALIZACION	2
			TRIAGE ADULTO	FLUJOMETRO	1
				VACUOMETRO	1
				CAMILLA FIJA TIPO DIVAN CON ESPALDAR	0
				LAMPARA PIELITICA	0
				FONENDOSCOPIO ADULTO	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO CON CARRO DE TRANSPORTE	1
				BASCULA CON TALLIMETRO	1
			CONSULTORIO URGENCIAS ADULTO	FLUJOMETRO	7
				VACUOMETRO	7
				CAMILLA FIJA TIPO DIVAN CON ESPALDAR	7
				LAMPARA PIELITICA	6
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	6
				FONENDOSCOPIO ADULTO	7
				BASCULA CON TALLIMETRO	7
				PESA BEBE CON INFANTOMETRO Y CINTA METRICA	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	7
				TENSIOMETRO DE PARED	1
				PESA BEBE CON INFANTOMETRO Y CINTA METRICA	8
			TRIAGE PEDIATRICO	FLUJOMETRO	1
				VACUOMETRO	1
				CAMILLA FIJA TIPO DIVAN CON ESPALDAR	0
				LAMPARA PIELITICA	0
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO CON CARRO DE TRANSPORTE	1
				FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	1
				BASCULA CON TALLIMETRO	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	1
				PESA BEBE CON INFANTOMETRO Y CINTA METRICA	1
				TENSIOMETRO DE PARED	1
			CAMILLAS URGENCIAS ADULTO	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	1
				SILLA DE RUEDAS	2
			CONSULTORIO URGENCIAS PEDIATRICO	FLUJOMETRO	1
				VACUOMETRO	1
				CAMILLA FIJA TIPO DIVAN CON ESPALDAR	1
				LAMPARA PIELITICA	0

				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	1
				BASCULA CON TALLIMETRO	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	0
				FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	1
				PESA BEBE CON INFANTOMETRO Y CINTA METRICA	1
				TENSIOMETRO DE PARED	1
PLANTA NIVEL 2	URGENCIAS		OBSERVACION HOMBRES	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	23
				FLUJOMETRO	23
				VACUOMETRO	23
				FONENDOSCOPIO ADULTO	23
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	6
				VENTILADOR DE TRANSPORTE	0
				LLAMADO DE ENFERMERIA	25
				PANELES DE GASES MEDICINALES	23
			OBSERVACION HOMBRES AISLADO	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	2
				FLUJOMETRO	2
				VACUOMETRO	2
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	2
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	0
				ELECTROCARDIOGRAFO	1
				BASCULA CON TALLIMETRO	0
				VENTILADOR DE TRANSPORTE	0
				PANELES DE GASES MEDICINALES	2
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	0
			ENFERMERIA HOMBRES	CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	0
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	0
				BASCULA CON TALLIMETRO	0
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	2
				ELECTROCARDIOGRAFO	1
				FONENDOSCOPIO ADULTO	5
				NEVERA PARA MEDICAMENTOS	1
			CAMILLA Y SILLA DE RUEDAS OBSERVACION HOMBRES	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	2
				SILLA DE RUEDAS	2
			LAVADOR DE PATOS	SECADOR DE PATOS	0
				LAVADOR DE PATOS	0
			REANIMACION DE OBSERVACION HOMBRES	FLUJOMETRO	1
				VACUOMETRO	1
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (CON INVASIVAS) Y CENTRAL DE MONITOREO	1
				CAMA ELECTRICA CON RCP	1
				LAMPARA PIELITICA	1

				NASOFIBROLARINGOSCOPIO	0
				VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	1
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				FONENDOSCOPIO ADULTO	1
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	1
			OBSERVACION MUJERES	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	43
				FLUJOMETRO	43
				VACUOMETRO	43
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	7
				ELECTROCARDIOGRAFO	1
				VENTILADOR DE TRANSPORTE	0
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	0
				FONENDOSCOPIO ADULTO	10
				PANELES DE GASES MEDICINALES	40
			OBSERVACION MUEJERES AISLADO	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	2
				FLUJOMETRO	2
				VACUOMETRO	2
				BASCULA CON TALLIMETRO	0
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	0
				VENTILADOR DE TRANSPORTE	0
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	0
				PANELES DE GASES MEDICINALES	2
			ENFERMERIA MUJERES	CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	4
				FONENDOSCOPIO ADULTO	0
				NEVERA PARA MEDICAMENTOS	2
				LAMPARA PIELITICA	1
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	2
				BASCULA CON TALLIMETRO	2
					0
				PANELES DE GASES MEDICINALES	0
			CAMILLA Y SILLA DE RUEDAS OBSERVACION MUJERES	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	2
				SILLA DE RUEDAS	2
			LAVADOR DE PATOS	SECADOR DE PATOS	0
				LAVADOR DE PATOS	0
			REANIMACION DE OBSERVACION MUJERES	FLUJOMETRO	1
				VACUOMETRO	1
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (CON INVASIVAS) Y CENTRAL DE MONITOREO	1
				CAMA ELECTRICA CON RCP	1
				LAMPARA PIELITICA	1

				VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	1
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				FONENDOSCOPIO ADULTO	1
				NASOFIBROLARINGOSCOPIO	0
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	1
				PANELES DE GASES MEDICINALES	1
			OBSERVACION PEDIATRIA	CAMA CUNA CON BASCIULA	1
				FLUJOMETRO	2
				VACUOMETRO	2
				FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	2
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	1
				CAMILLA DE TRASNPORTE	1
				PANELES DE GASES MEDICINALES	2
				CAMA ELECTRICA CON RCP	1
			ENFERMERIA PEDIATRIA	CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	1
				FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	1
				BASCULA CON TALLIMETRO	1
				NEVERA PARA MEDICAMENTOS	1
PLANTA NIVEL 3	HEMODINAMIA 500 KILOS POR METRO CUADRADO		SALAS DE HEMODINAMIA	ANGIOGRAFO	1
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				ELECTROBISTURI	0
				MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR ANCLADO	0
				INYECTOR	1
				CALENTADOR DE MANTAS	2
				CALENTADOR DE MEDIOS DE CONTRASTE	2
				ECOGRAFO (ANESTESIOLOGO)	0
				NASOFIBROLARINGOSCOPIO	0
				MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (CON INVASIVAS) Y CENTRAL DE MONITOREO	1
			PREPARACION	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	3
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	3
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				CALENTADOR HORNO PARA LIQUIDOS	1
				CALENTADOR DE LIQUIDOS (INTRAVENOSO)	2
	ESTERILIZACION		PREVALADO	LAVADORA ULTRASONICA	1
				LAVADORA DESINFECTOR	2
				PISTOLA DE SECADO DE INSTRUMENTAL	2
			AREA DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVES DE ALTA TEMPERATURA	2
				AUTOCLAVE DE MESA 50 A 60 LITROS	2
				AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA	1
			JEFATRURA DE STERILIZACION	SISTEMA DE TRAZABILIDAD	1

	ESTRILIZACION TERAPIA RESPIRATORIA		PRELAVADO	LAVADOR DE HINOTERAPIA	0
				SECADOR DE HINOTERAPIA	0
				PISTOLA DE SECADO DE INSTRUMENTAL	2
			ESTERILIZACION	AUTOCLAVE DE MESA	1
	SALA DE CIRUGIA		TODAS LAS SALAS CIRUGIA DOTADAS	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR ANCLADO	7
				MESA DE CIRUGIA GENERAL	6
				MESA DE CIRUGIA ORTOPEDIA	1
				LAMPARA CIELITICA DOBLE SATELITE	7
				LAMPARA CUELLO DE CISNE EXAMEN	0
				CALENTADOR DE MANTAS	8
				ECOGRAFO (ANESTESIOLOGO)	1
				TORRE DE ENDOCOPIA	1
				TORRE DE LAPAROSCOPIA	4
				TORRE DE UROLOGIA	1
				TORRE DE ARTROSCOPIA	2
				CX DE OFTALMO (EQUIPOS ESPECIALES)	
				CX DE NEUROLOGIA (	
				TORRE DE BRONCOSCOPIA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	
				ELECTROBISTURI	8
				ELECTRODERMÁTOMO	2
				ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	0
				VIDEOLARINGOSCOPIO	3
				NASOFIBROLARINGOSCOPIO	1
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	2
				FOTOFEROS	3
				MONITOR PANTALLA DE GRADO MEDICO GRADO MEDICO VISUALIZACION	2
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	3
				SILLA DE RUEDAS	3
				ARCO EN C	3
				LAVADOR DE PATOS	0
				SECADOR DE PATOS	0
				CALENTADOR DE LIQUIDOS (INTRAVENOSO)	9
				CALENTADOR DE HEMOCOMPONENTES (SANGRE)	9
				CALENTADOR HORNO PARA LIQUIDOS	1
				COMPRESOR VASCULAR MS Y MI	1
				MONITOR DE ANESTESIA BIOESPECTRAL	4
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				MARCAPASOS BICAMERAL	2
				BRAZOS DE EQUIPOS	7
				BRAZOS DE ANESTESIA	7
				SISTEMA DE EXTRACION DE GASES ANESTESICO	7
				LAMPARA PIELITICA	1
				RX PORTATIL	1

				nevera de medicamnetos	1
	RECUPERACION		TODA LA REA DE RECUPERACION	CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	16
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				ELECTROCARDIOGRAFO	1
				CALENTADOR DE MANTAS	4
				MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (CON INVASIVAS) Y CENTRAL DE MONITOREO	4
				SILLA DE RUEDAS	3
				SUCCIONADOR PORTATIL	0
				CORTADOR DE YESO	0
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	0
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	0
				BASCULA CON TALLIMETRO	1
				PANELES DE GASES MEDICINALES	16
				LLAMADO DE ENFERMERIA	16
				MONITORESS BASICO DE CABECERA	14
				MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASNPORTE	2
				BASCULA GRADO MEDICO PESO ESPECIMENES	1
	PREPARACION DE SALAS CIRUGIA		PREPARACION DE SALAS CIRUGIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	2
				BASCULA CON TALLIMETRO	2
				SILLA DE RUEDAS	2
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	8
				PANELES DE GASES MEDICINALES	8
PLANTA NIVEL 4	INIDAD DE CUIDADO INTENSIVO		UCI INTENSIVOS	CAMA ELECTRICA CON RCP	39
				MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (CON INVASIVAS) Y CENTRAL DE MONITOREO	39
				VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	39
				VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO (TRASNPORTE).	3
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	4
				LAMPARA CUELLO DE CISNE EXAMEN	1
				RX PORTATIL	1
				ECOGRAFO (ANESTESIOLOGO) trasnductor craneal	1
				MARCAPASOS EXTRACUTANEOS BICAMERAL	3
				ELECTROCARDIOGRAFO	2
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	4
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	4
				VIDEOLARINGOSCOIPO DE DIFICIL ENTUBACION	3
				NASOFIBROLARINGOSCOPIO	0
				VIDEOBRONCOSCOPIO RIGIDO	1
				BASCULA DE PISO	3
				GRUA PARA LEVANTAR PACIENTE	1
				FLUJOMETRO	39
				CALENTADOR DE MANTAS	10

				VACUOMETRO	39
				MONITOR DE GASTO CARDIACO	0
				SUCCIONADOR PORTATIL	4
				CAMILLA DE TRASNPORTE PARA MUERTO (ASERO INOXIDABLE)	2
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	3
				SILLA DE RUEDAS	4
				LAVADOR DE PATOS	0
				SECADOR DE PATOS	0
				COLUMNA DE GASES MEDICINALES ELECTRONEUMATICA CON DESPLAZAMIENTO	39
				FONENDOSCOPIO	39
				MONITOR CON CALORIMETRIA	4
				ELECTROENCEFALOGRAMA DE 16 CANALES	1
	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS		INTERMEDIOS	CAMA ELECTRICA CON RCP	14
				MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	14
				VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO	4
				VENTILADOR DE TRANSPORTE	1
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				LAMPARA CUELLO DE CISNE EXAMEN	0
				RX PORTATIL	1
				ELECTROCARDIOGRAFO	1
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	2
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	0
				BASCULA DE PISO	1
				FLUJOMETRO	15
				VACUOMETRO	15
				SUCCIONADOR PORTATIL	1
				CAMILLA DE TRASNPORTE PARA MUERTO (ASERO INOXIDABLE)	1
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	0
				SILLA DE RUEDAS	2
				LAVADOR DE PATOS	0
				SECADOR DE PATOS	0
				COLUMNA DE GASES MEDICINALES ELECTRONEUMATICA CON DESPLAZAMIENTO	14
				TORRE DE BRONCOSCOPIO	1
				FONENDOSCOPIO	14
PLANTA NIVEL 5	HOSPITALIZACION		HOSPITALIZADOS 1964,11 MTS	CAMA ELECTRICA CON RCP	48
				ELECTROCARDIOGRAFO	2
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	2
				BASCULA CON TALLIMETRO	0
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	0
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	0
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	3

				NEVERA PARA MEDICAMENTOS	3
				FLUJOMETRO	48
				VACUOMETRO	48
				LAMPARA CUELLO DE CISNE EXAMEN	0
				SECADOR DE PATOS	0
				LAVADOR DE PATOS	0
				CAMILLA DE TRASLADO CON ATRIL, MARTILLO Y ESCALERILLA	2
				SILLA DE RUEDAS	2
				PANELES DE GASES MEDICINALES	48
				SILLA DE RUEDAS	4
				LLAMADO DE ENFERMERIA	48
			HOSPITALIZACION AISLADOS (3)	CAMA ELECTRICA CON RCP	3
				ELECTROCARDIOGRAFO	1
				CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	1
				BASCULA CON TALLIMETRO	3
				EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDO PORTATIL	3
				TENSIOMETRO PORTATIL MANUAL	3
				MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	3
				FLUJOMETRO	3
				VACUOMETRO	3
				PANELES DE GASES MEDICINALES	3
				LLAMADO DE ENFERMERIA	3

Dotación Mobiliario:
En el mes de óctubre 2023, se realizó el levantamiento de la necesidad a ser usada en el proyecto, determinando las cantidades por área y por piso, esta información se ha revisado de manera conjunta con el constructor quien a su vez está realizando el estudio de mercado para dicha necesidad.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Dotación Biomédica:
Para el mes de noviembre, se solicitará al consorcio que informe si hay observaciones presentadas a las fichas técnicas realizadas y entregadas por la Subred para la adquisición de los equipos biomédicos NO contractuales.

Dado el cambio de ingeniero biomédico por parte de la subred se extiende el plazo de ajuste de la base de datos para desagrupar los equipos contractuales y adjuntar número de ficha técnica para el día 2 de noviembre.

Se solicitará al grupo asistencial una nueva reunión de seguimiento con el fin de evaluar la necesidad de las áreas y la cantidad total de equipo contractuales – No contractuales.

Dotación Mobiliario:
En el mes de noviembre de 2023, se realizará revisión por parte del Consultor, respecto a mobiliario y cantidades de acuerdo a los ajustes hechos en los planos como a su vez se realizará la revisión del mobiliario fijo que corresponde a todos los mesones en acero inoxidable que serán requeridas en el proyecto.

3. EJECUCIÓN

3.1 Resumen de la ejecución del Convenio a la fecha:

Detalle de componentes del convenio interadministrativo No.	Fecha de compromiso (RP)	Valor Compromiso (RP)	Valor Físico Facturado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje Físico Ejecución a la fecha
Valor del convenio (FFDS) (Incluye vr de Indexación de VF)	RP #3601 del 31/08/2021 por valor de $23.610.024.440 CDP VF 2023 por $75.491.915.560	$ 105.245.995.345			
Gastos del convenio					
Contrato Llave en mano: (No 5008/2022) 1. Estudios y diseños 2. Obra 3. Dotación	CRP #13925 del 21/04/2022	$89.323.181.304	$12.430.635.755	$12.430.635.755	16.06%
Interventoría (No 5009/2022)	CRP #13903 del 20/04/2022	$7.214.261.155	$ 4.699.724.685	$ 4.699.724.685	16,06%
Otros (discriminar el objeto del gasto)					NA
Gastos administrativos para contratación estudios diseños, obras e interventoría (EGAT)		$1.723.193.348	$1.723.193.348	$1.723.193.348	NA
Gastos administrativos para contratación de Dotación y mobiliario (EGAT)					
Total, gastos del convenio		**$ 98.260.635.807**	**$18.853.553.788**	**$18.853.553.788**	16.06%
Saldo del convenio		**$6.985.359.538**			
Rendimientos financieros acumulados	**$3.045.940.524,15**	**Devolución de rendimientos financieros.**		**$0**	**%**
OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano e Interventoría) y refiere al avance en la ejecución física del proyecto.					

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador No 4: Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1%. (Meta: 80%)

Estudios y Diseños (%)	Obra Adjudicada (%)	Ejecución de obra (%)	Dotación Adjudicada (%)	Dotación Entregada (%)	Puesta en Funcionamiento (%)
97%	100%	14,93%	0%	N/A	N/A

4. OTROS:

4.1. Relación de visitas de entes de control: *A continuación, deberá relacionar las visitas recibidas por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias*

Ente de control	Fecha de visita	Hallazgos	Resumen del plan de acción adoptado o acciones adelantadas
NA	NA	NA	NA


(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

- El 13 de octubre de 2023, se radicó informe No. 24 correspondiente a la ejecución del mes de septiembre de 2023, con N° de salida 2023300-025935-1.

- En el mes de octubre de 2023, no se realizó reuniones de veedores del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



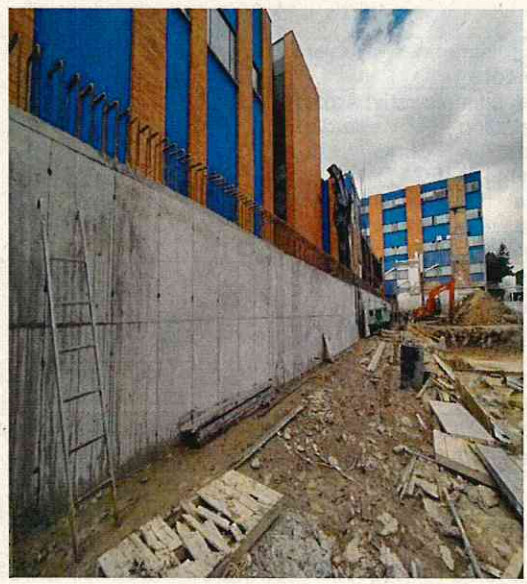

Avances Convenio 2806257 de 2021. Octubre 2023



Avances Convenio 2806257 de 2021. Octubre 2023

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Gerente
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Anexos

Apoyo técnico para el seguimiento y cumplimiento del Convenio: María Elena Restrepo García - Médico Especialista Proyectos.

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	María Elena Restrepo García- Médico Especialista Proyectos		10/11/2023
Elaborado y Revisado por Profesional SISS ESE. (Componente Técnico dotación):	Mónica Pinilla Moreno-Biomédico Proyectos (Dotación equipos Biomédicos)		10/11/2023
Elaborado y Revisado por Profesional SISS ESE. (Componente Técnico dotación):	Fabián García -Gestión de Proyectos (Dotación Mobiliario)		10/11/2023
Elaborado y Revisado por Profesional SISS ESE. Componente Técnico (infraestructura):	Carlos Tovar -Ingeniero Civil Gestión de Proyectos		10/11/2023
Revisado por Profesional SISS ESE	Mónica R. Salguero C. – Referente Gestión de proyectos		10/11/2023
Revisado por Profesional SISS ESE. (Componente Técnico (infraestructura y/o dotación)	José Napoleón Posada Viana – gerente de Proyectos		10/11/2023
Revisado por Profesional SISS ESE. (Componente Financiero):	Adriana Posada – Asesora Financiera proyectos		10/11/2023
Revisado por Profesional *SISS ESE (Componente Jurídico):*	Lidia Hemilet Cala Celis- Jurídica proyectos		
Aprobado por:	Gloria Libia Polanía Aguillón- Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		10/11/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por Profesional *SDS-DIYT (Componente Técnico (infraestructura y/o dotación):(Añadir filas abajo según necesidad)*	Camilo Vanegas		12/12/2023
Revisado por Profesional *SDS-DIYT (Componente Financiero): (Añadir filas abajo según necesidad)*	David López		12/12/2023
Revisado por Profesional *SDS-DIYT (Componente Jurídico): (Añadir filas abajo según necesidad)*	Gloria Garrido		12/12/2023

(NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo.)

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

0048 0046 0919

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL
tesoreria@subredsur.gov.co

Saldo Anterior	$91,148,755,458.22
Más Créditos	$378,401,453.93
Menos Débitos	$359,715,963.00
Nuevo Saldo	$91,167,440,949.15
Saldo Promedio	$91,137,151,717.47

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	$ 208,778,354.00-	8356	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL-EMPRESARIAL
31 10	$ 150,937,609.00-	2897	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 10	$ 378,401,453.93+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

LA DIRECTORA FINANCIERA (E), LA LIDER DE PRESUPUESTO Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CERTIFICAN:

Que dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de los convenios de Inversión No.1153-17, No. 1171-17, No. 1186-17, No. 1210-17, No. 1211-17, No 1223-17, y los Convenios N° CO1.PCCNTR. 676500-18, No 2058936-2020, No.2806257-2021, No 2980595 -2021, N° 4187767-2022, suscritos por la Subred Sur E.S.E en la vigencia 2017, 2018, 2019,2020, 2021 y 2022 se han realizado las siguientes acciones:

- El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para la incorporación al Presupuesto de la Entidad los valores viabilizados de los Convenios de Inversión; para lo cual se detalla los actos administrativos expedidos:

Vigencia 2018

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
1153-17	No 009 del 12 Febrero 2018	No 238 del 26 Febrero 2018	470.868.567.00
1171-17	No 008 del 12 Febrero 2018	No 241 del 26 Febrero 2018	442.045.171.00
1186-17	No 007 del 12 Febrero 2018	No 237 del 26 Febrero 2018	1.333.099.994.00
1210-17	No 006 del 12 Febrero 2018	No 240 del 26 Febrero 2018	531.736.874.00
1211-17	No 005 del 12 Febrero 2018	No 236 del 26 Febrero 2018	860.799.290.00
1223-17	No 003 del 12 Febrero 2018	No 239 del 26 Febrero 2018	855.829.785.00

Los Convenios fueron incorporados en el Presupuesto de Gastos de Inversión en el rubro de **Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales,** a excepción del convenio No 1213-17 que se incorporó en el rubro de **Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital.**

Vigencia 2019

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
N° CO1.PCCNTR. 676500-18	No 013 del 14 Febrero 2019	No 291 del 12 Marzo 2019	57.672.000.000

Según el radicado 2-2019-60954 de Secretaria Distrital de Planeación, comunica que el CONFIS Distrital en sesión No 16 celebrada el día 9 de septiembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Distrital 662 de 2018, autorizo a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2020-2022 por valor de $238.624.088.800 pesos constantes junio 2019.

No. CONVENIO	VIGENCIAS			Total Vigencias Futuras
	2020	2021	2022	
N° CO1.PCCNTR. 676500-18	38.900.385.400	95.434.023.600	104.289.679.800	238.624.088.800

Vigencia 2020

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $14.736.873.120, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Febrero de la vigencia 2020, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2019.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1153-2017 No 1171-2017 No 1186-2017	No 067 del 27 Noviembre 2020	No 1397 del 30 noviembre 2020	28.506.479.231

- Se efectúa una reducción en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para la vigencia fiscal 2020 por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($14.496.954.116), incorporado al Presupuesto médiate Resolución No 1566 del 23 de diciembre de 2020, aprobado mediante acuerdo N° 061 del 30 de octubre de 2020 y Resolución del CONFIS 20 del 18 de diciembre de 2020.

Vigencia 2021

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $145.325.337.160, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de marzo de la vigencia 2021, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2020.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 042 del 26 Marzo 2021	No 434 del 12 Abril 2021	134.283.510
No 2058936-2020	No 043 del 26 Marzo 2021	No 435 del 12 Abril 2021	179.408.165
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**TRASLADO INTERNO**
No 1153-2017 No 1171-2017	No 049 del 30 Abril 2021	No 534 del 30 Abril 2021	4.979.362.232
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1186-2017	No 053 del 18 Mayo 2021	No 639 del 27 Mayo 2021	11.488.092.429
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1223-2017	No 056 del 28 Mayo 2021	No 740 del 16 Junio 2021	1.499.913.335
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1186-2017	No 057 del 28 Mayo 2021	No 713 del 10 Junio 2021	3.037.700.531

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 073 del 30 de Julio 2021	No 1124 del 07 Septiembre 2021	3.752.046.500
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 2058936-2020	No 074 del 30 de Julio 2021	No 1125 del 07 Septiembre 2021	2.675.832.500
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1210-2017	No 125 del 29 de Octubre 2021	No 1486 del 1 Diciembre 2021	3.444.641.986

El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para que mediante Acuerdo 113 del 21 octubre 2021 la Junta Directiva de la Entidad Autorizo al Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para que se adelante el trámite correspondiente ante el CONFIS Distrital para solicitar la aprobación de vigencias futuras excepcionales por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($99.101.940.000)**, conforme al siguiente detalle:

Vigencia futura 2022, en la suma **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($23.610.024.440).**

Vigencia futura 2023, en la suma **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS /CTE ($75.491.915.560).**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E mediante radicado externo No 2021ER42614O1 del 25 de octubre de 2021, solicita ante Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud la Aprobación Vigencias Futuras excepcionales por valor de $99.101.940.000 del Convenio 2806257-2021, autorizadas mediante radicado del CONFIS No 2-2021-110117 del 1 de diciembre de 2021.

Vigencia 2022

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación y honorarios por valor de $199.909.999.382, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Enero de la vigencia 2022, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2021.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR
No 2980595-2021	No 008 del 28 de Enero 2022	No 102 del 07 Febrero 2022	10.471.170.225
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1210-2017	No 014 del 17 de Febrero 2022	No 175 del 25 Febrero 2022	3.506.400.914
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1186-2017	No 013 del 21 de Febrero 2022	No 176 del 25 Febrero 2022	300.236.524

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR
No 1153-2017	No 065 del 30 de Septiembre 2022	No 1155 del 13 Octubre 2022	4.304.943.008
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1210-2017	No 066 del 30 de Septiembre 2022	No 1156 del 13 Octubre 2022	286.958.748
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1223-2017	No 070 del 14 de Octubre 2022	No 1228 del 31 Octubre 2022	1.914.122.218
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 4187767-2022	No 074 del 21 de Noviembre 2022	No 1381 del 06 Diciembre 2022	110.035.288

Vigencia 2023

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $ 271.161.679.319, fue incorporada al presupuesto en su totalidad, en el mes de marzo vigencia 2023, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia fiscal 2022.

Para el convenio 1153 de 2017 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra la adición No 5 del Convenio Nº 1153 de 2017 por valor de $2.921.791.392.

Para el convenio 5141999 de 2023 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra el movimiento del Convenio Nº 5141999 de 2023 por valor de $ 847.955.047 valor pactado en el acta de inicio del Convenio N° 5141999 de 2023.

- El Área de Tesorería aperturó las siguientes cuentas bancarias para el manejo de los recursos recibidos, relacionamos información con corte al 30 de septiembre del 2023

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1.DE SEPTIEMBRE 2023	RECAUDO	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
1153-2017	4800416622	7.208.380.140,38	-	28.678.074,04	1.061.449.181,00	6.175.609.033,42
1171-2017	4800416606	1.214.708.758,39	1.896.250	-	1.216.605.008,39	-
1186-2017	4800417547	17.657.069.599,53	-	70.919.868,89	97.947.089,00	17.630.042.379,42
1210-2017	4800417505	4.634.075.712,43	-	18.619.716,21	-	4.652.695.428,64
1211-2017	4800417513	133.879.140,54	-	511.037,51	100.381.543,00	34.008.635,05
1223-2017	4800417497	4.760.039.883,03	-	17.160.414,08	2.161.614.113,00	2.615.586.184,11
2055128-2020	4800455224	3.715.052.012,53	-	14.927.078,98	-	3.729.979.091,51
2058936-2020	4800455216	2.698.001.993,59	-	10.840.572,01	-	2.708.842.565,60
2806257-2021	4800460919	91.656.459.768,05	-	367.851.639,17	875.555.949,00	91.148.755.458,22

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023	RECAUDO	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
2980595-2021	4800463475	7.137.880.144,37	-	28.484.734,15	728.975.620,00	6.437.389.258,52
4187767-2022	4800489959	334.779.325,83	-	1.176.139,31	54.863.120,00	281.092.345,14
5141999-2023	48280031551	-	839.559.452	36.716,73	-	839.596.168,73
TOTAL		141.150.326.478,67	841.455.702,00	559.205.991,08	6.297.391.623,39	136.253.596.548,36

Los siguientes recursos se encuentran en administración por parte de la Dirección Distrital de tesorería para el proyecto de obra Usme de acuerdo al siguiente detalle:

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE AGOSTO 2023	ABONOS	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2023
Nº. 676500-18	130309000200042000042372	204.127.919.446,79	-	1.999.988.715,00	22.722.457.893,00	183.405.450.268,79
TOTAL		204.127.919.446,79	0,00	1.999.988.715,00	22.722.457.893,00	183.405.450.268,79

El Área de Contabilidad, evidenció que las cuentas aperturadas de los convenios anteriormente relacionados llevan contabilidades separadas y no hace unidad de caja con corte al treinta (30) de septiembre de 2023.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Líder de Presupuesto
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitaria – Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ANGÉLICA SÁNCHEZ
Directora Financiera (e)
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Proyectado por: Margareth Dahiam Urazán Engativá –Técnico administrativo
Proyectado por: Christian David Toro Mora – Profesional administrativo

LA DIRECTORA FINANCIERA (E), LA LIDER DE PRESUPUESTO Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CERTIFICAN:

Que dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de los convenios de Inversión No.1153-17, No. 1171-17, No. 1186-17, No. 1210-17, No. 1211-17, No 1223-17, y los Convenios Nº CO1.PCCNTR. 676500-18, No 2058936-2020, No.2806257-2021, No 2980595 -2021, N° 4187767-2022, suscritos por la Subred Sur E.S.E en la vigencia 2017, 2018, 2019,2020, 2021 y 2022 se han realizado las siguientes acciones:

- El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para la incorporación al Presupuesto de la Entidad los valores viabilizados de los Convenios de Inversión; para lo cual se detalla los actos administrativos expedidos:

Vigencia 2018

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
1153-17	No 009 del 12 Febrero 2018	No 238 del 26 Febrero 2018	470.868.567.00
1171-17	No 008 del 12 Febrero 2018	No 241 del 26 Febrero 2018	442.045.171.00
1186-17	No 007 del 12 Febrero 2018	No 237 del 26 Febrero 2018	1.333.099.994.00
1210-17	No 006 del 12 Febrero 2018	No 240 del 26 Febrero 2018	531.736.874.00
1211-17	No 005 del 12 Febrero 2018	No 236 del 26 Febrero 2018	860.799.290.00
1223-17	No 003 del 12 Febrero 2018	No 239 del 26 Febrero 2018	855.829.785.00

Los Convenios fueron incorporados en el Presupuesto de Gastos de Inversión en el rubro de **Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales,** a excepción del convenio No 1213-17 que se incorporó en el rubro de **Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital.**

Vigencia 2019

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	No 013 del 14 Febrero 2019	No 291 del 12 Marzo 2019	57.672.000.000

Según el radicado 2-2019-60954 de Secretaria Distrital de Planeación, comunica que el CONFIS Distrital en sesión No 16 celebrada el día 9 de septiembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Distrital 662 de 2018, autorizo a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2020-2022 por valor de $238.624.088.800 pesos constantes junio 2019.

No. CONVENIO	VIGENCIAS			Total Vigencias Futuras
	2020	2021	2022	
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	38.900.385.400	95.434.023.600	104.289.679.800	238.624.088.800

Vigencia 2020

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $14.736.873.120, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Febrero de la vigencia 2020, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2019.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1153-2017	No 067 del 27 Noviembre 2020	No 1397 del 30 noviembre 2020	28.506.479.231
No 1171-2017			
No 1186-2017			

- Se efectúa una reducción en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para la vigencia fiscal 2020 por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($14.496.954.116), incorporado al Presupuesto médiate Resolución No 1566 del 23 de diciembre de 2020, aprobado mediante acuerdo N° 061 del 30 de octubre de 2020 y Resolución del CONFIS 20 del 18 de diciembre de 2020.

Vigencia 2021

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $145.325.337.160, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de marzo de la vigencia 2021, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2020.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 042 del 26 Marzo 2021	No 434 del 12 Abril 2021	134.283.510
No 2058936-2020	No 043 del 26 Marzo 2021	No 435 del 12 Abril 2021	179.408.165
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**TRASLADO INTERNO**
No 1153-2017 No 1171-2017	No 049 del 30 Abril 2021	No 534 del 30 Abril 2021	4.979.362.232
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1186-2017	No 053 del 18 Mayo 2021	No 639 del 27 Mayo 2021	11.488.092.429
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1223-2017	No 056 del 28 Mayo 2021	No 740 del 16 Junio 2021	1.499.913.335
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1186-2017	No 057 del 28 Mayo 2021	No 713 del 10 Junio 2021	3.037.700.531

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 073 del 30 de Julio 2021	No 1124 del 07 Septiembre 2021	3.752.046.500
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 2058936-2020	No 074 del 30 de Julio 2021	No 1125 del 07 Septiembre 2021	2.675.832.500
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1210-2017	No 125 del 29 de Octubre 2021	No 1486 del 1 Diciembre 2021	3.444.641.986

El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para que mediante Acuerdo 113 del 21 octubre 2021 la Junta Directiva de la Entidad Autorizo al Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para que se adelante el trámite correspondiente ante el CONFIS Distrital para solicitar la aprobación de vigencias futuras excepcionales por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($99.101.940.000),** conforme al siguiente detalle:

Vigencia futura 2022, en la suma **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($23.610.024.440).**

Vigencia futura 2023, en la suma **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS /CTE ($75.491.915.560).**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E mediante radicado externo No 2021ER42614O1 del 25 de octubre de 2021, solicita ante Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud la Aprobación Vigencias Futuras excepcionales por valor de $99.101.940.000 del Convenio 2806257-2021, autorizadas mediante radicado del CONFIS No 2-2021-110117 del 1 de diciembre de 2021.

Vigencia 2022

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación y honorarios por valor de $199.909.999.382, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Enero de la vigencia 2022, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2021.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR
No 2980595-2021	No 008 del 28 de Enero 2022	No 102 del 07 Febrero 2022	10.471.170.225
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1210-2017	No 014 del 17 de Febrero 2022	No 175 del 25 Febrero 2022	3.506.400.914
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1186-2017	No 013 del 21 de Febrero 2022	No 176 del 25 Febrero 2022	300.236.524

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR
No 1153-2017	No 065 del 30 de Septiembre 2022	No 1155 del 13 Octubre 2022	4.304.943.008
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1210-2017	No 066 del 30 de Septiembre 2022	No 1156 del 13 Octubre 2022	286.958.748
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1223-2017	No 070 del 14 de Octubre 2022	No 1228 del 31 Octubre 2022	1.914.122.218
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 4187767-2022	No 074 del 21 de Noviembre 2022	No 1381 del 06 Diciembre 2022	110.035.288

Vigencia 2023

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $ 271.161.679.319, fue incorporada al presupuesto en su totalidad, en el mes de marzo vigencia 2023, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia fiscal 2022.

Para el convenio 1153 de 2017 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra la adición No 5 del Convenio Nº 1153 de 2017 por valor de $2.921.791.392.

Para el convenio 5141999 de 2023 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra el movimiento del Convenio Nº 5141999 de 2023 por valor de $ 847.955.047 valor pactado en el acta de inicio del Convenio N° 5141999 de 2023.

Para el convenio 2980595 de 2021 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra el movimiento del Convenio Nº 2980595 de 2021 por valor de $ 4.836.940.052 valor pactado en el Modificatorio del Convenio.

- El Área de Tesorería aperturó las siguientes cuentas bancarias para el manejo de los recursos recibidos, relacionamos información con corte al 31 de octubre del 2023

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE OCTUBRE 2023	RECAUDO	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 2023
1153-2017	4800416622	6.175.609.033,42	-	23.192.767,50	1.865.381.591,00	4.333.420.209,92
1186-2017	4800417547	17.630.042.379,42	-	$ 65.181.039,48	$ 3.008.200.756,42	$ 14.687.022.662,48
1210-2017	4800417505	4.652.695.428,64	-	$ 19.317.991,41	-	$ 4.672.013.420,05
1211-2017	4800417513	34.008.635,05	-	$ 132.093,92	$ 34.008.635,05	$ 132.093,92
1223-2017	4800417497	2.615.586.184,11	-	$ 10.504.556,06	$ 303.363.081,00	$ 2.322.727.659,17
2055128-2020	4800455224	3.729.979.091,51	-	$ 15.486.873,18	-	$ 3.745.465.964,69
2058936-2020	4800455216	2.708.842.565,60	-	$ 11.247.114,33	-	$ 2.720.089.679,93
2806257-2021	4800460919	91.148.755.458,22	-	$ 378.401.453,93	$ 359.715.963,00	$ 91.167.440.949,15
2980595-2021	4800463475	6.437.389.258,52	-	$ 26.700.290,63	$ 207.186.101,00	$ 6.256.903.448,15

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE OCTUBRE 2023	RECAUDO	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 2023
4187767-2022	4800489959	281.092.345,14	-	$ 1.010.994,73	$ 52.976.890,00	$ 229.126.449,87
5141999-2023	48280031551	839.596.168,73	-	$ 71.365,67	-	$ 839.667.534,40
TOTAL		136.253.596.548,36	-	551.246.540,84	5.830.833.017,47	130.974.010.071,73

Los siguientes recursos se encuentran en administración por parte de la Dirección Distrital de tesorería para el proyecto de obra Usme de acuerdo al siguiente detalle:

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023	ABONOS	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Nº. 676500-18	130309000200042000042372	183.405.450.268,79	-	1.904.255.045,00	5.046.296.520,00	180.263.408.793,79
TOTAL		183.405.450.268,79	0,00	1.904.255.045,00	5.046.296.520,00	180.263.408.793,79

El Área de Contabilidad, evidenció que las cuentas aperturadas de los convenios anteriormente relacionados llevan contabilidades separadas y no hace unidad de caja con corte al treinta y uno (31) de octubre de 2023.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Líder de Presupuesto
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitaria – Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ANGELICA SÁNCHEZ
Directora Financiera (e)
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Proyectado por: Margareth Dahiam Urazán Engativá –Técnico administrativo
Proyectado por: Christian David Toro Mora – Profesional administrativo
