Actas Informe final
Reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	16/7/2019	**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**	Contrato 833006/2019		
Asistentes	Gyselle Beltran Sonia Liliana Fonseca.					**Asistentes Externos**	Jaime Alberto Suarez		
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Gyselle				**Próxima Reunión**	

DLE BOSA

Se recogio escombro
Se termino piso
Se traslado basicleteno
Firmada acta de recibo, del piso esta pendiente.
Pendiente Colgar carteleras y estantes cuarto aseo OK
Cambio acrilicos. pendiente. OK.

DLE SAN CRISTOBAL

Hoy instalan banderas
Mañana puerta directura
Hoy termina sonido los de mantenimiento.

DILE SUBA

Se entrego con acta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**		

DLE PUENTE ARANDA.
Se entregó con acta.

DLE TUNJUELITO
Se adicionó pintura sobre el parque termina viernes
Hacer reja ventana
Arreglo andén urgente.

DLE USAQUEN
Película inicia 22 de Julio.
Muebles en fabricación.
Soportes T.V.
arreglar toma corriente mantenimiento 23 Julio/2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	16/7/19	**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	Cyseth Beltran Sonia Liliana Fonseca					**Asistentes Externos**	Jaime Alberto Suarez		
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Cyseth				**Próxima Reunión**	

NIVEL CENTRAL

Instalación de vidrios, iniciar arreglo de archivo rodante.
Cotizar huecos de fachada, según reunión de mañana.

DILE ANTONIO NARIÑO

Enviar personal autorizado
Inicio 15 de Julio / 2019.

DLE USME

Inicia. 22 julio/2019.

DLE CHAPINERO TEUSAQUILLO

Inició esta semana.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**		

ROSA CARATE
Pendiente Cotizar para hoy 16 Jul/19

CONTRATO

Acta de recibo # 20, 18, 19, 24, 6, 5, 2, 4, 7, 9
Se tienen ordenes aprobadas por valor de $765.847.445^{20}$
El corte 1 – 171.507.804 El corte 2 $169.013.085^{92}$ El cort
3 por presentar $246.398.238^{80}$
La proyeccion de lo aprobados $671.914.296^{04}$
Queda saldo de $128.059.703^{96}$
Sin aprobar Kennedy y de Usme solo impermeabilizacion

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	16/7/19	**Inicio**	9:00	**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	Gyselle Beltran Sonia Liliana Fonseca					**Asistentes Externos**	Jaime Alberto Suarez		
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Gyselle				**Próxima Reunión**	

NOMBRE Gyselle Beltran	NOMBRE	NOMBRE Jaime A. Suarez	NOMBRE LIVANA FONSECA	NOMBRE	
CARGO Supervisora Contrato	CARGO	CARGO Ppal Syc	CARGO CONTRATISTA D.S.A.	CARGO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**		

CUADRO CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO S.E.D

FECHA ACTA: 18-06-2019

FECHA ELABORACIÓN	No. DE ORDÉN	UBICACIÓN	VALOR DE ORDEN	AUTORIZADO	ACTIVIDAD	CORTE 1	CORTE 2	CORTE 3	ACUMULADO	VALOR PROYECTADO	PENDIENTE	OBSERVACIONES	ACTA DE RECIBO
20/03/2019	1	OFICNAS SAN CRISTOBAL	$ 63.121.529,60	SI	Adecuacion de oficnas en muros Divisorios de Drywall y Divisiones en aluminio y Vidrio.	$ 70.897.948,00	$ 6.102.052,00		$ 77.000.000,00	$ 77.000.000,00	$ -	EJECUCIÓN 98%	PENDIENTE
20/03/2019	2	CARRERA 91 No. 146c-29 SEDE SUBA.	$ 78.309.785,17	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, Enchape Baños, Andenes Aparatos Sanitarios y Pintura	$ 73.269.048,00	$ 9.869.764,60	$ 8.500.000,00	$ 91.638.812,60	$ 91.638.812,60	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
13/05/2019	3	USAQUEN	$ 81.732.819,00	SI	CONSTRUCCION DE MODULO E INSTALACIÓN DE CARPA		$ 18.807.718,40	$ 17.300.000,00	$ 36.107.718,40	$ 81.732.819,00	-$ 45.625.100,60	EJECUTADO 45%	
22/03/2019	4	CARRERA 34 # 12-17 PUENTE ARANDA	$ 21.486.761,10	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura	$ 27.340.808,00	$ -		$ 27.340.808,00	$ 27.340.808,00	$ -	EJECUTADO 100%	ok
13/05/2019	5	BOSA	$ 53.400.842,00	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura		$ 43.523.279,00	$ 22.138.353,88	$ 65.661.632,88	$ 65.661.632,88	$ -	EJECUTADO 100%	ok
05/05/2019	6	TUNJUELITO	$ 75.811.204,00	SI	CONSTRUCCION REDES HIROSANITARIAS Y MANTENIMEITNOS EXTERIORES		$ 76.710.925,46	$ 15.827.672,00	$ 92.538.597,46	$ 92.538.597,46	$ -	EJECUTADO 100%	ok
15/03/2019	7	SEDE CENTRAL CAFETERIA	$ 6.738.412,00	SI	ADECUACION DE ESPACIO, PISOS Y PINTURA		$ 6.738.412,00		$ 6.738.412,00	$ 6.738.412,00	$ -	EJECUTADO 100%	ok
15/03/2019	9	SEDE CENTRAL BLOQUES EN GENERAL	$ 7.260.933,96	SI	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS		$ 7.260.933,96		$ 7.260.933,96	$ 7.260.933,96	$ -	EJECUTADO 100%	ok
05/06/2019	10	TEUSAQUILLO	$ 28.586.540,30	SI	VENTANAS FACHADA CUBIERTAS CUARTO RACK			$ 14.257.786,00	$ 14.257.786,00	$ 28.586.540,30	-$ 14.328.754,30	SIN EJECUCIÓN	
05/06/2019	11	SEDE USME	$ 94.787.208,10	NO	MTTO. CUBIERTA,				$ -		$ -	SIN APROBAR	
05/06/2019	12	**SEDE KENNEDY**	**$ 35.845.810,35**	**NO**	**CAMBIO VENTANERIA**				**$ -**		**$ -**	**SIN APROBAR**	
05/06/2019	13	SEDE ANTONIO NARIÑO	$ 24.160.753,00	SI	CUBIERTA PISO LAMINDO				$ -	$ 24.160.753,00	$ 24.160.753,00	SIN EJECUCIÓN	
05/06/2019	14	BOSA SEGUNDA FASE	$ 14.330.538,70	NO	REJA FORJA				$ -	$ -	$ -	NO SE VA A HACER	
18/06/2019	15	TUNJUELITO	$ 12.228.556,00	SI	BAÑO DISCAPACIDAD- COCINA			$ 13.471.618,92	$ 13.471.618,92	$ 13.471.618,92	$ -	EJECUCION AL 100%	
12/06/2019	16	USAQUEN	$ 15.768.900,00	SI	CARPA, REJILLA CARCAMO, PUESTOS DE TRABAJO			$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ -	EJECUCION DEL 8%	
02/06/2019	17	BODEGA PFISICAS	$ 6.132.105,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 4.438.476,00	$ 4.438.476,00	$ 4.438.476,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
02/06/2019	18	SEDE ENGATIVA	$ 4.630.500,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 3.351.600,00	$ 3.351.600,00	$ 3.351.600,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
02/06/2019	19	SEDE RAFAEL URIBE	$ 1.494.990,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 1.082.088,00	$ 1.082.088,00	$ 1.082.088,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
02/06/2019	20	BODEGA SAN ISIDRO	$ 12.654.495,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 9.159.444,00	$ 9.159.444,00	$ 9.159.444,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
1 JUNIO-30 JUNIO	21	SEDE CENTRAL	$ 9.135.000,00	SI	AIRES ACONDICIONADOS RACK			$ 18.270.000,00	$ 18.270.000,00	$ 18.270.000,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
1 JUNIO-30 JUNIO	22	TODAS LAS SEDES	$ 95.634.000,00	SI	FUMIGACIÓN			$ 95.634.000,00	$ 95.634.000,00	$ 95.634.000,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
1-ABRIL A 15 MAYO DE 2019	23	TODAS LAS SEDES	$ 7.302.000,00	SI	ACARREOS			$ 7.302.000,00	$ 7.302.000,00	$ 7.302.000,00	$ -	EJECUTADO 100%	
	24	USME	$ 1.915.200,00	SI	PODA			$ 1.915.200,00	$ 1.915.200,00	$ 1.915.200,00	$ -		OK
05/06/2019	25	SEDE CENTRAL	$ 13.380.559,92	SI	ESCALERA Y REFORZAMIENTO PARALES ENTRADAS			$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 13.380.559,92	-$ 6.880.559,92	EJECUCION 50%	
TOTALES			**$ 765.849.443,20**			**$ 171.507.804,00**	**$ 169.013.085,42**	**$ 240.398.238,80**	**$ 580.919.128,22**	**$ 671.914.296,04**	**-$ 90.995.167,82**		
		VALOR DEL CONTRATO	$ 799.974.000,00							-$ 128.059.703,96			

16/JL/2019

11.9.19 9:17 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	28/8/19	**Inicio**	8:30	**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	Gisella Beltran					**Asistentes Externos**	Jaime Alberto Suarez		
Fecha de Elaboración	28/8/19	**Elaborado por**	Gisella					**Próxima Reunión**	

DILE BOSA → Pendiente Película Ventana
→ fuga corregida,
→ Revisar pintura madera.

DILE USAQUEN – Se corrigió película
– Pendiente muebles para hoy
– Ya se corrigió parte eléctrica

DICE - SAN CRISTOBAL – Se corrigió fuga de cocina.

DICE - ANTONIO NARIÑO – Se corrigió la canal de lluvias
– Se corrigió el piso

DICE – CHAPINERO – se instalaron puertas – se corrigió claraboya esta pendiente mano con vecino.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**		

Presupuesto se adjunta valores quedado solo #

NOMBRE Laura G Beltrán
CARGO PE Supervisora

NOMBRE
CARGO

NOMBRE JAIME A. SUAN
CARGO R. Legal Syc

NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO

Rosa Zarate - se revisa arreglo cubierta.

CUADRO CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO S.E.D													FECHA ACTA: 28-08-2019	
FECHA ELABORACIÓN	No. DE ORDÉN	UBICACIÓN	VALOR DE ORDEN	TORIZA	ACTIVIDAD	CORTE 1	CORTE 2	CORTE 3	CORTE 4	ACUMULADO	VALOR PROYECTADO	PENDIENTE	OBSERVACIONES	ACTA DE RECIBO
20/03/2019	1	OFICNAS SAN CRISTOBAL	$ 63.121.529,60	SI	Adecuacion de oficnas en muros Divisorios de Drywall y Divisiones en aluminio y Vidrio.	$ 70.897.948,62	$ 3.140.303,19			$ 74.038.251,81	$ 77.000.000,00	-$ 2.961.748,19	EJECUCIÓN 100%	ok
20/03/2019	2	CARRERA 91 No. 146c-29 SEDE SUBA.	$ 78.309.785,17	SI	de cielo raso, Enchape Baños, Andenes Aparatos Sanitarios y Pintura	$ 73.269.049,11	$ 9.869.764,60	$ 8.392.860,00		$ 91.531.673,71	$ 91.531.673,71	$ -	EJECUCION AL 100%	ok
13/05/2019	3	USAQUEN	$ 81.732.819,00	SI	CONSTRUCCION DE MODULO E INSTALACIÓN DE CARPA		$ 18.807.718,40	$ 19.583.970,97		$ 38.391.689,37	$ 85.058.192,00	$ 46.666.502,63	EJECUTADO 100%	pendiente
22/03/2019	4	CARRERA 34 # 12-17 PUENTE ARANDA	$ 21.486.761,10	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura	$ 27.340.808,44	$ -			$ 27.340.808,44	$ 27.340.808,44	$ -	EJECUTADO 100%	ok
13/05/2019	5	BOSA	$ 53.400.842,00	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura		$ 43.523.279,00	$ 24.841.934,02		$ 68.365.213,02	$ 74.115.213,02	$ 5.750.000,00	EJECUTADO 100%	ok
05/05/2019	6	TUNJUELITO	$ 75.811.204,00	SI	CONSTRUCCION REDES HIROSANITARIAS Y MANTENIMEITNOS EXTERIORES		$ 76.710.925,46	$ 17.429.581,74		$ 94.140.507,20	$ 94.140.507,20	$ -	EJECUTADO 100%	ok
15/03/2019	7	SEDE CENTRAL CAFETERIA	$ 6.738.412,00	SI	ADECUACION DE ESPACIO, PISOS Y PINTURA		$ 6.738.412,46			$ 6.738.412,46	$ 6.738.412,00	$ 0,46	EJECUTADO 100%	ok
15/03/2019	9	SEDE CENTRAL BLOQUES EN GENERAL	$ 7.260.933,96	SI	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS		$ 7.260.933,96			$ 7.260.933,96	$ 7.260.933,96	$ -	EJECUTADO 100%	ok
05/06/2019	10	TEUSAQUILLO	$ 28.586.540,30	SI	VENTANAS FACHADA-CUBIERTAS-CUARTO RACK			$ 14.738.387,91		$ 14.738.387,91	$ 32.938.223,57	$ 18.199.835,66	EJECUTADO 100%	pendiente
05/06/2019	11	SEDE USME	$ 94.787.208,10	SI	MTTO. CUBIERTA,					$ -	$ 67.776.114,42	$ 67.776.114,42	EJECUTADO 100%	pendiente
05/06/2019	12	SEDE KENNEDY	$ 35.845.810,35	NO	CAMBIO VENTANERIA					$ -		$ -	SIN APROBAR	
05/06/2019	13	SEDE ANTONIO NARIÑO	$ 24.160.753,00	SI	CUBIERTA-PISO LAMINDO					$ -	$ 24.442.317,48	$ 24.442.317,48	EJECUTADO 100%	pendiente
05/06/2019	14	BOSA SEGUNDA FASE	$ 14.330.538,70	NO	REJA FORJA					$ -	$ -	$ -	NO SE VA A HACER	
18/06/2019	15	TUNJUELITO	$ 12.228.556,00	SI	BAÑO DISCAPACIDAD- COCINA			$ 13.561.602,24		$ 13.561.602,24	$ 13.561.602,24	$ -	EJECUCION AL 100%	pendiente
12/06/2019	16	USAQUEN	$ 15.768.900,00	SI	CARPA, REJILLA CARCAMO, PUESTOS DE TRABAJO					$ -	$ 15.768.900,00	$ 15.768.900,00	EJECUCION DEL 8%	pendiente
02/06/2019	17	BODEGA PFISICAS	$ 6.132.105,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 4.438.476,00		$ 4.438.476,00	$ 4.438.476,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
02/06/2019	18	SEDE ENGATIVA	$ 4.630.500,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 3.351.600,00		$ 3.351.600,00	$ 3.351.600,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
02/06/2019	19	SEDE RAFAEL URIBE	$ 1.494.990,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 1.082.088,00		$ 1.082.088,00	$ 1.082.088,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
02/06/2019	20	BODEGA SAN ISIDRO	$ 12.654.495,00	SI	LIMPIEZA Y PODAS			$ 9.159.444,00		$ 9.159.444,00	$ 9.159.444,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
1 JUNIO-30 JUNIO	21	SEDE CENTRAL	$ 9.135.000,00	SI	AIRES ACONDICIONADOS RACK			$ 18.270.000,00		$ 18.270.000,00	$ 18.270.000,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
1 JUNIO-30 JUNIO	22	TODAS LAS SEDES	$ 95.634.000,00	SI	FUMIGACIÓN			$ 95.634.000,00		$ 95.634.000,00	$ 95.634.000,00	$ -	EJECUCION AL 100%	OK
1 ABRIL A 15 MAYO DE 2019	23	TODAS LAS SEDES	$ 7.302.000,00	SI	ACARREOS			$ 7.302.960,00		$ 7.302.960,00	$ 7.302.000,00	$ 960,00	EJECUTADO 100%	OK
	24	USME	$ 1.915.200,00	SI	PODA			$ 1.915.200,00		$ 1.915.200,00	$ 1.915.200,00	$ -	EJECUTADO 100%	pendiente
05/06/2019	25	SEDE CENTRAL	$ 13.380.559,92	SI	ESCALERA Y REFORZAMIENTO PARALES ENTRADAS			$ 6.500.000,00		$ 6.500.000,00	$ 13.380.559,92	$ 6.880.559,92	EJECUCION 50%	pendiente
	26	BODEGA ROSA ZARATE	$ 1.932.085,00	SI	PUERTA ACCESO PAL, PTOS HIDRAULICOS					$ -	$ 3.432.085,00	$ 3.432.085,00	EJECUCION 90%	pendiente
		NIVEL CENTRAL	$ 2.420.000,00	SI	ARCHIVO RODANTE					$ -	$ 2.420.000,00	$ 2.420.000,00	EJECUCION 35%	pendiente
TOTALES			**$ 770.201.528,20**			**$ 171.507.806,17**	**$ 166.051.337,07**	**$ 251.234.529,00**	**$ -**	**$ 583.761.248,12**	**$ 778.058.350,96**	**$ 188.375.527,38**		
		VALOR DEL CONTRATO	$ 799.974.000,00					$ 246.202.104,88		$ 136.215.351,88	$ 21.915.649,04	$ 188.375.527,38		
			$ 719.976.600,00					$ 5.032.424,12						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	17 Sept/19	**Inicio**	9:00	**Fin**	12 PM	**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**	Contrato 833006/19		
Asistentes	Gysella Belman G PCCEE					**Asistentes Externos**	Jaime Alberto Suarez O		
Fecha de Elaboración	Gysella	**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

Liquidación:

- Acta final: acta, memorias, ~~mayores~~ N/A ~~y menores~~, parafiscales FUEC, RUT DIAN, Certificado cierto, factura,
- Paquete 1
  - Acta Liquidación → Acta Terminación – con remisión a contratista
  - Estado financiero → Aprobación Pólizas
  - C.D → Cierre PIN.
  - Memorando aprobación de poliza. → Informe A.
    - Radicación de Informe – Certificado Áreas
    - Hallazgos Contraloría – Estado Jurídico – PIN cierre
- Paquete 2
  - Acta Terminación – Plan Escombros – Ficha Técnica Colegio
  - Paz y salvo S. P – Manual Mantenimiento – Bitácora.
  - Actas de Entrega – Directorio Obra
  - Formato de Planos. – Inventario llaves.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**		

NOMBRE Laura Gisell Bohórquez	NOMBRE	NOMBRE JAIME A. SUAN	NOMBRE
CARGO PE 624 Supervisor.	CARGO	CARGO R. Legal Syca	CARGO

Pendiente por firma recibido, Usaquén, Antonio Nariño, Rosa Zarate Nivel Central.

PAC Diciembre 80mll.

Se hicieron garantías obra, en Usaquén, Tunjuelito, A Nariño, Rosa Zarate.

Pendiente Orden Barrios Unidos.

Se programa traslado para el 21 Sept al 30 Sept. 2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	22 Oct/19	**Inicio**	9:30	**Fin**	
Proyecto						**Asunto**	
Asistentes	Gysella Pachón.					**Asistentes Externos**	Jaime Alberto Suarez
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Gysella		**Próxima Reunión**	1 Nov/2019

Barrios Unidos

Traslado final para el miercoles 30 octubre 2019.
Acta de terminacion para el 30 octubre 2019.

- Se deben subir la actualizacion de pólizas al SECOP II
→ Se subieron al SECOP.

Chapinero

Arreglar Cubierta. 2 Nov/2019.
Se entrega el Paz y Salvo servicios públicos
se radica informe #4.
→ Pendiente acta recibo Usaquen y funpeliti.

Gysella Pachón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	9/10/2019	**Inicio**	9:10	**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**	Contrato 833006/2019		
Asistentes	Gysella Beltran Sonia Ciona Fonseca					**Asistentes Externos**	Oscar Granados		
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	

DLE BOSA - Orden 5 $53.400.842 - $10.mil adicionales

- Cocina instalada
- Remates aseo OK instalando puerta hoy
- Pintura 100% socalo.
- se instalo piso que se levanto
- Se instalaron columnas
- Entrega 10 Julio/2019
- Cambiar acrílico de cocina y de Hall acceso.

DLE SAN CRISTOBAL

- Soportes TV OK
- Resanes piso OK
- Tapas ciegas OK
- marco puerta OK
- arreglo pintura OK
- Soporte banderas $380.000
- Sonido inicio ayer con personal mantenimiento.
- lampara archivo en instalacion con mantenimiento

- Arreglo muebles pendientes.

Suba

No hay basura, no hay nada pendiente

Pte Aranda

Arreglar lampara Acta para 10 Julio / 2019

Tunjuelito

Pendiente requerimiento ambiente
Acta recibo 10 Julio / 2019.

Fumigaciones


Nivel Central OK San Cristobal OK

Usaquén

- Termino estructura
- Finde semana funde piso
- piso para archivo duro piso 30x30
- rejilla en fabricacion
- Visita Yovani viernes 12 de julio
- Aprobada Película 35%
- Soporte TV. iniciar

Nivel Central

- Se termino arreglo de puertas
- Se hizo fumigacion.
- Viernes instala vidrios
- Escalera - para iniciar 26 de Julio del 2019.

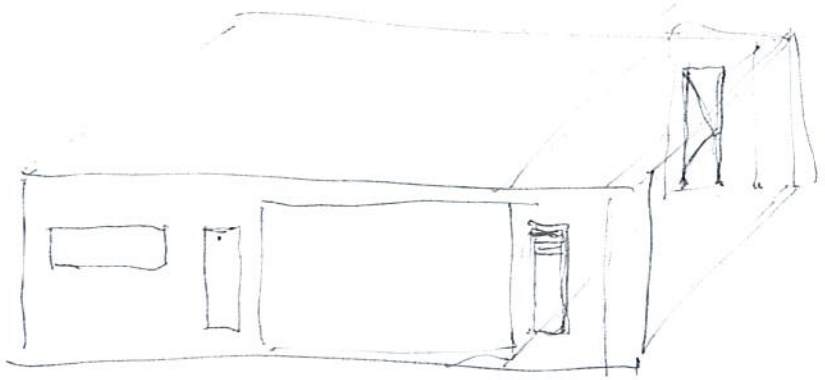

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	Nov. 01/19	**Inicio**		**Fin** 10am 11:00am	**Lugar** Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**	
Asistentes	Yiyinella Beltran Jaime Suarez. Maria Fernanda Rojas G.					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	Nov. 1/19	**Elaborado por**	MFRG.			**Próxima Reunión**	Nov. 6/19.

* Firmada acta de terminación del Contrato.
* Revisar Cantidades Acta Final
* Se corregiran la instalación de lamparas San Cristobal.
* Se solicitan documentos para liquidación
* Enviar Informe 5 - Miercoles 6 Nov/19.
* Se solicita formato liquidacion con cantidades ejecutadas vs contratadas.
* Se debe enviar a contratos el informe 4 → Dir Construcciones.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	Dirección de Construcción
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

NOMBRE Laura Gyselle Beltrán
CARGO PE 624

NOMBRE
CARGO

NOMBRE JAIME ASERRO
CARGO R.C. Syoc. Conh.

NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO
