Informe Final
Supervisión.

833006 / 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación	Ejecución de obras menores de adecuación mejoramiento, reparación y conservación de la infraestructura física y de mobiliario en las diferentes sedes administrativas de la Secretaria de Educación de Bogotá
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 05 FINAL Del 15 julio de 2019 al 30 de octubre 2019 Contrato de Obra no. 833006 de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 FINAL

Según lo establecido numeral 10.6 Informes de supervisión e Interventoría, del Manual de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito adoptado mediante Resolución No. 1333 del 30 de julio de 2014.

Periodo de cobertura del informe 15 de julio del 2019 al 30 de octubre de 2019

a. Información general del contrato

INFORMACION CONTRACTUAL	
CONTRATO DE OBRA	
CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ.	
Contrato No.	833006 de 2019
Contratista	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION
Fecha de Iniciación	15 de marzo del 2019
Fecha de Terminación	14 de noviembre de 2019
Plazo Inicial	8 MESES
Valor Inicial	$ 799.974.000

POLIZA	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR	12-44-101180259	26-03-2019	15-03-2019	03-07-2020
CALIDAD DEL SERVCIO			15-03-2019	16-03-2021
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			15-03-2019	02-01-2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIBADA DE CUMPLIMIENTO	12-40-101041118	12-04-2019	15-03-2019	02-01-2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

Ejecución de obras menores de adecuación mejoramiento, reparación y conservación de la infraestructura física y de mobiliario en las diferentes sedes administrativas de la Secretaria de Educación de Bogotá

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 05 FINAL

Del 15 julio de 2019 al 30 de octubre 2019
Contrato de Obra no. 833006 de 2019


CUADRO CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO S.E.D

DE OR	UBICACIÓN	VALOR DE ORDEN	FECHA ORDEN	ACTIVIDAD	VALOR FINAL	FECHA ENTREGA
1	OFICNAS SAN CRISTOBAL.	$ 63.121.529,60	20/03/2019	Adecuacion de oficnas en muros Divisorios de Drywall y Divisiones en aluminio y Vidrio.	$ 80.534.991	05/05/2019
2	CARRERA 91 No. 146c-29 SEDE SUBA.	$ 78.309.785,17	20/03/2019	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, Enchape Baños, Andenes Aparatos Sanitarios y Pintura	$ 96.178.763	08/06/2019
3	USAQUEN	$ 81.732.818,93	15/04/2019	CONSTRUCCION DE MODULO E INSTALACIÓN DE CARPA	$ 97.496.905	18/08/2019
4	CARRERA 34 # 12-17 PUENTE ARANDA	$ 21.486.761,10	22/03/2019	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura	$ 27.574.463	05/04/2019
5	BOSA	$ 53.400.842,17	22/03/2019	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura	$ 71.645.825	10/07/2019
6	TUNJUELITO	$ 75.811.204,44	20/03/2019	CONSTRUCCION REDES HIROSANITARIAS Y MANTENIMEITNOS EXTERIORES	$ 94.140.507	25/06/2019
7	SEDE CENTRAL CAFETERIA	$ 6.539.911,56	22/03/2019	ADECUACION DE ESPACIO, PISOS Y PINTURA	$ 6.738.412	04/06/2019
9	SEDE CENTRAL BLOQUES EN GENERAL	$ 13.380.559,92	05/06/2019	HIDROSANITARIO	$ 7.260.933	04/07/2019
10	TEUSAQUILLO	$ 28.586.540,30	05/06/2019	VENTANAS FACHADA-CUBIERTAS-CUARTO RACK	$ 32.087.264	23/08/2019
11	SEDE USME	$ 94.787.208,10	05/06/2019	MTTO. CUBIERTA,	$ 63.983.557	22/08/2019
12	SEDE KENNEDY	$ 35.845.810,35	ANULADA	CAMBIO VENTANERIA		ANULADA
13	SEDE ANTONIO NARIÑO	$ 24.160.753,00	05/06/2019	CUBIERTA-PISO LAMINDO	$ 24.742.116	05/09/2019
14	BOSA SEGUNDA FASE	$ 14.330.538,70	ANULADA	REJA FORJA		ANULADA
15	TUNJUELITO	$ 12.228.556,00	18/06/2019	BAÑO DISCAPACIDAD- COCINA	$ 22.345.715	08/08/2019
16	USAQUEN	$ 15.768.900,00	12/06/2019	CARPA, REJILLA CARCAMO, PUESTOS DE TRABAJO	$ 15.070.847	28/08/2019
17	BODEGA PFISICAS	$ 6.132.105,00	02/05/2019	LIMPIEZA Y PODAS	$ 4.438.476	16/07/2019
18	VARIAS SEDES	$ 4.630.500,00	02/05/2019	LIMPIEZA Y PODAS	$ 4.243.987	15/06/2019
19	SEDE RAFAEL URIBE	$ 1.494.990,00	02/05/2019	LIMPIEZA Y PODAS	$ 1.246.795	27/06/2019
20	BODEGA SAN ISIDRO	$ 12.654.495,00	02/05/2019	LIMPIEZA Y PODAS	$ 10.038.855	05/05/2019
21	SEDE CENTRAL	$ 9.135.000,00	05/06/2019	AIRES ACONDICIONADOS RACK	$ 18.270.000	21/06/2019
22	TODAS LAS SEDES	$ 7.147,98	21/05/2019	FUMIGACIÓN	$ 95.634.000	08/07/2019
23	TODAS LAS SEDES	$ 7.302.000,00	NO HAY	ACARREOS	$ 7.302.960	10/06/2019
24	USME	$ 1.915.200,00	01/04/2019	PODA	$ 2.308.582	20/04/2019
25	SEDE CENTRAL	$ 13.380.559,92	NO HAY	ESCALERA Y REFORZAMIENTO PARALES ENTRADAS	$ 11.488.561	22/08/2019
26	BODEGA ROSA ZARATE	$ 1.932.085,00	22/07/2019	ARREGLO DE CANALES Y CUBIERTA, PUERTA ACCESO PAL, PTOS HIDRAULICOS	$ 2.153.045	08/08/2019
27	NIVEL CENTRAL	$ 2.420.000,00	15/09/2019	ARCHIVO RODANTE	$ 3.048.255	20/10/2019
	TOTAL ORDENES	$ 680.495.802,24			**$ 799.973.815**	
				VALOR DEL CONTRATO	$ 799.974.000	
				POR COMPROMETER	-$ 185	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación	Ejecución de obras menores de adecuación mejoramiento, reparación y conservación de la infraestructura física y de mobiliario en las diferentes sedes administrativas de la Secretaria de Educación de Bogotá
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 05 FINAL Del 15 julio de 2019 al 30 de octubre 2019 Contrato de Obra no. 833006 de 2019

FOTOS

USAQUEN

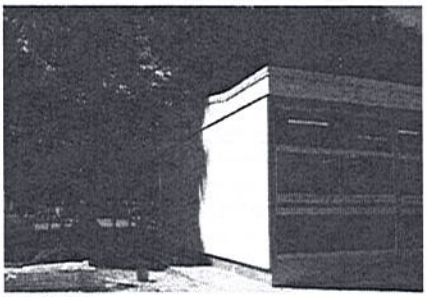


INICIAL

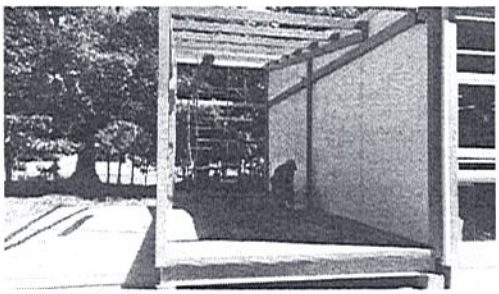

ACTUAL





INICIAL



ACTUAL


TUNJUELITO





INICIAL

CHAPINERO TEUSAQUILLO

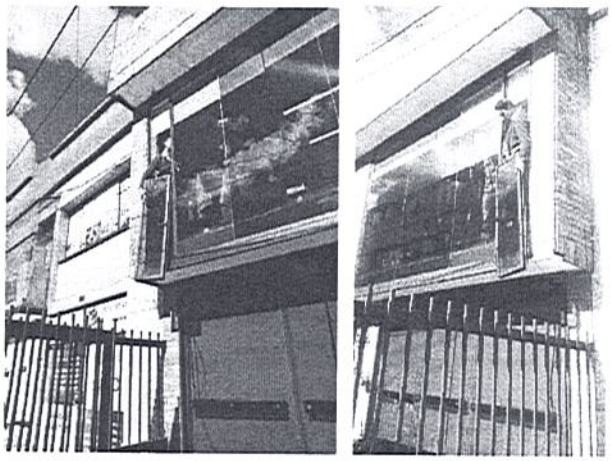

INICIAL



FINAL
