INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME PARCIAL (SEMANAL) __40____ FINAL _____

PERIODO DE: 15 DE NOVIEMBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.	: 131 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN	: No. IP 013 de 2022
OBJETO	: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)".
LOCALIZACIÓN	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
VALOR INICIAL	: $59.800.000 (Cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos)
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	: $ 5.999.868 (Cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos)
VALOR ADICIÓN	: $ 43.588.442 (Cuarenta y tres millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
VALOR FINAL	: $ 97.388.574 (Noventa y siete millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro mil pesos)
PLAZO INICIAL	: Hasta 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	: 8 de septiembre de 2022
SUSPENSIÓN No 1	: 8 de diciembre de 2023

REINICIO No 1 : 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 : 156 días

PRORROGA No. 2 : 50 días

TERMINACION FINAL DEL CONTRARO :31 de diciembre de 2023

CONSULTOR INTERVENTORÍA : BRV Ingeniería y planeación SAS

CONTRATISTA : CONSORCIO JMS-C, conformado por JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC (70%) Y JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA (30%)

CONTRATO No. : 147 DE 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de méritos

PROCESO DE CONTRATACIÓN : No. 07 de 2022

OBJETO : Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

LOCALIZACIÓN Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

VALOR : $1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos)

PLAZO INICIAL : Hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE INICIO : 8 de septiembre de 2022

SUSPENSIÓN No 1 : 8 de diciembre de 2023

REINICIO No 1 : 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 **:** 156 días

PRORROGA No. 2 **:** 50 días

TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO **:**31 de diciembre de 2023

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El presente informe semanal, pertenece a la semana número 40 del contrato de interventoría No. 131 de 2022, dicha semana está comprendida entre el 15 de noviembre al 21 de noviembre de 2023.

A continuación, se relacionan las actividades y oficios enviados por la **consultoría** en el avance de la semana No. 40:

- El 15/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-454-2023, la consultoría remite a Nación-Consejo Superior de la Judicatura con copia a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, respuesta a comunicado DEAJUIFO23-538. Comentarios de interventoría a presunto incumplimiento por tema de SERIE 3 de la Sede Zipaquirá. Prueba de no entrega de diseños existentes.

- El 15/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-455-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado DEAJUIFO23-528. Estudio de Vulnerabilidad, Sede Zipaquirá.

- El 16/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-456-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado DEAJUIFO23-576. Observaciones al componente ambiental, Sede Barrancominas.

- El 16/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-457-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado DEAJUIFO23-577. Observaciones al componente ambiental, Sede Bolívar.

- El 16/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-458-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado BRV-INT-CSJ-409-2023. Componente estructural. Sede Barrancominas.

- El 17/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-459-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado BRV-INT-CSJ-409-2023. Actualización de póliza, contrato 147/2022.

- El 17/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-460-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado DEAJUIFO23-578 y BRV-INT-CSJ-409-2023. Componente ambiental Sede Concordia.

- El 17/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-461-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado DEAJUIFO23-587. Componente Mobiliario Sede Orocué.

- El 17/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-462-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a comunicado BRV-INT-CSJ-410-2023. Componente estructural. Sede La Primavera.

- El 17/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-463-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, entrega TOMO 5. Arquitectura. Diseño Paisajismo. Sede Concordia.

- El 17/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-464-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, entrega TOMO 5. Arquitectura. Memoria Arquitectónica. Sede Bolívar.

- El 20/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-465-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a BRV-INT-CVSJ-412-2023. Componente estructural. Sede Concordia.

- El 20/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-466-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a DEAJUIFO23-579 Y BRV-INT-CVSJ-394-2023. Componente ambiental. Sede La Primavera.

- El 20/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-467-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a BRV-INT-CVSJ-411-2023. Componente estructural. Sede Orocué.

- El 21/11/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-468-2023, la consultoría remite a BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia UIF-CSJ, respuesta a BRV-INT-CVSJ-411-2023. Diseño paisajístico. Sede Barrancominas.

A continuación, se relacionan las actividades contractuales y oficios enviados por la **interventoría,** en el avance de la semana No. 40 del contrato:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-422-2023	15/11/2023	Remisión de documentos para tramite de pago de interventoría Sede Neiva (Huila) Modificatorio del 3 de mayo de 2023.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-423-2023	16/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-455-2023 – Respuesta a los oficios DEAJUIFO23-526 y DEAJUIFO23-528 con respecto a la	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		aceptación condicionada del aval al estudio geotécnico para la red de alcantarillado pluvial y sanitario para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.	
BRV-INT-CSJ-424-2023	20/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-328-2023 - Observaciones al presupuesto del diagnóstico arquitectónico para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-425-2023	20/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-355-2023 - Observaciones al Presupuesto optimización de redes hidrosanitarias y sistema contraincendios para la Sede Judicial de	Consultoría

		Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.	
BRV-INT-CSJ-426-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-445-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Orocué (Casanare) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-427-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-446-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Bolívar (Cauca) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-428-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-447-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-429-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		448-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía) Versión 0.	
BRV-INT-CSJ-430-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-449-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-431-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-406-2023. Aval a la Conexión de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-432-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-456-2023. Aval al informe del componente ambiental sede	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Barrancominas (Guainía) Versión 1.	
BRV-INT-CSJ-433-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-457-2023. Aval al informe del componente ambiental sede de Bolívar (Cauca) Versión 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-434-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-460-2023. Aval al informe del componente ambiental sede Concordia (Magdalena) Versión 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-435-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-466-2023. Aval al informe del componente ambiental sede La Primavera (Vichada) Versión 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-436-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-469-2023. Aval al	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		informe del componente ambiental sede Orocué (Casanare) Versión 0.	
BRV-INT-CSJ-437-2023	21/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-470-2023 – Respuesta al oficio DEAJUIFO23-600 con respecto a la consulta de actualización catastral ante el IGAC para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-438-2023	21/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-451-2023 - Observaciones al diagnóstico estructural para la propuesta de anclajes que permitan el retiro del casetón de guadua existente en la Sede Judicial de Zipaquirá	Consultoría

		Cundinamarca) - Versión 0.	

En la semana número 40 la **interventoría** hizo él envió de diferentes oficios dando respuesta y remitiendo información ya sea a la entidad o a la consultoría como se muestra en la anterior tabla. El día 21/11/2023 se envió el Aval al informe del componente ambiental de las sedes nuevas.

1.2. GARANTÍAS

INTERVENTORÍA:

- La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexo 0 conforme al contrato, fue cargada en la plataforma SECOP II el 8/08/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se debían hacer a esta. Una vez realizados los ajustes y diferentes verificaciones, se aprobó en el SECOP II el día 25/08/2022.
- La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexos 1,2 y 3 al acta de inicio, fue cargada a la plataforma SECOP II el 26/09/2022 y aprobada en SECOP II el 04/10/2022.
- La póliza correspondiente al reinicio 1 fue cargada por la interventoría el 22/02/2023 y fue aprobada en SECOP II el 09/03/2023.
- La póliza correspondiente al reinicio 2 fue cargada al SECOP II el día 21 de junio de 2023 y después de ser revisada por parte de la entidad fue aprobada el 14 de julio de 2023.
- En cuanto al trámite de la póliza con relación a la prórroga No 2 se está realizando el respectivo trámite ante la aseguradora.

Tabla No. 1 garantías de la interventoría conforme al acta de suspensión 2, reinicio 2 y modificación 1

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 14/07/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	11/11/2023	$ 8.970.000.00

Calidad del servicio	11/03/2023	11/03/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	11/03/2026	$ 8.970.000.00

CONSULTORÍA:

- La póliza 14-44-101160700 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada a la plataforma SECOP II el 22/08/2022 y aprobada en SECOP II el 24/08/2022 por parte de la entidad.

- La actualización de la póliza conforme al acta de inicio se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 05/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-060-2022, nuevamente se carga anexos 1 y 2 de la póliza al SECOP II con las indicaciones dadas por la entidad aún están pendiente de aprobación en la plataforma.

- La actualización de póliza con relación al reinicio 1 se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 21/02/2023 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-161-2023, y con aprobación por parte del CSJ.

- Una vez suplido los requerimientos de la Entidad, la Póliza No. 14-44-101160700 fue aprobada por el CSJ.

- Por condiciones del contrato se genera suspensión No 2 el 3 de marzo de 2023 y se reinicia el 31 de mayo de 2023, se prorroga el contrato evento aprobado en SECOP II el 5 de Junio de 2023 Anexo 8, por lo que se procede a la actualización de póliza y mediante comunicado CEGG-CON-147-52-213-2023 del 6 de Junio de 2023 se remite a interventoría y la entidad las pólizas y de lo cual el 20 de junio, la entidad hace observaciones y se procede a traslado de las mismas ante la aseguradora y el 29 de junio de 2023, se remite por correo electrónico a la entidad de la Dra. María Alejandra Montoya la póliza ajustada para revisión y aprobación para proceder a ser cargada a la plataforma, se carga la respectiva póliza y es aprobada por la entidad el 10 de Julio de 2023, quedando atendido por parte del consultor lo correspondiente a pólizas en su anexo 9.

- En cuanto al trámite de la póliza con relación a la prórroga No 2 se está realizando el respectivo trámite ante la aseguradora.

Tabla No. 2 garantías de la consultoría conforme al reinicio

GARANTÍAS ACTUALIZADAS			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS y MODIFICACIONES			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
Anexo	9		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	11/05/2024	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2022	11/05/2024	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/09/2022	11/11/2026	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	11/11/2023	11/11/2028	$ 301.191.224.50

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el siguiente cuadro se presenta el avance del contrato concurrida la semana número 40, en el cuadro se discrimina el avance para cada 1 de las sedes que se piensan diseñar:

Tabla No.3 Avance físico programado y ejecutado

AVANCE FÍSICO ACUMULADO							
SEMANA No 40							
PERIODO DE 15 AL 21 NOVIEMBRE DE 2023							
GENERALIDADES			AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO		AVANCE Y/O ATRASO
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL PROGRAMADO	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL EJECUTADO	
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	64,470%	3,20%	89,000%	4,42%	24,530%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	64,470%	3,20%	89,000%	4,42%	24,530%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	4,96%	64,470%	3,20%	89,000%	4,42%	24,530%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	64,470%	9,17%	89,000%	12,66%	24,530%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	64,470%	10,71%	89,000%	14,78%	24,530%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	88,520%	22,46%	88,800%	22,53%	0,280%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	100,000%	6,29%	100,000%	6,29%	0,000%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	97,480%	22,05%	95,660%	21,64%	-1,820%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**	**100,00%**		**80,273%**		**91,147%**	**10,874%**

El avance del contrato de consultoría físico total programado como lo describe la anterior tabla corresponde al 80,273% en la semana número 40 de trabajo, aun así, hasta el corte de la semana 40 se ha ejecutado un avance total de 91,147%, lo que genera un valor de avance positivo de 10,874%.

El 10 de noviembre de 2023, se aprobó en el sistema SECOP II, la prórroga No. 2 de los contratos de consultoría No.147 de 2022 y de interventoría No. 131 de 2022. La fecha de terminación actual de estos contratos es del 31 de diciembre de 2023.

Como se observa para todas las sedes después de la modificación en el cronograma debido a la prórroga No. 2 que extiende los contratos de interventoría y consultoría hasta el 31 de diciembre de 2023, se presenta un porcentaje de avance positivo que subsana el atraso presentado en el informe semanal No. 38.

En el **anexo No. 1** del presente informe se muestra el cronograma actualizado aprobado por la **interventoría** que sirve como base para la elaboración de la **Tabla No. 3 Avance físico programado y ejecutado.**

Avance Físico. Contrato 147/2022:

Se presenta a continuación el análisis resumido efectuado para la determinación del avance físico de cada una de las sedes, así como el avance integral total del contrato.

Criterios para evaluación:

Teniendo en cuenta el número de sedes, así como de los entregables en cada una de las mismas, para la determinación de los avances físicos se definieron los siguientes criterios:

- Para cada sede se asigna un porcentaje (%) en peso de cada componente estableció en el Anexo Técnico de Entregables.
- Con lo anterior y el cronograma de ejecución del contrato, se establecen los avances físicos programados de cada actividad.
- Para la determinación del avance ejecutado de actividad para cada sede se asigna un porcentaje de acuerdo con el avance real estimado por el mismo CONSORCIO JMS-C.
- Para la determinación del avance integral, se estima el peso de cada sede en particular del contrato.

Peso en % de entregables para cada sede:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de las sedes de La Primavera, Concordia, Barrancominas, Orocué y Bolívar; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

PESO (%) POR COMPONENTE						
ÍTEM	ACTIVIDADES	SEDES				
		LA PRIMAVERA	CONCORDIA	BARRANCOMINAS	OROCUÉ	BOLÍVAR
		PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)
1	ASPECTOS GENERALES	1%	1%	1%	1%	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	6%	6%	6%	6%	6%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	8%	8%	8%	8%	8%
4	TOPOGRAFÍA	6%	6%	6%	6%	6%
5	ARQUITECTÓNICO	12%	12%	12%	12%	12%
5,3	Esquema Básico Arquitectónico					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico					
5,5	Diseño Arquitectónico					
5,6	Mobiliario					
5,7	Señalización					
5,8	Paisajismo					
6	ESTRUCTURAL	10%	10%	10%	10%	10%
7	HIDROSANITARIO	5%	5%	5%	5%	5%
8	ELÉCTRICO	6%	6%	6%	6%	6%
9	AÍRE ACONDICIONADO	4%	4%	4%	4%	4%
10	AMBIENTAL	3%	3%	3%	3%	3%
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4%	4%	4%	4%	4%
12	SEGURIDAD Y CONTROL	3%	3%	3%	3%	3%
13	TRANSPORTE VERTICAL	3%	3%	3%	3%	3%

14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	10%	10%	10%	10%	10%
15	PRESUPUESTO	4%	4%	4%	4%	4%
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4%	4%	4%	4%	4%
17	LICENCIAS Y PERMISOS					
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO	3%	3%	3%	3%	3%
19	INFORMACIÓN CATASTRAL	5%	5%	5%	5%	5%
20	BIM	3%	3%	3%	3%	3%
		100%	100%	100%	100%	100%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. VULNERABILIDAD:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto a la vulnerabilidad del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

ÍTEM	ACTIVIDADES	PESO (%)
0	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	100%
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)	1,00%
2	VISITAS TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO OBRA EXISTENTE	1,00%
3	ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN	5,00%
3,1	Análisis y diagnóstico de Estudio de Patología de la Sociedad Colombiana de Ingenieros	
3,2	Análisis de estudios de suelos realizados	
3,3	Análisis de la información referente a diseños estructurales realizados	
4	VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL	4,00%
5	PATOLOGÍA ESTRUCTURAL (ADICIONAL)	
5,1	Definición de programa de ensayos	1%
5,2	Metodología de ensayos y programación general de actividades	3%
5,3	Ejecución de ensayos	7%
5,4	Ensayos de laboratorios y resultados	5%

5,5	Análisis de Resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	7%
6	ESTUDIO DE SUELOS	
6,2	Análisis de la información secundaria	2%
6,2	Definición de programada y metodología	3%
6,3	Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)	14%
6,4	Ensayos de laboratorio	8%
6,5	Estudio de suelos y recomendaciones	7%
7	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	7%
7,1	Memorias	
7,2	Planos	
8	ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO	1%
8,1	Alternativa 1	
7,2	Alternativa 2	
7,3	Alternativa 3	
9	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	15%
8,2	Memorias	
8,3	Planos	
10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO	2,50%
11	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	2,50%
12	PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA	2,00%
13	TRÁMITE DE LICENCIA	2,00%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. DIAGNÓSTICO:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto al diagnóstico del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

1	ASPECTOS GENERALES	0,50%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	3,50%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	2,00%
	Exploración e campo	
3,1	Ensayos y Resultados	
3,2	Geofísica	
3,3	Geotecnia	
3,4	Sísmica	

4	TOPOGRAFÍA	2,00%
4,1	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	
4,2	Levantamiento topográfico detallado de franja para las redes de conexión. Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá)	
5	ESTRUCTURAL	1,50%
5,1	Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación	
6	HIDROSANITARIO	
6,1	Definición de alternativas	0,50%
6,2	Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
6,3	Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
7	FIBRA ÓPTICA	1,50%
	Memoria técnica y planimetría para la conexión de fibra óptica	
8	AMBIENTAL	2,00%
8,1	Riesgos ambientales	
8,2	Informe de Arborización existente	
9	PRESUPUESTO	2,50%
	Presupuesto	
10	MANUAL DE ESPECIFICACIONES	2,50%
	Especificaciones de Obra	
11	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	1,50%
	1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial.	
	2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	

	3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).	
	4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.	
	5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	
	6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	
12	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO	
12,1	DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO	1,00%
12,2	DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE REDES ELÉCTRICAS	1,00%
12,3	DIAGNÓSTICO HIDROSANITARIO	1,00%
12,4	DIAGNÓSTICO SISTEMA CONTRAINCENDIOS	1,00%
13	PRUEBAS (ADICIONAL) - PRUEBAS E INFORMES	
13,1	SISTEMA HIDROSANITARIO	
13,1,1	Pruebas red de suministro de agua potable	3,00%
13,1,2	Pruebas de sistema sanitario	3,00%
13,1,3	Pruebas sistema de aguas lluvias	2,00%
13,1,4	Pruebas sistema bombeo	3,00%
13,2	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	
13,2,1	Pruebas redes sistema Contraincendios	8,00%
13,2,2	Pruebas sistema bombeo	7,00%
13,3	SISTEMA ELÉCTRICO	
13,3,1	Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia	15,00%
13,3,2	Pruebas redes eléctricas, voz y datos	25,00%
14	TRABAJOS EN ALTURA	

14,1	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	1,00%
14,2	2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	1,00%
15	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	
15,1	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1,00%
16	INFORMACIÓN CATASTRAL	
16,1	Diagnóstico Catastral	2,00%
16,2	Trámites saneamiento.	2,00%

Los porcentajes de avance físico en el periodo del contrato de **interventoría** son iguales a los del contrato de consultoría ya que los dos contratos van ligados y llevan el mismo avance de la siguiente manera:

Contrato 147 de 2022 Estudios y diseños:

Avance Físico Programado 80,273%

Avance Ejecutado físico 91,147%

Contrato 131 de 2022 Interventoría:

Avance Físico Programado 80,273%

Avance Ejecutado físico 91,147%

Avance sedes de Barrancominas, Bolívar, Concordia, la primavera y Orocué:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte	Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
Semana 40 del 15 de noviembre al 21 de noviembre del año 2023	Sin aval de interventoría
	Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
	Sin presentar por consultor
	Revisión interventoría

Entregables			Sedes				
N°	**Tomos**	**Capítulos (mínimo:**	**Barrancominas (Guainía)**	**Bolívar (Cauca)**	**Concordia (Magdalena)**	**La Primavera (Vichada)**	**Orocué (Casanare).**
1	**Aspectos generales**	Información general del contrato	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-
2	**Informe base preliminar**		APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-271. 14/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-263. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-272. 14/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-273. 14/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-274. 14/07/2023
3	**Geofísica y suelos**	Constantes elásticas	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-572. 09/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-462. 11/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-573. 09/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-574. 09/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-575. 09/11/2023
4	**Topografía**	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-473. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-477. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-476. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-475. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-474. 12/10/2023
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)					
5	**Arquitectónico**	Diseño arquitectónico	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-382. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-383. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-384. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-385. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-386. 22/09/2023
		Diseño Mobiliario					
		Señalización	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-424-2023. 30/10/2023	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-425-2023. 31/10/2023	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-423-2023. 30/10/2023	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-422-2023. 30/10/2023	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-394-2023. 13/10/2023
		Paisajismo		REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-440-2023. 06/11/2023	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-463-2023. 20/11/2023		REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-393-2023. 13/10/2023

6	**Estructural**	Memoria Técnica estructural	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-374-2023 del 17/10/2023 se envío a la consultoría Observaciones al Informe estructural.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-376-2023 del 17/10/2023 se envío a la consultoría Observaciones al Informe estructural.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-375-2023 del 17/10/2023 se envío a la consultoría Observaciones al Informe estructural.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-365-2023 del 11/10/2023 se envío a la consultoría Observaciones al Informe estructural.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-373-2023 del 17/10/2023 se envío a la consultoría Observaciones al Informe estructural.
		Diseño estructural					
10	**Ambiental**	Riesgos ambientales	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-377-2023 del 18/10/2023 se dio Observaciones al componente ambiental	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-378-2023 del 18/10/2023 se dio Observaciones al componente ambiental	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-379-2023 del 18/10/2023 se dio Observaciones al componente ambiental	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-380-2023 del 18/10/2023 se dio Observaciones al componente ambiental	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-381-2023 del 18/10/2023 se dio Observaciones al componente ambiental
		Informe de Arborización existente					
11	**Red de detección y extinción de**	Memoria técnica					
		Memoria de calculo					
		Planos					
12	**Seguridad y control**	Memoria técnica					
		Planos					
13	**Transporte vertical**	Memoria técnica	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-482. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-387. 22/09/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-388. 22/09/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-484. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-483. 12/10/2023
14	**Construcción sostenible**	Energía - Medidas Activas		REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-391-2023. 11/10/2023			REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-381-2023. 05/10/2023
		Energía - Medidas Pasivas					
		Agua - Medidas Bajo Consumo					
		Otras Medidas de Construcción Sostenible					
20	**Información catastral**	Diagnóstico Catastral	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-478. 12/10/2023		APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-536. 01/11/2023		APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-594. 17/11/2023
		Tramites saneamiento.					
21	**Entregable bim**	Información geométrica					
		Información no geométrica	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023

Avance sede de Zipaquirá Cundinamarca:

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 4
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF	
Sin aval de interventoría	
Avalado por interventoría y aceptado por UIF.	
Sin presentar por consultor	
Revisión interventoría	

Periodo de corte				
Semana 40 del 15 de noviembre al 21 de noviembre del año 2023				
Entregables			**Sedes**	
N°	**TOMOS**	**CAPÍTULOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**
1	**ASPECTOS GENERALES**	**Información general del contrato**	1.- N° contrato	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022. 06/10/2022
			2.- Objeto	
			3.- Valor	
			4.- Duración	
			5.- Interventoría	
			6.- Supervisor	
			7.- Pólizas.	
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-486. 12/10/2023
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.),	

3	GEOFÍSICA Y SUELOS	**Constantes elástic**	Ensayos y resultados	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-596. 17/11/2023
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	
			3.- Espectro elástico de diseño	
		Geotécnica	Estudio de suelos	
			1.- Introducción	
			2.- Generalidades	
			3.- Trabajos de investigación	
			4.- Estratigrafía	
			5.- Propiedades del suelo	
			6.- Capacidad portante	
			7.- Estabilidad de taludes	
			8.- Conclusiones y recomendaciones	
			a.- Suelos	
			b.- Sistema de fundación	
			c.- Sistema estructural	
			d.- Muros de contención	
4	TOPOGRAFÍA		7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-597. 17/11/2023
			8 - Registro Fotográfico.	
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	
			9 - Certificaciones de los Equipos.	
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	
5	ESTRUCTURAL	**Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación**	1.- Descripción general	REVISIÓN CONSULTORÍA. Oficio BRV-INT-CSJ-438-2023. 21/11/2023
			2.- Cargas de diseño	
			3.- Combinación de cargas	
			4.- Análisis estructural	
			5.- Diseño estructural	
			6.- Especificación de materiales	
			7.- Modelo estructural.	
6	HIDROSANITARIO	**Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas**	1.- Generalidades	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-179-2023 del 26 de abril de 2023 se dio Aprobación de pruebas complementarias recomendadas a Redes Hidrosanitarias, Red de Subdrenaje y Sistema Contraincendios – Sede Judicial Zipaquirá.
			a.- Localización	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-341-2023 del 04/10/2023 se dioAval del informe de actividad de suministro de agua y desinfección de zonas húmedas.
			b.- Bases técnicas	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-194-2023 del 12 de mayo de 2023 se dioAprobación del Informe de diagnóstico redes hidrosanitarias, red de subdrenaje y sistema contra incendio para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).
			c.- Materiales de construcción	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-217-2023 del 21 de junio de 2023 se enviaron Observaciones al Informe de diagnóstico redes hidrosanitarias, red de subdrenaje y sistema contra incendio para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca)
			2.- Instalaciones pluviales	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-241-2023 del 14 de julio de 2023 se dio aval por parte de interventoría del diseño hidráulico del sistema pluvial y sanitario para la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca Versión No. 1.
9	PRESUPUESTO	**Presupuesto**	1.- Presupuesto resumen por capítulos	PRESUPUESTO CONEXIÓN EAAAZ REVISIÓN CONSULTORÍA. Oficio DEAJUIFO23-598. 17/11/2023
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	PRESUPUESTO DIAGNOSTICO ARQUITECTONICOREVISIÓN CONSULTORÍA. Oficio BRV-INT-CSJ-424-2023. 20/11/2023
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.	
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.	

10	MANUAL DE ESPECIFICACIONES	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	REVISIÓN ENTIDAD. Oficio BRV-INT-CSJ-418-2023. 14/11/2023
			a.- Unidad de medida	
			b.- Descripción	
			c.- Procedimiento de ejecución	
			d.- Tolerancia para aceptación	
			e.- Ensayos a realizar	
			f.- Materiales	
			g.- Equipos	
			h.- Referencias y otras especificaciones	
			i.- Medida y forma de pago	
			j.- No conformidad	
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	
12	Revisión y diagnósticos	Red y equipos de aire acondicionado	c.- Levantamiento en planos de la red y equipos de aire acondicionado	Diagnóstico R. Hidrosanitaria y R.C.I. APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-595. 17/11/2023
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Diagnóstico Arquitectonico fase 1 y 2 APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-277. 17/07/2023
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Diagnóstico al sistema eléctrico y sistemas anexos APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-479. 12/10/2023
		Red interna, externa y equipos eléctricos	1. Informe	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-350-2023 del 06 de octubre de 2023 se dio Aval a la Conexión eléctrica definitiva
			a - Diagnóstico de redes instaladas	
			b - Diagnóstico de equipos instalados	
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	
			1. Informe	
13	TRABAJOS EN ALTURA	Propuesta técnica para hacer trabajos en altura	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-488. 12/10/2023
			2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	
14	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1. Informe	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-487. 12/10/2023
			2. Tramites y permisos desplegados para la obtener la autorización del Plan de Manejo de Tráfico.	
			3. Radicación del PMT junto con la totalidad de los documentos necesarios.	
15	INFORMACIÓN CATASTRAL	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-266-2023 de 16/08/2023 se dio el aval de interventoría del Informe catastral para la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca Versión No. 0.
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	
			a - áreas.	
			b - Cabida y Linderos.	
			c - titularidad.	
			d - Personas que intervienen en el acto.	
			e - Titularidad de dominio	
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 3
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VULNERABILIDAD SISMICA

Periodo de corte		
Semana 40 del 15 de noviembre al 21 de noviembre del año 2023		Por aprobar UIF (CSJ)
		Sin aprobar (consultor está haciendo ajustes)
		Aprobado por interventoría y UIF (CSJ)
		Sin presentar por consultor
		Revisión interventoría

Entregables		Sedes		
Nº	Tomos	Capítulos mínimos	Contenido mínimo	Zipaquirá (Cundinamarca)
		1. Relación total de documentos existentes que se utilizaron en la construcción de la estructura original y los cuales fueron utilizados como parte de la evaluación y diseño.	1. Informe de revisión del estudio geotécnico, perfil sísmico y especificaciones de la NSR-10.	Propuesta reforzamiento estructural APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-489. 13/10/2023
			2. Informe de revisión del Estudio de suelos.	
		2. Evaluación del estado actual de la edificación.	3. Informe revisión geotecnia (Informe de revisión del estudio de suelos y análisis de la cimentación para la vulnerabilidad sísmica edificio consejo superior de la Judicatura Sede Zipaquirá.	
			4. Informe de revisión de los diseños presentados por CSJ frente a la NSR-10. incluye revisión de los títulos J y K de la misma.	
		3. Descripción de la definición de los parámetros de evaluación y diseño que proviene del estudio de la situación actual.	5. Informe de revisión reforzamiento (Revisión memorias de reforzamiento, revisión de muro perimetral, revisión de accesos peatonal, vehicular y plataforma de parqueaderos, revisión de coherencia planos arquitectónicos y de reforzamiento).	

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

En cuanto al contrato de consultoría el avance financiero en la semana número 40 de trabajo se ha mostrado de la siguiente manera:

Tabla No. 4 Avance financiero programado vs ejecutado

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO							
SEMANA No 40							
PERIODO DE 15 AL 21 NOVIEMBRE DE 2023							
GENERALIDADES			FINANCIERO				
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	PROGRAMADO POR SEDE		EJECUTADO POR SEDE		AVANCE Y/O ATRASO
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 25.143.300,00	64,47%	$ 34.710.000,00	89,00%	24,530%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 25.143.300,00	64,47%	$ 34.710.000,00	89,00%	24,530%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 25.143.300,00	64,47%	$ 34.710.000,00	89,00%	24,530%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	$ 72.045.225,00	64,47%	$ 99.457.500,00	89,00%	24,530%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	$ 84.133.350,00	64,47%	$ 116.145.000,00	89,00%	24,530%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	$ 176.503.149,28	88,52%	$ 177.061.451,15	88,80%	0,280%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	$ 49.407.082,45	100,00%	$ 49.407.082,45	100,00%	0,000%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	$ 173.238.374,03	97,48%	$ 170.003.927,58	95,66%	-1,820%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**	**100,00%**	**$ 630.757.080,76**	**80,27%**	**$ 716.204.961,18**	**91,15%**	**10,874%**

% de avance financiero semanal programado: 6,78%

% de avance financiero semanal ejecutado: 2,02%

% de avance financiero programado acumulado: 80,27%

% de avance financiero ejecutado acumulado: 91,15%

Se aclara que los porcentajes de avance ejecutado en la **tabla No. 4** no es en su totalidad de dinero que se ha cobrado o ha sido suministrado el Consejo Superior de la Judicatura, parte de este porcentaje se adquiere debido al dinero que ha invertido el consultor en este caso el consorcio JMS-C de sus propias arcas. Por lo cual, el avance financiero ejecutado acumulado en el contrato es del 50%, que corresponde al valor del anticipo.

El avance financiero de la **interventoría** no se calcula debido a que la empresa en este caso BRV Ingeniería y planeación SAS rechazo el anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos. Como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad:



BRV SAS INGENIERÍA Y PLANEACIÓN NIT 900.654.302-3

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS
GEOTECNIA – TRANSITO Y TRANSPORTE

BRV – 016 – 2022

Bogotá D. C., 27 de Julio de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección ejecutiva de administración judicial
Ciudad.

Asunto: **Rechazo al anticipo estipulado en la invitación pública del proceso IP-013-2022.**

Referencia: **Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barranco minas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**

Cordial saludo,

De acuerdo con el mensaje recibido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II el día 26 de julio de 2022, con objeto "ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL ANTICIPO", Yo Gabriel Andrés Velandia García, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. con NIT. 900.654.302-3, por medio de la presente **RECHAZO** el anticipo estipulado en la invitación pública del proceso en mención, para de este modo poder continuar con el trámite de inicio de dicho proceso.

Quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de la entidad.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Gabriel Andrés Velandia García
C.C. 80.074.228 de Bogotá D.C.
Representante legal BRV Ingeniería y Planeación SAS.

Ingenieros
Consultores – Estudios Geotécnicos y Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte
Carrera 7ª No. 156 – 52, Oficina 405 en Bogotá D. C. – Colombia / *Tele fax:* 672 28 28,
Cel: 301 245 44 55 / 310 789 27 53 *E-mail:* brvingenieria@gmail.com, contacto@brvingenieria.com

De igual manera se aclara que el pago de la interventoría se efectuara mediante LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL de cada proyecto, se solicitó la adición del contrato 131 de 2022 por el tiempo a extender el mismo (4 meses), adicional a los cinco (5) meses estipulados para ejecutar dicho contrato en un inicio, después se sumaron los valores de todas las sedes descontando la sede de Neiva Huila debido al retiro de dicha sede del proyecto, por ende se organizaron y pactaron los pagos de la siguiente manera:

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022			
Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Vr. Establecido contrato (7 sedes)	$ 11.960.000,00	5	$ 59.800.000,00
Vr. Ejecutado con 7 sedes	$ 11.960.000,00	3	$ 35.880.000,00
Vr. Ejecutado con 6 sedes	$ 10.251.429,00	2	$ 20.502.858,00
Saldo contrato a favor de la Entidad			$ 3.417.142,00

Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Adición requerida	$ 10.251.429,00	4	$ 41.005.716,00
Saldo condiciones iniciales contrato			$ 3.417.142,00
Valor adición del contrato			**$ 37.588.574,00**
Valor total del contrato			**$ 97.388.574,00**

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL (FACTURADO)

Dentro del presente informe no se reporta avance en gasto presupuestal, teniendo en cuenta que no se ha facturado a la fecha, debido a que se han generado gastos en el contrato No. 147 de 2022 pero que han sido asumidos por el **consultor**. De igual manera se aclara que ya se ha desembolsado el anticipo pactado por parte de la entidad el Consejo Superior de la Judicatura el día 23 de noviembre de 2022. Está pendiente por facturar el costo generado de la Sede Neiva, de acuerdo con las condiciones de modificatorio contractual.

En cuanto al contrato de **interventoría** no se reporta avances en gasto presupuestal ya que se han generado gastos, pero son asumidos por la interventoría debido a que se rechazó el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

Los recursos provenientes del pago del anticipo se invertirán conforme al documento del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-125-2022 del 7 de diciembre y CEGG-CON-147-52-126-2022 del 8 de diciembre de 2022 se remite a la interventoría la solicitud de retiro No 1 y retiro No 2. El cual fue aprobado mediante comunicado BRV-INT-CSJ-132-2022.

Mediante comunicado enviado por la consultoría No. CEGG-CON-147-52-214-2023 del 8 de junio de 2023 se remitió a esta interventoría la solicitud de Retiro No 3 la cual el 15 de junio de 2023, mediante comunicado BRV-INT-CSJ-210-2023 está interventoría da la aprobación correspondiente.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-383-2023 del 6 de octubre de 2023 se remite a interventoría la solicitud de Retiro No 4, a lo cual el 18 de octubre de 2023 mediante comunicado BRV-INT-CSJ-383-2023 la interventoría da la aprobación correspondiente.

Retiro No 1	$34.072.714.00
Retiro No 2	$52.424.038.00
Retiro No 3	$268.648.394.00
Retiro No 4	$57.201.058.49
Total	$412.346.204.49

La interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS renuncio al pago del anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos, como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad.

Tabla No.5 Plan de inversión del anticipo consultoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICPO							
VALOR CONTRATO		$ 1.204.764.898,00					
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 602.382.449,00					
ÍTEM	CONCEPTO DE VALOR			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	VALOR 1. COSTO DIRECTO						
1,1	SALARIOS PERSONAL PROFESIONALES			$ 49.500.000,00	$ 53.500.000,00	$ 54.500.000,00	$ 56.500.000,00
1,2	SALARIOS PERSONAL ADMINSITRATIVO (Adminsitrador, secretaria, contador)			$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00
1,3	IMPUESTOS -POLIZAS			$ 7.013.178,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 4.000.000,00
1,4	GASTOS DE OFICINA (ARRIENDO/SERVICIOS)			$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA			$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD/DOTACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,7	ELABORACIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, IMPRESIONES/COMPRA DE INFORMACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,8	TRASLADOS/TRANSPORTE			$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 1.039.534,00
	TOTAL VALOR 1. COSTO DIRECTOS/MES			$ 78.190.625,00	$ 78.177.447,00	$ 78.177.447,00	$ 78.216.981,00
	TOTAL GASTOA DIRECTOS ACUMULADOS			$ 78.190.625,00	$ 156.368.072,00	$ 234.545.519,00	**$ 312.762.500,00**
2	VALOR 2. COSTOS POR PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARISO Y/O ADICIONALES						
	PROVISIÓN/MES			$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.990,00
	PROVISIÓN ACUMULADO			$ 4.562.988,00	$ 9.125.976,00	$ 13.688.964,00	**$ 18.251.954,00**
	SUB TOTAL . SUMA VALOR 1 + VALOR 2			$ 82.753.613,00	$ 82.740.435,00	$ 82.740.435,00	$ 82.779.971,00
	ACUMULADO SUB TOTAL (1+2)			$ 82.753.613,00	$ 165.494.048,00	$ 248.234.483,00	**$ 331.014.454,00**
3	VALOR 3. IVA (19% DE 1+2)						
	IVA/MES			$ 15.723.186,47	$ 15.720.682,65	$ 15.720.682,65	$ 15.728.194,49
	IVA ACUMULADO			$ 15.723.186,47	$ 31.443.869,12	$ 47.164.551,77	**$ 62.892.746,26**
	VALOR 4. PROVISIÓN PARA TRÁMITES, LICENCIAS, ETC						
4	"PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD"			$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00
	ACUMULADO PROVISIÓN			$ 52.118.812,00	$ 104.237.624,00	$ 156.356.436,00	**$ 208.475.248,00**
							$ 602.382.448,26

NOTAS:

1. Por ser integral el contrato de consultoría el rubro correspondiente a VALOR 2 "PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES", se estimó tentativo por mes, para ser utilizado según necesidades en cada una de las sedes. Este rubro tendrá una contabilidad de uso según requerimientos aprobados

2, La distribución de este rubro "VALOR 3 "PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD" , se distribuyó por sede tentativamente, ya que inicialmente se desconoce los requerimientos de pago para cada sede en particular. Los gastos de este rubro tendrá la contabilidad correspondiente

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el contrato de **consultoría** se efectuó el desembolso del anticipo por parte de la entidad contratante el 23 de noviembre de 2022.

Los rendimientos financieros generados por el desembolso del anticipo se desglosan a continuación. El reporte aquí consignado es a corte de 30 de septiembre de 2023, extraído del extracto y de lo cual será consignado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al finalizar el retiro total del anticipo:

Periodo	Intereses del Periodo
1 Noviembre a 30 de Noviembre de 2022	$ 3.873,97
1 Diciembre a 31 de Diciembre de 2022	$ 16.718,94
1 de Enero a 31 de Enero de 2023	$ 14.470,51
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2023	$ 13.070,53
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2023	$ 14.471,34
1 de Abril a 30 de Abril de 2023	$ 14.004,99
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023	$ 14.472,23
1 de Junio a 30 de Junio de 2023	$ 9.976,06
1 de julio a 31 de Julio de 2023	$ 6.144,82
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2023	$ 6.144,96
1 de Septiembre a 30 Septiembre de 2023	$ 5.946,90
Total a la fecha (Septiembre de 2023)	**$ 119.295,25**

En el contrato de **interventoría** no hay excedentes o rendimientos financieros debido a que la interventoría rechazo el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

En el contrato de **consultoría** se presenta a David Ricardo Araque Castiblanco, como personal con discapacidad y actualmente se encuentra adscrito a la empresa JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC. como parte del Consorcio JMS-C, y así se mantendrá a lo largo de la ejecución del contrato.

Personal en condición de discapacidad del consultor:

Nombre personal	EPS	ARL	Pensión
David Ricardo Araque Castiblanco.	Sanitas EPS	Positiva	Pensionado por invalidez

En el contrato de **interventoría** de acuerdo con el decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad" la interventoría declara que en su personal de trabajo no se encuentran personas en condición de discapacidad y cumple con la norma antes mencionada debido al bajo número total de trabajadores de la planta de personal del proponente.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Hasta la fecha de elaboración del presente informe semanal no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago tanto en el contrato de **consultoría** e **interventoría.**

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 40:

- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-422-2023 del 15 de noviembre de 2023 la Remisión de documentos para tramite de pago de interventoría Sede Neiva (Huila) Modificatorio del 3 de mayo de 2023.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-423-2023 del 16 de noviembre de 2023 la Respuesta a los oficios DEAJUIFO23-526 y DEAJUIFO23-528 con respecto a la aceptación condicionada del aval al estudio geotécnico para la red de alcantarillado pluvial y sanitario para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.
- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-424-2023 del 20 de noviembre de 2023 las Observaciones al presupuesto del diagnóstico arquitectónico para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.
- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-425-2023 del 20 de noviembre de 2023 las Observaciones al Presupuesto optimización de redes hidrosanitarias y sistema contraincendios para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) – Versión 0.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-426-2023 del 20 de noviembre de 2023 el Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Orocué (Casanare) Versión 0.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-427-2023 del 20 de noviembre de 2023 el Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Bolívar (Cauca) Versión 0.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-428-2023 del 20 de noviembre de 2023 el Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena) Versión 0.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-429-2023 del 20 de noviembre de 2023 el Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía) Versión 0.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-430-2023 del 20 de noviembre de 2023 el Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada) Versión 0.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-431-2023 del 20 de noviembre de 2023 el Aval a la Conexión de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-432-2023 del 21 de noviembre de 2023 el Aval al informe del componente ambiental sede Barrancominas (Guainía) Versión 1.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-433-2023 del 21 de noviembre de 2023 el Aval al informe del componente ambiental sede de Bolívar (Cauca) Versión 1.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-434-2023 del 21 de noviembre de 2023 el Aval al informe del componente ambiental sede Concordia (Magdalena) Versión 1.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-435-2023 del 21 de noviembre de 2023 el Aval al informe del componente ambiental sede La Primavera (Vichada) Versión 1.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-436-2023 del 21 de noviembre de 2023 el Aval al informe del componente ambiental sede Orocué (Casanare) Versión 0.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-437-2023 del 21 de noviembre de 2023 la Respuesta al oficio DEAJUIFO23-600 con respecto a la consulta de actualización catastral ante el IGAC para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-438-2023 del 21 de noviembre de 2023 las Observaciones al diagnóstico estructural para la propuesta de anclajes que permitan el retiro del casetón de guadua existente en la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca) - Versión 0.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

- Demoras en respuestas por parte de las entidades involucradas en el proceso, para la obtención de permisos, licencias, factibilidad de servicios.

- Riesgo por demora en envió de aval u observaciones por parte de la interventoría a los diferentes informes presentados por la consultoría, que pueden ocasionar atrasos.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

La **consultoría** manifiesta el cumplimiento en los aspectos ambientales y sociales, estos serán presentados durante la ejecución del contrato en cumplimiento a los planes presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PGA-001-V0 y según tabla 3 del documento “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA” el cual fue revisado por la interventoría y aprobado mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-006-2022.

PROGRAMA 1. COMPRAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LOS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA 2. CONTROL AL CONSUMO DE PAPEL
PROGRAMA 3. GESTIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
PROGRAMA 4. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA 5. AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
PROGRAMA 6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 7. CAPACITACIÓN PERMANENTE

El PGAS para cada sede se hará entrega de éste de acuerdo en el cronograma de actividades aprobado por la interventoría siguiendo las etapas conforme se presenta en el cronograma aprobado por la interventoría.

La **interventoría** acoge dicho componente ambiental que será implementado al contrato No. 131 de 2022.

7.1 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cronograma estipulado por la consultoría en el plan de gestión de sistema de seguridad y salud en el trabajo, las reuniones de sana convivencia en el ambiente y discriminación laboral; para la fecha final del presente informe ya se realizaron con el equipo de trabajo, como se muestra:

Tabla No.6 Cronograma de actividades del PSST

Fecha	Tema
Septiembre 30 de 2022	Sana Convivencia en el Ambiente Laboral. Buenas Prácticas Laborales
Noviembre 25 de 2022	Discriminación Laboral

La **interventoría** acogió dicho calendario para realizar y compartir con su equipo de trabajo las respectivas reuniones que ya fueron realizadas en las fechas estipuladas.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- La interventoría, cuenta con los protocolos y controles internos en la metodología de trabajo para el óptimo desarrollo de las actividades técnicas.
- La consultoría e interventoría en los diferentes documentos generados genera los mecanismos de control de calidad requeridos por la entidad.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SEGUIMIENTO SECOP II)

Los documentos mostrados a continuación son los cargados por parte de la interventoría en la plataforma del SECOP II:

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Comprador	Descargar
	Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Proveedor	Descargar
	Plan de inversión General.pdf	Plan de inversión General.pdf	Proveedor	Descargar
	Plan Inversión de Anticipo.pdf	Plan Inversión de Anticipo.pdf	Proveedor	Descargar
	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	Proveedor	Descargar
	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	Proveedor	Descargar
	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	Proveedor	Descargar
	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	Proveedor	Descargar
	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	Proveedor	Descargar
	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Proveedor	Descargar
	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Proveedor	Descargar
	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Proveedor	Descargar
	Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 1.pdf	Informe supervisor semana 1.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 2.pdf	Informe supervisor semana 2.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 3.pdf	Informe supervisor semana 3.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 4.pdf	Informe supervisor semana 4.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 5.pdf	Informe supervisor semana 5.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 6.pdf	Informe supervisor semana 6.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 7.pdf	Informe supervisor semana 7.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 8.pdf	Informe supervisor semana 8.pdf	Comprador	Descargar
	Informe supervisor semana 9.pdf	Informe supervisor semana 9.pdf	Comprador	Descargar
	Informe de supervision semana 10.pdf	Informe de supervision semana 10.pdf	Comprador	Descargar
	1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar
	1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar

1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar
Informe supervisor mes 1.pdf	Informe supervisor mes 1.pdf	Comprador	Descargar
Informe supervisor mes 2.pdf	Informe supervisor mes 2.pdf	Comprador	Descargar
Acta Reinicio 1 Consultoría CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Consultoría CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor	Descargar
Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor	Descargar
Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Proveedor	Descargar
Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Proveedor	Descargar
Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Proveedor	Descargar
Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Proveedor	Descargar
14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Comprador	Descargar
RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar
RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar
RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar
R.P. 107823 U2.pdf	R.P. 107823 U2.pdf	Comprador	Descargar
BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	Proveedor	Descargar
INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Proveedor	Descargar
ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR.pdf	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR ANEXO 1. CRONOGRAMAS.pdf	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR ANEXO 1. CRONOGRAMAS.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
17. INF. SEM. 17 SUPERVISOR.pdf	17. INF. SEM. 17 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL 17 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 17 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
INFORME SEMANAL No. 18 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 18 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 1 A LA 17.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 1 A LA 17.pdf	Proveedor	Descargar
19. INF. SEM. 19 SUPERVISOR.pdf	19. INF. SEM. 19 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
18. INF. SEM. 18 SUPERVISOR.pdf	18. INF. SEM. 18 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
20. INF. SEM. 20 SUPERVISOR.pdf	20. INF. SEM. 20 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL No. 20 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 20 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
ACTAS DE COMITE SEMANAS 18 Y 19.pdf	ACTAS DE COMITE SEMANAS 18 Y 19.pdf	Proveedor	Descargar
21. INF. SEM. 21 SUPERVISOR.pdf	21. INF. SEM. 21 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL 21 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 21 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
22. INF. SEM. 22 SUPERVISOR.pdf	22. INF. SEM. 22 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL 22 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 22 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
23. INF. SEM. 23 SUPERVISOR.pdf	23. INF. SEM. 23 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 20 A LA 23.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 20 A LA 23.pdf	Proveedor	Descargar
BRV-016-2022 Rechazo anticipo.pdf	BRV-016-2022 Rechazo anticipo.pdf	Proveedor	Descargar
24. INF. SEM. 24 SUPERVISOR.pdf	24. INF. SEM. 24 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
25. INF. SEM. 25 SUPERVISOR.pdf	25. INF. SEM. 25 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar

26. INF. SEM. 26 SUPERVISOR.pdf	26. INF. SEM. 26 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL 27 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 27 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe Mensual No 6 de Supervision.rar	Informe Mensual No 6 de Supervision.rar	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
27. INF. SEM. 27 SUPERVISOR.pdf	27. INF. SEM. 27 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
28. INF. SEM. 28 SUPERVISOR.pdf	28. INF. SEM. 28 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 24 A LA 26.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 24 A LA 26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL No. 28 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 28 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
29. INF. SEM. 29 SUPERVISOR.pdf	29. INF. SEM. 29 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL 29 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 29 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe Mensual No 7 de Supervision.rar	Informe Mensual No 7 de Supervision.rar	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
30. INF. SEM. 30 SUPERVISOR.pdf	30. INF. SEM. 30 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL 30 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 30 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
31. INF. SEM. 31 SUPERVISOR.pdf	31. INF. SEM. 31 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL No. 31 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 31 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
32. INF. SEM. 32 SUPERVISOR.pdf	32. INF. SEM. 32 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
33. INF. SEM. 33 SUPERVISOR.pdf	33. INF. SEM. 33 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL No. 32 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 32 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 27 A LA 32.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 27 A LA 32.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe Mensual No 8 de Supervision Completo.pdf	Informe Mensual No 8 de Supervision Completo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME MENSUAL No. 8 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 8 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
34. INF. SEM. 34 SUPERVISOR.pdf	34. INF. SEM. 34 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Hasta la fecha final del presente informe el contrato de interventoría y consultoría han cargado los correspondientes documentos en el sistema SECOP II encontrándose al día en el cargue de documentos.

10. OBSERVACIONES

- El 10 de noviembre de 2023, se aprobó en el sistema SECOP II, la prórroga No. 2 de los contratos de consultoría No.147 de 2022 y de interventoría No. 131 de 2022. La fecha de terminación actual de estos contratos es del 31 de diciembre de 2023.
- El contrato presenta un porcentaje de avance positivo hasta la fecha final del presente informe, debido a la reprogramación del cronograma que se dio por la prórroga No. 2.
- El comité correspondiente a la presente semana se realizó el día 21 de noviembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 22 días, del mes de noviembre de 2023.

Carol Fernanda González Atehortúa
Representante Legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Contratista

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Consecutivo	Fecha	Dirigido a	Asunto
CEGG-CON-147-52-454	15/11/2023	NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia / BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS / SEGUROS DEL ESTADO S. A	Atención a comunicado DEAJUIFO23-538 del 1 de noviembre de 2023. Atención comunicada CEGG-CON-147-52-413-2023. Comentarios Consultoría a informe de presunto incumplimiento. Contrato de Consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.
CEGG-CON-147-52-455	15/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Atención a comunicado DEAJUIFO23-526 y DEAJUIFO23-528 de 30 de octubre de 2023
CEGG-CON-147-52-456	16/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Atención a comunicado DEAJUIFO23-576 de 9 de noviembre de 2023 - Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-392-2023. Observaciones al informe del componente ambiental sede Barrancominas (Guainía) Versión 0.
CEGG-CON-147-52-457	16/11/2023	BRV INGENIERÍA Y	Atención a comunicado DEAJUIFO23-577 de 9 de

		PLANEACIÓN SAS	noviembre de 2023 - Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-391-2023. Observaciones al informe del componente ambiental sede de Bolívar (Cauca) Versión 0.
CEGG-CON-147-52-458	16/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta al documento BRV-INT-CSJ-409-2023 Aval Condicionado al estudio de memoria técnica estructural – sede Barrancominas (Guainía)
CEGG-CON-147-52-459	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Actualización de Póliza No 14-44-101160700 Contrato 147-2022
CEGG-CON-147-52-460	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Atención a comunicado DEAJUIFO23-578 de 9 de noviembre de 2023 -Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-393-2023. Observaciones al informe del componente ambiental sede Concordia (Magdalena) Versión 0.
CEGG-CON-147-52-461	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Atención al comunicado DEAJUIFO23-587 del 10 de noviembre de 2023. Atención a observaciones de mobiliario sede Orocué (Casanare) V1.
CEGG-CON-147-52-462	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta al documento BRV-INT-CSJ-410-2023 Aval Condicionado al estudio de memoria técnica estructural – sede La Primavera (Vichada)

CEGG-CON-147-52-463	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Diseño Paisajístico Sede Concordia (Magdalena) V0. Tomo 5 Arquitectura.
CEGG-CON-147-52-464	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Tomo 5 Arquitectura. Memoria Técnica Arquitectónica Sede Bolívar (Cauca) V0.
CEGG-CON-147-52-465	20/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta al documento BRV-INT-CSJ-412-2023 Aval Condicionado al estudio de memoria técnica estructural – sede La Concordia (Magdalena)
CEGG-CON-147-52-466	20/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Atención a comunicado DEAJUIFO23-579 de 9 de noviembre de 2023 -Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-394-2023. Observaciones al informe del componente ambiental sede La Primavera (Vichada) Versión 0.
CEGG-CON-147-52-467	20/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta al documento BRV-INT-CSJ-411-2023 Aval Condicionado al estudio de memoria técnica estructural – sede Orocué (Casanare)
CEGG-CON-147-52-468	21/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	: Diseño Paisajístico Sede Barrancominas (Guainía) V0. Tomo 5 Arquitectura.

DEAJUIFO23-594	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-420-2023. Aceptación del Aval del informe catastral para la Sede Judicial de Orocué (Casanare) Versión 0. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.
DEAJUIFO23-595	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-414-2023. Aceptación del Aval al informe de revisión y diagnóstico complementario para el sistema de suministro, sistema de agua residual, sistema pluvial, sistema subdrenajes y sistema contraincendios para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión 0. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.
DEAJUIFO23-596	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-423-2023. Aceptación del Aval al estudio geotécnico para la red de alcantarillado pluvial y sanitario para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.

DEAJUIFO23-597	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-345-2023. Aceptación del Aval del Informe de Topografía sede Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 1. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.
DEAJUIFO23-598	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-417-2023. Observaciones al componente presupuestal de la conexión al sistema sanitario y pluvial para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 1. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.
DEAJUIFO23-599	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-419-2023. Observaciones al estudio de vulnerabilidad para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 2. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.
DEAJUIFO23-600	17/11/2023	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-266-2023. Observaciones al Informe catastral para la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca Versión No. 0. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-422-2023	15/11/2023	Remisión de documentos para tramite de pago de interventoría Sede Neiva (Huila) Modificatorio del 3 de mayo de 2023.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-423-2023	16/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-455-2023 – Respuesta a los oficios DEAJUIFO23-526 y DEAJUIFO23-528 con respecto a la aceptación condicionada del aval al estudio geotécnico para la red de alcantarillado pluvial y sanitario para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-424-2023	20/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-328-2023 - Observaciones al presupuesto del	Consultoría

		diagnóstico arquitectónico para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.	
BRV-INT-CSJ-425-2023	20/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-355-2023 - Observaciones al Presupuesto optimización de redes hidrosanitarias y sistema contraincendios para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-426-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-445-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Orocué (Casanare) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-427-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-446-2023. Aval al	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Bolívar (Cauca) Versión 0.	
BRV-INT-CSJ-428-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-447-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-429-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-448-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-430-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-449-2023. Aval al Manual de Dotación de Mobiliario para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF


BRV-INT-CSJ-431-2023	20/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-406-2023. Aval a la Conexión de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-432-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-456-2023. Aval al informe del componente ambiental sede Barrancominas (Guainía) Versión 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-433-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-457-2023. Aval al informe del componente ambiental sede de Bolívar (Cauca) Versión 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-434-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-460-2023. Aval al informe del componente	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		ambiental sede Concordia (Magdalena) Versión 1.	
BRV-INT-CSJ-435-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-466-2023. Aval al informe del componente ambiental sede La Primavera (Vichada) Versión 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-436-2023	21/11/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-469-2023. Aval al informe del componente ambiental sede Orocué (Casanare) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-437-2023	21/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-470-2023 – Respuesta al oficio DEAJUIFO23-600 con respecto a la consulta de actualización catastral ante el IGAC para la Sede	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	
BRV-INT-CSJ-438-2023	21/11/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-451-2023 - Observaciones al diagnóstico estructural para la propuesta de anclajes que permitan el retiro del casetón de guadua existente en la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca) - Versión 0.	Consultoría

ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES SEDES APROBADO POR LA INTERVENTORÍA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE BARRANCOMINAS GUAINÍA**	**jue 8/09/22**	**dom 31/12/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 4/09/23	dom 31/12/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	jue 8/12/22	mié 15/02/23
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	vie 3/03/23	mar 30/05/23
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 28/06/23	mié 28/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	mié 20/09/23
16		Aprobación Anteproyecto Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 21/09/23
17		Diseño Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 30/11/23
18		Mobiliario	jue 21/09/23	jue 30/11/23
19		Señalización	jue 21/09/23	jue 30/11/23
20		Paisajismo	jue 21/09/23	jue 30/11/23
21		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 1/12/23	lun 4/12/23
22		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 5/12/23	dom 10/12/23
23		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
24		**ESTRUCTURAL**	jue 21/09/23	sáb 4/11/23
25		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	dom 5/11/23	vie 10/11/23
26		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	sáb 11/11/23	mar 14/11/23
27		Trámite FUN Licencia	vie 3/11/23	mar 7/11/23
28		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 15/11/23	sáb 18/11/23
29		**HIDROSANITARIO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
30		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
31		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
32		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
33		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
34		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
35		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
36		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
37		**AIRE ACONDICIONADO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
38		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
39		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
40		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
41		**AMBIENTAL**	**dom 5/11/23**	**sáb 25/11/23**
42		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	mar 28/11/23
43		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mié 29/11/23	mar 5/12/23
44		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	vie 8/12/23
45		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	**lun 20/11/23**	**mar 5/12/23**
46		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	lun 11/12/23
47		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 12/12/23	lun 18/12/23
48		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
49		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mié 15/11/23	dom 10/12/23
50		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
51		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	jue 14/12/23	dom 17/12/23
52		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 18/12/23	mié 20/12/23
53		**TRANSPORTE VERTICAL**	mar 5/09/23	lun 2/10/23
54		Revisón y aprobación interventoría /UIF-CSJ	mar 3/10/23	mar 3/10/23
55		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	**sáb 11/11/23**	**mar 5/12/23**
56		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	sáb 9/12/23
57		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	dom 10/12/23	mar 12/12/23
58		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 13/12/23	vie 15/12/23
59		**PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 15/11/23	sáb 9/12/23
60		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	vie 15/12/23
61		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 18/12/23	jue 21/12/23
62		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 22/12/23	mar 26/12/23
63		**LICENCIAS Y PERMISOS**	sáb 25/11/23	dom 31/12/23
64		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	dom 5/11/23	sáb 25/11/23
65		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	vie 1/12/23
66		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 4/12/23	mié 6/12/23
67		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	jue 7/12/23	lun 11/12/23
68		**INFORMACION CATASTRAL**	**mié 1/11/23**	**lun 20/11/23**
69		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 21/11/23	jue 23/11/23
70		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 24/11/23	mar 28/11/23
71		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 28/11/23	jue 30/11/23
72		**BIM**	mié 31/05/23	dom 31/12/23
73		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	dom 31/12/23	dom 31/12/23

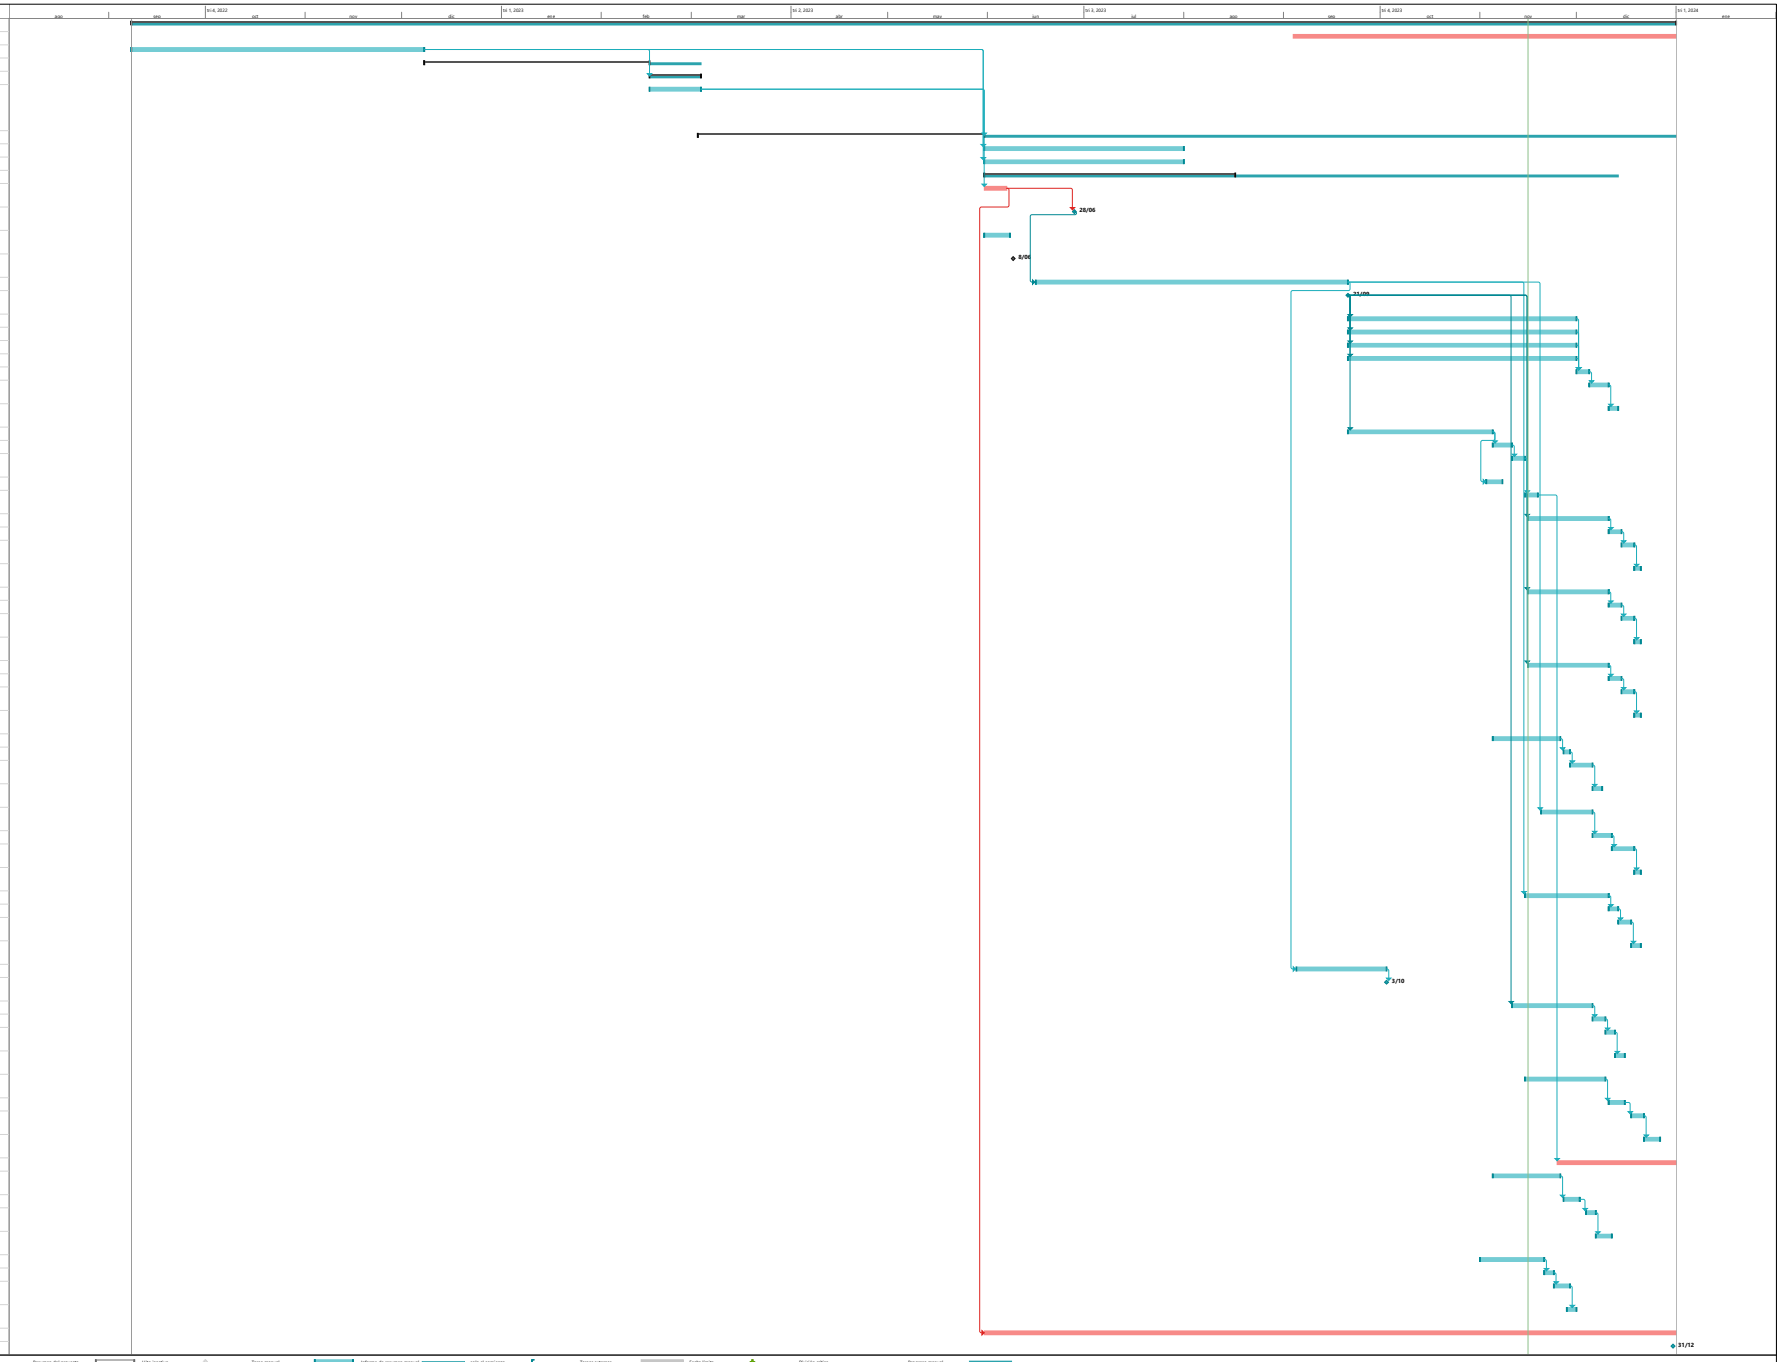

Proyecto: Sede Barrancominas Guainía
Fecha: 31-05-2023

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE BOLÍVAR CAUCA**	**jue 8/09/22**	**dom 31/12/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 4/09/23	dom 31/12/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	jue 8/12/22	mié 15/02/23
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	vie 3/03/23	mar 30/05/23
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mar 4/07/23	mar 4/07/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	mié 20/09/23
16		Aprobación Anteproyecto Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 21/09/23
17		Diseño Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 30/11/23
18		Mobiliario	jue 21/09/23	jue 30/11/23
19		Señalización	jue 21/09/23	jue 30/11/23
20		Paisajismo	jue 21/09/23	jue 30/11/23
21		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 1/12/23	lun 4/12/23
22		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 5/12/23	dom 10/12/23
23		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
24		**ESTRUCTURAL**	jue 21/09/23	sáb 4/11/23
25		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	dom 5/11/23	vie 10/11/23
26		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	sáb 11/11/23	mar 14/11/23
27		Trámite FUN Licencia	vie 3/11/23	mar 7/11/23
28		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 15/11/23	sáb 18/11/23
29		**HIDROSANITARIO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
30		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
31		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
32		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
33		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
34		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
35		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
36		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
37		**AIRE ACONDICIONADO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
38		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
39		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
40		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
41		**AMBIENTAL**	**dom 5/11/23**	**sáb 25/11/23**
42		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	mar 28/11/23
43		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mié 29/11/23	mar 5/12/23
44		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	vie 8/12/23
45		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	**lun 20/11/23**	**mar 5/12/23**
46		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	lun 11/12/23
47		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 12/12/23	lun 18/12/23
48		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
49		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mié 15/11/23	dom 10/12/23
50		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
51		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	jue 14/12/23	dom 17/12/23
52		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 18/12/23	mié 20/12/23
53		**TRANSPORTE VERTICAL**	mar 5/09/23	lun 2/10/23
54		Revisón y aprobación interventoría /UIF-CSJ	jue 28/09/23	jue 28/09/23
55		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	**sáb 11/11/23**	**mar 5/12/23**
56		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	sáb 9/12/23
57		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	dom 10/12/23	mar 12/12/23
58		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 13/12/23	vie 15/12/23
59		**PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 15/11/23	sáb 9/12/23
60		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	vie 15/12/23
61		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 18/12/23	jue 21/12/23
62		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 22/12/23	mar 26/12/23
63		**LICENCIAS Y PERMISOS**	sáb 25/11/23	dom 31/12/23
64		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	dom 5/11/23	sáb 25/11/23
65		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	vie 1/12/23
66		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 4/12/23	mié 6/12/23
67		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	jue 7/12/23	lun 11/12/23
68		**INFORMACION CATASTRAL**	**mié 1/11/23**	**lun 20/11/23**
69		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 21/11/23	jue 23/11/23
70		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 24/11/23	mar 28/11/23
71		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 28/11/23	jue 30/11/23
72		**BIM**	mié 31/05/23	dom 31/12/23
73		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	dom 31/12/23	dom 31/12/23

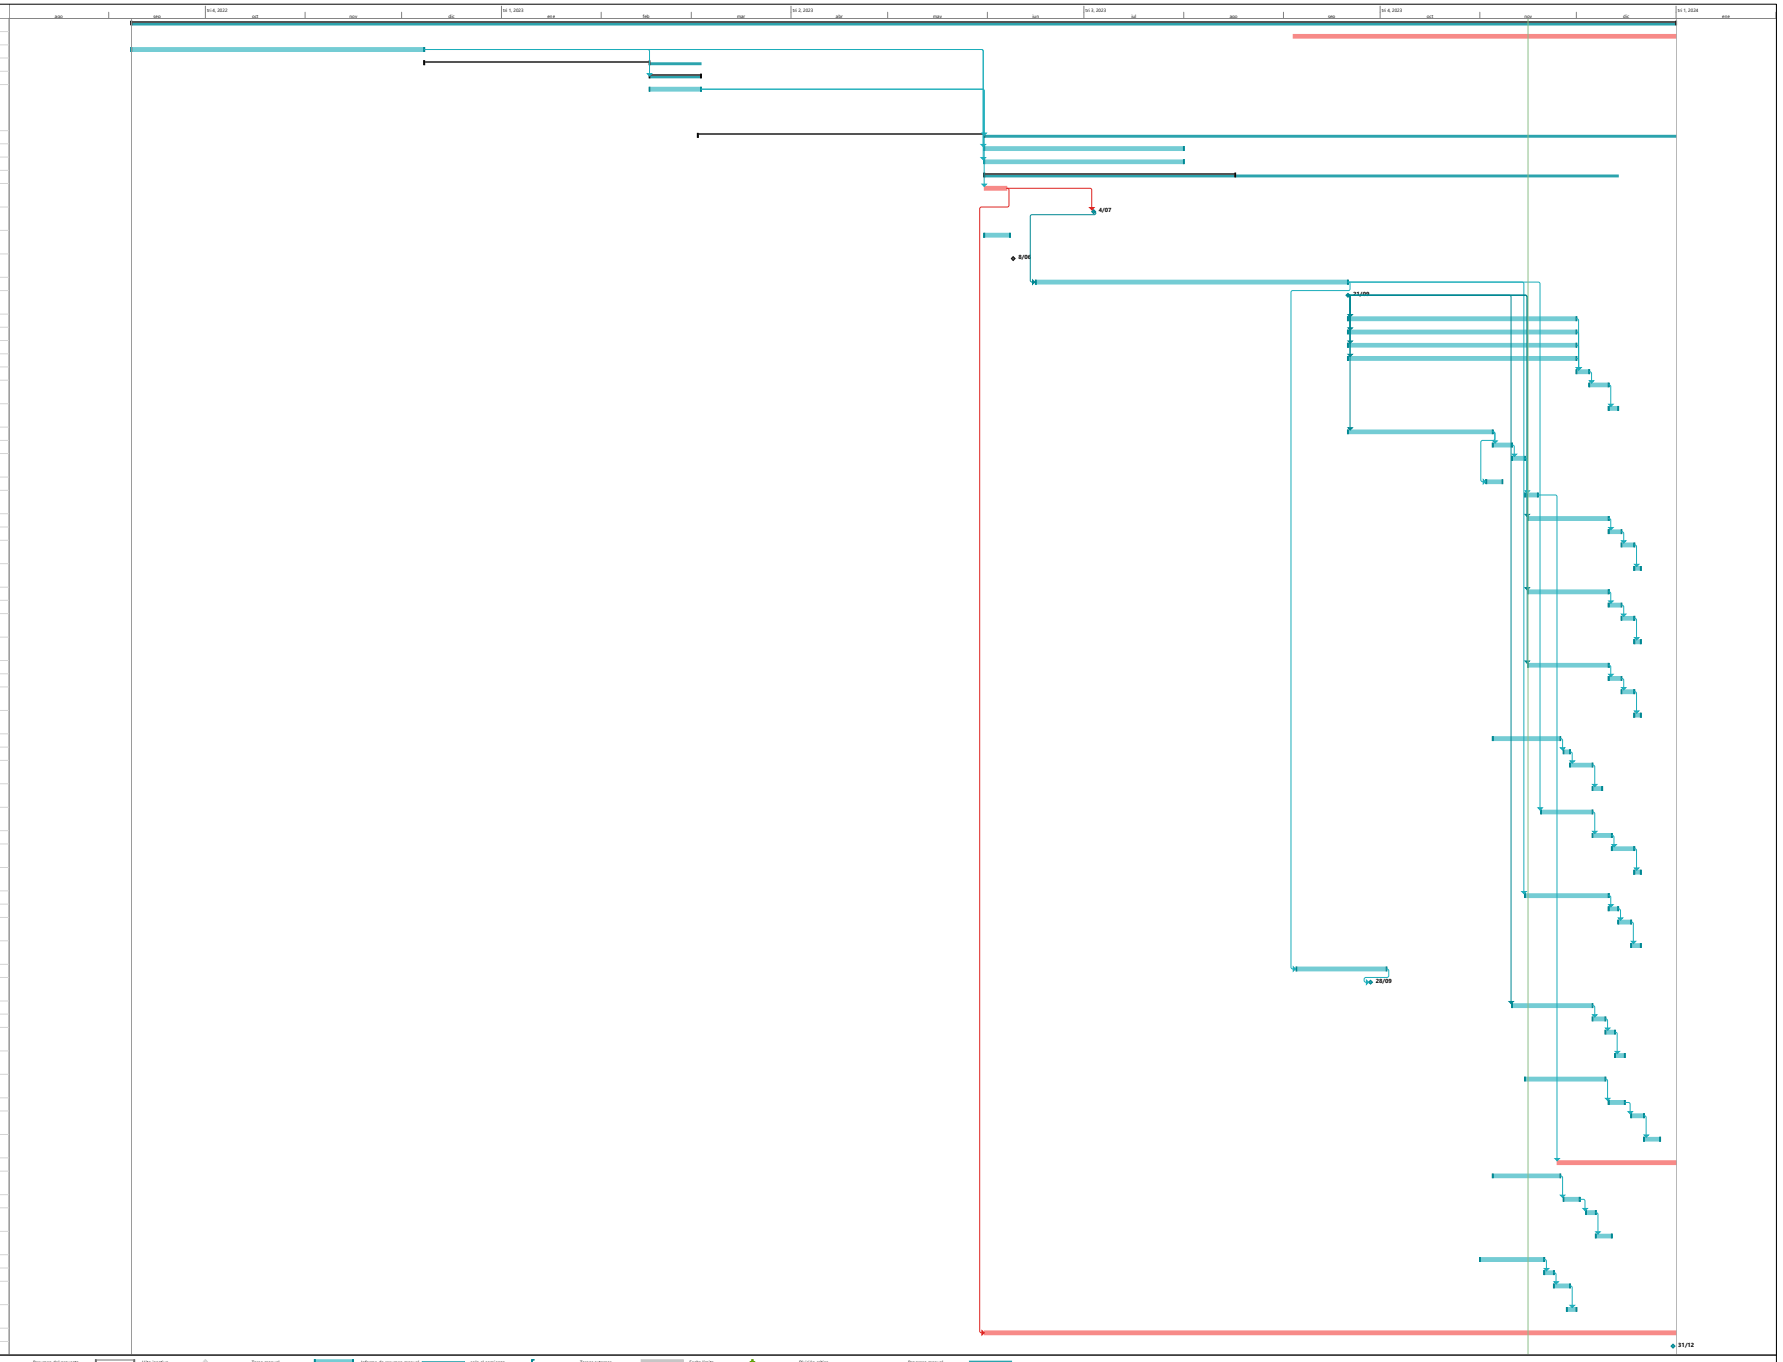

Proyecto: Sede BOLÍVAR CAUCA
Fecha a 31/12/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE CONCORDIA MAGDALENA**	**jue 8/09/22**	**dom 31/12/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 4/09/23	dom 31/12/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	jue 8/12/22	mié 15/02/23
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	vie 3/03/23	mar 30/05/23
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 28/06/23	mié 28/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	mié 20/09/23
16		Aprobación Anteproyecto Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 21/09/23
17		Diseño Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 30/11/23
18		Mobiliario	jue 21/09/23	jue 30/11/23
19		Señalización	jue 21/09/23	jue 30/11/23
20		Paisajismo	jue 21/09/23	jue 30/11/23
21		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 1/12/23	lun 4/12/23
22		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 5/12/23	dom 10/12/23
23		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
24		**ESTRUCTURAL**	jue 21/09/23	sáb 4/11/23
25		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	dom 5/11/23	vie 10/11/23
26		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	sáb 11/11/23	mar 14/11/23
27		Trámite FUN Licencia	vie 3/11/23	mar 7/11/23
28		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 15/11/23	sáb 18/11/23
29		**HIDROSANITARIO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
30		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
31		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
32		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
33		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
34		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
35		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
36		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
37		**AIRE ACONDICIONADO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
38		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
39		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
40		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
41		**AMBIENTAL**	**dom 5/11/23**	**sáb 25/11/23**
42		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	mar 28/11/23
43		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mié 29/11/23	mar 5/12/23
44		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	vie 8/12/23
45		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	**lun 20/11/23**	**mar 5/12/23**
46		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	lun 11/12/23
47		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 12/12/23	lun 18/12/23
48		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
49		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mié 15/11/23	dom 10/12/23
50		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
51		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	jue 14/12/23	dom 17/12/23
52		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 18/12/23	mié 20/12/23
53		**TRANSPORTE VERTICAL**	mar 5/09/23	vie 22/09/23
54		Revisón y aprobación interventoría /UIF-CSJ	vie 22/09/23	vie 22/09/23
55		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	**sáb 11/11/23**	**mar 5/12/23**
56		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	sáb 9/12/23
57		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	dom 10/12/23	mar 12/12/23
58		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 13/12/23	vie 15/12/23
59		**PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 15/11/23	sáb 9/12/23
60		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	vie 15/12/23
61		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 18/12/23	jue 21/12/23
62		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 22/12/23	mar 26/12/23
63		**LICENCIAS Y PERMISOS**	sáb 25/11/23	dom 31/12/23
64		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	dom 5/11/23	sáb 25/11/23
65		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	vie 1/12/23
66		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 4/12/23	mié 6/12/23
67		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	jue 7/12/23	lun 11/12/23
68		**INFORMACION CATASTRAL**	**mié 1/11/23**	**lun 20/11/23**
69		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 21/11/23	jue 23/11/23
70		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 24/11/23	mar 28/11/23
71		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 28/11/23	jue 30/11/23
72		**BIM**	mié 31/05/23	dom 31/12/23
73		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	dom 31/12/23	dom 31/12/23

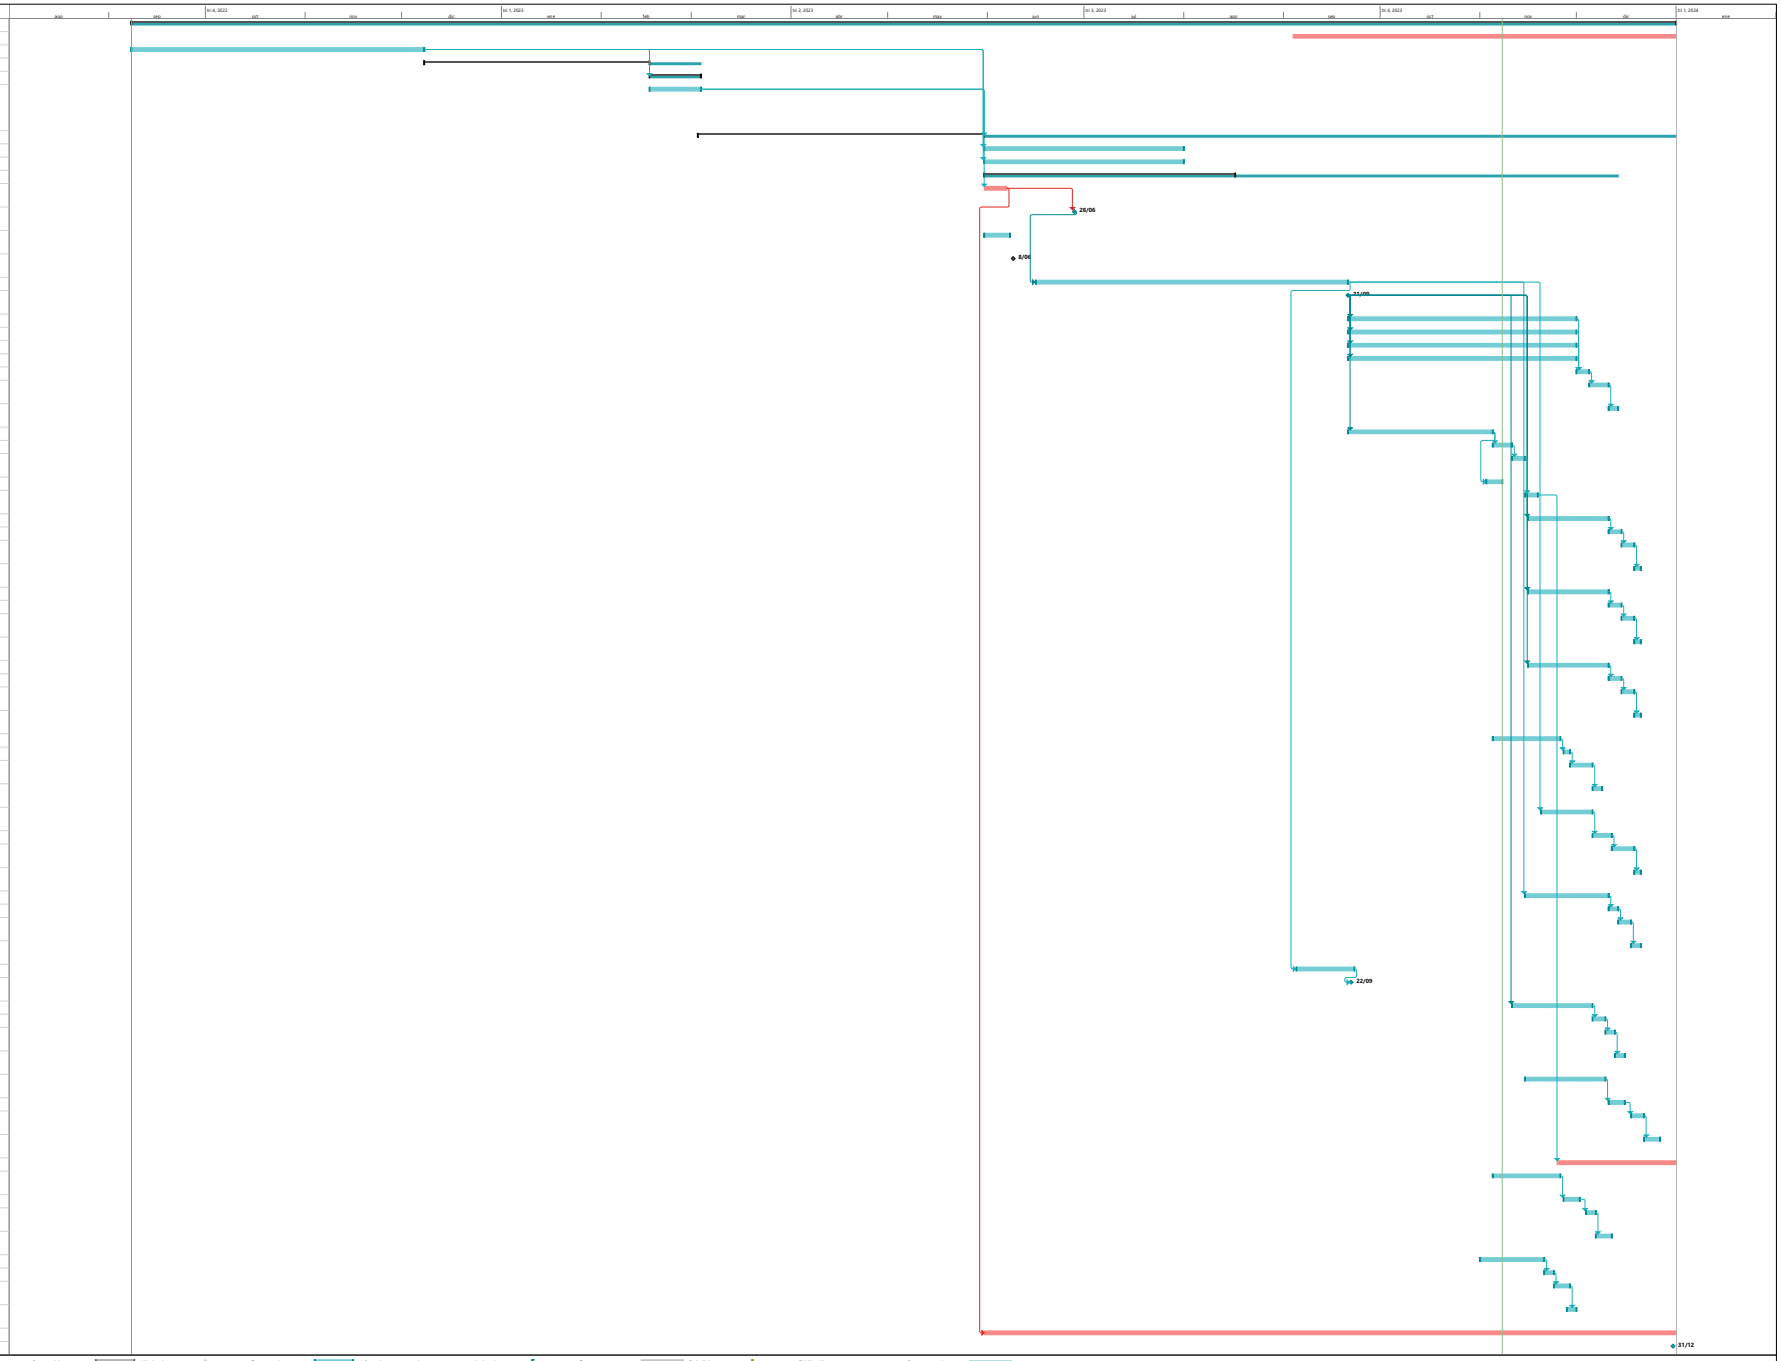

Proyecto: Sede CONCORDIA MAGDALENA
Fecha: a 31/12/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		SEDE LA PRIMAVERA VICHADA	**jue 8/09/22**	**dom 31/12/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 4/09/23	dom 31/12/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	jue 8/12/22	mié 15/02/23
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoria)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**vie 3/03/23**	**mar 30/05/23**
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 28/06/23	mié 28/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	mié 20/09/23
16		Aprobación Anteproyecto Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 21/09/23
17		Diseño Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 30/11/23
18		Mobiliario	jue 21/09/23	jue 30/11/23
19		Señalización	jue 21/09/23	jue 30/11/23
20		Paisajismo	jue 21/09/23	jue 30/11/23
21		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	vie 1/12/23	lun 4/12/23
22		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 5/12/23	dom 10/12/23
23		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
24		**ESTRUCTURAL**	jue 21/09/23	sáb 4/11/23
25		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	dom 5/11/23	vie 10/11/23
26		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	sáb 11/11/23	mar 14/11/23
27		Trámite FUN Licencia	vie 3/11/23	mar 7/11/23
28		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mié 15/11/23	sáb 18/11/23
29		**HIDROSANITARIO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
30		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
31		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
32		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
33		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
34		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
35		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
36		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
37		**AIRE ACONDICIONADO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
38		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
39		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
40		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
41		**AMBIENTAL**	**dom 5/11/23**	**sáb 25/11/23**
42		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	mar 28/11/23
43		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mié 29/11/23	mar 5/12/23
44		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	vie 8/12/23
45		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	**lun 20/11/23**	**mar 5/12/23**
46		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	lun 11/12/23
47		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 12/12/23	lun 18/12/23
48		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
49		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mié 15/11/23	dom 10/12/23
50		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
51		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	jue 14/12/23	dom 17/12/23
52		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 18/12/23	mié 20/12/23
53		**TRANSPORTE VERTICAL**	mar 5/09/23	lun 2/10/23
54		Revisón y aprobación interventoría /UIF-CSJ	mar 3/10/23	mar 3/10/23
55		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	**sáb 11/11/23**	**mar 5/12/23**
56		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	sáb 9/12/23
57		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	dom 10/12/23	mar 12/12/23
58		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mié 13/12/23	vie 15/12/23
59		**PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 15/11/23	sáb 9/12/23
60		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	vie 15/12/23
61		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 18/12/23	jue 21/12/23
62		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	vie 22/12/23	mar 26/12/23
63		**LICENCIAS Y PERMISOS**	sáb 25/11/23	dom 31/12/23
64		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	dom 5/11/23	sáb 25/11/23
65		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	vie 1/12/23
66		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 4/12/23	mié 6/12/23
67		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	jue 7/12/23	lun 11/12/23
68		**INFORMACION CATASTRAL**	**mié 1/11/23**	**lun 20/11/23**
69		Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	mar 21/11/23	jue 23/11/23
70		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 24/11/23	mar 28/11/23
71		Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	mar 28/11/23	jue 30/11/23
72		**BIM**	mié 31/05/23	dom 31/12/23
73		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	dom 31/12/23	dom 31/12/23

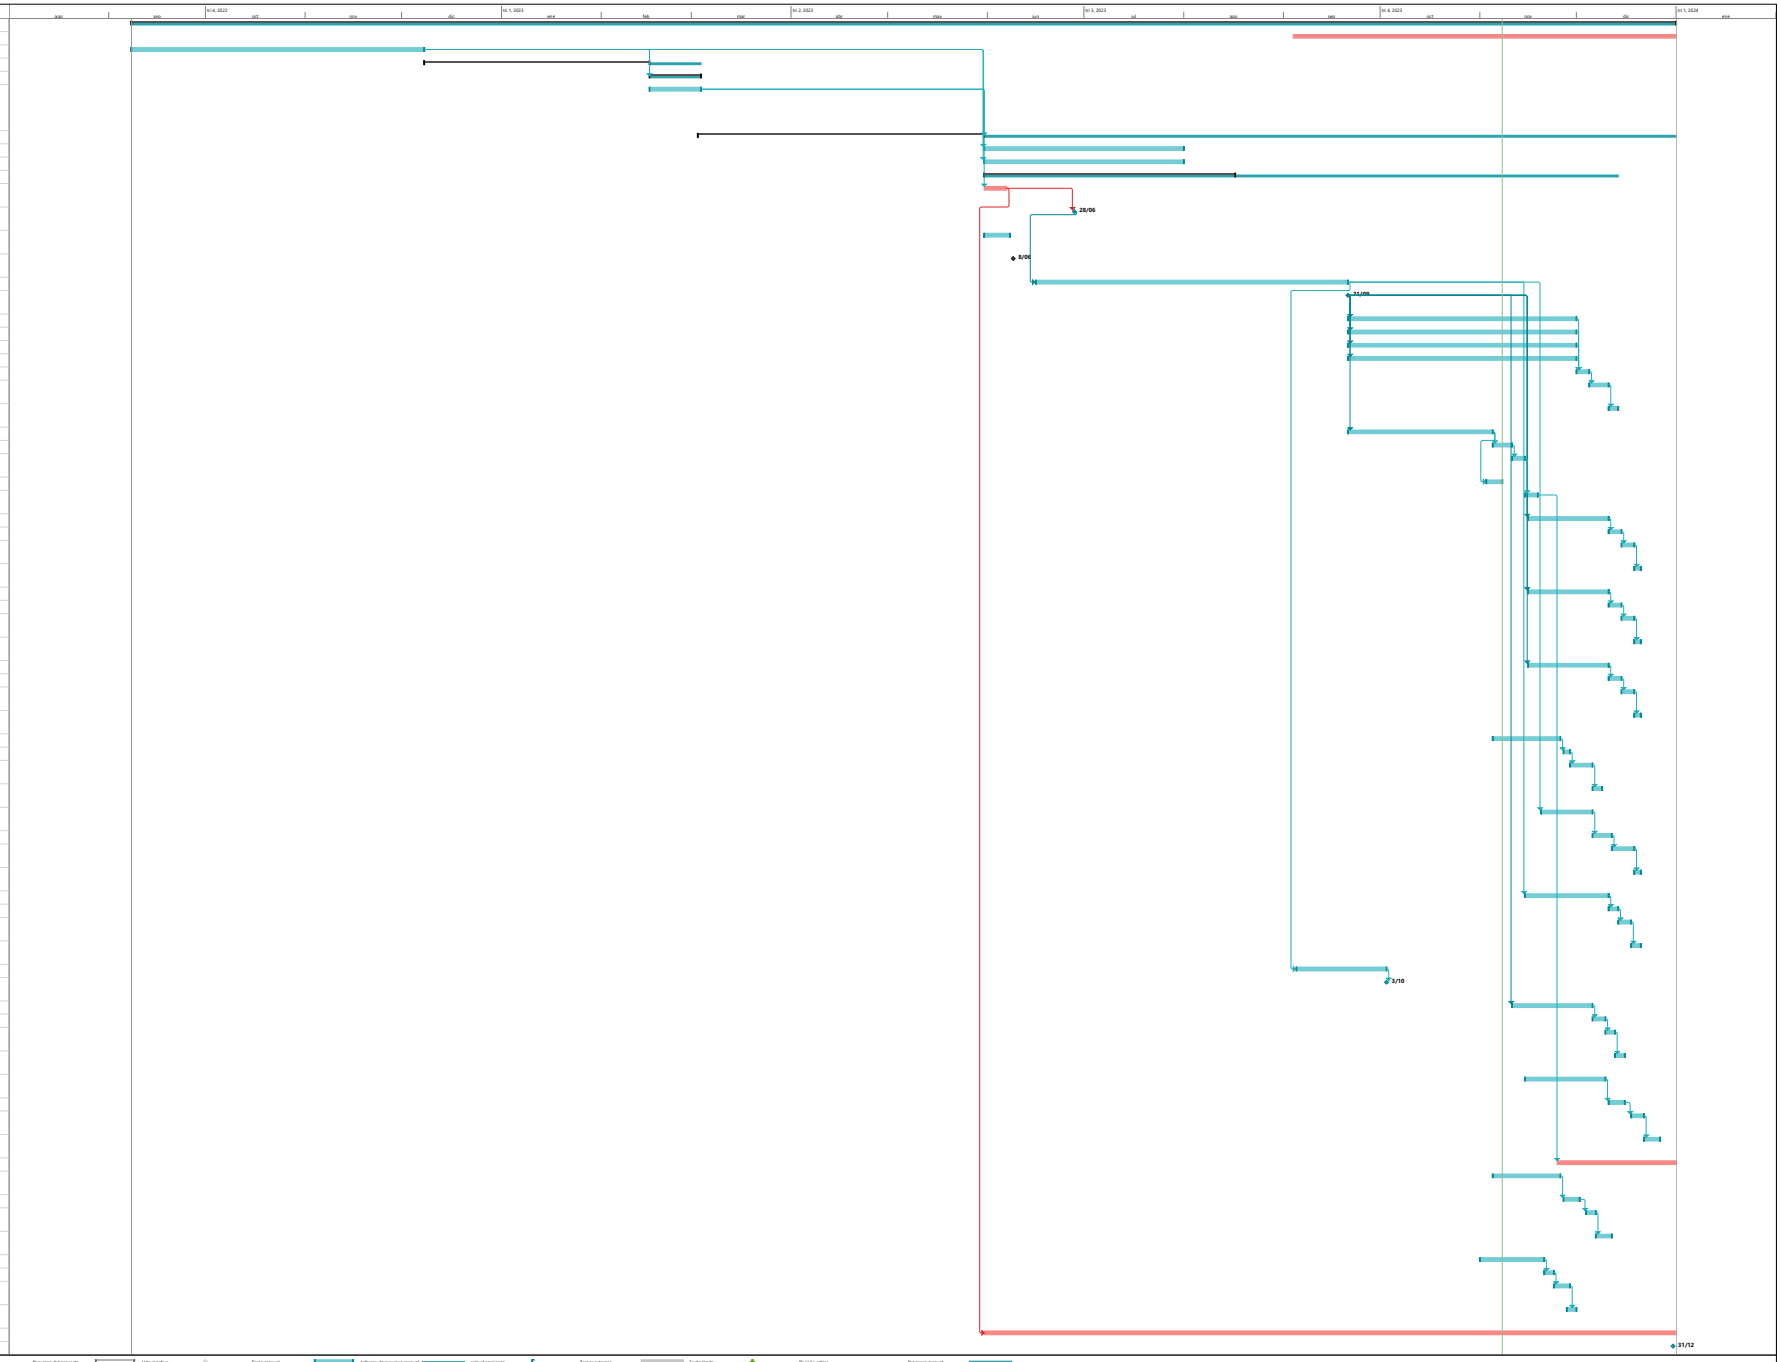

Proyecto: Sede LA PRIMAVERA VICHADA
Fecha a 31/12/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE OROCUÉ CASANARE**	**jue 8/09/22**	**dom 31/12/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 4/09/23	dom 31/12/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	jue 8/12/22	mié 15/02/23
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	vie 3/03/23	mar 30/05/23
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 28/06/23	mié 28/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	mié 20/09/23
16		Aprobación Anteproyecto Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 21/09/23
17		Diseño Arquitectónico	jue 21/09/23	jue 30/11/23
18		Mobiliario	jue 21/09/23	jue 30/11/23
19		Señalización	jue 21/09/23	jue 30/11/23
20		Paisajismo	jue 21/09/23	jue 30/11/23
21		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 1/12/23	lun 4/12/23
22		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 5/12/23	dom 10/12/23
23		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
24		**ESTRUCTURAL**	jue 21/09/23	sáb 4/11/23
25		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	dom 5/11/23	vie 10/11/23
26		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	sáb 11/11/23	mar 14/11/23
27		Trámite FUN Licencia	vie 3/11/23	mar 7/11/23
28		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 15/11/23	sáb 18/11/23
29		**HIDROSANITARIO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
30		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
31		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
32		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
33		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
34		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
35		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
36		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
37		**AIRE ACONDICIONADO**	jue 16/11/23	dom 10/12/23
38		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	jue 14/12/23
39		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 15/12/23	lun 18/12/23
40		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
41		**AMBIENTAL**	**dom 5/11/23**	**sáb 25/11/23**
42		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	mar 28/11/23
43		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mié 29/11/23	mar 5/12/23
44		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	vie 8/12/23
45		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	**lun 20/11/23**	**mar 5/12/23**
46		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	lun 11/12/23
47		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	mar 12/12/23	lun 18/12/23
48		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 19/12/23	mié 20/12/23
49		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mié 15/11/23	dom 10/12/23
50		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	mié 13/12/23
51		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	jue 14/12/23	dom 17/12/23
52		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 18/12/23	mié 20/12/23
53		**TRANSPORTE VERTICAL**	mar 5/09/23	lun 2/10/23
54		Revisón y aprobación interventoría /UIF-CSJ	mar 3/10/23	mar 3/10/23
55		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	**sáb 11/11/23**	**mar 5/12/23**
56		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 6/12/23	sáb 9/12/23
57		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	dom 10/12/23	mar 12/12/23
58		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mié 13/12/23	vie 15/12/23
59		**PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 15/11/23	sáb 9/12/23
60		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 11/12/23	vie 15/12/23
61		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 18/12/23	jue 21/12/23
62		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	vie 22/12/23	mar 26/12/23
63		**LICENCIAS Y PERMISOS**	sáb 25/11/23	dom 31/12/23
64		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	dom 5/11/23	sáb 25/11/23
65		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	lun 27/11/23	vie 1/12/23
66		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	lun 4/12/23	mié 6/12/23
67		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	jue 7/12/23	lun 11/12/23
68		**INFORMACION CATASTRAL**	**mié 1/11/23**	**lun 20/11/23**
69		Revisión (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 21/11/23	jue 23/11/23
70		Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	vie 24/11/23	mar 28/11/23
71		Aprobación definitiva (Interventoría/UIF-CSJ)	mar 28/11/23	jue 30/11/23
72		**BIM**	mié 31/05/23	dom 31/12/23
73		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	dom 31/12/23	dom 31/12/23

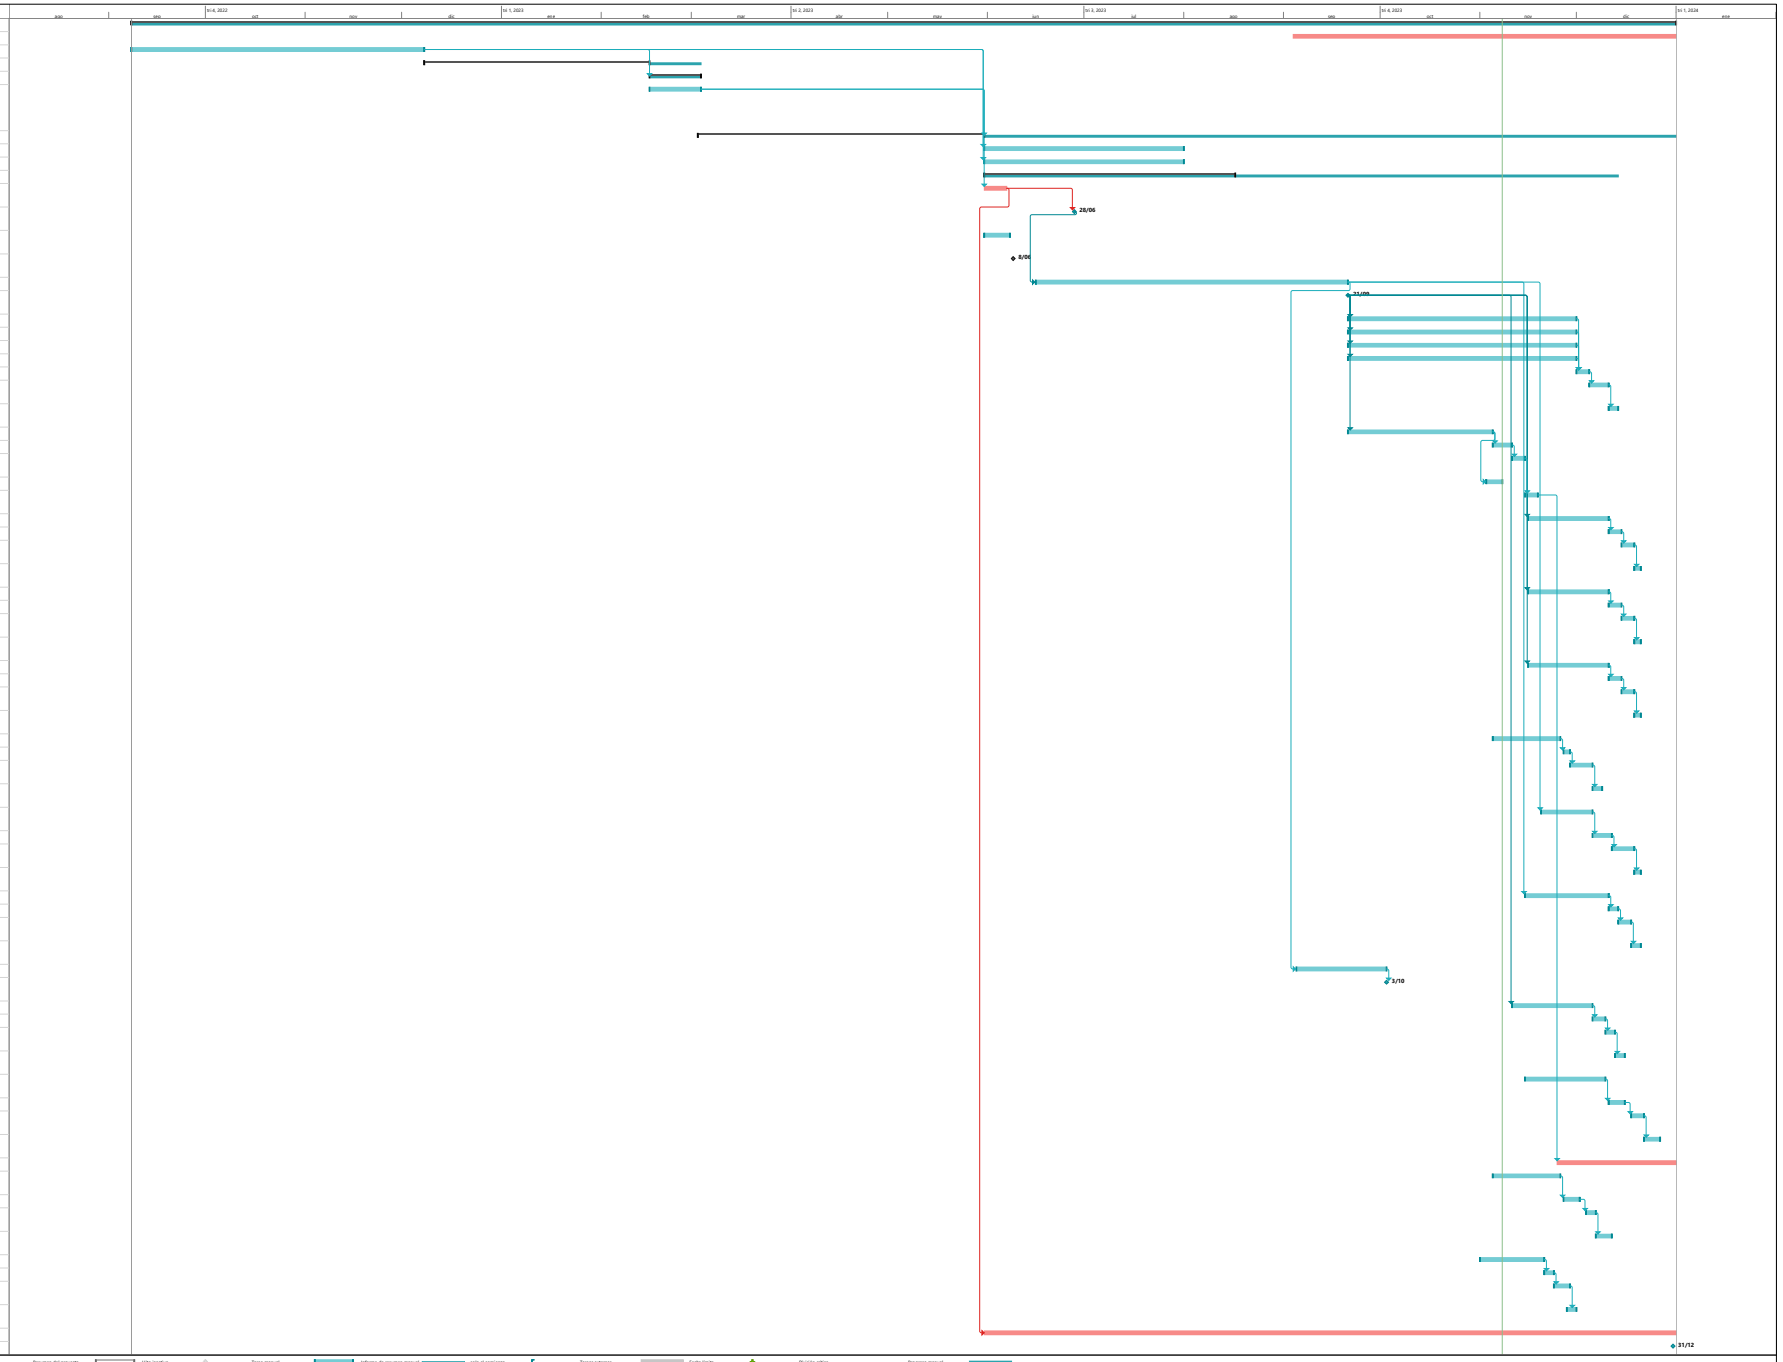

Proyecto: Sede OROCUÉ CASANARE
Fecha: a 31/12/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA DIAGNÓSTICO**	**344 días**	**jue 8/09/22**	**dom 31/12/23**	
2	**ACTIVIDADES PREVIAS**	**308 días**	**jue 8/09/22**	**vie 10/11/23**	
3	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA ENTREGADA POR ENTIDAD	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22	
4	VISITA TECNICA DETALLADA	7 días	jue 8/09/22	vie 16/09/22	
5	SOLICTUD DE INFORMACIÓN BÁSICA A TERCEROS (Planeación municipal , servicios públicos, bomberos, ambiental y/o otros	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22	
6	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE	12 días	lun 26/09/22	mar 11/10/22	3;4;5
7	**ASPECTOS GENERALES**	95 días	lun 3/07/23	vie 10/11/23	
8	**INFORME BASE PRELIMINAR**	23 días	jue 8/09/22	sáb 8/10/22	
9	**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**52 días**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**	
10	**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 días**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**	
11	**DEFINICIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EPZ**	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23	9
12	Terminación del Contrato (Sin prór	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23	
13	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	**51 días**	**lun 12/06/23**	**lun 21/08/23**	8
14	Exploración de campo	16 días	lun 12/06/23	lun 3/07/23	
15	Ensayos y Resultados	13 días	mar 4/07/23	jue 20/07/23	14
16	Geofísica	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23	15
17	Geotécnia	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23	15
18	Sísmica	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23	15
19	**TOPOGRAFÍA**	23 días	lun 12/06/23	mié 12/07/23	8
20	**ESTRUCTURAL (Anclajes casetón)**	12 días	**sáb 18/11/23**	**lun 4/12/23**	2;8
21	Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	3 días	mar 5/12/23	jue 7/12/23	20
22	Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	4 días	vie 8/12/23	mié 13/12/23	21
23	Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	22
24	**HIDROSANITARIO**	24 días	**mar 22/08/2**	**vie 22/09/23**	13;19;2;8
25	**FIBRA ÓPTICA**	17 días	**dom 5/11/23**	**lun 27/11/23**	13;19;2;8
26	Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	3 días	mar 28/11/2	jue 30/11/23	25
27	Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	3 días	vie 1/12/23	mar 5/12/23	26
28	Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	2 días	mié 6/12/23	jue 7/12/23	27
29	**AMBIENTAL**	17 días	**dom 5/11/23**	**sáb 25/11/23**	
30	Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	2 días?	lun 27/11/23	mar 28/11/2	29
31	Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	5 días?	mié 29/11/23	mar 5/12/23	30
32	Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	3 días?	mié 6/12/23	vie 8/12/23	31
33	**PRUEBAS (ADICIONALES) - PRUEBAS E INFORMES**	**59 días**	**lun 12/06/23**	**jue 31/08/23**	
34	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**56 días**	**lun 12/06/23**	**lun 28/08/23**	
35	Pruebas red de suministro de agua potable	12 días	lun 12/06/23	mar 27/06/23	
36	Pruebas de sistema sanitario	11 días	mié 28/06/2	mié 12/07/23	
37	Pruebas sitema deaguas lluvia	12 días	jue 13/07/23	vie 28/07/23	
38	Pruebas sistema bombeo	12 días	vie 28/07/23	sáb 12/08/23	
39	Elaboración de Informe de Resultados	11 días	lun 14/08/23	lun 28/08/23	35;36;37;38
40	**SISTEMA CONTRAINCENDIOS**	**14 días**	**sáb 12/08/23**	**jue 31/08/23**	
41	Pruebas redes sistema contraincendio	12 días	sáb 12/08/23	dom 27/08/23	
42	Pruebas sistema bombeo	4 días	vie 18/08/23	mié 23/08/23	
43	Elaboración de Informe de Resultados	4 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23	41;42
44	**SISTEMA ELÉCTRICO**	**56 días**	**lun 12/06/23**	**lun 28/08/23**	
45	Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia	7 días	lun 12/06/23	mar 20/06/23	
46	Pruebas redes electricas,voz y datos	30 días	mar 20/06/23	lun 31/07/23	
47	Elaboración de Informe de Resultados	20 días	mar 1/08/23	lun 28/08/23	45;46
48	**INFORME DE TRABAJO DE ALTURAS**	22 días	jue 31/08/23	vie 29/09/23	
49	**PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	23 días	jue 8/06/23	lun 10/07/23	11
50	**INFORMACION CATASTRAL**	45 días	mié 12/07/23	mar 12/09/23	
51	**PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	39 días	vie 27/10/23	mié 20/12/23	20;24;25;29;33
52	Revisión (Interventoria/UIF-CSJ)	3 días	jue 21/12/23	dom 24/12/2	51
53	Atención observaciones y/o aprobaciones (consultor)	5 días	lun 25/12/23	vie 29/12/23	52
54	Aprobación definitiva (Interventoria/UIF-CSJ)	2 días	vie 29/12/23	sáb 30/12/23	53
55	**LICENCIAS Y PERMISOS**	47 días	vie 27/10/23	dom 31/12/2	20;24;25;29;33
56	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	0 días	dom 31/12/23	dom 31/12/23	

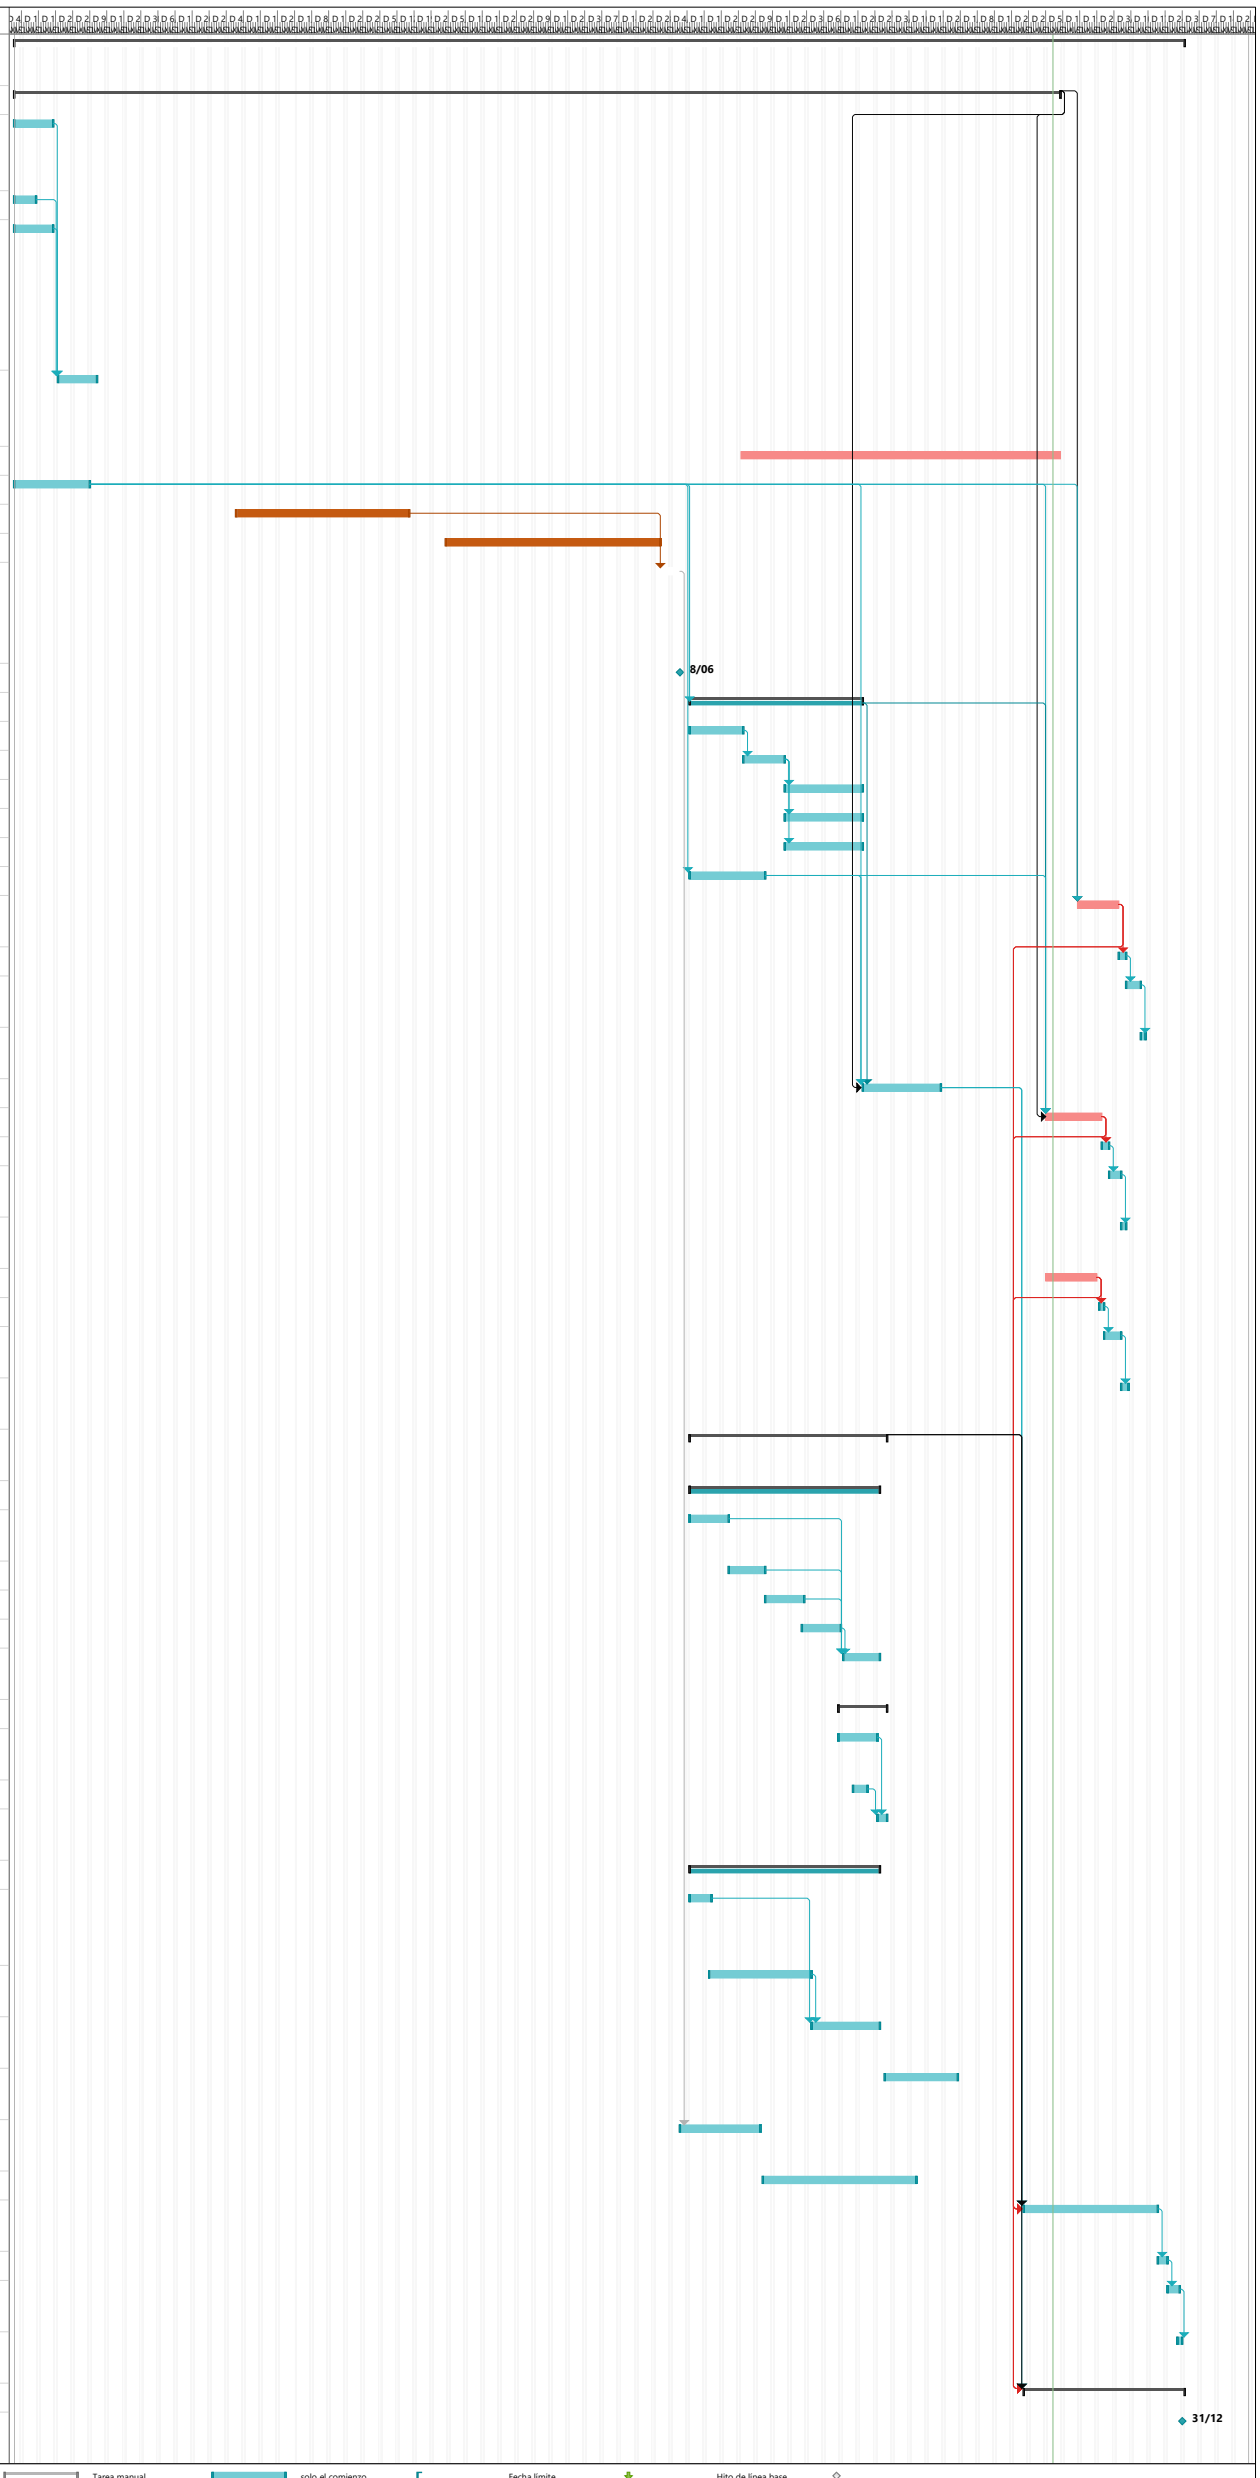

Proyecto: Zipaquirá Diagnóstic
Cundinamarca
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA VULNERABILIDAD**	**344 días**	**jue 8/09/22**	**dom 31/12/23**
2	**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)**	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
3	**VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMEINTO OBRA EXISTENTE**	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4	**ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN**	12 días	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
5	**VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL**	12 días	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
6	**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**52 días**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
7	**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 días**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**
8	Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
9	Terminación del Contrato (Sin prórroga)	0 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23
10	**PATOLOGÍA ESTRUCTURAL**	**39 días**	**mié 31/05/2**	**lun 24/07/23**
11	Definición de programa de ensayos	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
12	Metodologia de ensayos	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13	Ejecución de ensayos	12 días	lun 12/06/23	mar 27/06/23
14	Ensayos de laboratorios y resultados	14 días	mié 28/06/23	lun 17/07/23
15	Análisis de resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	5 días	mar 18/07/23	lun 24/07/23
16	Aprobación final	0 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23
17	**ESTUDIOS DE SUELOS**	**95 días**	**mié 31/05/2**	**mié 11/10/23**
18	Análisis de la información secundaria	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
19	Definición de programana y metodología	6 días	jue 8/06/23	jue 15/06/23
20	Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)	16 días	vie 16/06/23	vie 7/07/23
21	Ensayos de laboratorio	13 días	lun 10/07/23	mié 26/07/23
22	Estudio de suelos y recomendaciones	24 días	jue 27/07/23	mar 29/08/23
23	Aprobación final	0 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23
24	**ESTUDIO DE VULNERABILIDAD**	23 días	lun 24/07/23	mié 23/08/23
25	Aprobación final	0 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23
26	**ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO**	4 días	mié 11/10/23	sáb 14/10/23
27	Planificación de nuevas necesidades técncias segín alternativa aprobada	3 días	sáb 14/10/23	mar 17/10/23
28	ESTUDIO DE SUELOS: Nuevo estudio y análisis especializado de sismicidad y suelos para determinar parámetros para reforzamiento de cimentación existente	19 días	mié 18/10/23	lun 13/11/23
29	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**	43 días	mié 18/10/23	vie 15/12/23
30	Reforzamiento de super estructura	24 días	mié 18/10/23	sáb 18/11/23
31	Reforzamiento de cimentación	15 días	mar 14/11/23	lun 4/12/23
32	Revisión Interventoría - UIF CSJ	4 días	mar 5/12/23	vie 8/12/23
33	Atención de observaciones	3 días	jue 9/11/23	lun 13/11/23
34	Aprobación definitiva	3 días	lun 13/11/23	mié 15/11/23
35	**DEFINICIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTUVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL REFORZAMIENTO RESULTANTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES)**	**9 días**	**sáb 9/12/23**	**mié 20/12/23**
36	Procesos constructivos por consultoría	7 días	sáb 9/12/23	sáb 16/12/23
37	Aprobación interventoría - UIF CSJ	3 días	lun 18/12/23	mié 20/12/23
38	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	10 días	sáb 9/12/23	jue 21/12/23
39	Aprobación interventoría - UIF CSJ	3 días	jue 21/12/23	sáb 23/12/23
40	**PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA**	14 días	sáb 9/12/23	mié 27/12/23
41	Aprobación interventoría - UIF CSJ	3 días	jue 28/12/23	dom 31/12/2
42	**TRAMITE DE LICENCIA**	12 días	sáb 16/12/23	dom 31/12/2
43	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	0 días	dom 31/12/2	dom 31/12/2
44				

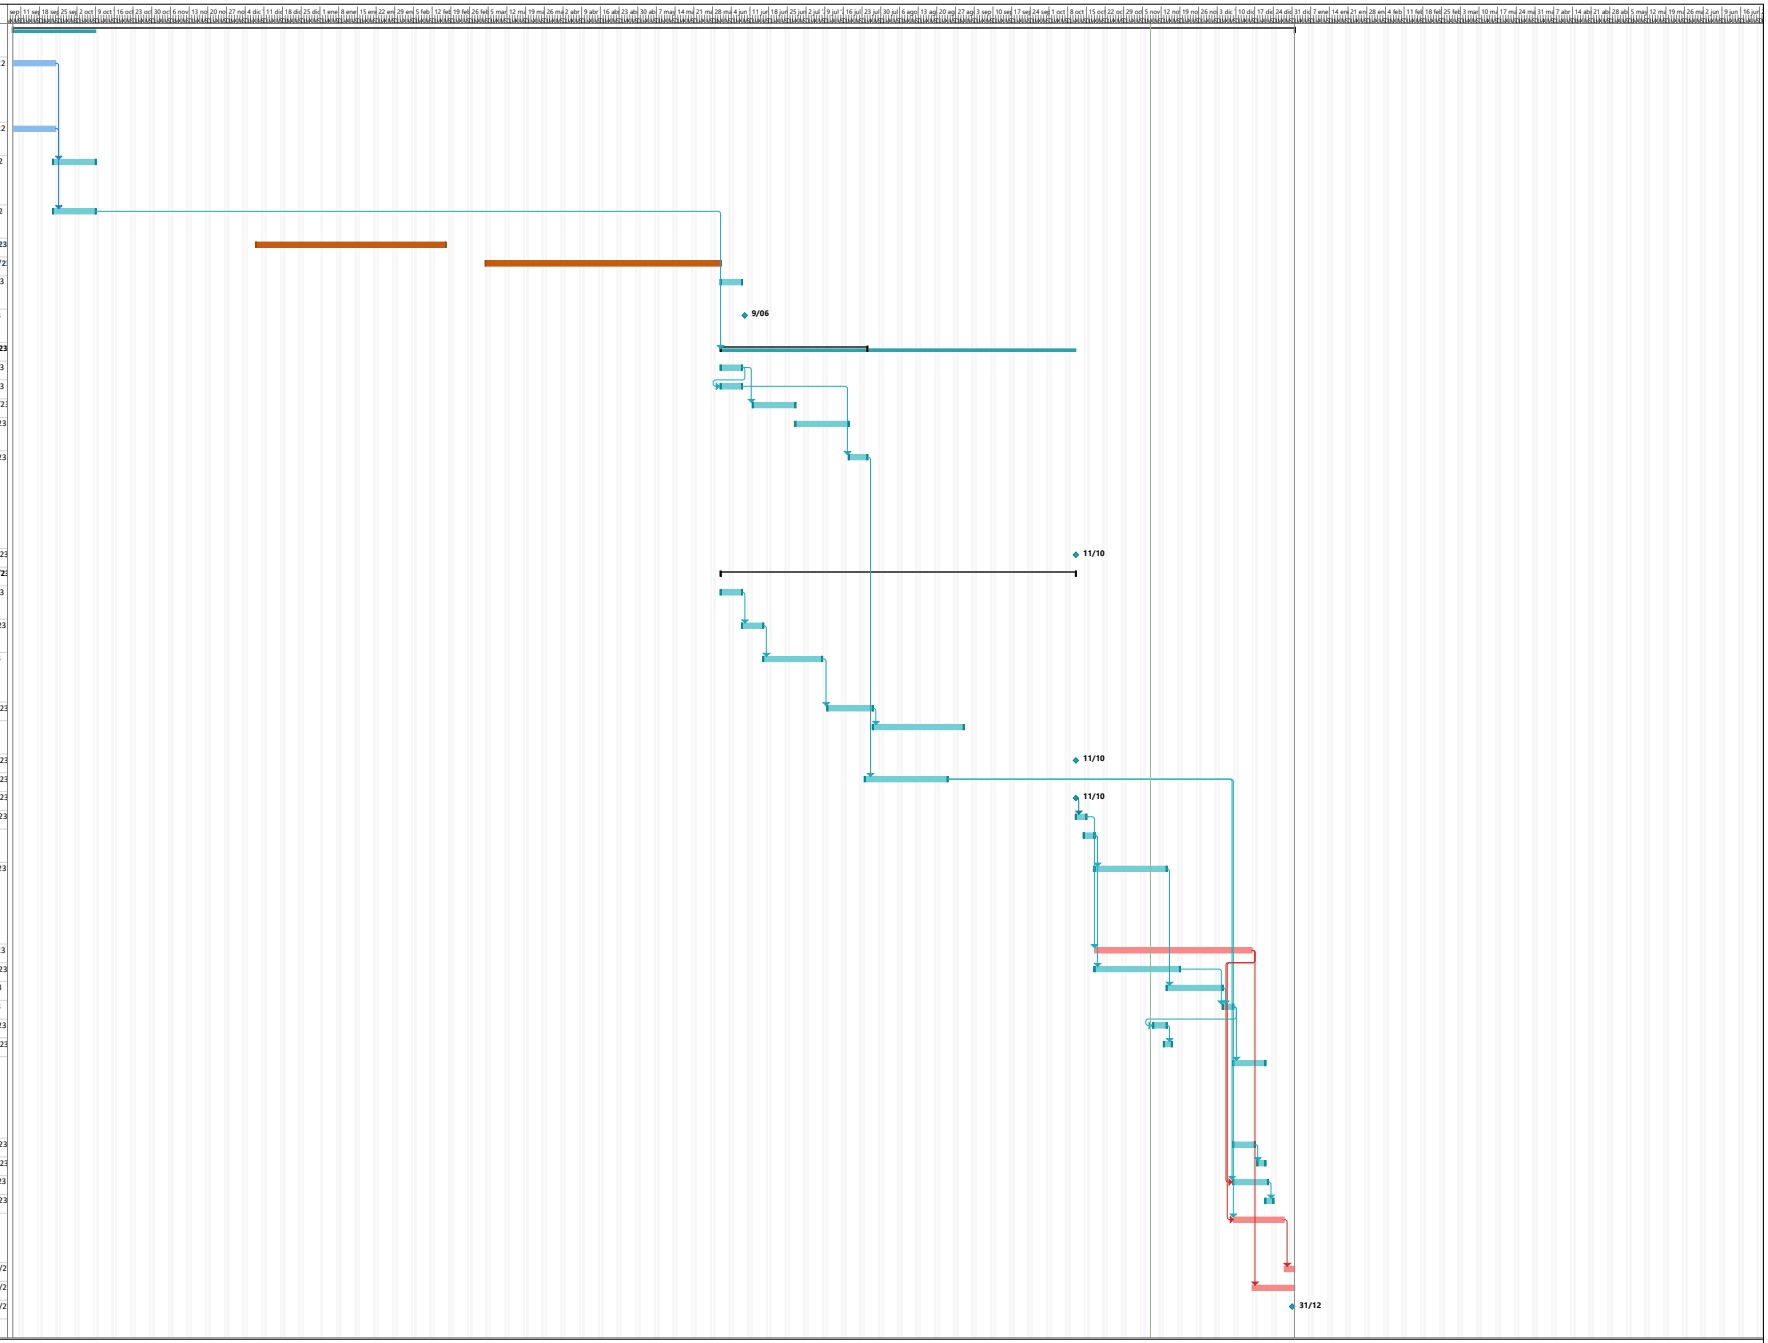

Proyecto: Sede Zipaquira Vulnerabilidad
Fecha: 31-05-2023

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual
