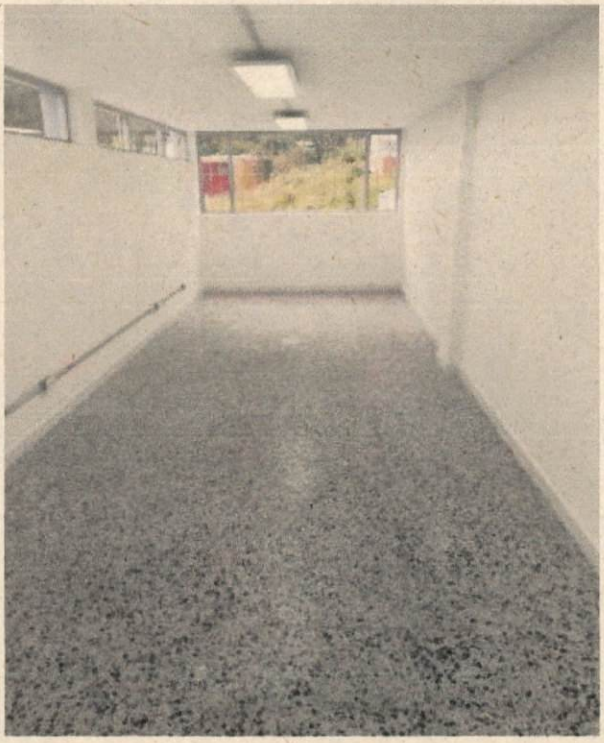


Figura 9-21 Sotano.



Figura 9-22 Ingreso escaleras segundo piso.

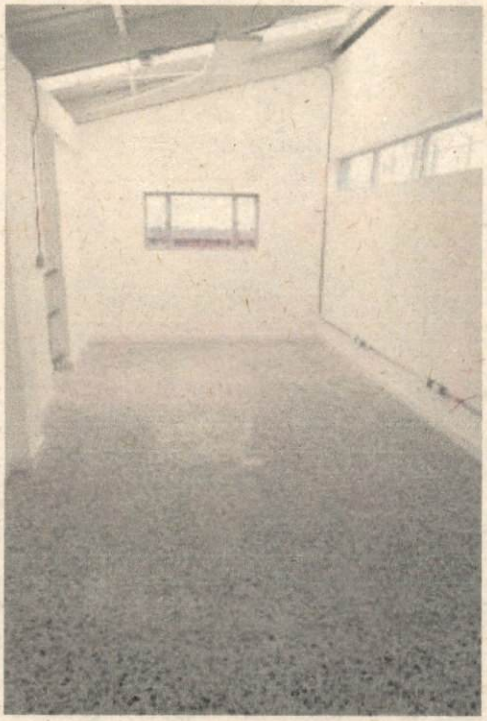


Figura 9-23 Segundo piso.

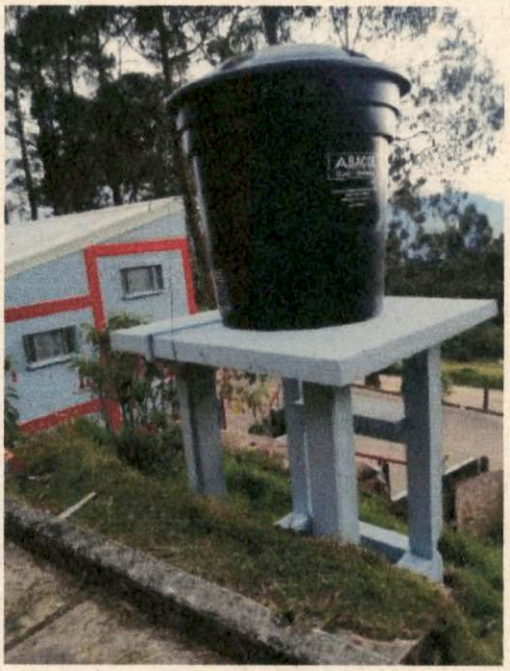


Figura 9-24 Tanque de agua potable.



Figura 9-25 Tanque aguas negras.



Figura 9-26 Nicho de gas.

ACTAS COMITÉ

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE OBRA

Fecha: 11-05-2023 **Hora:** 08:30 am

Lugar: Instalaciones Obra La Alemana

Tema: Realizar el mejoramiento y dotación de las instalaciones del predio LA ALEMANA para la academia de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Ing. Christiam Rubio	Infraestructura SGC – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos		crrubio@bomberosbogota.gov.co	
Arq. Laura Gordillo	Dir. Interventoría Gordillo & Asociados SAS		interventoriabomberoslaalemana@gmail.com	
Arq. Alexander Lopez	Residente Interventoría Gordillo & Asociados SAS		interventoriabomberoslaalemana@gmail.com	
Ing. Didier Acosta	Dir. Proyectos SOLTEC Proyectos de Ingeniería SAS		sassoltec@gmail.com	
Ing. Laura Rincón	Residente de Obra SOLTEC Proyectos de Ingeniería		sassoltec@gmail.com	

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

Desarrollo de la reunión:

Se inició la reunión en la sede del proyecto atendiendo el requerimiento de la puesta a tierra de los contenedores de simulación para su correcto funcionamiento, debido a que se requiere un sistema de puesta a tierra, descargas atmosféricas, apantallamiento, descargadores de sobre tensiones para tener un sistema de tierra aislada diferente al que inicialmente se ha instalado cuando se colocó el tablero trifásico solicitado. Se tiene en sitio al Ingeniero Eléctrico del contratista quien hace las acotaciones anteriormente referidas. El Ingeniero de apoyo a la supervisión, el contratista y la directora de interventoría hacen el análisis de los planos y se presentan alternativas como:

1. Quitar 2 postes con reflector (a la entrada)
2. Hacer un NP cómo suministro de materiales que se requieren para este tipo de trabajo
3. Quitar el Ítem de la cocina que aun no se está ejecutando y que no se ha mandado a hacer a la fecha para compensar el gasto

Se solicita hacer una reunión en el comando central de bomberos y/o una reunión virtual con apoyo de la supervisión del proyecto, la dirección de interventoría, el director de obra de contratista y el ingeniero eléctrico designado por el contratista para el día 12-05-2023 08:30 am (reunión virtual).

La adición y prorroga fue avalada por la firma de la directora de Interventoría el día de ayer 10-05-2023 y se requiere la actualización de pólizas de seguro del contratista máximo en el plazo de 3 días contados a partir de la fecha de esta acta.

La programación de la adición será enviada al apoyo a la supervisión de acuerdo a la solicitud hecha en comité y será remitida por correo electrónico el día de hoy 11-05-2023.

R3DkODE-39
R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5

Se hacen observaciones en cuanto a retoques de la pintura aplicada en las puertas del cerramiento que se deben mejorar para la entrega final del proyecto.

Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1	**Radicación del corte de obra oficina de interventoría y en oficina central de bomberos**	**SOLTEC**	**11-05-2023**
2	**Reunión virtual para informar tema eléctrico de conexión a tierra**	**SOLTEC**	**11-05-2023**
3			
4			

Fecha próxima reunión: __Jueves 18-05-2023_____

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE OBRA

Fecha: 25-05-2023 **Hora:** 08:30 am

Lugar: Instalaciones Obra La Alemana

Tema: Realizar el mejoramiento y dotación de las instalaciones del predio LA ALEMANA para la academia de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Ing. Cristiam Orozco	Infraestructura SGC – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos		ucabrera@bomberosbogota.gov.co	
Arq. Laura Gordillo	Dir. Interventoría Gordillo & Asociados SAS		interventoriabomberoslaalemana@gmail.com	
Arq. Alexander Lopez	Residente Interventoría Gordillo & Asociados SAS		interventoriabomberoslaalemana@gmail.com	
Ing. Didier Acosta	Dir. Proyectos SOLTEC Proyectos de Ingeniería SAS		sassoltec@gmail.com	
Ing. Fernando Beltran	Residente de Obra SOLTEC Proyectos de Ingeniería		sassoltec@gmail.com	

Powered by CamScanner

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

Desarrollo de la reunión:

Se inició la reunión haciendo el recorrido para la revisión de la instalación de la concertina, de la instalación de acometida eléctrica perimetral y adicionalmente se hace la revisión del movimiento que se realizo con los contenedores puesto que se presentaron daños y roturas en 2 de los pedestales que se habían fundido anteriormente. Se sugiere hacer la reparación de los dos que se dañaron y revisar en que punto del balance se entregara ese valor.

Se deja como fecha de pre-entrega de las actividades correspondientes al tanque de recepción de aguas servidas, con sus labores conexas (tuberías, instalaciones, cerramientos, etc.) para el día 09-06-2023 y se revisaran en sitio para verificar que se encuentren terminadas. Esto incluye todas las actividades de obra civil y eléctricas contempladas en el contrato y si llegasen a tenerse observaciones se hará un acta correspondiente para la verificación del cumplimiento de las observaciones.

Se realizará una reunión de seguimiento a través de fotografías e informes el día 08-06-2023 en la sede central del comando previa a la revisión final en obra.

Entrega de balance final con Ítems a ejecutar el día 29-05-2023

Radicación de cuenta a interventoría por parte del contratista el día 31-05-2023

Radicación de cuenta con revisión de interventoría a supervisión de obra el día 06-06-2023

Powered by CamScanner

R3DkODE-39
R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5

Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1	Informe de actividades ejecutadas por parte del contratista	SOLTEC	09-06-2023
2	Entrega de balance	SOLTEC	29-05-2023
3	Entrega de documentos a interventoría	SOLTEC	31-05-2023
4	Entrega de documentos revisados por interventoría a supervisión	GORIDLLO & ASOCIADOS	06-06-2023
5			

Fecha próxima reunión: _____JUEVES 01-06-2023_____

Powered by CamScanner

BITACORA


ARQ. ALEXANDER LOPEEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

01-06-23 SE INICIA LA PINTURA PARA LA FACHADA ADYACENTE AL ESPACIO DEL TANQUE
SE HACEN RETOQUES A LA MALLA CON PINTURA DE COLOR ROJO Y SE INICIA LA INSTALACION DE LA CONCERTINA
SE HACEN RETOQUES DE PINTURA EN COLOR BLANCO
SE HACE PRESENCIA EN COMANDO CENTRAL PARA COMITE DE OBRA CON FOTOGRAFIAS
PERSONAL EN OBRA
1 INGENIERO RESIDENTE
1 TECNICA SST
1 OPERARIO MANTENIMIENTO
2 OPERARIOS CERRAMIENTO
2 OPERARIOS OBRA CIVIL.
ARQ. ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

02-03-23 LLEGA EL TANQUE DE RECEPCION DE AGUAS SERVIDAS Y SE INSTALA EN EL SITIO ACORDADO
SE CONTINUA PINTURA EN FACHADA ADYACENTE
SE REALIZA PINTURA EN ESTRUCTURA DE TANQUE Y

Powered by CamScanner

SE INSTALA TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
SE INICIA ARMADO DE ESTRUCTURA DE PUERTA EN MALLA PARA ZONA DE TANQUE
SE SIGUEN RETOQUES DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA
PERSONAL EN OBRA
1 INGENIERO RESIDENTE
1 TECNICA SST
1 OPERARIO MANTENIMIENTO
2 OPERARIOS OBRA CIVIL
2 OPERARIOS CERRAMIENTO
ARQ. ALEXANDER LÓPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA



03-06-23 SE INSTALA TUBERIA BLANCA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE 2000 LTS Y REGISTRO
SE CONTINUA EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO PARA TANQUE
SE REALIZA LAVADO DE ENTRADAS A ZONA ADMINISTRATIVA
SE INFORMA QUE EN HORAS DE LA TARDE NOCHE LLEGA COCINA INTEGRAL Y SE INICIA LA INSTALACION DE LA MISMA

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA
1 INGENIERO RESIDENTE
1 TECNICA SST
1 OPERARIO MANTENIMIENTO
2 OPERARIOS CERRAMIENTO
2 OPERARIOS (CIELO) OBRACIVIL
1 OPERARIO COCINA
ARQ. ALEXANDER LÓPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

05-06-23 SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS ESCALONADA EN CONCRETO
SE REALIZA LIMPIEZA DE JARDINERIA Y DE ZONAS CERCANAS A LA PARTE ADMINISTRATIVA
SE VERIFICA INSTALACION DE DUCHAS ELECTRICAS
SE CONTINUAN RETOQUES DE PINTURA EN FACHADAS E INTERNA DE COLOR BLANCO
SE TERMINA ARMADO DE PUERTA Y ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO PARA TANQUE.
PERSONAL EN OBRA
1 INGENIERO RESIDENTE
1 TECNICA SST
1 OPERARIO MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner

2 OPERARIOS OBRA CIVIL - 2 OPERARIOS CERRAMIENTO
ARQ. ALEXANDER LOPEZ - RESIDENTE INTERVENTORIA

05/06/2023 AREA AMBIENTAL

- Se solicita jornada de orden y aseo
- Se retira retiro de material (carton PVC y plastico (peligroso - especial) empacado cemento y pinturas
- Ajustar codificación color bolsas de punto ecologico.

Yindy Rubiano
Interventoria
Residente Ambiental

06-06-23 SE ASISTE AL COMANDO PARA CORRECCIONES DE 1 CORTE INTERVENTORIA.
ARQ. ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

07-06-23 SE REALIZA PINTURA EN CERRAMIENTO DE LA AREA DE TANQUE EXTERNO
SE HACE INSTALACION DE FIJO EN VIDRIO FALTANTE PARA SALA DE JUNTAS
SE HACE LIMPIEZA DE PISOS EN BAÑOS

Powered by CamScanner

SE REALIZARON LABORES DE FUNDIDA Y REPARACION DESDE EL DIA DE AYER DE LOS DADOS EN CONCRETO
SE HACE LLENADO DE TANQUE PARA VERIFICAR QUE NO HAY FUGAS.
AR/ PERSONAL EN OBRA
1 INGENIERO RESIDENTE - 1 TECNICA SST - 1 OPERARIO MANTENIMIENTO - 1 OPERARIA ASEO - 2 OPERARIOS OBRA CIVIL - 2 OPERARIOS CERRAMIENTO
ARQ. ALEXANDER LOPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

28-06-23 SE HACE ASEO GENERAL EN LAS AREAS DE BAÑOS Y EN LA ZONA DE OFICINAS
SE REALIZAN RETOQUES EN LA ZONA DEL CERRAMIENTO Y LA CONCERTINA
SE REALIZAN REFACCIONES DE MUROS Y DE PINTURA EN FACHADAS
SE REALIZAN REPARACIONES EN VERTANERIA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA
PERSONAL EN OBRA
1 INGENIERO RESIDENTE - 2 OPERARIOS MANTENIMIENTO
2 OPERARIOS CERRAMIENTO - 1 OPERARIO OBRA CIVIL
ARQ. ALEXANDER LÓPEZ - RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner

09-Jun/23	Iniciamos en obra haciendo remates menores, pintando la cinta perimetral del acceso de la escalera hacia las oficinas. Se colocan los espejos que faltaban el de baño de mujeres y se obsequia espejo baño discapacitados, se atienden las recomendaciones de las manchas de pintura del nicho y correcciones de pintura en la ornamentacion gris. finaliza sin otras novedades la jornada
10-Jun/23	Iniciamos la jornada con labores de Aseo dando en el Sector del atopio como de las oficinas por dentro, se prueban nuevamente todas las llaves del proyecto incluidas las llaves de los tableros electricos, tambien se atiende la mejora de tapar el dubo sanitario de Ø6" sanitario con el material granular sobrante de las excavaciones de los postes de energia
12-Jun/23	FESTIVO NO SE LABORÓ

13-Junio/23	Iniciamos la jornada con el traslado de herramienta principal y andamios incluido material sobrante para almacenaje en bodega, se hace despeje y limpieza de la zona de Pedestales, se continua mejorando el aseo en el sector de los acopios finaliza la jornada sin novedades
14-Junio	Se hace reparación de muro superior de la Sala de juntas en pisos se hace devolución de contziner que utilizamos para campamento y se programa retiro de los baños para el 17-Jun tambien se programa la recoleccion de residuos del dia 20. finaliza la jornada sin novedades

Ok

Faltan Firmas

INFORMES SEMANALES

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC

INFORME SEMANAL #20

Semana Número:	20	Del:	29 de mayo de 2023	Al:	4 de junio de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	140		
ENTIDAD CONTRATANTE	CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	SEDE: ESCUELA FORMACIÓN BOMBERIL ACADEMIA UAECOB		SUPERVISOR	DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. - SGC."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,20%	95,20%
Valor básico de la Obra	$ 12.075.999,14	$ 522.561.417,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,40%	97,40%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	13.173.817,25	534.637.416,65


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-631-2021
Valor Inicial:	$398.909.052,00
Valor Actualizado:	$548.909.052,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 16 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 15 de junio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-646-2022
Valor Inicial:	$70.361.844,00
Valor Actualizado:	$87.952.305,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 16 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 15 de junio de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

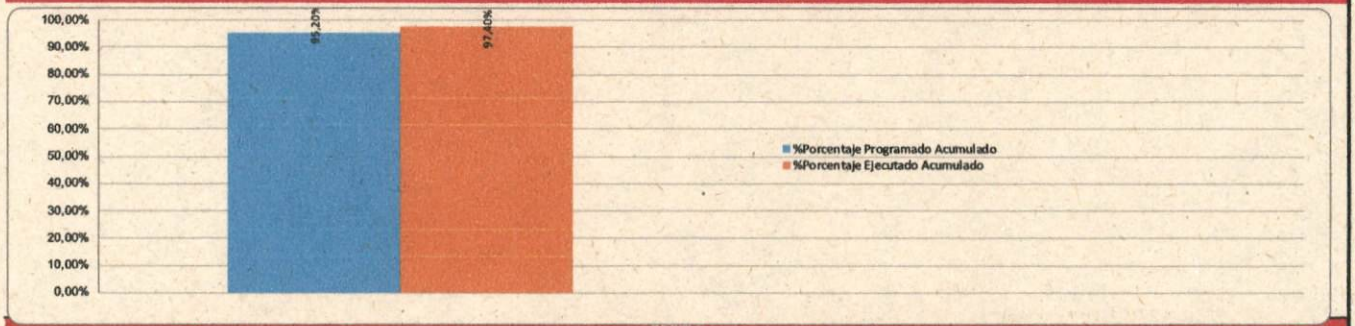

AVANCE

Durante la semana se tiene cómo personal itinerante en la obra: 1 Ingeniero residente, 1 Técnica SST, 2 Operarios de mantenimiento, 4 Operarios de mampostería, 3 Operarios electricidad, 2 operarios de cielo raso. Se debe aclarar que se manejan dos porcentajes en cuanto a la ejecucion de la obra, es decir en referencia al contrato inicial y tiempos iniciales que iban hasta el 15-05-2023 se tiene avance del 95,00% (presentando atraso de 5,00% a la fecha de entrega incial) y en referencia a la adicion aprobada para el proyecto se presenta un avance de 85% con fecha de entrega final el dia 16-06-2023. Se trabaja durante esta semana en la instalacion de la iluminacion perimetral por medio de los reflectores y la acometida en cable trenazdo que se termina de instalar a inicio de la semana y se dejan en funcionamiento a traves de las fotoceldas lo que da un horario promedio de iluminacion de 6:00 pm a 5:30 am. Adicionalmente se continua con la instalacion del cableado electrico interno de la zona administrativa para la conexion de area de oficinas, area de baños, area de recepcion y lamparas internas que iluminan estas zonas, quedando pendiente de instalacion la toma de la cocina. Se continua con la aplicacion de pintura en vinilo para las paredes de color blanco en toda el area interna de la zona administrativa, y se procede a realizar la instalacion de aparatos sanitarios y de los lavamanos en los mesones en granito que se han pulido en el final de la semana pasada. En cuanto a los enchapes de piso estos se termina de instalar en esta semana, se aplica la boca puerta en granito lavado como se habia indicado en todos los accesos y se empieza a aplicar la boquilla para la finalizacion de esta actividad. Se continua trabajando tambien en la aplicacion de la pintura insitucional de las fachadas en color gris (muros en ladrillo) y rojo (estructura) ahora en la parte sur y oriental de la fachada en la zona administrativa. En cuanto a la instalacion de la concertina acoplada al cerramiento perimetral esta se encuentra desarrollada en un 80% puesto que ya se habian colocado los pie de amigo y las guayas de base que sostienen los rollos de las concertinas, y se espera que la labor se este finalizando la semana entrante. Los tramos de cielo raso perimetral que se encuentran en la parte externa del area de recepcion se estan terminando y se espera que el edia lunes esten listos para su revision y aprobacion. Se deja anotacion en referencia a la instalacion de guarda escobas en vinilo para las areas de oficinas unicamente; las restantes areas tienen guarda escobas en ceramica de acuerdo al material de la zona donde se han instalado.


IMAGENES AVANCE



APLICACIÓN DE PINTURA (COLORES INSTITUCIONALES) SOBRE FACHADA SUR Y ORIENTAS ZONA ADMINISTRATIVA


IMAGENES AVANCE



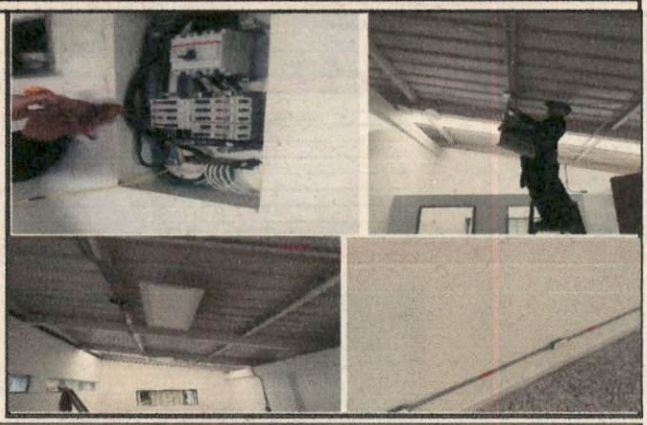

INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC // INSTALACIONES ELECTRICAS EN ZONA ADMINISTRATIVA



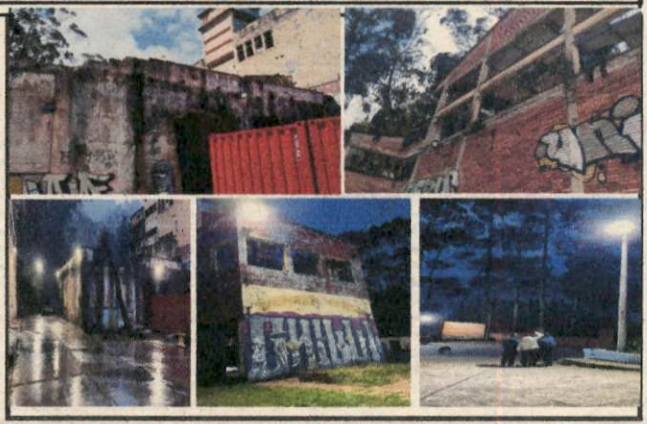

INSTALACION DE CABLEADO TRENZADO PARA ACOMETIDA DE REFLECTORES – INSTALACION DE REFLECTORES – ILUMINACION NOCTURNA DE LOS REFLECTORES





INSTALACION DE LAVAMANOS Y DE SANITARIOS EN AREA DE BAÑOS ZONA ADMINISTRATIVA – INSTALACION DE CONCERTINA PERIMETRAL

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC

INFORME SEMANAL #21

Semana Número:	21	Del:	5 de mayo de 2023	Al:	11 de mayo de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	147		
ENTIDAD CONTRATANTE	CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	SEDE: ESCUELA FORMACIÓN BOMBERIL ACADEMIA UAECOB		SUPERVISOR	DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. - SGC."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,20%	98,20%
Valor básico de la Obra	$ 17.565.089,66	$ 539.028.689,06

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,10%	99,50%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.527.090,09	546.164.506,74

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-631-2021
Valor Inicial:	$398.909.052,00
Valor Actualizado:	$548.909.052,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 16 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 15 de junio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-646-2022
Valor Inicial:	$70.361.844,00
Valor Actualizado:	$87.952.305,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 16 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 15 de junio de 2023

GRÁFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE

Se tiene como personal del contratista en obra durante la semana el siguiente: 1 Ingeniero residente de obra, 1 Tecnica SST, 1 operario de mantenimiento, 2 operarios cerramiento, 1 operario de obra civil y acabados. Durante la semana se trabajan en los acabados de la obra civil puesto que se tiene programada la pre-entrega para el dia 09-10-2023. Se confirma la instalacion del tanque de recpcion de desechos liquidos en fibra de vidrio en color azul y con una estructura metalica de color negro que ha sido colocado en la parte de la entrada al complejo de la escuela y en este sitio se hace la colocacion de un cerramiento en malla eslabonada y con concertina en la parte superios de las mismas caracteristicas que se coloco en el perimetro de la escuela. Se hace pintura y retoques en la fachada desde la ubicacion del cerramiento en malla, pasando por la ubicacion del tanque de desechos liquidos, hasta la fachada completa de la zona administrativa en todas sus caras incluyendo las areas de las escaleras asi como de las del jardin que se encuentra en la entrada de la escuela y de la zona administrativa. Se hace la revision en las instalaciones electricas del predio y se encuentra que funcionan los toma corrientes, los interruptores y el tablero principal de la zona administrativa, asi como el tablero general de distribucion de las acometidas del predio que proveen de electricidad a las acometidas perimetrales y de iluminacion de cada bodega asi como de la zona de hospedaje. Se hace recorrido de revision en el cerramiento instalado y se hacen los ajustes y correcciones requeridas para que se pueda recibir a satisfaccion y se hacen arreglos en la concertina para sellar las zonas de cambios de nivel en todo el perimetro general del cerramiento. Se realizaron las correcciones respectivas en el nicho para gases que previamente se habia realizado anteriormente debido a algunas marcas de la pintura roja de la puerta del cerramiento correspondiente. Se hace revision de los acabados en el area de los baños de la zona administrativa y se hace tambien la verificacion del suministro de agua desde el tanque aereo de 2000 lt y se tiene una presion constante que permite el funcionamiento de esta parte sin contratiempo alguno. Se hace revision de las puertas de madera de los baños en la zona administrativa sin novedades. Asi mismo se hace la revision de la instalacion de la division en vidrio templado para la el area de las oficinas en la planta superior y se verifica que quedo con su pelicula frosted instalada de manera correcta. Se realiza el recorrido en compañia del apoyo a la supervision de la obra, de la direccion de interventoria, de la direccion de obra del contratista el dia 09-06-2023 en horas de la amañan tal como se habia acordado y se dejan como observaciones el quitar un pasador en una de la puertas metalicas que dan acceso desde afuera de la escuela al area administrativa y de algunos retoques en la pintura interbna de color blanco. Se estaba a la espera de la definicion de la fecha de entrega final que fue aporbada para el dia 14-06-2023 con el anterior personal de nuevo para este recorrio y se hara presente tanto la coordinadora degestion humana como la supervisora del contrato para dicha entrega, se solicita a todos los participantes el diligenciar los documemtos respectivos de la entrega para ser firmados en sitio el dia asignado.

IMAGENES AVANCE



APLICACIÓN DE PINTURA (COLORES INSTITUCIONALES) SOBRE FACHADA OCCIDENTAL, SUR Y ORIENTAL ZONA ADMINISTRATIVA

IMAGENES AVANCE



TANQUE DE RESIDUOS LIQUIDOS // AREA INTERNA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA



CERRAMIENTO PERIMETRAL CON CONCERTINA // NICHO PARA GASES



ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REFLECTORES EXTERNOS EN BODEGAS DE LA ESCUELA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC

INFORME SEMANAL #22

Semana Número:	22	Del:	5 de mayo de 2023	Al:	11 de mayo de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	154		
ENTIDAD CONTRATANTE	CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	SEDE: ESCUELA FORMACIÓN BOMBERIL ACADEMIA UAECOB		SUPERVISOR	DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. - SGC."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,80%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 9.880.362,94	$ 548.909.052,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,50%	100,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.744.545,26	548.909.052,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-631-2021
Valor Inicial:	$398.909.052,00
Valor Actualizado:	$548.909.052,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 16 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 15 de junio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-646-2022
Valor Inicial:	$70.361.844,00
Valor Actualizado:	$87.952.305,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	lunes, 16 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 15 de junio de 2023


GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE

Se realiza instalación de grifería en cocina integral.
- Se realiza prueba de llenado en tanque de aguas negras.
- Se realiza instalación de cinta asfáltica.
- Se instalan espejos en baños.
- Se realiza instalación de división en vidrio en el segundo piso.
- Se realiza mejoramiento de empalmes de cielo raso.
- Se realiza instalación de puerta con pasadores, anticorrosivo, wash primer y esmalte en zona de tanque de aguas negras.
- Se termina de instalar la película frosted en ventanas.
- Se realiza instalación de tubería sanitaria de 6 "para el tanque de aguas negras.
- Se realizan retoques de pintura en cerramiento.
- Se realiza instalación de corazas en cableado de duchas.
- Se realiza instalación de barras en baño de personas discapacitadas.
- Se realiza soldadura en manijas de ventanas.
- Se realiza limpieza e impermeabilización de muro túnel.
- Se termina podada.
- Se realiza limpieza de manchas de pintura en el nicho.
- Se realiza inventario de llaves.

IMAGENES AVANCE

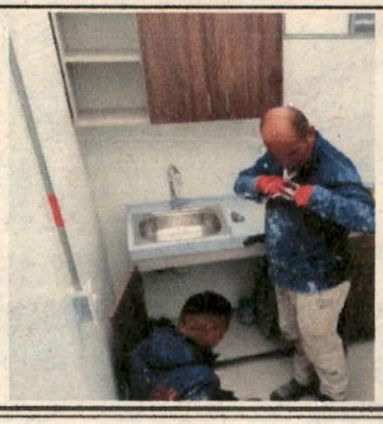




INSTALACION DE COCINA Y ESPEJOS

IMAGENES AVANCE



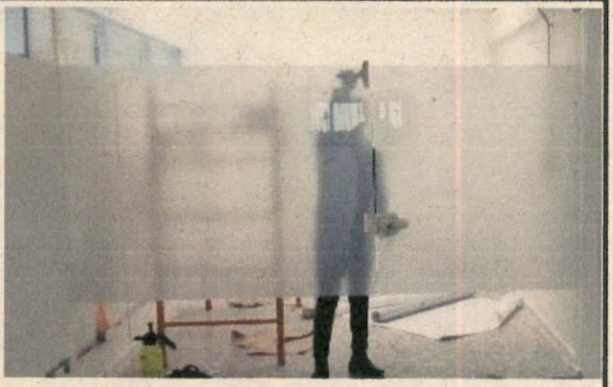

PINTURA REJA DEL TANQUE E INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO OFICINAS





ISNTALACION DE DUCHAS ELECTRICAS Y RETIRO DE SOBRANTES DE LA OBRA





INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DEL TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE RESIDUOS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, 05 de Junio de 2023
INTER-BMBALE-ADM-048

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC

Asunto: Remision Informe Tecnico Mensual De obra No.04

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia esta interventoría se permite remitir el informe mensual técnico de obra que comprende el periodo entre el 01 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023 con todos sus anexos correspondientes, revisado y avalado por esta interventoría.

Cordialmente,

Arq. Laura P. Gordillo M.
Esp. Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Ing. Cristhiam Camilo Orozco Rubio – Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 05 de Junio de 2023
INTER-BMBALE-ADM-047

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC

Asunto: Remision Informe Seguridad Y Salud En El Trabajo Mensual De obra No.04

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia esta interventoría se permite remitir el informe mensual de seguridad y salud en el trabajo de obra que comprende el periodo entre el 01 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023 con todos sus anexos correspondientes, revisado y avalado por esta interventoría.

Cordialmente,

Arq. Laura P. Gordillo M.
Esp. Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Ing. Cristhiam Camilo Orozco Rubio – Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 05 de Junio de 2023
INTER-BMBALE-ADM-046

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC

Asunto: Remision Informe Ambiental Mensual De obra No.04

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia esta interventoría se permite remitir el informe mensual ambiental de obra que comprende el periodo entre el 01 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023 con todos sus anexos correspondientes, revisado y avalado por esta interventoría.

Cordialmente,

Arq. Laura P. Gordillo M.
Esp. Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Ing. Cristhiam Camilo Orozco Rubio – Apoyo A La Supervisión UAE

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 05 de Junio de 2023
INTER-BMBALE-ADM-045

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC

Asunto: Remision Corte Parcial De obra No.03

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia esta interventoría se permite remitir el corte parcial de obra No.03 por valor de $175.189.006,00 con todos sus anexos correspondientes, revisado y avalado por esta interventoría.

Cordialmente,

Arq. Laura P. Gordillo M.
Esp. Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Ing. Cristhiam Camilo Orozco Rubio – Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 05 de Junio de 2023
INTER-BMBALE-ADM-043

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-646-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Remision Informe Mensual No.03 Contrato De Inteventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia esta interventoría se permite remitir el informe mensual de interventoría No.04 que comprende el periodo entre el 01 de Mayo de 2023 y el 31 de Mayo de 2023.

Cordialmente,

Arq. Laura P. Gordillo M.
Esp. Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Ing. Cristhiam Camilo Orozco Rubio – Apoyo A La Supervisión UAE

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 23 de Mayo de 2023
INTER-BMBALE-ADM-042

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-646-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Retiro De Escombros No Autorizado En Acadamia

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia esta interventoría se permite informar formalmente el retiro no autorizado y de forma indebida de las instalaciones de la academia el cual se dio el día lunes 15 de mayo de 2023 aproximadamente entre la 1:00 pm y las 2:00 pm, presuntamente retiro autorizado por el Sargento Torres que e encuentra a cargo de la academia.

El residente de interventoría le solicito algún documento al Sargento indicando que e se hacía responsable por ese retiro pero al día de hoy no se ha recibido ninguna comunicación .

Se reitera que todos los escombros deben manejarse de manera como lo indica la normativa ambiental y hay unos volúmenes de generación de escombros cuantificados del proyecto y no pueden hacerse retiros no autorizados, se solicita a la Entidad nos notifique como proceder.

Cordialmente,

Arq. Laura P. Gordillo M.
Esp. Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Ing. Cristhiam Camilo Orozco Rubio – Apoyo A La Supervisión UAE

CERTIFICACIONES

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

Referencia: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Informe Desempeño Del Personal De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico el seguimiento al desempeño tecnico apropiado del personal de obra del contrato de la referencia, no se ha presentado a la fecha de corte de la presente certificacion ningun tipo de requerimmiento o contratiempo, y se ha velado por el personal de obra cumpla con sus obligaciones, entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

Referencia: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Seguimiento Tecnico Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico el seguimiento al manejo tecnico de los trabajos realizados por el contratista de obra de la referencia entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

Referencia: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Seguimiento Manejo Administraivo Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico la realizacion del seguimiento del manejo administrativo de la obra entre entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal

Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

Referencia: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Revision De Balance De Obra y Actividades Adicionales Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico la realizacion de la revision del balance semanlmente en conjunto interventoria-obra despues de los comites de obra. Respecto a las actividades adicionales en el periodo de la presente certificacion entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

Referencia: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Realizacion Comites Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico la realizacion de comites de obra y reuniones pertinentes para evaluar el desarrollo del proyecto entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023. Evidencia presentada en los correos de citacion y en las actas de comité adjuntas a los informes mensuales.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

Referencia: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Seguimiento Calidad Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646- 2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico el seguimiento a la calidad de los trabajos realizados por el contratista de obra de la referencia. Se realizo el seguimiento y ajustes en todo proceso realizado en la obra y se notifico de esto a la supervision en los informes semanales entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023. De igual forma en la bitacora adjunta a los informes mensuales se evidencia el seguimiento a cada actividad desarrollada diariamente por parte de interventoria.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Cumplimiento Objeto Contractual Contratista De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". certifico que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demás aspectos relacionados entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifica que el contratista implemente que uno los materiales de construcción sean sostenibles, donde la materia prima sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes, de producción justa y consuman poca energía en su ciclo de vida. Es importante que se conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo a la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del producto como soporte de cumplimiento. Al momento del presente informe no se ha realizado el uso de ningun material solo se han realizado demoliciones y desmontes, entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023..

..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**,: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1.* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifica la no afectacion de ningun individuo arboreo entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo, que se ha delegado personal profesional comptente y adionalmente ha dispuesto todos los recursos de personal, equipos, implementos al igual que el contratista de interventoria. Durante el periodo de la presente certificacion no se ha solitado el remplazo de ningun empleado o trabajador ya que no se ha presentado la necesidad, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". . Certifica que se ha velado por proteger las propiedades de terceros durante la ejecucion de la obra y a la presente no se ha presentado ningun evento ni reclamación, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifica que se ha mantenido una actitud conciliadora entre las partes que intervienen en los contratos de relación, coordinando los eventos como comites semanales y reuniones extraordinarias que tengan lugar la correcta revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para las intervenciones, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifica que se ha mantenido una actitud conciliadora entre las partes que intervienen en los contratos de relación, coordinando los eventos como comites semanales y reuniones extraordinarias que tengan lugar la correcta revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para las intervenciones, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifico la correcta revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para las intervenciones, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Cumplimiento Recursos De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", interventoria encargada del **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifico la correcta administración de recursos de obra en cuanto al personal, equipos necesarios e implementos necesarios para el normal desarrollo de las labores de la interventoria del contrato de referencia, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación No Actos De Corrupcion De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico la no presentacion de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o la norma que lo sustituya o derogue.que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demás aspectos relacionados. entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Cumplimiento Objeto Contractual Contratista De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demás aspectos relacionados entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Implementación del Sistema De Gestion en Y Salud En El Trabajo Contratista De Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico correcta verificacion de la Implementación del Sistema De Gestion en Seguridad Y Salud En El Trabajo Contratista De Interventoria, en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019. Adicionalmente se certifica la entrega de todos los EPP (elementos de protección personal obligatorios incluidos los de Bioseguridad). entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Verificacion del Sistema De Gestion en Seguridad Y Salud En El Trabajo Contratista De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico correcta verificacion de la implementacion de control según los riesgos identificados en la Matriz De Peligros presentada por el contrato **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". SOLTEC , como lo señala la Resolución 2400 de 1979, la Ley 9a de 1979, la Resolución 1016 de 1989 y la Resolución 2413 de 1979. Se anexa matriz de Riesgos Del Contratista De Obra. entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.
Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Cumplimiento Dotación Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico el cumplimiento de la entrega de la dotación adecuada y completa al personal de obra acorde a la labor desempeñada. entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

55

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Cumplimiento Dotación Contrato De Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", certifico el cumplimiento de la entrega de la dotación adecuada y completa al personal de interventoria acorde a la labor desempeñada. entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Protocolo Bioseguridad Contrato Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion expedida por la ARL POSITIVA a la firma GORDILLO Y ASOCIADOS SAS, el dia 04 de septiembre de 2020 dando visto bueno al protocolo de seguridad que implementa la empresa en sus diferentes contratos y que se ha aplicado en el presente en cumplimiento a las recomendaciones estimuladas en cumplimiento a la legislacion vigente de la emergencia sanitaria RESOLUCION 666 y 682 de 2020 entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Seguimiento Impacto Auditivo Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC",, grarantizo que se ha velado por generar el menor impacto auditivo en las actividades ejecutadas y que hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad al prespecto. entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Aprovechamiento Granulo De Caucho

Respetados Señores:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion relacionada con la viabilizacion del aprovechamiento de granulo de caucho en las actividadades del proyecto en zonas y/o áreas del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios etc.) la cual no fue posible ya que no se esta desarrollando ninguna actividad que lo permita. entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Retiro De Escombros Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC"", se realiza el retiro correcto y de acuerdo < la normativa legal vigente de los escombros entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion No Uso Parque Automotor Contrato De Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", Certifico el no uso de parque automotor del contrato de interventoria, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Uso Del Papel

Respetados Señores:

La presentación de los informes físicos, que han realizado de acuerdo con los criterios ambientales Numeral 24.2 (El contratista, para la presentación de informes físicos deberá dar un adecuado uso al recurso del papel, donde se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF. Para lo cual, se certifica que la Empresa GORDILLO & ASOCIADOS SAS con numero de NIT 900.581.578- 1, cumple con este criterio ambiental, así mismo se ha mitigado el uso de papel y se ha reemplazado por envío de la información por correos electrónicos. entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion De No Generación Residuos Peligrosos

Respetados Señores:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion de la no generacion de residuos peligrosos y/o especiales tales como tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEES, disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionado), garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, a la fecha de corte de la presente certificación

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion De No Requerimiento De Plan De Manejo De Transito Contrato De Obra

Respetados Señores:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion del no uno de plan de manejo de transito del contrato de referencia, ya que por las obras a desarrollar no se identifica su necesidad ya que no se afectara directamente la movilización de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas). De igual forma se brindara un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar a medida que lo ameriten las actividades a desarrollar

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificación Cumplimiento Recursos De Interventoría

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", y responsable de la interventoria del contrato **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", Certifico la correcta administración de recursos de interventoría en cuanto al personal, equipos necesarios e implementos necesarios para el normal desarrollo de las labores de la interventoria del contrato de referencia, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

ACREDITACION DE PLANTA DE PERSONAL Y TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Yo, OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, identificado con cedula de ciudadania no. 19.287.455 expedida en bogotá, actuando en calidad de respresentante legal, mediante la presente certifico que el n umero total de trabajdores de la planta de personal de GORDILLO Y ASOCIADOS SAS, el cual corrresponde a 7 y el numero de trabajadores en condicion de discapacidad corresponde a 1 a la fecha, adenas me comprometo a mantener el personal contratado por el plazo de ejecucion del contrato.
Se expide certificacion el 16 del mes de junio de 2023

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Cumplimiento Personal Ofertado

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", y responsable de la interventoria del contrato **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifico el cumplimiento del personal ofrecido conforme a la propuesta en el desarrollo de los contratos de mención, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Vigencia Y Correcta Cobertura Garantias Contractuales

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", y responsable de la interventoria del contrato **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1,* Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifico la verificacion de la vigencia y la correcta cobertura de las garantias contractuales de obra e interventoria, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certificacion Correcta Ecuacion Equilibrio Economico Contratos De Obra E Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-646-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC", y responsable de la interventoria del contrato **UAECOB-631-2022,** a cargo de **SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificado con NIT *900.812.511-1*, Que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC". Certifico la verificación de la correcta ecuacion y equilibrio economico contratos de obra e interventoria, en el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 16 de Junio de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB– Supervisor De Contrato

CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Certiicado Del Oferente Del Servicio Publico
De Empleo Contrato De Interventoria 646-2022

De la manera más atenta esta interventoría informa certifica su afiliacion del personal femenimo vinculado al proyecto en la plataforma de Servicio Publico De Empleo, en cumplimiento con lo requerido por la Entidad contratante.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

0234

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles
NIT.900.581.578-1

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Siendo responsabilidad de todo el personal promover y mantener una cultura de Seguridad y Salud en el trabajo.

Logrando convertirla en un estilo de vida, cumpliendo con las normas y procedimientos estipulados por la empresa y la legislación vigente.

La alta gerencia se compromete a:

- Promover la participación de sus colaboradores en el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y de las acciones necesarias para su intervención.
- Proveer las medidas de prevención y control de los riesgos propios de las actividades y procesos de acuerdo con la identificación, análisis y valoración que se haga de los mismos.
- Generar una cultura de compromiso individual y colectivo desde la observación y retroalimentación sobre el comportamiento seguro en cada uno de sus colaboradores.
- Desarrollar programas de capacitación y motivación permanentes dirigidos a trabajadores, supervisores y contratistas
- Proteger y prevenir la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora continua, como variable fundamental para el desempeño de la empresa dentro del cumplimiento en materia de legislación en seguridad y salud en el trabajo, aplicable y vigente para la organización.

Todos los trabajadores, visitantes, contratistas, proveedores y demás partes interesadas, tendrán la responsabilidad de cumplir con las políticas, normas y procedimientos seguros de trabajo, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones y actos que puedan generar consecuencias adversas para la seguridad y la salud de los trabajadores y la fundación.

Gerente: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
Fecha: 10/12/2021

0230

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría e Interventoría de Obras Civiles
NIT 900.581.578-1

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S NIT. 900.581.578-1

ESTANDARES MINIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTANDAR		ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requerida para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	0,5	0	0	4
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5	0	0	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.	0,5		0,5	0	0	
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5	0	0	
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5		0,5	0	0	
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		0,5	0	0	
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		0,5	0	0	
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0,5	0	X	
		Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2	0	0	6
			1.2.2 Inducción y Re inducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2		2	0	0	
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		2	0	0	
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	1	15	1	0	0	12
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1	0	0	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1	0	0	
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2	0	0	
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2		2	0	0	
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		0	0	0	

		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2	0	0		
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	0	0		
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salúd en el Trabajo SG-SST	1		1	0	0		
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		0	0	0		
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	0	0		
II HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica Diagnostico de Condiciones de Salud	1	9	1	0	0	9	
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1	0	0		
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1	0	0		
			3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales. Peligros-Periodicidad Comunicación al Trabajador	1		1	0	0		
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1	0	0		
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1	0	0		
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1	0	0		
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1	0	0		
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1	0	0		
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	5	2	0	0	5	
			3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2		2	0	0		
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1		1	0	0		
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	1	0	0	6	
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		1	0	0		
			3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	1		1	0	0		
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		1	0	0		
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		1	0	0		
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica	1		1	0	0		
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15	4	0	0	15	
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4	0	0		
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.	3		3	0	0		
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4	0	X		

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría e Interventoría de Obras Civiles
NIT 900.581.576-1

		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5	15	2,5	0	0	15
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		2,5	0	0	
			4.2.3 Elaboración de procedimientos instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5	0	0	
			4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST	2,5		2,5	0	0	
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5	0	0	
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5	0	0	
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias	5	10	5	0	0	5
			5.1.2 Brigada de prevención conformada capacitada y dotada	5		0	0	0	
III VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5	1,25	0	0	2,5
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		0	0	0	
			6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	1,25		0	0	0	
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25		1,25	0	0	
IV ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	10	2,5	0	0	10
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		2,5	0	0	
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		2,5	0	0	
			7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		2,5	0	0	
TOTALES					**100**	**89.50**	**0**	**0**	**89.50**

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)


FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRANTE **FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST**


EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:	**ACEPTABLE**

CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A. hace constar que la empresa **Gordillo & Asociados Sas**, identificada con **NI 900581578** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **06/05/2022** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2021** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **89,50%. ACEPTABLE**

Resultados Evaluación por Ciclo

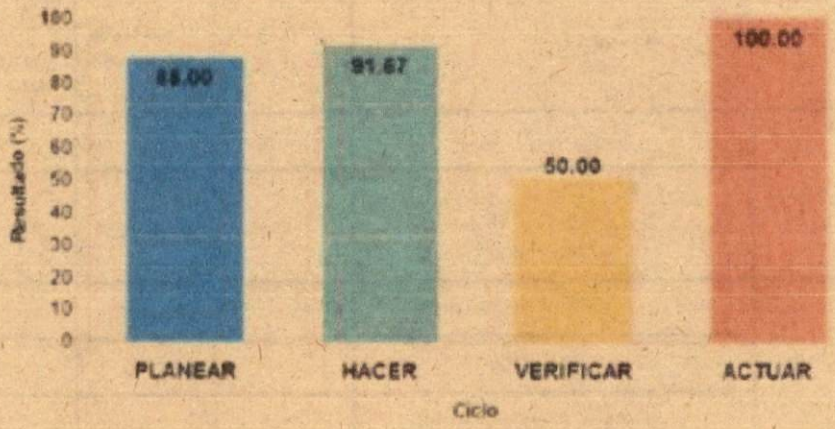

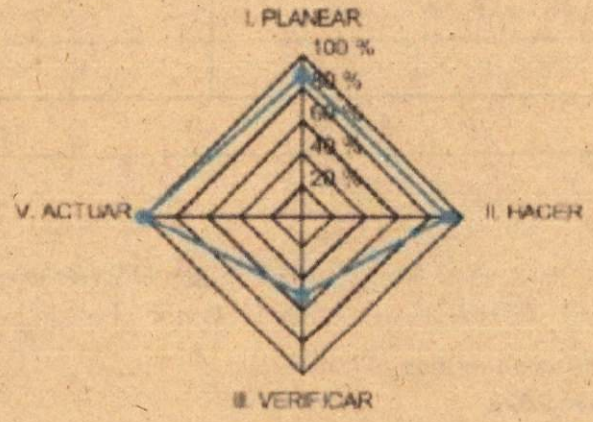

CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	22,00%	88,00%
HACER	60,00%	55,00%	91,67%
VERIFICAR	5,00%	2,50%	50,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	100%	89,50%	89,50%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

0232

Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	12,00%	80%
HACER	3 GESTION DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	5,00%	50%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	2,50%	50%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	89,50%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **06 mayo 2022**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=3/LGpfO7lXtlfT0c74jrhQ==)

Para verificación de Positiva

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2023721100000001092
FECHA RADICADO:	13/01/2023
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	GORDILLO & ASOCIADOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	900581578-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	4
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	25,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD0284.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 17 de febrero de 2023

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

Servicio de Empleo

Certificado de Registro del Oferente

Bogotá, D.C., 29 de Noviembre 2022

El prestador CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR con NIT No. 8600669427 adscrito a la red del Servicio Público de Empleo, CERTIFICA que, una vez consultado el sistema de información, la señora LAURA PATRICIA GORDILLO MACHADO con Cédula de Ciudadanía No. 1020760496 se encuentraregistrada con el prestador desde el 25 de Mayo 2018. Su última fecha de actualización de datos reportada es 15 de Octubre 2022 y su hoja de vida se encuentra COMPLETA.

Se expide el presente certificado, para que surta los efectos oportunos.

Servicio de Empleo

Certificado de Registro del Oferente

Bogotá, D.C., 29 de Noviembre 2022

El prestador CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR con NIT No. 8600669427 adscrito a la red del Servicio Público de Empleo, CERTIFICA que, una vez consultado el sistema de información, la señora MARIA LUCRECIA LOPEZ AROCA con Cédula de Ciudadanía No. 52387407 se encuentra registrada con el prestador desde el 23 de Mayo 2011. Su última fecha de actualización de datos reportada es 27 de Octubre 2022 y su hoja de vida se encuentra COMPLETA.

Se expide el presente certificado, para que surta los efectos oportunos.

Servicio de Empleo

Certificado de Registro del Oferente

Bogotá, D.C., 17 de Marzo 2023

El prestador CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO con NIT No. 8600073361 adscrito a la red del Servicio Público de Empleo, CERTIFICA que, una vez consultado el sistema de información, la señora MERCY CHARYL GONZALEZ con Cédula de Ciudadanía No. 39755515 se encuentra registrada con el prestador desde el 12 de Abril 2016. Su última fecha de actualización de datos reportada es 23 de Julio 2019 y su hoja de vida se encuentra COMPLETA.

Se expide el presente certificado, para que surta los efectos oportunos.
