Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA** **FORMATO: ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE RECIBO FINAL**	**Código: FO-GA-01** **Fecha: 21/07/2021** **Versión:02** **Página: 1 de 1**

CONTRATO No	296-2023	**ACTA No**	**RECIBO FINAL**	**FECHA DEL ACTA**	15/12/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL	01/12/2023	AL	19/12/2023	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**		19/12/2023

CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA	**C.C.:**	80,279,268
CONTRATISTA:	X ACRUX ARQUITECTURA S.A.S	**NIT.:**	901.501.626-9
REP. LEGAL:	X NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**C.C.:**	79.950.295
SUPERVISOR:	X CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	**CARGO**	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DEP. SUPERVISOR:	X OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
INTERVENTOR:	X N/A	**NIT.:**	N/A
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de recibo final, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido: **100%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	1	DIAS	0	**INICIA**	20/11/2023
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENCIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**1**	**DIAS**	**0**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**1**	**DIAS**	**0**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	19/12/2023

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas: **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.						

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

EN EL PERIODO EVALUADO, EL CONTRATISTA CUMPLE SUS FUNCIONES A SATISFACCION

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:				
NINGUNA				
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?		**SI**		**NO** X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?		**SI** X		**NO**
SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SOPORTES				
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?		**SI** X		**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101018885	18/11/2023	18/04/2024	N/A	20/04/2024	12/12/2023
PRESTACIONES SOCIALES	62-44-101018885	18/11/2023	18/12/2026	N/A	20/12/2026	12/12/2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	62-44-101018885	18/12/2023	18/12/2028	N/A	20/12/2028	12/12/2023

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	nov-23	11/12/2023	$ 1,640,000
SALUD	dic-23	11/12/2023	$ 410,200
ARL	dic-23	11/12/2023	$ 714,000

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **99.97%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$**	**91,983,452.00**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$	61,983,452.00	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		$30,000,000.00	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES		$0	
E5. VALOR ANTICIPO		$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA			$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES			$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))			$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$**	**42,980,994.87**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES			$48,970,831.58
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		$	31,625.55
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$**		**42,980,994.87**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000825	FECHA:	17/11/2023
F2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000896	FECHA:	07/12/2023
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS	No	38500002174

F6.F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	X	ESPECIAL	0

G. FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada.

Los pagos parciales se realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar El 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.

Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100% del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

H. OBSERVACIONES:

El presente informe de supervisión y acta final, hace las veces del ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL del contrato de obra No. 296 de 2023 y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecución del contrato de la referencia.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA** Alcalde Municipal	
CONTRATISTA:	**NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	

ÁCRUX ARQUITECTURA

INFORME TECNICO
RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No 296 DE 2023

OBJETO "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA."

CONTRATISTA: ACRUX ARQUITECTURA S.A.S
R.L. NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

DICIEMBRE DE 2023

ÁCRUX ARQUITECTURA

TABLA DE CONTENIDO

I. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO 3
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 3
III. LOCALIZACION 4
IV. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONOMICA 5
V. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 5
VI. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA 6
VII. ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
VIII. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 7
IX. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 7

ÁCRUX ARQUITECTURA

I. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SUPERVISOR:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
CONTRATO No:	296 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
NIT. No:	901.501.626-9
CLASE	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($61.983.452,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES
VALOR DEL ANTICIPO:	$0,00
FECHA INICIO:	20/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19/12/2023
ADICION No. 1	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 30.000.000,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($91.983.452,00)
FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA	19/12/2023

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El municipio de Villeta con el propósito de mejorar la red vial terciaria de su jurisdicción y contribuir con el desarrollo sostenible de sus pobladores, contempló en el plan de Desarrollo municipal el programa ¡Villeta Competitiva con Gestión Transparente! Calidad del sistema vial y de transporte para el desarrollo. Motivo por el cual para dar cabal cumplimiento a las metas que se desprenden de los diferentes programas, en especial del descrito anteriormente. La Oficina Asesora de Planeación Municipal elaboró el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA". Con el fin de atender

las necesidades de seguridad vial y de transitabilidad que afectan a nuestras comunidades.

La administración Municipal de Villeta Cundinamarca en aras de realizar el mejoramiento de las vías rurales en los sitios críticos de acceso de la población, ve la necesidad de realizar la construcción de placa huellas en estos puntos neurálgicos de la vía de las veredas anteriormente mencionadas, por lo que es importante mencionar que de acuerdo al trabajo de diagnóstico y trabajo conjunto con los presidentes de las juntas de acción comunal y la comunidad misma de cada sector rural, se han priorizado las vías con mayor dificultad de acceso o inconvenientes en el tránsito peatonal y vehicular, debido, a sus condiciones físicas de deterioro, altas pendientes.

Con sustento en lo anterior cabe resaltar que actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural de la vereda Cune, del municipio de Villeta Cundinamarca, debido a que, las vías de estas dos veredas se encuentran en mal estado, y en temporada de lluvias se vuelve intransitable generando restricciones en el tránsito vehicular. Pues a pesar del mantenimiento rutinario que se realiza a las vías rurales del municipio, las condiciones de deterioro de la superficie de rodadura y las condiciones de pendiente hacen que se acelere el deterioro y persistan los problemas de circulación vehicular.

III. LOCALIZACION

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.



ÁCRUX ARQUITECTURA

IV. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONOMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6,9428	$ 73.235,00	$ 508.455,96
2	AFIRMADO	M3	45,72	$ 65.337,00	$ 2.987.207,64
3	CUNETA D E CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	13,48	$ 704.420,00	$ 9.495.581,60
4	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	9,62	$ 591.703,00	$ 5.692.182,86
5	CONCRETOS CLASE D , f´c =3000 psi (bases)	M3	23,09	$ 897.202,00	$ 20.716.394,18
6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.268,12	$ 9.771,00	$ 22.161.800,52
7	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	304,79	$ 1.384,00	$ 421.829,36
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$61.983.452**
				AJUSTE AL DECIMAL	**-$ 0,12**
				VALOR TOTAL	$ 61.983.452,00

AIU	**ADMINISTRACIO N**	25%
	IMPREVISTO	3%
	UTILIDAD	5%
TOTAL AIU		33%

ÁCRUX ARQUITECTURA

V. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

SUPERVISOR	CLAUDIA CAROLINA MUÑZO ROJAS
	SECRETARIO DE PLANEACION

VI. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA

NOMBRE DEL AMPARO	No. PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101018885	20/11/2023	20/04/2024	$ 18.396.690,40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	62-44-101018885	20/11/2023	20/12/2026	$ 9.198.345,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	62-44-101018885	20/12/2023	20/12/2028	$ 18.396.690,40

ÁCRUX ARQUITECTURA

VII. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades principales que están relacionadas al **mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la esmeralda a la vereda cune, en el sector la capilla,** se mencionan a continuación:

- EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM
- AFIRMADO
- CUNETA D E CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
- CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
- CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

La cantidad de la actividad ejecutada de acuerdo al presupuesto oficial es de:

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	43.10
2	311.1	AFIRMADO	M3	100.40
3	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20.46
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	13.15
5	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	39.15
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	M3	2458.11
7	671.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	650.00

ÁCRUX ARQUITECTURA

VIII. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El avance de obra a la fecha es del %100 de ejecución equivalente a $ 91.951.826,45

AVANCE FINANCIERO CORTE No. 1

VALOR DEL CONTRATO	$ 61.983.452,00
VALOR CORTE No. 1	$ 48,970,831.58
VALOR CORTE RECIBO FINAL	$ 42.980.994,87
VALOR EJECUTADO	$ 91.951.826,45
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 31.625,67

IX. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La construcción de la placa huella en la vereda cune ha mejorado significativamente las condiciones de movilidad, desarrollo y crecimiento para los habitantes del área.

Se han cumplido todas las especificaciones establecidas en los diseños y se han utilizado materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y resistencia de la obra. Todo esto, ha permitido mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes del sector.

Cordialmente,

Nombre del representante legal	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
C. C. No.	9.950.295 de Bogotá
Matrícula profesional No.	A25232003 79950295
Dirección de correo	Calle 7 No. 11 – 180
Correo electrónico	n_ortiz1979@hotmail.com
Celular	313 4673418

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9 - REP. LEGAL NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
SUPERVISION: OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS

PLAZO: UN (1) MES
INICIO: 20-nov-23
TERMINACION: 19-dic-23

PRESENTE ACTA 13-dic-23

ASEGURADORA / POLIZA SEGUROS DEL ESTADO SA CUMPLIMIENTO 6244101018885
CUMPLIMIENTO 20-11-2023 / 20-04-2024
PRESTACIONES SOCIALE: 20-11-2023 / 20-12-2026
ESTABILIDAD DE OBRA 20-12-2023 / 20-12-2028
ASEGURADORA / POLIZA SEGUROS DEL ESTADO SA RCE 6240101010545
RESPONSABILIDAD CIVIL 20-11-2023 / 20-12-2023

CONDICIONES CONTRACTUALES							ADICION N°1		ACUMULADO		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6.94	$ 73,235.00	$ 508,456	3.47	$ 254,125	15.62	$ 1,144,223.64	27.47	$ 2,012,058.39	43.10	$ 3,156,282.03
2	311.1	AFIRMADO	M3	45.72	$ 65,337.00	$ 2,987,208	18	$ 1,176,066	63.00	$ 4,116,231.00	37.40	$ 2,443,603.80	100.40	$ 6,559,834.80
3	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	13.48	$ 704,420.00	$ 9,495,582	6.5	$ 4,578,730	13.02	$ 9,171,548.40	7.44	$ 5,241,730.10	20.46	$ 14,413,278.50
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	9.62	$ 591,703.00	$ 5,692,183	4.6	$ 2,721,834	8.10	$ 4,792,794.30	5.05	$ 2,987,804.30	13.15	$ 7,780,598.60
5	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	23.09	$ 897,202.00	$ 20,716,394	11.2	$ 10,048,662	18.95	$ 16,997,492	20.20	$ 18,126,530.89	39.15	$ 35,124,022.78
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2268.12	$ 9,771.00	$ 22,161,801	1131.36	$ 11,054,502	1248.22	$ 12,196,326.35	1209.89	$ 11,821,883.39	2458.11	$ 24,018,209.74
7	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	304.79	$ 1,384.00	$ 421,829	120	$ 166,080	399.00	$ 552,216	251.00	$ 347,384.00	650.00	$ 899,600.00
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 61,983,452**		**$ 30,000,000**		**$ 48,970,831.58**		**$ 42,980,994.87**		**$ 91,951,826.45**
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 61,983,452**		**$ 30,000,000**		**$ 48,970,831.58**		**$ 42,980,994.87**		**$ 91,951,826.45**
		VALOR TOTAL				**$ 61,983,452**		**$ 30,000,000**		**$ 48,970,831.58**		**$ 42,980,994.87**		**$ 91,951,826.45**

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA


NELSON ARTURO ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
ACRUX ARQUITECTURA

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — **FECHA:** 10-dic-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS	**NIT.**	901.501.626-9
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

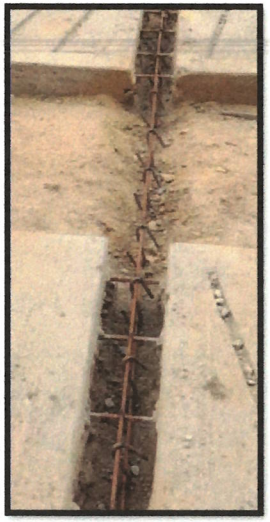



ACTIVIDAD: **EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**

ITEM 600.4 P — **UNIDAD** M3

Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
CUNETAS	2.00	100.00	1.00	0.18	35.00
VIGAS	35	4.20	0.17	0.20	5.00
RAMPAS	2.00	2.00	4.30	0.18	3.10
				Subtotal	43.09
				acumulado	15.62
				presente acta	27.47
				Total	43.09

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor

CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 10-dic-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS	**NIT.**	901.501.626-9
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **AFIRMADO**

ITEM	311.10		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
VIA	1.00	126	5.00	0.16	100.40
				Subtotal	100.40
				acumulado	63.00
				presente acta	37.40
				Total	100.40

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor

CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 10-dic-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS	**NIT.**	901.501.626-9
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: **CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR**

ITEM	671.10		**UNIDAD**	M2	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
Placa huella	2.00	88.50	0.68	0.17	20.46
				Subtotal	20.46
				acumulado	13.02
				presente acta	7.44
				Total	20.46

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor

CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 10-dic-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS	**NIT.**	901.501.626-9
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES**

ITEM	630.7		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO		
CENTROS	1.00	85.00	0.91	0.17	13.15
				Subtotal	13.15
				acumulado	8.10
				presente acta	5.05
				Total	13.15

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor

CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 10-dic-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS	**NIT.**	901.501.626-9
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: **CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)**

ITEM	630.40		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO		
HUELLAS	2.00	86.00	0.91	0.17	26.61
RAMPA ACCESO	2.00	1.60	4.15	0.17	2.26
VIGAS	32.00	4.15	0.16	0.30	6.37
REVESTIMIENTO	1.00	86.00	0.91	0.05	3.91
				Subtotal	39.15
				acumulado	18.95
				presente acta	20.20
				Total	39.15

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor


CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — **FECHA:** 10-dic-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS	**NIT.**	901.501.626-9		1 DE 1
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	**ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**		
DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD		**ITEM**	640.1	**UNIDAD**	KG



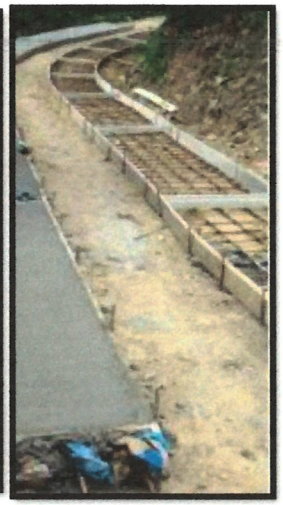

Localización	Dimensiones			UNIDADES	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	PESO		
ACERO HUELLAS					
HUELLA LONGITUDINAL	5.00	3.00	1.00	32.00	480.00
HUELLA TRANSVERSAL	18.00	1.00	1.00	32.00	576.00
TRASLAPOS	10.00	0.75	1.00	32.00	240.00
ACERO CUNETAS					
LONGITUDINAL	4.00	84.00	0.56	2.00	376.32
TRANSVERSAL EN L	354.17	0.80	0.56	2.00	317.33
TRASLAPOS	8.00	0.75	0.56	32.00	107.52
ACERO VIGAS	2.00	4.00	0.56	32.00	143.36
	14.00	0.32	0.56	32.00	80.28
ACERO RAMPAS					
PLACA HUELLAS	17.00	1.45	1.00	2.00	49.30
	11.00	4.00	1.00	2.00	88.00
				Subtotal	2,458.11
				acumulado	1,248.22
				presente acta	1,209.89
				Total	2,458.11

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor

CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

CONTRATO DE OBRA 296 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — **FECHA:** 10-dic-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA SAS	**NIT.**	901.501.626-9
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		1 DE 1

ACTIVIDAD: **CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE**



ITEM	310.10		**UNIDAD**	ML	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
PLACA HUELLA	1.00	130.00	5.00		650.00
				Subtotal	650.00
				acumulado	399.00
				presente acta	251.00
				Total	650.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor

CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-40-101010810	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	20	11	2023	00:00	20	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ACRUX ARQUITECTURA SAS	NIT: 901.501.626-9	3134673818

DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 11 - 180 AP 109 CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2	8444412

DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61 CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA

BENEFICIARIO: 899999312 - MUNICIPIO DE VILLETA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 296 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y LA ALCALDA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT: 899.999.312-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/11/2023**	**20/12/2023**	**$232,000,000.00**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/11/2023**	**20/12/2023**	**$232,000,000.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/11/2023**	**20/12/2023**	**$232,000,000.00**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 QUEDANDO COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******47,671.00	$ *******3,000.00	$ *******9,627.00	$ **********60,298.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

62-40-101010810

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101018885	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	20	11	2023	00:00	20	12	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
ACRUX ARQUITECTURA SAS	NIT: 901.501.626-9	
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 11 - 180 AP 109	CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3134673818

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2	
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61	CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8444412
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMAS SANCIONES IMPUESTAS, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA No. 296 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2023	20/04/2024	$12,396,690.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2023	20/12/2026	$6,198,345.20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/12/2028	$12,396,690.40	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 QUEDANDO COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****198,580.00	$ *******8,000.00	$ ******39,250.00	$ **********245,830.00	$ *******30,991,726.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101018885

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101018885	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	20	11	2023	00:00	20	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ACRUX ARQUITECTURA SAS	NIT: 901.501.626-9	3134673818

DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 11 - 180 AP 109 — CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2	8444412

DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61 — CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMAS SANCIONES IMPUESTAS, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA No. 296 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2023	20/04/2024	$18,396,690.40	$12,396,690.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2023	20/12/2026	$9,198,345.20	$6,198,345.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/12/2028	$18,396,690.40	$12,396,690.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA LA SUMA ASEGURADA PARA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A ADICION No. 1, AL CONTRATO DE OBRA No. 296 DE 2023, QUEDANDO COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******94,035.00	$ *******8,000.00	$ ******19,386.00	$ ***********121,421.00	$ *******45,991,726.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101018885

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901501626-9	ACRUX ARQUITECTURA SAS	calle 7 #11-180 apto 109 conjunto kasana	6018444700	gerencia@acruxarquitectura.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73146100	$3.175.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	14.000	0		0		0	4	100	0	14.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	4	200	0	46.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	199.600	0		0		0	4	800	0	200.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	102.100	0		0		0	4	400	0	102.500	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.400	0		0		0	4	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	556.800	0	0	0	0	4	2.200	0	559.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	649.700	0	0	0	0	4	2.600	0	652.300	5
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	4	800	0	186.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	241.300	0	0	0	0	4	1.000	0	242.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	711.200				711.200	4	2.800	714.000			7.112	714.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	410.100	4	1.600	411.700	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901501626-9	ACRUX ARQUITECTURA SAS		calle 7 #11-180 apto 109 conjunto kasana	6018444700	gerencia@acruxarquitectura.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73146100	$3.175.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	408.500	410.200
Pensión	4	1.633.400	1.640.000
Riesgos Laborales	1	711.200	714.000
CCF	1	410.100	411.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.163.200	3.175.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901501626-9	ACRUX ARQUITECTURA SAS		calle 7 #11-180 apto 109 conjunto kasana	6018444700	gerencia@acruxarquitectura.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73146100	$3.175.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	IMS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070709232	VEGA HERNANDEZ YEFERSON STIVEN	1	0			S	X																230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS017	348.000	14.000	14-11	348.000	5	24.300	CCF22	373.290	15.000	0	0	0	0	0
2	CC	1077966531	TINOCO PEDRAZA YOMAR FERNANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1077974972	BOHORQUEZ CASTAÑEDA LUIS ALBERTO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	3245828	ESPINOSA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1000835365	RAMIREZ AMAYA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1033790347	CASTELLANOS MUÑOZ OSCAR DAVIDSON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1054561466	LONDOÑO BUSTAMANTE YEFERSON DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1070706358	OLAYA GONZALEZ JAVIER ANDRES	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	16275631	GOMEZ GOMEZ GABRIEL DE JESUS	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	6027825	SANCHEZ CRUZ ORLANDO AUGUSTO	1	0			S		X															25-14	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-11	348.000	5	24.300	CCF22	364.258	14.600	0	0	0	0	0
11	CC	80283460	TORO ESPINOSA RUBEN ISIDRO	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS037	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF22	232.000	9.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.
NIT 901.501.626-9
CL 7 11 180 AP 109
Tel: (601) 4673418
Villeta - Colombia
gerencia@acruxarquitectura.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV 11

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(601) 8444412 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No. 5-61 / 5-75	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/12/2023, 09:08
Expedición	14/12/2023, 09:08
Vencimiento	14/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA VEREDA CUNE SECTOR LA CAPILLA	1.00	42,980,994.87	0 %	42,980,994.87

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones novecientos ochenta mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 42,980,994.87

Total Bruto	42,980,994.87
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	42,980,994.87

Observaciones:
ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO 296 DE 2023

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE, EN EL SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051724734 aprobado en 20230712 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 3e472bcbe4cfb9c1ab648aa74e86664457696ff7ed82508eab6c8dd597c372dcf34a1275d3607050640e53cfac4f7cd5
