Villeta COMPETITIVA gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE RECIBO FINAL	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	234-2023	ACTA No	RECIBO FINAL	FECHA DEL ACTA	15/12/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 01/12/2023 AL 15/12/2023	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/12/2023
CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT.:	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA	C.C.:	80,279,268
CONTRATISTA:	X G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S.	NIT.:	901651525-6
REP. LEGAL:	X LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA	C.C.:	79.729.934
SUPERVISOR:	X CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DEP. SUPERVISOR:	X OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
INTERVENTOR:	X	NIT.:	
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de recibo final, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

					Plazo Cumplido	100%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	2	DIAS	15	INICIA	01/09/2023
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	15		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	15		
A5. SUSPENCIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**3**	**DIAS**	**0**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**3**	**DIAS**	**0**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**0**	TERMINA	15/12/2023

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

							Obligaciones Cumplidas	100%
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES	
1	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.							

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

EN EL PERIODO EVALUADO, EL CONTRATISTA CUMPLE SUS FUNCIONES A SATISFACCION

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:				
NINGUNA				
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?		**SI**	**NO**	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?		**SI**	X **NO**	
SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SOPORTES				
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?		**SI**	X **NO**	

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101092019	28/08/2023	12/03/2024	N/A	16/03/2023	05/10/2023
PRESTACIONES SOCIALES	18-44-101092019	28/08/2023	12/11/2026	N/A	16/11/2026	05/10/2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	18-44-101092019	5 AÑOS		N/A	5 AÑOS	05/10/2023

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	oct-23	16/11/2023	$ 187,100
SALUD	nov-23	16/11/2023	$ 46,800
ARL	nov-23	16/11/2023	$ 51,000

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **99.90%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$ 320,192,323.00**		
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 242,192,323.00		
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$78,000,000.00		
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0		
E5. VALOR ANTICIPO	$0		
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA			$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES			$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))			$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$**	**77,713,974.72**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES			$242,173,302.91
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.) - A FAVOR DE LA ENTIDAD		$	305,045.37
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$**		**77,713,974.72**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000544	FECHA:	28/08/2023
F2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000864	FECHA:	29/11/2023
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS	No	385-000021-37			
F6.F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	X	ESPECIAL	0	

G. FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada. Los pagos parciales se realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar el 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.

Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100 del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

H. OBSERVACIONES:

El presente informe de supervisión y acta final, hace las veces del ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL del contrato de obra No. 234 de 2023 y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecución del contrato de la referencia.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA** Alcalde Municipal	
CONTRATISTA:	**LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	

INFORME TECNICO Y EJECUTIVO
CORTE DE OBRA No. 3 Y DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No 234 DE 2023

OBJETO "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S
R.L. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

DICIEMBRE 2023

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
3. LOCALIZACION 5
4. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONMICA 6
5. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 6
6. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA 7
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
8. AVANCE FISICO Y FINACIERO DEL CONTRATO 8
9. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RCOMENDACIONES 9

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

1. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SUPERVISOR:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
CONTRATO No:	234 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
NIT. No:	79.729.934
CLASE	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($242.192.323)
VALOR ADICIONAL	SETENTE Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 78.000.000,00)
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE $ 320.192.323,00
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES
VALOR DEL ANTICIPO:	$0,00
FECHA INICIO:	01/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15/10/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA	30/11/2023

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El municipio de Villeta con el propósito de mejorar la red vial terciaria de su jurisdicción y contribuir con el desarrollo sostenible de sus pobladores, contempló en el plan de desarrollo municipal el programa ¡Villeta Competitiva con Gestión Transparente! Calidad del sistema vial y de transporte para el desarrollo. Motivo por el cual para dar cabal cumplimiento a las metas que se desprenden de los diferentes programas, en especial del descrito anteriormente. La Oficina Asesora de Planeación Municipal elaboró el proyecto denominado 'Mejoramiento de vía en los diferentes sectores de las veredas Mave, Chapaima y Payande del municipio de Villeta, Cundinamarca". Con el fin de atender las necesidades de seguridad vial y de transitabilidad que afectan a nuestra comunidad.

La administración Municipal de Villeta, Cundinamarca, en aras de realizar el mejoramiento de las vías rurales en los sitios críticos de acceso de la población, ve la necesidad de realizar la construcción de placa huellas en estos puntos neurálgicos de la vía de las veredas anteriormente mencionadas, por lo que es importante mencionar que de acuerdo al trabajo de diagnóstico, así como el efectuado con los presidentes de las juntas de acción comunal y la comunidad misma de cada sector rural, se han priorizado las vías con mayor dificultad de acceso o inconvenientes en el tránsito peatonal y vehicular, debido a sus condiciones físicas de deterioro, altas pendientes, entre otros.

Con sustento en lo anterior, cabe resaltar que actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural de las veredas Mave, Chapaima y Payande del municipio de Villeta, Cundinamarca, debido a que, la vía se encuentra en mal estado, y en temporada de lluvias se vuelve intransitable, generando restricciones en el tránsito vehicular. A pesar del mantenimiento rutinario que se realiza a las vías rurales del municipio, las condiciones de deterioro de la superficie de rodadura y las condiciones de pendiente hacen que se acelere el deterioro y persistan los problemas de circulación vehicular.

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com


3. LOCALIZACION

El Proyecto será en el área rural del municipio de Villeta en las vías de las veredas Mave, Chapaima y Payande.

A continuación, se describe la localización dispuesta en el proyecto de inversión, no obstante, en el momento de iniciar la ejecución de los proyectos, la supervisión designada por el municipio, y el contratista procederán a realizar la respectiva visita al lugar mencionado a continuación, con el fin de determinar las zonas y el tramo específico a intervenir. (El registro de dicha visita se llevará a cabo mediante acta de comité en el cual se quedarán estipuladas las coordenadas exactas del tramo a intervenir.

VEREDA CHAPAIMA, SECTOR ESCUELA EL HIGUERÓN


	NORTE	OESTE
INICIO K0+000:	04°57'26.77"N	74°31'32.30"W

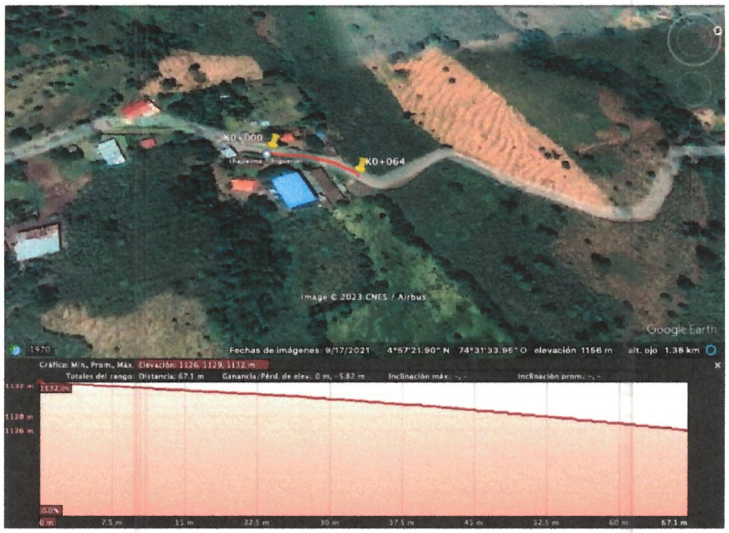

VEREDA CHAPAIMA, SECTOR FINCA LA ESPERANZA


	NORTE	OESTE
INICIO K0+000:	04°58'34.38"N	74°31'17.74"W

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

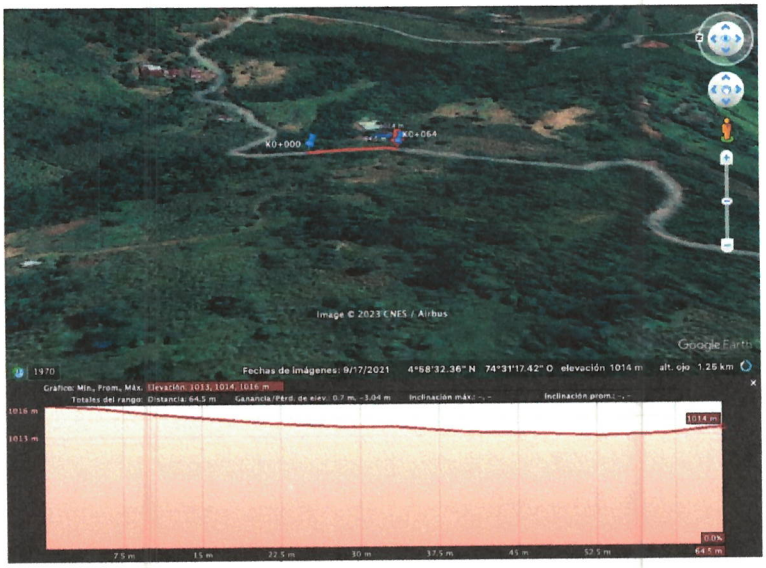

VEREDA MAVE, SECTOR FINCA BELGRADO

	NORTE	OESTE
INICIO K0+000:	04°58'18.08"N	74°29'22.41"W

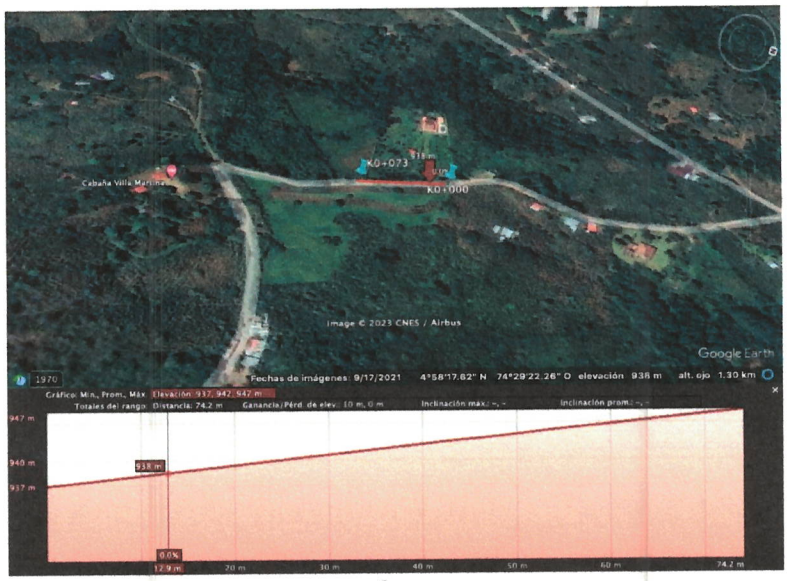

VEREDA PAYANDÉ, SECTOR EL PUENTE

	NORTE	OESTE
INICIO K0+000:	04°59'28.67"N	74°29'21.62"W

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com



4. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONMICA

VALOR CONTRATADO	**$ 242.192.323,00**
VALOR ADICIÓN	**$ 78.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 320.192.323,00**

FORMAS DE PAGO El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporciónale a la obra ejecutada.

Los pagos parciales se realizarán mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el interventor y el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar el 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.

NOTA: Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100% del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

El contratista deberá Entregar los soportes de cumplimiento de las obligaciones en materia del Sistema de seguridad social. Suma que estará sujeta a los descuentos de retención en la fuente, impuestos y demás según las normas legales. No podrá efectuarse ningún pago hasta que se haya formalizado el correspondiente contrato.

La factura o cuenta de cobro debe ser avalada por el supervisor designado, se harán constar en un acta firmada por las partes en la que se estipule la clase de obra, fecha, el sitio, y las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y valores totales reconocidos.

Deberá tenerse en cuenta el régimen tributario del contratista y expresarlo con la propuesta. El Municipio realizará las retenciones de acuerdo a la ley en materia tributaria y el Estatuto Tributario Municipal Vigente.

5. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

SUPERVISION	**CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS**
	SECRETARIO DE PLANEACION

6. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA

6.1. Anexo 1.

NOMBRE DEL AMPARO	No. PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101092019	28/08/2023	12/03/2024	$48.438.464,60
PRESTACIONES SOCIALES	18-44-101092019	28/08/2023	12/11/2026	$24.219.232,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	18-44-101092019	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$48.438.464,60

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades principales que están relacionadas a la construcción de las Placas Huellas, se mencionan a continuación:

- Excavaciones
- Afirmado
- Conformación de calzada
- Concretos
- Cuneta
- Acero de refuerzo

Las cantidades de cada la actividad ejecutada de acuerdo al presupuesto oficial es de:

600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	78.8570
311.1	AFIRMADO	M3	274.48
671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	74.7450
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	70.67
630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	108.6213
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	10,438.6720
671.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,674.80

8. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El presente corte de obra se especifica que con fecha de corte del 15 de diciembre del 2023, se refleja un avance de obra del 100% de ejecución equivalente a $ 319.889.108,67

AVANCE FINANCIERO CORTE No. 1

VALOR DEL CONTRATO	$ 242.192.323,00
VALOR EJECUTATO CORTE No. 1	$ 150.343.043,04

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

VALOR EJECUTADO CORTE No. 2	$ 91.830.259,87
VALOR EJECUTADO EN PRESENTE CORTE	$ 77. 713974,72
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 319.889.108,67

9. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La construcción de las placas huellas en las veredas Chapaima, Mave y Payande ha mejorado significativamente las condiciones de movilidad, desarrollo y crecimiento para los habitantes del área.

Actualmente, la obra cuenta con un avance del 100%, habiéndose construido $ 319.889.108,67 en placa huellas. Se han cumplido todas las especificaciones establecidas en los diseños y se han utilizado materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y resistencia de la obra. Todo esto, ha permitido mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes del sector.

Cordialmente;

R.L. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

CONTRATO DE OBRA 234 DE 2023 - ACTA No. 3 Y DE RECIBO FINAL

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S - LUS GABRIEL PEÑA COMBITA		
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		
PLAZO: 2,5 MESES	ASEGURADORA / POLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 1-44-101092019	VALOR INICIAL $ 242,192,323.00
INICIO: 01-sep-23	CUMPLIMIENTO	28-08-2023 / 12-03-2024	VALOR ADICIONAL $ 78,000,000.00
TERMINACION 15-nov-23	PRESTACIONES SOCIALES	28-8-2023 / 12-11-2026	VALOR TOTAL $ 320,192,323.00
	ESTABILIDAD DE OBRA	CINCO AÑOS	
PRESENTE ACTA 07-dic-23	ASEGURADORA / POLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 18-40-101067713	ACTA FINAL No. 3 $ 77,713,974.72
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXT.	28-08-2023 / 12-11-2023	

CONDICIONES CONTRACTUALES							MAYORES Y MENORES			PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
							+	-					
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12.53	$ 73,235.00	$ 917,634.55	66.33	0.00	$ 4,857,457.85	14.55	$ 1,065,349.55	78.8570	$ 5,775,092.40
2	311.1	AFIRMADO	M3	57.75	$ 65,337.00	$ 3,773,211.75		0.00	$ 0.00	80.08	$ 5,232,186.96	274.4800	$ 17,933,699.76
3	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	16.53	$ 704,420.00	$ 11,644,062.60	0.00	0.00	$ 0.00	17.33	$ 12,204,076.50	74.7450	$ 52,651,872.90
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26.35	$ 591,000.00	$ 15,572,850.00	0.00	0.00	$ 0.00	23.10	$ 13,652,100.00	70.6700	$ 41,765,970.00
5	630.4	CONCRETOS CLASE D , f'c =3000 psi (bases)	M3	25.64	$ 897,200.00	$ 23,004,208.00	0.68	0.00	$ 611,217.50	26.32	$ 23,615,425.50	108.6213	$ 97,454,985.50
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2,306.92	$ 9,771.00	$ 22,540,915.32	0.00	-123.15	$ 0.00	2,183.77	$ 21,337,636.21	10,438.6720	$ 101,996,264.11
7	671.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	385.00	$ 1,380.00	$ 531,300.00	55.00	0.00	$ 75,900.00	440.00	$ 607,200.00	1,674.8000	$ 2,311,224.00
SUB TOTAL						$ 77,984,182.22			$ 5,544,575.35		$ 77,713,974.72		$ 319,889,108.67

TOTAL PRESENTE ACTA	$ 77,984,182.22	$ 5,544,575.35	$ 77,713,974.72	$ 319,889,108.67

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 06-dic-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	**NIT.**	901.651.525-6
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ITEM 600.4 P **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CUNETAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	1	77.00	0.75	0.2	11.55
VIGAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	27	3.70	0.15	0.2	3.00
RAMPAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	2	1.50	3.60	0.2	
				Subtotal	14.55
				Vienen	
				pasan	14.55
				Total	14.55

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
Contrato 234 del 2023

ING. DAIRO RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISIÓN OPM

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 06-dic-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	**NIT.**	901.651.525-6	1 DE 1
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: AFIRMADO

ITEM 311.1 **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	1	77.00	5.20	0.2	80.08
				Subtotal	80.08
				Vienen	
				pasan	80.08
				Total	80.08

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
Contrato 234 del 2023

ING. DAIRO RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISIÓN OPM

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

NIT. 901.651.525-6


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 06-dic-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	NIT.	901.651.525-6
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

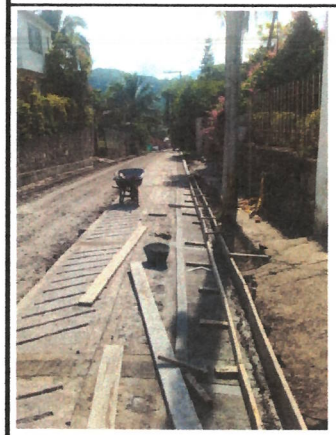



ACTIVIDAD: CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

ITEM: 671.1 UNIDAD: M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	2	77.00	0.45	0.15	10.40
BORDILLO	2	77.00	0.15	0.3	6.93
				Subtotal	17.33
				Vienen	
				pasan	17.33
				Total	17.33

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
Contrato 234 del 2023

ING. DAIRO RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISIÓN OPM

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 06-dic-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	**NIT.**	901.651.525-6	1 DE 1
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

ITEM 630.7 **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ					
CENTRAL	1	77.00	0.90	0.15	10.40
SOBRE ANCHO	2	77.00	0.55	0.15	12.71
				Subtotal	23.10
				Vienen	
				pasan	23.10
				Total	23.10

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
Contrato 234 del 2023

ING. DAIRO RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISIÓN OPM

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 06-dic-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	NIT.	901.651.525-6
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD:	CONCRETOS CLASE D , f´c =3000 psi (bases)				
ITEM	630.4		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
HUELLAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	2	77.00	0.90	0.15	20.79
VIGAS	27	4.50	0.15	0.25	4.56
SOBRE ANCHO CURVA VIA POLIDEPORTIVO	1	5.00	1.30	0.15	0.98
				Subtotal	26.32
				Vienen	
				pasan	26.32
				Total	26.32

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PENA COMBITA

ING. DAIRO RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE Y ALTO DE TORRES DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 06-dic-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	**NIT.**	901.651.525-6	1 DE 1
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO D E ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM 640.1 **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	PESO	UNIDADES	TOTAL
ACERO HUELLAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ					
HUELLA LONGITUDINAL	5	3.00	1	26	390.00
HUELLA TRASNVERSAL	15	1.00	1	26	390.00
TRASLAPOS	250	0.60	1	2	300.00
ACERO CUNETAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ					
LONGITUDINAL	3	77.00	0.56	2	258.72
TRANSVERSAL	330	0.77	0.56	2	284.59
TRASLAPOS	300	0.55	0.56	2	184.80



ACERO VIGAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	2	4.50	0.56	27	136.08
	19	0.25	0.56	27	71.82
ACERO RAMPAS					
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	14	1.68	1	3	70.56
	9	3.60	1	3	97.20
				Subtotal	2,183.77
				Vienen	
				pasan	319,905,824.85
				Total	319,905,824.85

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
Contrato 234 del 2023

ING. DAIRO RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISIÓN OPM

MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE Y ALTO DE TORRES DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 06-dic-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	**NIT.**	901.651.525-6
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

ITEM 671.1 **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
TRAMO ADICIÓN - PAYANDÉ	1	80.00	5.50		440.00
				Subtotal	440.00
				Vienen	
				pasan	440.00
				Total	440.00

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
Contrato 234 del 2023

ING. DAIRO RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISIÓN OPM

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA identificado con **C.C. 79.729.934 de Bogotá** en mi condición de representante legal de **G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S** identificada con **NIT. 901.651.525-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002..

En constancia, se firma en Villeta, a los 07 días del mes de diciembre de 2023

LUIS GABRIEL PEÑA CÓMBITA
R.L. G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS

Carrera 8 # 10-79 Villeta
315 7651930
311 4930914
gycingenieria.cc
GyCIngenieria.cc
gyc.ingenieriacc@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101092019	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	10	2023	01	09	2023	00:00	16	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	NIT: 901.651.525-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 10 - 79 UR LAS ACACIAS	VILLETA, CUNDINAMARCA	3114930914

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NRO. 5 - 61	VILLETA, CUNDINAMARCA	8445092

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE OBRA Nro. 234 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
-SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN.
-NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/09/2023**	**16/03/2024**	**$48,438,464.60**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/09/2023**	**16/11/2026**	**$24,219,232.30**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$48,438,464.60**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL CONTRATO DE OBRA No. 234-2023
LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****762,010.00	$ ******20,000.00	$ *****148,581.00	$ **********930,591.00	$ ******121,096,161.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

18-44-101092019

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101067713	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	10	2023	01	09	2023	00:00	16	11	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	NIT: 901.651.525-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 8 NRO. 10 - 79 UR LAS ACACIAS	VILLETA, CUNDINAMARCA	3114930914

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 4 NRO. 5 - 61	VILLETA, CUNDINAMARCA	8445092

BENEFICIARIO: 899999312 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 234 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
-ASEGURADO: G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S NIT. No.901.651.525-6 Y ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT.899.999.312-2
-BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT. 899.999.312-2
-1.LA PRESENTE POLIZA CONTIENE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.
2.OPERA BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/09/2023**	**16/11/2023**	**$232,000,000.00**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/09/2023**	**16/11/2023**	**$232,000,000.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/09/2023**	**16/11/2023**	**$232,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL CONTRATO DE OBRA No. 234-2023
LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****120,767.00	$ *******3,000.00	$ ******23,515.00	$ **********147,282.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101067713
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901651525-6	GYC ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	Cr810 79 Urbanizacion las Acasias	6010231380	gyc.ingenieriacc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	72467588	$331.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	8	400	0	46.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	8	1.500	0	187.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	50.500				50.500	8	500	51.000			505	51.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	46.400	8	400	46.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.800
Pensión	1	185.600	187.100
Riesgos Laborales	1	50.500	51.000
CCF	1	46.400	46.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	328.900	331.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901651525-6	GYC ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	Cr810 79 Urbanizacion las Acasias	6010231380	gyc.ingenieriacc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	VILLETA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	72467588	$331.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79729934	PEÑA COMBITA LUIS GABRIEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Villeta Cundinamarca, 25 de abril de 2023

A Quien Interese

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **G & C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS** identificado con **NIT. 901651525,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	**385-000021-37**	**2023/04/25**	**ACTIVO**

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 844 5096 Ext. 142 de Villeta Cundinamarca.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Villeta - Cr. 385 Villeta
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº

CARLOS AUGUSTO BENAVIDES GONZALEZ.
Asesor comercial Pyme.
Sucursal Villeta.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 74f540ba916250d02620ba471b3836bc39c2c7d5ee9362594f3b3f8b59cb75eab8d28e15f6c080589f2be83ec4bdfcf5

Número de Factura: GYC-16
Fecha de Emisión: 14/12/2023
Fecha de Vencimiento: 13/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S
Nombre Comercial: G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S
Nit del Emisor: 901651525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Villeta
Dirección: CR 8 10 79 UR LAS ACACIAS
Teléfono / Móvil: 3114930914
Correo: gyc.ingenieriacc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Municipio de Villeta
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999312
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Villeta
Dirección: Calle 4 # 5 - 75 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 8444874
Correo: secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	GYC00030	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA	NIU	1,00	$ 77.713.974,72	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.713.974,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-14 08:52:29
Documento generado el: 2023-12-14 08:52:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		77.713.974,72
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		77.713.974,72
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		77.713.974,72
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 77.713.974,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764060481441 Rango desde: 10 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-11-23
