Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045**
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**2**	FECHA:	**11**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**				
PERIODO:	DEL	**7**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**6**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**
CONVENIO No:	**2752**	DE	**2023**								

OBJETO:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA. (27)"

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE MACANAL - BOYACA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SERVILIO CAICEDO ULLOA
Teléfono: Dirección	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO (JAC)	TOTAL
$ 24.993.082,05	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 24.993.082,05**

OBSERVACIÓN: Aporte de la JAC representado en bienes y servicios correspondiente a material, equipo, mano de obra y transporte, el cual se ve reflejado en el convenio 2752 numeral 3 inciso b

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CD-2813-2023	N/A	
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A	
Estudios Previos	N/A	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	N/A	
Acto de adjudicación	N/A	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación		N/A
Estudios Previos		N/A
Proyecto de pliego de condiciones		N/A
Pliego de condiciones definitivos		N/A
Acto de adjudicación		N/A

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL MUNICIPIO DE MACANAL	**$ 24.993.082,05**

OBJETO:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA. (27)"

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL MUNICIPIO DE MACANAL				JUAN DE LA CRUZ ALZA CUARAN			
Teléfono:	**3134085135**	Dirección:	VEREDA DEL DATIL	Teléfono:	3134085135	Dirección:	VEREDA DEL DATIL


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA	
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	9	2023					
PLAZO INICIAL TRES (03) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	7	9	2023					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	6	12	2023					
ADICIONES EN PLAZO								
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	12	2023					

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



% DE AVANCE CTO INTERV.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante los dos primero meses de ejecucion del convenio la junta ha adelantado localizacion y replanteo, extendida y compactacion de material, solados, excavacion manual y amarre de aceros de huellas, se realiza visita por parte del técnico de la Gobernación para realizar inspeccion tecnica y es aprobada la fundida de la placa huella. Durante finales del mes de octubre la junta avanza en la construccion de la placa huella, para el 5 de noviembre de 2023 la JAC termina la placa huella.

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	7	9	2023	
Acta de terminación	6	12	2023	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	21-54-101009763 21-46-101072667	ANEXO No.	0 0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							26	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	7	9	2023	6	12	2023	$ 232.185.731,78
CUMPLIMIENTO	27	6	2023	27	3	2024	$ 2.499.308,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	27	6	2023	27	9	2026	$ 1.249.654,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							$ 2.499.308,20

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
		0	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	4-154-83-00290-1	BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL:	MACANAL - BOYACÁ

NOMBRE CUENTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL DEL MUNICIPIO DE MACANAL

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	50%	25	9	2023	$ 12.496.541,02
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 12.496.541,02**

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				$ 0,00
Acta Parcial No.				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				**$ 0,00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No.				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	COORDENADAS 05° 0’ 58’’ W - 73° 21’ 18’’
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM	
TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE LIBRE DE 5KM)	
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	7	9	2023	6	10	2023	

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra		
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio		
Copia del Contrato de obra e interventoría		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

R.L VEREDA DEL DATIL

NOMBRE:	JUAN DE LA CRUZ ALZA CUARAN

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Erika Ximena Rodriguez F.
Firma: Fecha: 14-12-2023

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA RECIBIDO

1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)					UNIDAD	KM
ITEM	DESCRIPCION	LONGITUD 1	LONGITUD 2	ANCHO 1	ANCHO 2	ESPESOR	TOTAL
1	LOCALIZACION Y	0,026					0,026
TOTAL							**0,026**









2,01	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM						UNIDAD	M3
ITEM	DESCRIPCION	LONGITUD	LONGITUD 2	ANCHO	ESPESOR	VIAJES	TOTAL	
	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y	**22,94**	**2,8**	**5**	0,02		2,57	
							0	
TOTAL							2,57	





2,02	TERRAPLENES (INCLUYETRANSPORTE LIBRE DE 5KM)						UNIDAD	M3
ITEM	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M3	VIAJES	TOTAL	
	TERRAPLENES	1,03	1	1			1,03	
							0	
TOTAL							1,03	





2,03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)						UNIDAD	KM
ITEM	DESCRIPCION	LONGITUD 1	LONGITUD 2	ALTO	M3	VIAJES	TOTAL	
	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA	22,94	22,94				0,05	
	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO	2,8	2,8				0,0056	
TOTAL							0,05	





2,04	suministro extendida y compactacion de material seleccionado para subase granular (incluye acarrreo libre de 5 km)					UNIDAD	M3
ITEM	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	M3	VIAJES	TOTAL
1	**viajes de volqueta**				5,736	3,0	17,208
2	**viajes de volqueta**						0
TOTAL							17,21







2,05	excavacion manual en material comun					UNIDAD	M3
ITEM		ANCHO	PROFUNDIDAD	ANCHO HUELLA	LONGITUD HUELLA	0	TOTAL
1	**Excavacion riostras**	**0,2**	**0,15**	**5**	25,74		1,59
2	**Excavacion cunetas**	**1,1**	**0,15**		25,74		8,49
TOTAL							10,08






2,06	solado concreto espesor E= 0.05MTS 14Mpa (2000PSI)						
ITEM		ANCHO		ALTO	UNIDAD	VIAJES	TOTAL
1	**Solado Viga Riostra**	**5**		**0,2**	9,0		9,00
TOTAL							9,00

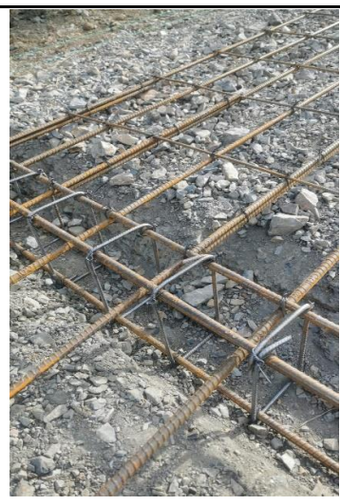

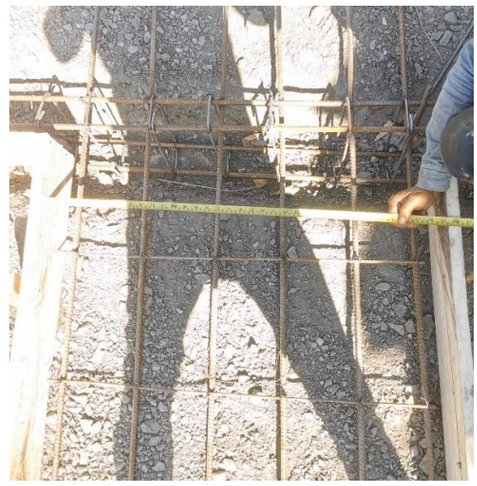

2,07	concreto ciclópeo 21 MPa (3000 PSI) relacion 60C/40P						**UNIDAD**	**M3**
ITEM		LONGITUD	ANCHO	ALTO		VIAJES	TOTAL	
1	**centros de huella**	**22,94**	**0,90**	**0,15**			3,10	
2	**sobre anchos**	**22,94**	**0,900**	**0,15**			3,10	
TOTAL							6,19	

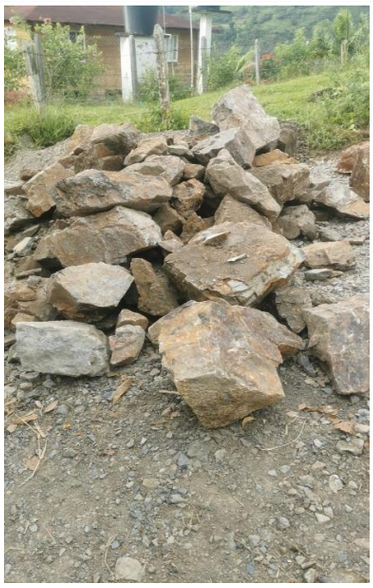





2,08	suministro e instalacion del concreto simple de 21 MPA(3000)para bases					UNIDAD	M3
ITEM		LONGITUD	ANCHO	ALTO		VIAJES	TOTAL
1	**huella**	**22,94**	**1,80**	**0,15**			6,19
							0,00
TOTAL							6,19






2,09	suministro figurado y amarre de acero 600000 PSI 420 Mpa					UNIDAD	KG
ITEM		LONGITUD	ANCHO	ALTO	UNIDAD x 6mt	KG	TOTAL
1	**Viga Riostra**	**213**			35,3	0,99	212
2	**Flejes**	**304,48**			12,7	0,25	76,12
3	**Huella Transversal**	**152,93**			6,4	0,25	38,23
4	**Huella Longitudinal**	**302,81**			50,2	0,99	300,99
5	**Cuneta transversal**	**84,11**			3,5	0,25	21,03
6	**Cuneta Longitudinal**	**185,05**			30,7	0,99	183,94
7	**Bordillo**	**362,78**			33,9	0,56	203,16
8	**Rampa Transversal**	**46,67**			1,9	0,25	11,67
9	**Rampa Longitudinal**	**93,33**			15,5	0,99	92,77
TOTAL							1139,43





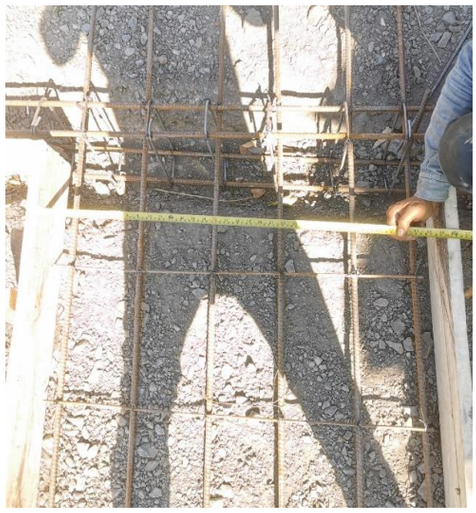

2,10	bordillo fundido en sitio 20 x 35 cm						UNIDAD	ML
ITEM		LONGITUD	LONGITUD 2	ALTO	UNIDAD	KG	TOTAL	
1	bordillo izquierdo	22,94	2,80				25,74	
2	bordillo derecho	22,94	2,80				25,74	
TOTAL							51,48	





2,11	concreto estriado rampas 17.5 Mpa -(2500 PSI)						UNIDAD	M2
ITEM		LONGITUD	ANCHO	ALTO	UNIDAD	KG	TOTAL	
1	rampa inicio placa huella	2,8	5,00				14,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL							14,00	





2,12	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR					UNIDAD	M3
ITEM		LONGITUD	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SECCIONES	TOTAL
1	**concreto riostas**	**5,00**	**0,20**	**0,3**	9	3,00	2,70
2							0,00
TOTAL							2,70







3,01	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)					UNIDAD	M3
ITEM		LONGITUD	ANCHO	ALTO	UNIDAD	KG	TOTAL
1	**concreto cunetas**	**25,74**	**1,100**	**0,15**	0		4,25
							0,00
TOTAL							4,25





FIRMA:	
	R.L VEREDA DEL DATIL
NOMBRE:	JUAN DE LA CRUZ ALZA CUARAN
