GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0**
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO / CONVENIO N°	2752 DE 2023
OBJETO	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA. (27)".

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior: N/A

Reunidos el día 5 de noviembre de 2023, se advierte a los presentes Hernán Amelio Esquivel Daza como contratista de la Secretaría de Gobierno y Servilio Caicedo Ulloa como supervisor de la Secretaría de Gobierno, Juan de la Cruz Alza Cuaran presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Datil del municipio de Macanal el propósito fundamental de la presente acta es determinar desde la perspectiva técnica el cumplimiento y ejecución de cantidades e ítems de cada una de las partes dentro del presente convenio para la construcción de un placa huella.

Al respecto se debe indicar que, revisado las memorias de cantidades, las sabanas, el contenido contractual se puede advertir con suficiencia que la ejecución del Convenio Solidario se dio en debida forma y por lo mismo las partes aceptan que existe un 100 % de cumplimiento para la construcción de la placa huella. Esta construcción se encuentra ubicada en el municipio de Macanal vereda del Datil teniendo como coordenadas 05° 0' 58'' W - 73° 21' 18'' y para lo cual se aportan material fotográfico de la existencia de la placa huella, su construcción y algunas condiciones técnicas que son visibles.

Atendiendo a los presupuestos normativos que regulan los convenios solidarios se debe indicar que este negocio jurídico suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la JAC de la vereda del Datil el cual tiene como propósito ejecutar actividades de mantenimiento rutinario a través de la construcción de vías –placa huella- con la JAC de la vereda del Datil que se trata de una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de la vereda del Datil del municipio de Macanal que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa y que puede desarrollar actividades en el territorio al cual pertenezca.

Bajo esta breve contextualización, se advierte que se celebró el convenio solidario No. 2752 encontrándose dentro del término y oportunidad contractual para efectos de efectuar la liquidación de aquella relación jurídica contractual, las partes acuerdan y determinan que las siguientes corresponden a las actividades, ítems y cantidades ejecutadas por cada parte, así:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Erika Ximena Rodriguez F.
Firma: Fecha: 14-12-2023

a. EJECUCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACA EN EL PRESENTE ASUNTO.

LA GOBERNACION DE BOYACA APORTA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA:

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM
TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE LIBRE DE 5KM)
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

NOTA: Como evidencias de la presente acta se anexa sabana de modificación cantidades y actas de visita de obra las cuales fueron expuestas en el comité

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	**OBSERVACIÓN**
N/A	N/A

DESARROLLO DEL COMITÉ

En el lugar de la obra se reúnen el señor Juan de la Cruz Alza Cuaran presidente de la JAC de la vereda del Datil del municipio de Macanal, el arquitecto Hernán Amelio Esquivel Daza, profesional delegado por la supervisión para el seguimiento de la obra y el doctor Servilio Ulloa en su calidad de supervisor, con el fin de tratar aspectos correspondientes al recibo final de la obra. A la fecha se evidencia que la obra se encuentra terminada en su totalidad y que cumple con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

Los recursos asignados por la Gobernación ($ 24.993.082,05), son ejecutados en su totalidad y de acuerdo al balance realizado en la sabana de modificación cantidades la longitud de placa huella construida con recursos del Departamento es de **26 mt**.


Nota: De acuerdo con la visita de recibo se hace la apreciación de que existen metros lineales de construcción adicionales que fueron proporcionados netamente por la JAC.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	N/A

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
La Junta de Acción Comunal se debe compromete a realizar la entrega del informe final.	N/A	La Junta de Acción Comunal de la Vereda del Datil
La Junta de Acción Comunal se debe comprometer a dejar 28 días de fraguado antes de aperturar la vía e hidratar diariamente el concreto.	N/A	La Junta de Acción Comunal de la Vereda del Datil

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
JUAN DE LA CRUZ ALZA CUARAN	PRESIDENTE JAC	3134085135	
HERNAN AMELIO ESQUIVEL DAZA	PROFESIONAL EXTERNO	3138064956	
SERVILIO CAICEDO ULLOA	SUPERVISOR	3118489669	

Boyacá	FORMATO	Versión: 0
		Código: M-PD-ID-F-006
INFORME DE VISITAS DE CAMPO		Fecha: 24/Jul/2019

Informe dirigido a: GOBERNACION DE BOYACA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL.

MUNICIPIO: Macanal - el Datir	**FECHA:**
CONTRATO / CONVENIO No. 2752	
OBJETO DE LA VISITA: Visita de seguimiento al proyecto un comvite comunal 2023 " placa huella"	

TIPO DE VISITA

Interventoría:	**Supervisión:**
Visita Técnica: ✓	**Otro:**

ASISTENTES

No.	Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo	Firma
1	Lorenzo Mendoza	JAC	Trabajador Lorenzo M	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se realiza visita al municipio de Macanal, a la placa Huella en el Sector Datir, para recibir y revisar la obra pactada en el Convenio, se evidencia que esta terminada en su totalidad y se recibe a satisfacción

COMPROMISOS


RESPONSABLE DE LA VISITA

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Hernan Amelio Esguivel	Contratista	

Powered by CamScanner

Boyacá	FORMATO	Versión: 0
		Código: M-PD-ID-F-006
INFORME DE VISITAS DE CAMPO		Fecha: 24/Jul/2019

MEDIDAS FINALES ENTREGADAS DE PLACA HUELLA.

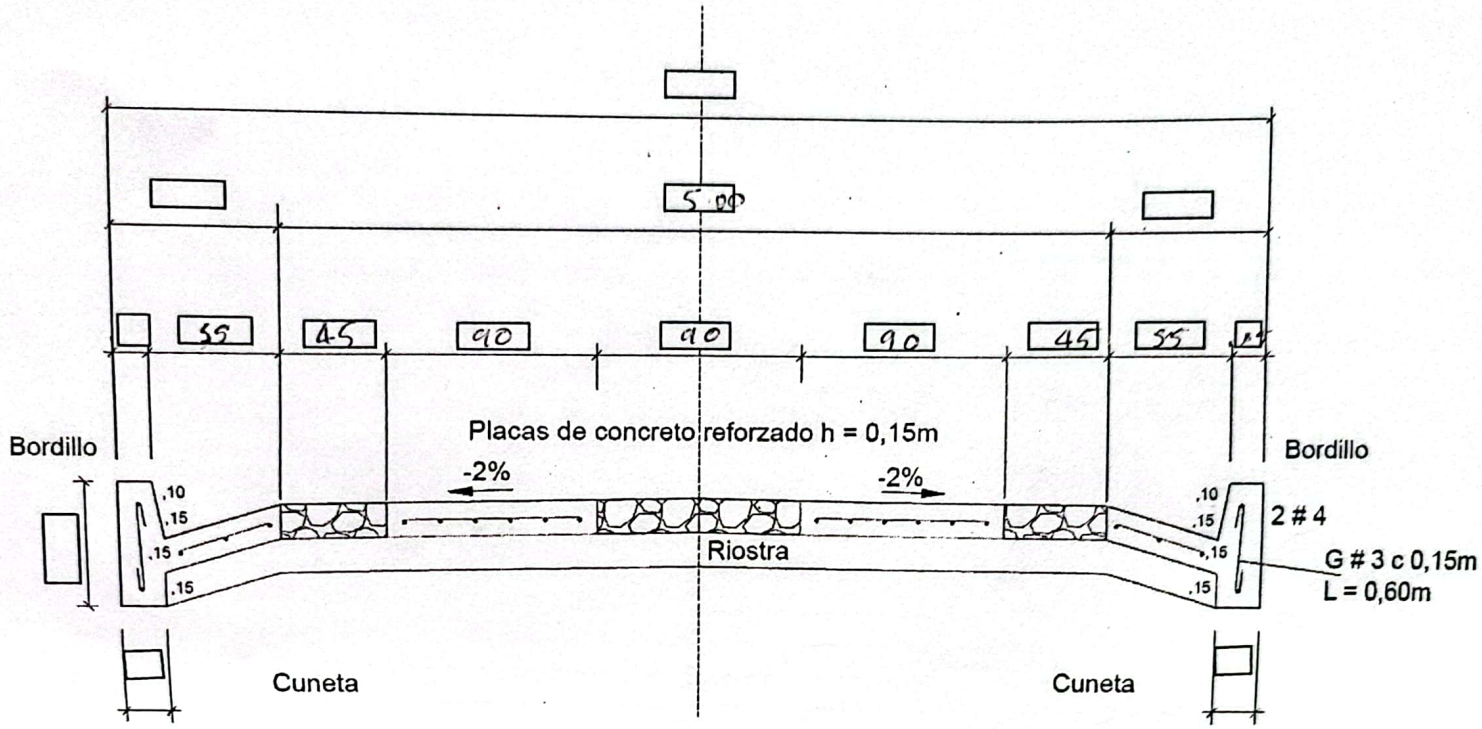

ESPECIFICACIONES ENRTEGADAS DE PLACA HUELLA

1. Ancho de placa huella entregada. 5.00
2. Longitud de placa huella entregada. 17.00 + 2.80 rampa
3. La placa huella cumple con las especificaciones solicitadas. Si ✓ No___
4. El ancho de la riostra es de veinte centímetros (0,20 m). Si ✓ No___
5. peralte de la riostra es de treinta centímetros (0,30 m). Si ✓ No___
6. espesor de la placas-huella es de quince centímetros (0,15 m). Si ✓ No___

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-043
SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		**FECHA: 24/Jul/2019**

SECRETARÍA DE **GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL**

CONVENIO No: **2752 DE 2023**

MODIFICACIóN No: **1**

CONDICIONES ORIGINALES APORTE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ							**MODIFICACIONES** (insertar columnas según numero de modificaciones)			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**VLR/CAPITULO**	**+/-**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	METARIALES										
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	KM	0,023	$ 47.252,80	$ 1.086,81		+	0,003	$ 47.252,80	0,026	$ 1.228,57
2,01	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	2,03	$ 12.254,41	$ 24.876,45		+	0,540	$ 12.254,41	2,57	$ 31.493,83
2,02	TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE LIBRE DE 5KM)	M3	1,00	$ 15.545,73	$ 15.545,73		+	0,030	$ 15.545,73	1,03	$ 16.013,24
2,03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	Km	0,04	$ 1.249.701,00	$ 49.988,04		+	0,010	$ 1.249.701,00	0,05	$ 62.485,05
2,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	15,23	$ 102.476,51	$ 1.560.717,24		+	1,980	$ 102.476,51	17,21	$ 1.763.620,74
2,07	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	5,48	$ 515.026,63	$ 2.822.345,87		+	0,710	$ 515.026,63	6,19	$ 3.188.014,84
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21MPA (3000) PARA BASES	M3	13,63	$ 795.977,14	$ 10.849.168,41		-	-7,440	$ 795.977,14	6,19	$ 4.927.098,50
2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	989,03	$ 7.002,12	$ 6.925.296,85		+	150,400	$ 7.002,12	1.139,43	$ 7.978.425,59
2,10	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	40,63	$ 43.993,09	$ 1.787.438,84		+	10,850	$ 43.993,09	51,48	$ 2.264.764,27
2,11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	2,25	$ 130.054,93	$ 292.623,59		+	11,749	$ 130.055	14,00	$ 1.820.622,24
2,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UND	1,00	$ 394.494,91	$ 394.494,91		-	-1,000	$ 394.494,91	0,00	$ -
3,01	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	3,35	$ 80.447,56	$ 269.499,32		+	0,900	$ 80.447,56	4,25	$ 341.902,13
COSTO DIRECTO					**$ 24.993.082,05**						**$ 24.993.082,05**

JUAN DE LA CRUZ ALZA CUARAN	**DR. SERVILIO CAICEDO ULLOA**	**PROYECTO: ARQ. HERNAN AMELIO ESQUIVEL DAZA**
PRESIDENTE JAC R.L. VEREDA DEL DATIL	SUPERVISOR DEL CONVENIO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL	MP. A33992011-74348006

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-043
SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		**FECHA: 24/Jul/2019**

SECRETARÍA DE **GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL**

CONVENIO No: **2752 DE 2023**

MODIFICACIóN No: **1**

CONDICIONES ORIGINALES APORTE JAC DE LA VEREDA DEL DATIL							**MODIFICACIONES** (insertar columnas según numero de modificaciones)			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**Tipo de aporte**	**V. TOTAL**	**VLR/CAPITULO**	**+/-**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
MANO DE OBRA Y EQUIPO											
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	KM	0,023	mano de obra			+	0,003	mano de obra	0,026	
2,05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,63	equipo mano de obra			+	7,450	equipo mano de obra	10,080	
2,06	solado concreto espesor E= 0.05 MTS 14Mpa (2000PSI)	M2	1,02	equipo mano de obra			+	7,980	equipo mano de obra	9,000	
2,10	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	40,63	mano de obra			+	10,850	mano de obra	51,48	
2,12	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,03	equipo mano de obra transporte			+	0,670	equipo mano de obra transporte	2,700	
3,01	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	3,35	material			+	0,900	material	4,250	

JUAN DE LA CRUZ ALZA CUARAN	**DR. SERVILIO CAICEDO ULLOA**	**PROYECTO: ARQ. HERNAN AMELIO ESQUIVEL DAZA**
PRESIDENTE JAC RL VEREDA DEL DATIL	SUPERVISOR DEL CONVENIO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL	MP. A33992011-74348006
