# INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
# CONTRATO MC-DAAL-031-2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | DIAMMOS GROUP SAS |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 21/09/2023 |
| **Nº DEL CONTRATO** | MC-DAAL-031-2023 |
| **TIPO DE CONTRATO** | MINIMA CUANTÍA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y RED ELÉCTRICA, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO DE BAÑOS PARA LAS COMISIONES ESCRUTADORAS, EN EL MARCO DEL APOYO A LA REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL SECCIONAL DE CARTAGENA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES TERRITORIALES 2023 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 64.420.906 |
| **PLAZO** | 20 días |
| **NATURALEZA DEL CONTRATISTA** | PERSONA JURIDICA |
| **FECHA DE INICIO** | 29/09/2023 |
| **FECHA FINAL** | 19/10/2023 |

A continuación, se relacionan las actividades que fueron verificadas desde el apoyo a la supervisión del contrato No. MC-DAAL-031-2023 cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y RED ELÉCTRICA, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO DE BAÑOS PARA LAS COMISIONES ESCRUTADORAS, EN EL MARCO DEL APOYO A LA REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL SECCIONAL DE CARTAGENA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES TERRITORIALES 2023 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”.

Se deja constancia que el contratista cumplió con todos y cada uno de los requisitos técnicos necesarios estipulados para la ejecución del contrato No. MC-DAAL-031-2023 y desarrolló las actividades presentadas a continuación:

# INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
# CONTRATO MC-DAAL-031-2023

## TABLA DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

**SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO**

**OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y RED ELÉCTRICA, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO DE BAÑOS PARA LAS COMISIONES ESCRUTADORAS, EN EL MARCO DEL APOYO A LA REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL SECCIONAL DE CARTAGENA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES TERRITORIALES 2023 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS."**

| | ADECUACIONES LOCATIVAS | CONTRATADO | | EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ADECUACIONES SANITARIAS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **CANTIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | Suministro e instalación de Grifería tanque dual para sanitario tipo flotador. | UND | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Suministro e instalación de fluxómetro para sanitario institucional tipo palanca, cromada, descarga 4,8 lts. Incluye desmonte del existente, instalación del nuevo fluxómetro, teflón, pegante y demás elementos necesarios para su instalación. | UND | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional tipo push cromada, incluye desmonte de la existente, maguera de suministro de agua, cinta teflón, pegante y demás elementos necesarios para su instalación | UND | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Suministro e instalación de fluxómetro para orinal institucional tipo palanca, cromada, descarga 0,5 lts. Incluye desmonte del existente, instalación del nuevo fluxómetro, teflón, pegante y demás elementos necesarios para su instalación. | UND | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Suministro e instalación de grifería para ducha institucional tipo push cromada, incluye desmonte de la existente, maguera de suministro de agua, cinta teflón, pegante, demolición de enchape y muro, resane, enchape 20x20 blanco y aplicación de junta boquilla. | UND | 2 | 2 | 0 |
| | **ELÉCTRICOS** | | | | |
| 6 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12. Incluye tendido y fijación del cable al piso con cita transparente, Conexión al tablero de circuitos de los diferentes ramales eléctricos. | ML | 1700 | 1700 | 0 |
| 7 | Suministro e instalación de tomacorriente blanco de 15 amperio 110 a Voltios con polo a tierra. Incluye conexión al cable encauchetado de 30cm a su respectivo circuito eléctrico en el cubículo. | UND | 110 | 110 | 0 |
| 8 | Suministro e instalación de tablero de circuito eléctrico TMB-1 trifásico de 32 circuitos 225 amperios con espacio para totalizador. Incluye cableado y accesorios de instalación y fijación | UND | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Suministro e instalación de breaker industrial 3x250 regulable | UND | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Acometida TMB-1 THHN/THWN Cu 1/0 90°C AWG 90°C Incluye tendido, conexión del cable a tablero de circuitos a subestación eléctrica | ML | 30 | 30 | 0 |
| 11 | Acometida TMB-1 THHN/THWN Cu 8 90°C AWG 90°C Incluye tendido, conexión del cable a tablero de circuitos a subestación eléctrica | ML | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 12 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 1x20 amperios, incluye conexión al tablero de circuitos | UND | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 13 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 1x30 amperios, incluye conexión al tablero de circuitos | UND | 16,00 | 16,00 | 0 |
| 14 | Suministro e instalación extractor de aire de 24", Incluye accesorios de anclaje y fijación para su funcionamiento. Su instalación será en una cercha a 7 metros de altura. | UND | 6,00 | 6,00 | 0 |

# INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
# CONTRATO MC-DAAL-031-2023


A continuación, se anexa el registro fotográfico de los trabajos realizados y recibidos a satisfacción que soportan el presente informe.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ACTIVIDADES

1. Suministro e instalación de Grifería tanque dual para sanitario tipo flotador.
   Cantidad: 1



2. Suministro e instalación de fluxómetro para sanitario institucional tipo palanca, cromada, descarga 4,8 lts. Incluye desmonte del existente, instalación del nuevo fluxómetro, teflón, pegante y demás elementos necesarios para su instalación.
   Cantidad: 2

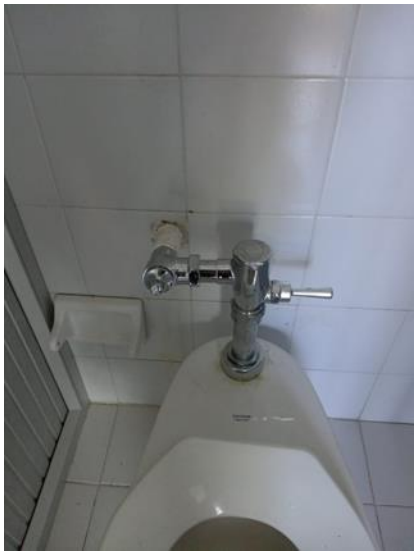



3.Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional tipo push cromada, incluye desmonte de la existente, maguera de suministro de agua, cinta teflón, pegante y demás elementos necesarios para su instalación.
Cantidad: 0

4.Suministro e instalación de fluxómetro para orinal institucional tipo palanca, cromada, descarga 0,5 lts. Incluye desmonte del existente, instalación del nuevo fluxómetro, teflón, pegante y demás elementos necesarios para su instalación.
Cantidad: 1



5. Suministro e instalación de grifería para ducha institucional tipo push cromada, incluye desmonte de la existente, maguera de suministro de agua, cinta teflón, pegante, demolición de enchape y muro, resane, enchape 20x20 blanco y aplicación de junta boquilla.





6. Suministro e instalación de cable encorchetado 3x12. Incluye tendido y fijación del cable al piso con cita transparente, Conexión al tablero de circuitos de los diferentes ramales eléctricos.





7. Suministro e instalación de tomacorriente blanco de 15 amperio 110 a Voltios con polo a tierra. Incluye conexión al cable encauchetado de 30cm a su respectivo circuito eléctrico en el cubículo.



8. Suministro e instalación de tablero de circuito eléctrico TMB-1 trifásico de 32 circuitos 225 amperios con espacio para totalizador. Incluye cableado y accesorios de instalación y fijación.





9. Suministro e instalación de breaker industrial 3x250 regulable



10. Acometida TMB-1 THHN/THWN Cu 1/0 90°C AWG 90°C Incluye tendido, conexión del cable a tablero de circuitos a subestación eléctrica

11. Acometida TMB-1 THHN/THWN Cu 8 90°C AWG 90°C Incluye tendido, conexión del cable a tablero de circuitos a subestación eléctrica



11. Suministro e instalación de Breaker enchufable de 1x20 amperios, incluye conexión al tablero de circuitos .
12.Suministro e instalación de Breaker enchufable de 1x30 amperios, incluye conexión al tablero de circuitos



# INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
# CONTRATO MC-DAAL-031-2023

14. Suministro e instalación extractor de aire de 24", Incluye accesorios de anclaje y fijación para su funcionamiento. Su instalación será en una cercha a 7 metros de altura.



Con base en lo anterior, desde el de apoyo a la supervisión se deja constancia de las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato y se aclara que las actividades no ejecutadas obedecen a que la realización de estas resultaban innecesarias toda vez que algunos baños fueron arreglados en el transcurso del proceso de contratación y estaban en óptimas condiciones al iniciar la ejecución del presente contrato.

Se firma en Cartagena, a los 20 días del mes de octubre de 2023.

**LILIA CAROLINA MEDRANO**
*Arq. Asesor Externo DAAL*

**LEONEL GOMEZ VANEGAS**
*Ing. Asesor Externo DAAL*
