CONTRATO DE CONSULTORIA No. GN2806-2022

OBJETO: Realizar la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES – SAN ISIDRO – LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INFORME DE SUPERVISION No 5

PERIODO INFORME: 15/10/2023 al 14/11/2023

San Juan de Pasto, noviembre de 2023

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	30-nov-23	CORTE	14/11/2023

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

CONCUROS DE MERITOS ABIERTO:	CM013-2022
CONTRATO DE CONSULTORIA Nro:	GN2806-2022

CDP DEPARTAMENTAL No.:	2022080036.	FECHA:	2-ago-22	VALOR	$ 273.237.090,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No:	2022120403	FECHA:	16-dic-22	VALOR	$ 211.915.200,00

OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES – SAN ISIDRO – LA PLANADA, SOBRE EL RIÓ GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATISTA DE CONSULTORIA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. NIT. 800256897-0 representado Legalmente por Luz Adriana Bastidas Álzate con C.C. 34.557.778.
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	Ing. JAVIER ENRIQUEZ BRAVO C.C. 98.379.545.
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. FREDY ERNESTO TREJO CORAL
META FISICA	1. ESTUDIO REALIZADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 211.915.200,00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ -
VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:	$ 211.915.200,00
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16-dic-22
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:	Cinco (5) Meses, contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.
FECHA DE ACTA INICIO:	15-jun-23
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15-nov-23
MODIFICATORIO No 1:	
FECHA TERMINACION MOD No 1:	
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15-jun-23
PORCENTAJE ANTICIPO	20% del valor del Contrato
TOTAL ANTICIPO 20%	$ 42.383.040,00
VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO	$ -
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA No.:	45-44-101144465

% AVANCE FISICO CONTRATO	% PROGRAMADO:	100,00%	% EJECUTADO:	33,10%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	95,0%	% EJECUTADO	20%
META FISICA A LA FECHA	1 ESTUDIO REALIZADO		% EJECUTADO	33,10%

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: El alcance abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar los Estudios y Diseños técnicos a nivel Fase 3 y gestiones ambientales, Consultoría Para La Elaboración de los Estudios y Diseños del Puente San Antonio Ubicado en la Vía Departamental 10NR02 Chucunes – San Isidro – La Planada, Sobre El Rio Guiza en los Municipios de Mallama y Ricaurte Departamento de Nariño.
El Consultor, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios básicos y diseños técnicos, gestiones ambientales, mesas de concertación y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio definitivo que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. Así mismo, para la construcción, planteará métodos constructivos de última generación y bajo los criterios ambientales necesarios definidos por las limitantes existentes en el punto de implantación del proyecto

El dia 3 de noviembre de 2023 se llevo a cabo el cuarto comité tecnico de manera virtual, donde el Ing. MAURICIO CERON, representante de la Firma Consultora realiza un informe pormenorizado y presentación en Power Poin sobre el avance de la consultoría.



Duante el periodo no se ha recibido el Informe de Interventoria No 5 - por tanto para este periodo no se ha podido determinar el avance en las actividades adelantadas por la Consultoria.

ASPECTOS FINANCIEROS: De acuerdo con la cláusula referente a VALOR Y FORMA DE PAGO, el Departamento de Nariño realizó el pago del anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato equivalente a: **$ 42,383,040,oo,** mediante comprobante de egreso Nro 2023008268 con fecha 22/08/2023, consignado en la cuenta corriente Nro 881-000035-84 del Bancolombia, cuenta destinada y aprobada para el manejo del anticipo. al corte del Informe No 04. No se ha cobrado actas parciales por parte del Consultor.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: El Contrato Nro 2806-2022 contractualmente inició su ejecución, una vez se adelantó su legalizacion y se suscribió el Acta de Inicio el dia 15-06-2023. todos los documentos se encuentran legalizados y publicados en pagina Secop 2, con el numero de proceso CM013-20022, La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023.de fecha 29 de junio de 2023. durante el periodo de encuentra en proceso la modificacion No 02, que prorroga el contrato hasta el 29/12/2023.

ASPECTOS LEGALES: Contrato de Consultoria debidamente suscrito el **26-10-2021.** Legalizado por el DAC según Certificado de Legalizacion del **15-06-2023**. Se legaliza el Acta de Inicio en Secop II por parte del DAC el **15-06-2023.** El modificatorio No 02, que prorroga el contrato hasta **el 29/12/2023** se encuntra en proceso de legalización.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo se ha recibido cuatro (4) informes de avance por parte de la Interventoria;: de los periodos 15-06-2023 al 14/07/2023 del 15/07/2023 al 14/08/2023. 15/08/2023 al 14/09/2023 y del 15/09/2023 al 14/102023. Al Corte del Presente no se ha presentado el Informe de Interventoria No 05 por lo que el avance de ejecución se reporta el mismo del periodo anterior 33,10%

Proyecto: Ing. **FREDY ERNESTO TREJO CORAL**
Profesional Univeristario - Apoyo a la Supervisión - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS**
Subsecretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **SONIA ALEJANDRA VELASCO R.**
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES – SAN ISIDRO – LA PLANADA, SOBRE EL RIO GÜIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

PERSONAL PROFESIONAL VINCULADO A LA CONSULTORIA

PROFESIONAL ACEPTADO	NOMBRE	REQUISISTOS GENERALES	TITULO PPOFESIONAL	POST- GRADO	POST- GRADO ADICIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	EXPERIENCIA ESPECIFICA -	OBERVACIONES
DIRECTOR DE CONSULTORIA: Dedicación del 50% mensual	ELMER JAVIER ZUÑIGA VEGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Ver Observación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Se Acepta teniendo en cuenta la matriz 4 de lineamientos del personal, la equivalencia de un postgrado se puede homologar por dos años adicionales de experiencia general y uno de específica. - La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
ESPECIALISTA PRINCIPAL (COORDINADOR ESTUDIO ESTRUCTURAL PUENTES - OTROS): Dedicación del 75% mensual	DIEGO ESTRADA PAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Ver Observación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Se Acepta teniendo en cuenta la matriz 4 de lineamientos del personal, la equivalencia de un postgrado se puede homologar por dos años adicionales de experiencia general y uno de específica. - La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR DISEÑO GEOMÉTRICO: Dedicación del 50% mensual	ELMER JAVIER ZUÑIGA VEGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR ESTUDIO DE TRANSITO Dedicación del 50% mensual	RUBEN DARIO TORRES URBANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR ESTUDIO DE PAVIMENTOS Dedicación del 50% mensual	LILY CECILIA CASTRILLÓN ORDOÑEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR ESTUDIO GEOTÉCNICO - ESTABILIDAD TALUDES: Dedicación del 50% mensual	LILY CECILIA CASTRILLÓN ORDOÑEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR ESTUDIO GEOLÓGICO: Dedicación del 50% mensual	GABRIEL FERNANDO RENGIFO LUQUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR ESTUDIO HIDRÁULICA - HIDROLOGÍA - SOCAVACIÓN: Dedicación del 50% mensual	PAOLA ANDREA MOSQUERA ARIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	Se Acepta el Contratista allega adjuntamos el plan de estudios del posgrado en Recursos Hídricos, y el de Hidráulica y/o hidrologia. La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR ESTUDIO AMBIENTAL: Dedicación del 50% mensual	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
COORDINADOR PRESUPUESTO -REQUISITOS ESPECIFICACIONES: Dedicación del 50% mensual	ANGELA CRISTINA PEDRAZA ALARCON	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.
CORDINADOR SOCIAL Y GESTION PREDIAL Dedicación del 50% mensual	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1018-2023 de fecha 29 de junio de 2023.

Nota: Sin cambios para el periódo

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

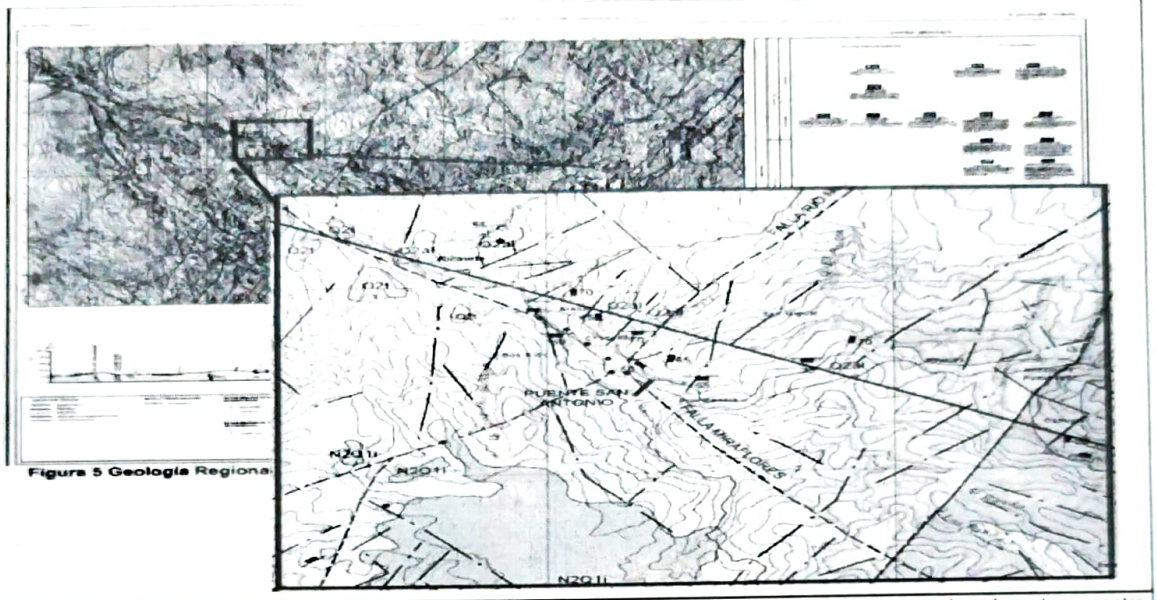


Figura 5 Geología Regional

Fotografia No 1-La caracterización geológica del área de estudio del proyecto, ubicadas en el municipio mencionado, esta se centra en las condiciones litológicas, estructurales y morfológicas necesarias para definir las condiciones del terreno donde se requiere desarrollar el proyecto

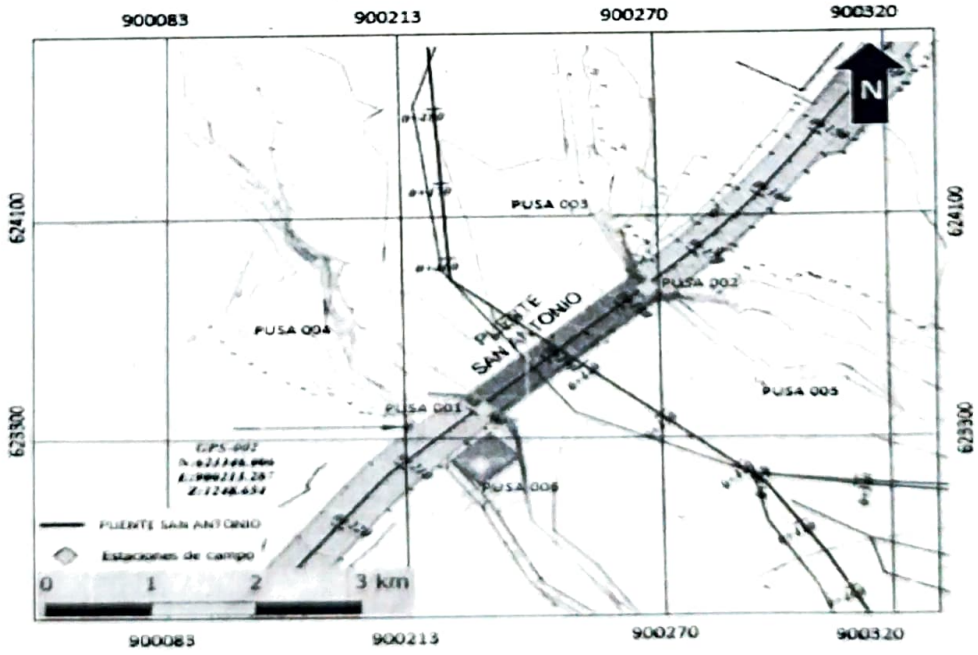


Imagen 2: Localizacion puntos Contro de Campo

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código: SIVEYC FTO Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No:	**2806-2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 211.915.200,00**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO No	FECHA PAGO
ANTICIPO 20%	22/08/2023	$ 42.383.040,00	$ -	$ -	$ 42.383.040,00	$ 42.383.040,00	$ -	2023008268	22/08/2023
TOTAL			**$ -**	**$ -**	**$ 42.383.040,00**	**$ 42.383.040,00**	**$ -**		

AVANCE FISICO	**33,10%**
AVANCE FINANCIERO	**20,00%**

Nota: Sin cambios para el periodo.
