CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GN2688-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VÍA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES - SAN ISIDRO - LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INFORME DE SUPERVISION No 5

PERIODO INFORME: 15/10/2023 al 14/11/2023

San Juan de Pasto, Noviembre de 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código: SIVEYC FTO Versión: 0.0 Vig. 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30-nov-23			CORTE	14/11/2023


1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

CONCUROS DE MINIMA CUANTIA:	MC 006-2023				
CONTRATO DE CONSULTORIA Nro:	GN2688-2023 del 12 de mayo de 2023.				
CDP No.:	2023020307	FECHA:	15-feb-23	VALOR	$ 64.519.896,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No:	2023050406.	FECHA:	12-may-23	VALOR	$ 58.067.906,00
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera a la Elaboración de Los Estudios y Diseños del Puente San Antonio Ubicado en la Vía Departamental 10NR02 Chucunes - San Isidro - La Planada, Sobre el Rio Guiza en los Municipios de Mallama y Ricaurte Departamento de Nariño				
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	JAVIER ENRIQUEZ BRAVO C.C. 98.379.545.				
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS				
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. FREDY ERNESTO TREJO CORAL				
META FISICA	1. INTERVENTORIA - ESTUDIO REALIZADO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 58.067.906,00				
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ -				
VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:	$ 58.067.906,00				
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	12-may-23				
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:	Cinco (5) Meses, contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.				
FECHA DE ACTA INICIO:	15-jun-23				
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15-nov-23				
MODIFICATORIO No 1:					
FECHA TERMINACION MOD No 1:					
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15-jun-23				
PORCENTAJE ANTICIPO	20% del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO 20%	$ 11.613.581,20				
VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO	$ -				
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
POLIZA No.:	41-44-101269264				
% AVANCE FISICO CONTRATO	% PROGRAMADO:	55%		% EJECUTADO:	33,10%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	55%		% EJECUTADO	0%
META FISICA A LA FECHA	1 ESTUDIO REALIZADO			% EJECUTADO	33,10%

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS La ejecución del contrato comprende realizar las actividades correspondientes a la interventoría en cuanto a los componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales mediante la cual se realizará el seguimiento, control cumplimiento de las obligaciones el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas y la vigilancia de la ejecución de las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en el Objeto del Contrato de Consultoria No. GN2806-2022.

El dia 3 de noviembre de 2023 se llevo a cabo el cuarto comité tecnico de manera virtual, donde el Ing. MAURICIO CERON, representante de la Firma Consultora realiza un informe pormenorizado y presentación en Power Poin sobre el avance de la consultoria.

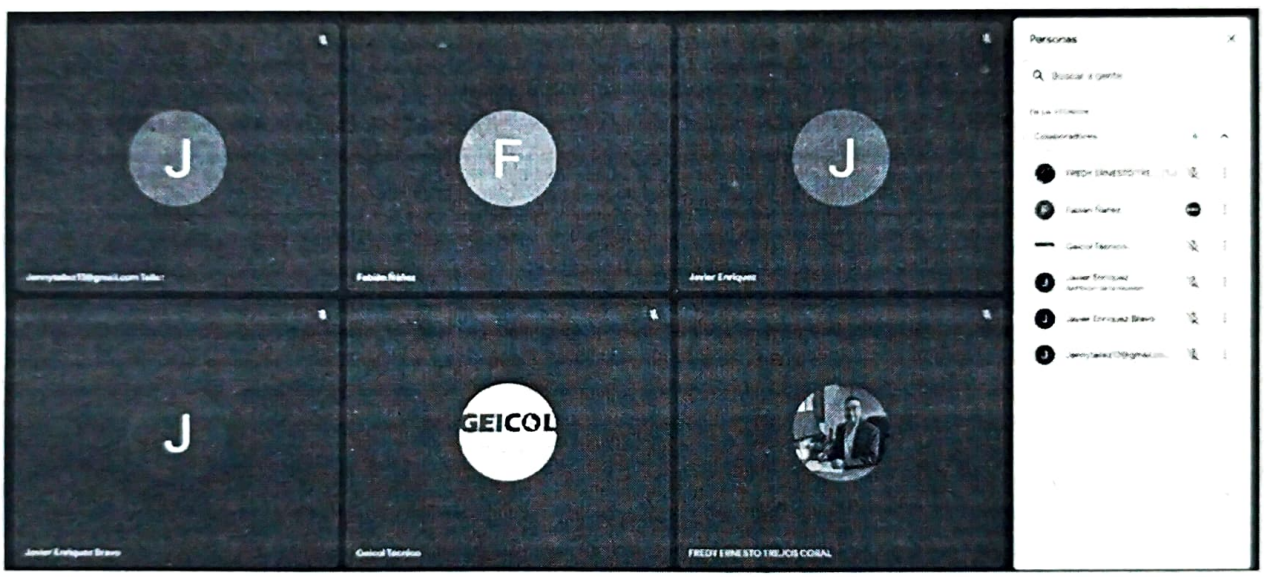

Duante el periodo no se ha recibido el Informe de Interventoria No 5 - por tanto para este periodo no se ha podido determinar el avance en las actividades adelantadas por la Consultoria.

ASPECTOS FINANCIEROS: De acuerdo con la cláusula referente a valor y forma de pago, el pago del anticipo correspondiente al 20% del valor del aportado por el Departamento de Nariño (**$ 11,613,581,2,oo**). Sin pago a la fecha.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: El Contrato Nro 2688-2023 contractualmente inició su ejecución, una vez se adelantó su perfeccionamiento y se suscribió el Acta de Inicio el dia 15-06-2023. todos los docuentos se encuentran legalizados y publicados en pagina Secop 2, con el numero de proceso IMC006-20023, La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Interventoria se realizó mendiante sim DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.

ASPECTOS LEGALES: Contrato de Interventoria debidamente suscrito el 12-05-2023. Se Publica el Acta de Inicio en Secop II por parte del DAC el **15-06-2023.** con fecha 15/06/2023 se legalizó el modificatorio 01, que modifica el numeral 8.1.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de los Estudios Previos del Proceso IMC006-2023 y de la cláusula "GARANTÍA UNICA" del Comunicado de aceptación de la oferta GN2688-2023, en cuanto a que, en la garantia de Buen manejo y correcta inversión del anticipo, se estableció que cubriría lo siguiente: "100% del monto entregado como anticipo (30% del valor del contrato)", no obstante, es necesario aclarar que correctamente el anticipo corresponde al 20% de valor total del contrato, tal y como se encuentra señalado en la Forma de Pago, tanto de los Estudios Previos como del Comunicado de aceptación de la oferta, y que por error involuntario en el contenido de la misma se indicó a un porcentaje diferente. El Contrato a la fecha tiene certificado de legalización y el modificacion No 02, que prorroga el contrato hasta el 29/12/2023. se encuntra en proceso de legalización

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo se ha recibido cuatro (4) informes de avance por parte de la Interventoria;: de los periodos 15-06-2023 al 14/07/2023 del 15/07/2023 al 14/08/2023. 15/08/2023 al 14/09/2023 y del 15/09/2023 al 14/10/2023. Al Corte del Presente no se ha presentado el Informe de Interventoria No 05 por lo que el avance de ejecución se reporta el mismo del periodo anterior 33,10%

Proyecto: Ing. **FREDY ERNESTO TREJO CORAL**
Profesional Univeristario - Apoyo a la Supervisión - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS**
Subsecretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **SONIA ALEJANDRA VELASCO R**
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VÍA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES - SAN ISIDRO - LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONAL PROFESIONAL VINCULADO A LA INTERVENTORIA

PROFESIONAL ACEPTADO	NOMBRE	REQUISISTOS GENERALES	TITULO PPOFESIONAL	POST- GRADO	POST- GRADO ADICIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBERVACIONES
Director de Interventoria Dedicación del 30 % mensual	Ing. Javier Enriquez Bravo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Ver Observación	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.
Ingeniero Postgrado Ambiental Dedicación del 15% mensual.	Ing. Javier Enriquez Bravo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Ver Observación	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.
Ingeniero Postgrado Geotecnia Dedicación del 15% mensual.	Ing. Javier Enriquez Bravo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.
Ingeniero Postgrado Vias o Ingeniería de carreteras Dedicación del 15% mensual.	Ing. Javier Enriquez Bravo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.
Ingeniero Postgrado Pavimentos Dedicación del 15% mensual.	Ing. Javier Enriquez Bravo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.
Ingeniero Postgrado Hidrologia/Hidráulica Dedicación del 15% mensual.	Ing,. Leon Harvey Quiroz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.
Ingeniero Postgrado Estructuras Dedicación del 30% mensual.	Ing . Oscar Lopez Rodriguez	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.
Profesional Social y Predial Dedicación del 15% mensual.	Ing. Jenny Téllez Salas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.

Nota: Sin cambios para el periódo.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

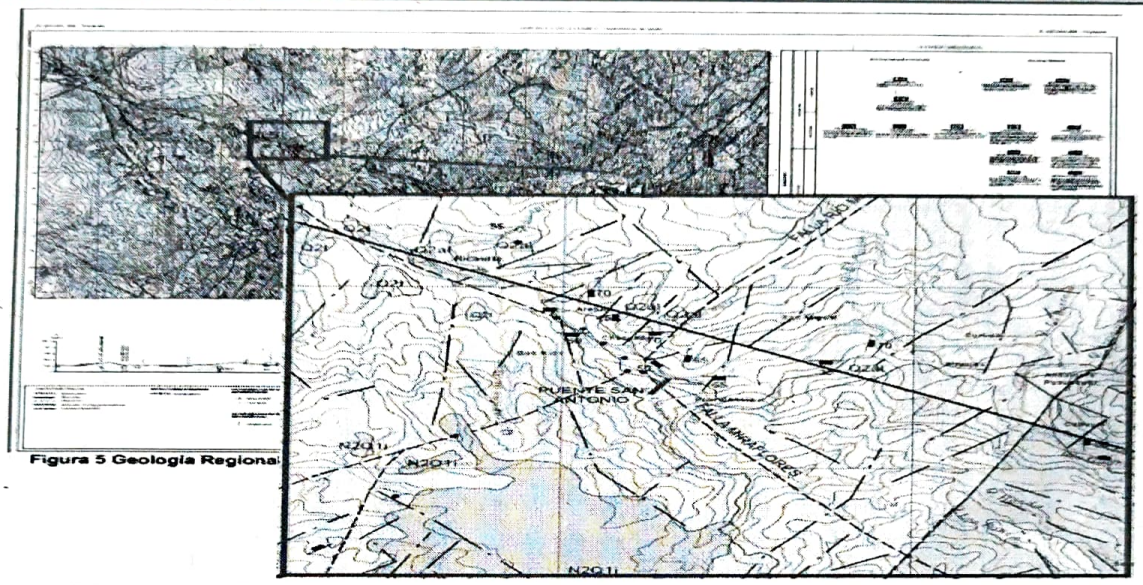


Figura 5 Geologia Regional

Fotografia No 1-La caracterización geológica del área de estudio del proyecto, ubicadas en el municipio mencionado, esta se centra en las condiciones litológicas, estructurales y morfológicas necesarias para definir las condiciones del terreno donde se requiere desarrollar el proyecto

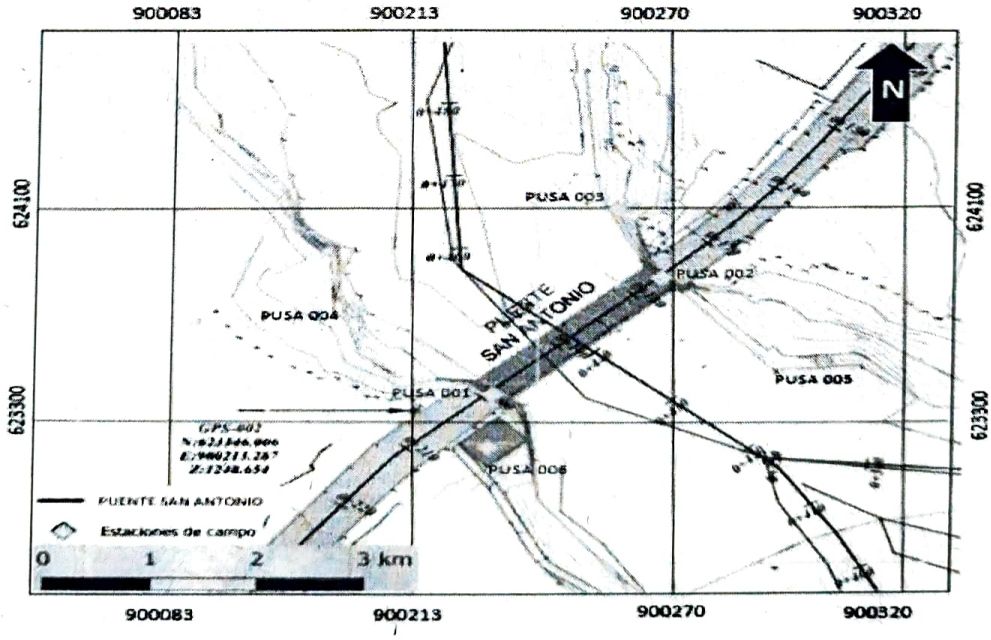


Imagen 2: Localizacion puntos Contro de Campo

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código: SIVEYC FTO Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No:	**2688-2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 58.067.906,00**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO No	FECHA PAGO
ANTICIPO 20%	15/12/2021	$ 11.613.581,20	$ -	$ -	$ -				
TOTAL			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		

AVANCE FISICO	**33,10%**
AVANCE FINANCIERO	**0,00%**

Nota: A la fecha no se ha efectuado el pago del Anticipo

Nota: Sin cambios para el periódo.
