4	OBRAS COMPLMENTARIAS				% EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN ACUMULADA
4.3.27	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa)	und	38,00	0,00	0,00%	50,00%
4.3.28	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	7353,62	0,00	0,00%	97,27%
4.3.29	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	15433,59	0,00	0,00%	99,67%
4.3.30	Material crudo de rio T.max 6"	m³	6793,68	0,00	0,00%	80,03%
4.3.31	Filtro en tubería 800 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (32") perforada con triturado de 1/2" - 3/4", geotextil y relleno atraque en base granular (1.20 x 1.20 x 17.45 m)	und	2,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.32	Caja de inspección 100 x 100	und	2,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.33	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	und	4,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.34	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4" hueco de 3" para tapa box, drenaje, inspección y limpieza (inc. marco)	m²	7,86	0,00	0,00%	0,00%
4.3.35	Geotextil No Tejido 1600	m²	864,00	0,00	0,00%	90,00%
4.3.36	Piedra común	m³	277,63	0,00	0,00%	90,01%
4.3.37	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 2" para gas. Suministro e instal.	m	1165,00	0,00	0,00%	0,00%

ITEM 4.3.1 REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO

Se realizó el replanteo y localización de las tuberías de alcantarillado del drenaje de la vía y de las estructuras existentes, en las que se tuvo en cuenta cada uno de los alineamientos previstos en los planos de diseño y las especificaciones técnicas aprobadas del proyecto.

ITEM 4.3.5 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO

Se realizó la excavación manual en material conglomerado para la instalación del drenaje de la vía, cumpliendo con cada uno de los alineamientos previstos en los planos de diseño, los anchos de excavación y las especificaciones técnicas aprobadas del proyecto y de acuerdo a las dimensiones requeridas.

ITEM 4.3.6 TUBERÍA 315 MM PEAD SN4 ALCANTARILLADO CORRUGADA (12"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 12”, de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico.

ITEM 4.3.14 RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERÍA CON MATERIAL BASE GRANULAR TRITURADO (TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2")

Previo a la instalación de la tubería, se efectuó el encamado de la tubería y el atraque con material base granular de 1 1/2”, siguiendo las secciones establecidas, haciéndolo en capas hasta llegar a la compactación requerida.

ITEM 4.3.15 BOLSA O SACO CON BASE GRANULAR DE 0.60 X 0.80

Una vez terminado el encamado con base granular para la instalación de la tubería, de manera simultánea se procedió a ubicar las bolsas sacos que contenían material granular, esto con el fin de garantizar un soporte y fijación de la tubería, evitando desacoples por la vibración al compactar el material de relleno y así poder garantizar los alineamientos y pendientes estipuladas en los diseños.

ITEM 4.3.19 SUMIDERO LATERAL SL-250 EN MAMPOSTERÍA


En la vigencia se llevó a cabo la construcción de sumidero lateral SL-250 en mampostería, con su respectiva tapa rectangular en concreto; la construcción se realizó en los lugares indicados estipulados en los planos de diseños, esta actividad que fue verificada por la comisión topográfica de obra.

4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				% EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN ACUMULADA
4.4	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	**UND**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**10,41%**	**82,55%**
4.4.1	Transporte de material pétreo (vía pavimentada)	m³-km	664433,68	69136,68	10,41%	82,55 %

ITEM 4.4.1 TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO (VÍA PAVIMENTADA)

Se realizó el transporte de material pétreo requerido para la construcción de todos los componentes contemplados en el proyecto, estos trabajos se realizaron de forma mecánica con su respectivo transporte de material en volquetas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

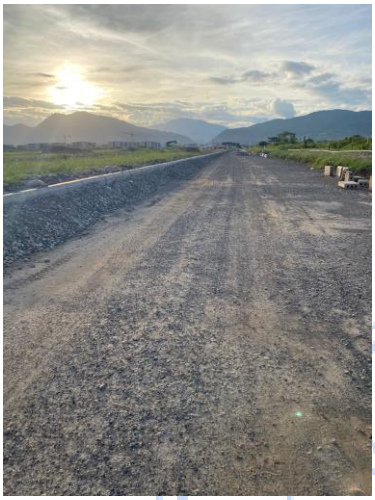
















5.2 PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Para el siguiente periodo se tiene el siguiente cronograma de actividades:

- ✓ Excavación mecánica y manual
- ✓ Instalación de tubería
- ✓ Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado
- ✓ Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
- ✓ Instalación de bolsa o saco con base granular
- ✓ Fundición de estructuras en concreto
- ✓ Armado y amarre de acero
- ✓ Transporte de materiales

5.3 EQUIPOS Y/O MAQUINARIA EN OBRA

Durante el desarrollo de ejecución de las actividades del presente periodo de informe, se involucró el siguiente listado de equipos y/o maquinaria:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Estación total	1
Nivel de precisión	1
Prisma	2
Trípode	2
Radios	2
Mira de topografía	2
Retroexcavadora de orugas	6
Retroexcavadora de llantas	3
Volquetas	10
Vibrocompactador	2
Herramienta menor	

5.4 MATERIAL UTILIZADO EN OBRA

Durante el desarrollo de ejecución de las actividades del presente periodo de se requirió el uso de los siguientes materiales de obra;

- ✓ Base granular triturada
- ✓ Bolsa o saco con base granular
- ✓ Tubería PEAD

- ✓ Concreto 4000 PSI
- ✓ Acero de refuerzo

5.5 BITÁCORA DE OBRA

Se ingresó a la obra el libro foliado para la bitácora de obra, el cual se está diligenciando en conjunto con la interventoría; plasmando cada una de las situaciones presentadas en el día a día de la ejecución del proyecto. En el Periodo comprendido del presente informe, se hicieron las anotaciones respectivas en la bitácora de obra, de las cuales se anexarán las copias. *(Ver anexo).*

5.6 ESTADO DEL TIEMPO

MAYO DE 2023					
DIA	**FECHA**	**ESTADO**	**DIA**	**FECHA**	**ESTADO**
Lunes	01-05-2023	---	Miércoles	17-05-2023	LLUVIOSO
Martes	02-05-2023	SOLEADO	Jueves	18-05-2023	SOLEADO
Miércoles	03-05-2023	SOLEADO	Viernes	19-05-2023	SOLEADO
Jueves	04-05-2023	SOLEADO	Sábado	20-05-2023	LLUVIOSO
Viernes	05-05-2023	SOLEADO	Domingo	21-05-2023	
Sábado	06-05-2023	SOLEADO	Lunes	22-05-2023	SOLEADO
Domingo	07-05-2023		Martes	23-05-2023	SOLEADO
Lunes	08-05-2023	SOLEADO	Miércoles	24-05-2023	SOLEADO
Martes	09-05-2023	LLUVIOSO	Jueves	25-05-2023	LLUVIOSO
Miércoles	10-05-2023	LLUVIOSO	Viernes	26-05-2023	SOLEADO
Jueves	11-05-2023	SOLEADO	Sábado	27-05-2023	LLUVIOSO
Viernes	12-05-2023	LLUVIOSO	Domingo	28-05-2023	
Sábado	13-05-2023	LLUVIOSO	Lunes	29-05-2023	LLUVIOSO
Domingo	14-05-2023		Martes	30-05-2023	SOLEADO
Lunes	15-05-2023	LLUVIOSO	Miércoles	31-05-2023	SOLEADO
Martes	16-05-2023	SOLEADO	Jueves		

5.7 DIFICULTADES, INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo, NO se presentaron dificultades que afectaran o entorpecieran el normal desarrollo de las obras.

5.8 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN

En el presente periodo se presentaron las siguientes actas de reunión. *(Ver anexo).*

FECHA	OBJETO	COMPROMISOS/CONCLUSIONES
25-05-2023	Solicitud Soportes de Seguridad Social y Pagos FIC	Adjuntar al informe mensual del mes de mayo, los soportes de pago de la seguridad social de abril y consecuentemente la del mes de mayo de 2023.
---	---	---

5.9 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Durante las actividades desarrolladas del presente periodo, se contó con el personal que se describe en la siguiente tabla, en la cual se indica cargo y número de identificación de los mismos y los demás trabajadores se refleja en la nómina. *(Ver anexo).*

MAYO DE 2023			
No.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7.182.173	REPRESENTANTE LEGAL
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA
4	BAEZ BAEZ CARLOS ANDRES	74.187.852	ESPECIALISTA EN VÍAS
5	GARCIA LOPEZ IVAN GABRIEL	7.392.071	SG-SST
6	MENDIVELSO ALVARADO JOHANA GEORGINA	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
7	NARANJO MESA JESÚS	80.019.489	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
8	OROS PINTO HENRY DANIEL	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL
9	FONSECA HERRERA JORGE ARIEL	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA
10	AGUDELO FIGUEREDO JOSE POLIDORO	1.118.535.712	AYUDANTE
11	ALBARRACIN PEREZ NELSON YESID	1.118.547.209	AYUDANTE
12	ARROYO PEREZ FABIAN ANTONIO DE JESUS	5.342.927	AYUDANTE
13	BAYONA INFANTE PAULO ALEJANDRO	1.055.315.097	AUXILIAR
14	CAÑAVERAL LONDOÑO MANUEL ANTONIO	14.891.186	AYUDANTE
15	CARREÑO MENESES FRANCISCO	1.007.680.165	AYUDANTE
16	CARREÑO MENESES VICENTE	1.003.087.623	AYUDANTE
17	CHAVEZ MONTAÑEZ LAURA TATIANA	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

MAYO DE 2023			
No.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
18	CONTRERAS ESPINEL YOSMAN ALBERTO	9.434.327	AYUDANTE
19	FLOREZ ARIAS GERARDO ANCIZAR	82.260.032	CONDUCTOR
20	FONSECA LOMBANA YAZMIN	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL
21	GALAN VARGAS EDWARD FERNANDO	1.118.558.066	AYUDANTE
22	GUANARO PAEZ NELSON	1.006.636.368	AYUDANTE
23	GUANARO TARACHE YESICA YIRETH	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL
24	JEREZ FORERO ESTEBAN DAVID	1.047.364.187	CONDUCTOR
25	LANDAETA CAINABA ANGIE KATHERINE	1.118.566.599	AUXILIAR
26	LOPEZ GARCÍA ELKIN ALEXI	96.121.602	CONDUCTOR
27	MARTINEZ MARTINEZ RUBEN DARIO	1.118.569.837	AYUDANTE
28	MIJARES FRANCO NURY YOLANDA	68.252.339	AYUDANTE
29	NIÑO FRANCO CELMIRA	47.441.305	CONTROLADOR VIAL
30	PEREZ GRANADOS MIGUEL MATEO	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA
31	PIDIACHE YUNADO MARIA ERLINDA	47.438.019	CONTROLADOR VIAL
32	RODRIGUEZ CRUZ MIGUEL ANGEL	1.056.801.920	CONDUCTOR
33	RODRIGUEZ FLOREZ LUIS EDUARDO	10.178.559	AYUDANTE
34	RODRIGUEZ GARZON CARLOS ALBERTO	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA
35	RODRIGUEZ LUZ LEIDI	47.438.910	CONTROLADOR VIAL
36	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN
37	SUARIQUE POLO JOSE SEBASTIAN	1.006.553.656	AYUDANTE
38	URIANA URIANA GUILLERMO ANDRES	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA
39	VALERIO MIJARES YENNIFER FERNANDA	1.116.492.529	AYUDANTE
40	VARGAS HERNANDEZ GERMAN	88.194.733	AYUDANTE
41	VARGAS RICO JOHN FREDY	74.858.641	AYUDANTE
42	VEGA LOPEZ EDILSON	1.193.564.753	AYUDANTE
43	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA
--	---	---	---
--	---	---	---

5.10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Durante el presente periodo de ejecución se recibió la siguiente correspondencia:

FECHA DE OFICIO	ENVIADO POR	REFERENCIA/ASUNTO
10-05-2023	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	SOLICITUD SOPORTES PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
---	---	---

Se relacionan los soportes de la correspondencia recibida. *(Ver anexo).*

5.11 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el presente periodo de ejecución se envió la siguiente correspondencia:

FECHA DE OFICIO	DIRIGIDO A	REFERENCIA/ASUNTO
10-05-2023	ENERCA S.A. E.S.P.	Solicitud de traslado de poste eléctrico de alta tensión.
10-05-2023	ENERCA S.A. E.S.P.	Solicitud de Traslado de Válvula de Gas.
---	---	---

Se relacionan los soportes de la correspondencia enviada. *(Ver anexo).*

6. CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra en ejecución y las actividades pactadas en el contrato de obra pública se están ejecutando según las especificaciones técnicas y diseños aprobados basados en la normativa vigente.

A la fecha de corte para este informe, el contrato de obra presenta un porcentaje de avance físico ejecutado acumulado del 42,69% según programación con acta de reinicio de fecha 13 de febrero de 2023, y en cuanto avance financiero se presenta un valor girado de $ 56.005.627.125,00 correspondiente al 70,01% del valor del contrato, el cual fue entregado en calidad de anticipo, sin embargo, con la suscripción del acta de recibo parcial de obra No.1 se amortizó la suma de $16.005.597.145,50 equivalentes a un 40,01%.

Elaboró: LUIS DARÍO GANTIVA GARZÓN
Ingeniero Residente de Obra
M.P. 25202 -74722 CND

7. ANEXOS

NÓMINAS FIRMADAS

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1

NÓMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	SUELDO BÁSICO	DT			DEVENGADO							DEDUCIDO			VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
								BÁSICO	AUX. TRANSP.	H. EXT. DIUR	H EXT. NOCT	DOM o FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	VALOR DEDUCIDO		
1	CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO	7.182.173	GERENTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	340.000	1.640.606	46.400	46.400	92.800	1.547.806	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.250.000	01-may	30-may	30	1.250.000	140.606	0	0	0	350.000	1.740.606	50.000	50.000	100.000	1.640.606	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.800.000	01-may	30-may	30	1.800.000	140.606	0	0	0		1.940.606	72.000	72.000	144.000	1.796.606	
4	OROS PINTO HENRY DANIEL	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.200.000	01-may	30-may	30	1.200.000	140.606	0	0	0	340.000	1.680.606	48.000	48.000	96.000	1.584.606	
5	GARCIA LOPEZ IVAN GABRIEL	7.392.071	APOYO HSE	$ 1.200.000	01-may	30-may	30	1.200.000	140.606	0	0	0	340.000	1.680.606	48.000	48.000	96.000	1.584.606	
6	MENDIVELSO ALVARADO JOHANA GEORGINA	1.115.855.518	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.200.000	01-may	30-may	30	1.200.000	140.606	0	0	0	340.000	1.680.606	48.000	48.000	96.000	1.584.606	
7	FONSECA HERRERA JORGE ARIEL	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	240.000	1.540.606	46.400	46.400	92.800	1.447.806	
8	NARANJO MESA JESUS	80.019.489	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	340.000	1.640.606	46.400	46.400	92.800	1.547.806	
9	BAEZ BAEZ CARLOS ANDRES	74.187.852	ESPECIALISTA ADICIONAL EN VIAS	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	340.000	1.640.606	46.400	46.400	92.800	1.547.806	
10	AGUDELO FIGUEREDO JOSE POLIDORO	1.118.535.712	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
11	ARROYO PEREZ FABIAN ANTONIO DE JESUS	5.342.927	BODEGUERO	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
12	CHAVEZ MONTAÑEZ LAURA TATIANA	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
13	GUANARO PAEZ NELSON	1.006.636.368	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
14	JEREZ FORERO ESTEBAN DAVID	1.047.364.187	CONDUCTOR	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
15	MARTINEZ MARTINEZ RUBEN DARIO	1.118.569.837	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
16	NIÑO FRANCO CELMIRA	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
17	RODRIGUEZ GARZON CARLOS ALBERTO	1.118.558.519	INSTALADOR DE TUBERÍA	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
18	RODRIGUEZ FLOREZ LUIS EDUARDO	10.178.559	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
19	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
20	URIANA URIANA GUILLERMO ANDRES	1.151.193.057	INSTALADOR DE TUBERÍA	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1

NÓMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	SUELDO BÁSICO	DT			DEVENGADO							DEDUCIDO			VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
								BÁSICO	AUX. TRANSP.	H. EXT. DIUR	H EXT. NOCT	DOM o FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	VALOR DEDUCIDO		
21	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96.124.891	INSTALADOR DE TUBERÍA	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
22	CONTRERAS YOSMAN ALBERTO	9.434.327	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
23	CAÑAVERAL LONDOÑO MANUEL ANTONIO	14.891.186	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
24	CARREÑO MENESES FRANCISCO	1.007.680.165	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
25	CARREÑO MENESES VICENTE	1.003.087.623	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
26	FLOREZ ARIAS GERARADO ANCIZAR	82.260.032	CONDUCTOR	$ 1.160.000	10-may	13-may	4	154.667	18.747	0	0	0		173.414	6.187	6.187	12.373	161.041	Q.E.P.D
27	FONSECA LOMBANA YAZMIN	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
28	GUANARO TARACHE YESICA YIRETH	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
29	PEREZ GRANADOS MIGUEL MATEO	1.018.483.833	AUX ING	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
30	PIDIACHE YUNADO MARIA ERLINDA	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
31	RODRIGUEZ CRUZ MIGUEL ANGEL	1.056.801.920	CONDUCTOR	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
32	LANDAETA CAINABA ANGIE KATHERINE	1.118.566.599	AUXILIAR	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0	140.000	1.440.606	46.400	46.400	92.800	1.347.806	
33	BAYONA INFANTE PAULO ALEJANDRO	1.055.315.097	AUXILIAR	$ 1.160.000	25-may	30-may	6	232.000	28.121	0	0	0	28.000	288.121	9.280	9.280	18.560	269.561	
34	RODRIGUEZ LUZ LEIDI	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
35	SUARIQUE POLO JOSE SEBASTIAN	1.006.553.656	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
36	VARGAS HERNANDEZ GERMAN	88.194.733	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
37	VARGAS RICO JHON FREDY	74.858.641	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
38	VEGA LOPEZ EDILSON	1.193.564.753	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	16-may	16	618.667	74.990	0	0	0		693.657	24.747	24.747	49.493	644.163	
39	ALBARRACIN PEREZ NELSON YESID	1.118.547.209	AYUDANTE	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
40	GALAN VARGAS EDWARD FERNANDO	1.118.558.066	AUXILIAR	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
41	MIJARES FRANCO NURY YOLANDA	68.252.339	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1

NÓMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	SUELDO BÁSICO	DT			DEVENGADO							DEDUCIDO			VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
								BÁSICO	AUX. TRANSP.	H. EXT. DIUR	H EXT. NOCT	DOM o FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	VALOR DEDUCIDO		
42	VALERO MIJARES YENNIFFER	1.116.492.529	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	01-may	30-may	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	Yanniffer V.
43	LOPEZ GARCIA ELKIN ALEXI	96.121.602	CONDUCTOR	$ 1.160.000	30-may	30-may	1	38.667	4.687	0	0	0		43.354	1.547	1.547	3.093	40.260	ELKIN LOPEZ
TOTAL GENERAL								$ 47.134.000	$ 5.610.179	$ -	$ -	$ -	$ 3.498.000	$ 56.242.179	$ 1.885.360	$ 1.885.360	$ 3.770.720	$ 52.471.459	

APORTES PARAFISCALES			PRESTACIONES SOCIALES			
Salud	8,5%	4.006.390	Cesantias		8,33%	4.393.590
Pensión	12%	5.656.080	Int. / Cesantias		1%	43.936
Riesgos Profesionales Clase V	6,96%	3.280.526	Prima de servicios		8,33%	4.393.590
Riesgos Profesionales Clase I	0,522%		Vacaciones		4,17%	1.965.488
Caja de Compensación	4%	1.885.360				
SUBTOTAL		$ 14.828.356	SUBTOTAL			$ 10.796.604
		TOTAL				$ 25.624.960

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
CC. 7.182.173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Consorcio Inter Nororiental

Yopal Casanare, 10 de mayo de 2023

Rdo: 10-may-2023
08:30 pm

Ingeniero:
CAMILO ERNESTO DÍAZ CARRILLO
R/L CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Diagonal 9 No. 6-42 Yopal – Casanare
Email: csomacronororiental@gmail.com
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Consultoría No. 046 de 2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: SOLICITUD SOPORTE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Cordial saludo,

Mediante la presente, El CONSORCIO INTER NORORIENTAL en calidad de firma interventora del Contrato de Obra No. 130.20.10.044 de 2022, se permite solicitarle formalmente al CONSORCIO MACRO NORORIENTAL, para que allegue los soportes de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del personal de obra vinculado durante el mes de abril del presente año, toda vez que, habiéndose surtido el proceso de revisión documental correspondiente al informe mensual No.4 no se evidenciaron dichos anexos.

Sin otro particular,

JAVIER VERGARA MARIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

Yopal, 10 de mayo de 2023

Yopal 2023/05/11 14:19:24
RAD: 20230104541
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P
Enerca
correspondencia

Ingeniera:
ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE – EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.
E-mail: contactenos@enerca.com.co
Carrera 19-No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
Yopal - Casanare

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044-2022 – "AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

ASUNTO: **SOLICITUD DE TRASLADO DE VÁLVULA DE GAS**

Cordial Saludo Respetada Ingeniera,

El Consorcio Macro Nororiental en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia suscrito con ACUATODOS S.A. E.S.P., a través de la presente, se permite comunicarle que, producto de las actividades contempladas en el alcance del proyecto, personal vinculado a la presente firma contratista ha venido adelantando labores de topografía y trabajos constructivos en la zona de influencia directa, producto de lo cual, se evidenció la existencia de una válvula de gas en un punto cuya localización se superpone con el área a intervenir en el presente contrato. Motivo por el cual, acudimos a su despacho, con la intención de solicitarle formalmente de su valiosa colaboración, en cuanto al desarrollo de las gestiones respectivas, para que se adelanten los trabajos correspondientes al traslado y/o reubicación de la válvula de gas ubicada en las coordenadas relacionadas a continuación:



Imagen. Localización Válvula de Gas

Sin otro particular y a la espera de contar con su compresión, así como de las gestiones administrativas y técnicas a que haya lugar, me suscribo ante usted.

Cordialmente,

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
R/L CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

Yopal, 10 de mayo de 2023

Yopal, 2023/05/11 14:22:29
RAD: 20230104542
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P
Enerca
correspondencia

Ingeniera:
ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE – EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.
E-mail: contactenos@enerca.com.co
Carrera 19-No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
Yopal - Casanare

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044-2022 – "AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

ASUNTO: **SOLICITUD DE TRASLADO DE POSTE ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN.**

Cordial Saludo Respetada Ingeniera,

El Consorcio Macro Nororiental en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia suscrito con ACUATODOS S.A. E.S.P., a través de la presente, se permite comunicarle que, producto de las actividades contempladas en el alcance del proyecto, personal vinculado a la presente firma contratista ha venido adelantando labores de topografía y trabajos constructivos en la zona de influencia directa, producto de lo cual, se evidenció la existencia de un poste eléctrico de alta tensión administrado por la entidad que usted representa, en un punto cuya localización se superpone con el área a intervenir en el presente contrato.

De manera consecuente con lo anterior, el Consorcio Macro Nororiental, acude formalmente a su despacho, con la intención de solicitarle formalmente de su valiosa colaboración, en cuanto al desarrollo de las gestiones respectivas, para que se adelanten los trabajos correspondientes al traslado y/o reubicación de la estructura de alta tensión ubicada en las coordenadas relacionadas a continuación:

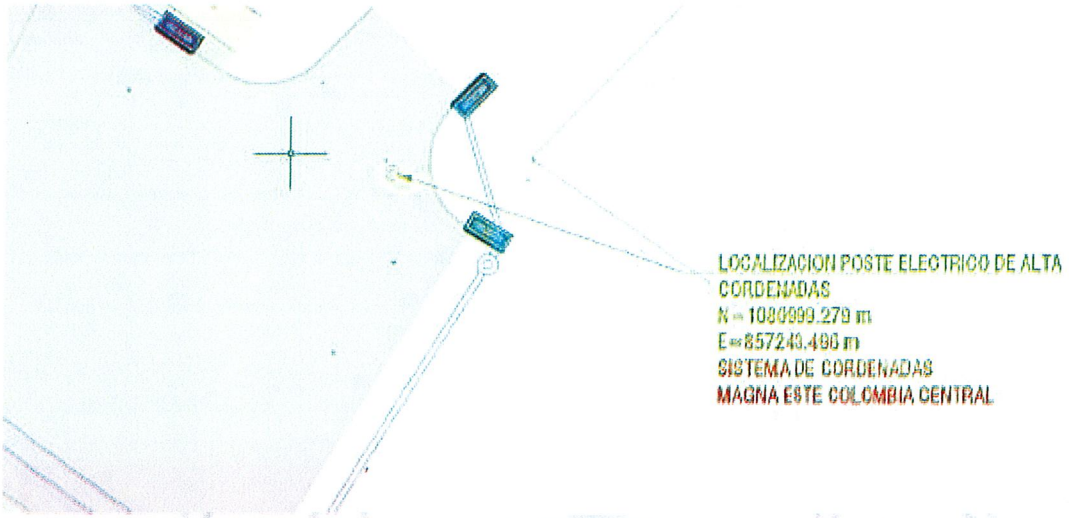


Imagen. Localización Poste Eléctrico de Alta

Sin otro particular y a la espera de contar con su compresión, así como de las gestiones administrativas y técnicas a que haya lugar, me suscribo ante usted.

Cordialmente,

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
R/L CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO

ACTAS DE REUNIÓN

I. DATOS GENERALES

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA: 130.20.10.044-2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 046 DE 2022

TEMA DE LA REUNIÓN:

Reiteración de la solicitud de Soportes de Pago de Seguridad Social y Pagos FIC

Fecha de la Reunión: AÑO	MES	DÍA	Hora de inicio	Hora de finalización
2023	05	25	03:00 pm	03:45 pm.

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Frente de Obra

ASISTENTES

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Luis Dario Cantiva Garzón	Residente de Obra	Consorcio Macro Nororiental
2	Henry Daniel Oros Pinto	Profesional Ambiental	Consorcio Macro Nororiental
3	Yerly Chaparro Lopez	Residente Interventoría	Consorcio Inter Nororiental
4	Javier Vergara Mariño	Director Interventoría	Consorcio Inter Nororiental
5			
6			
7			
8			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reiterar la solicitud hecha mediante oficio del 10 de mayo de 2023, respecto a la necesidad de presentar los soportes de pago de la seguridad social del mes de abril.

Verificar avances de obra.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El director de la interventoría agradece a los presentes la asistencia a la reunión y anuncia que el motivo de la misma obedece a la reiteración de la Solicitud hecha mediante oficio del día 10 de mayo de 2023 en cuanto a la necesidad de presentar los soportes de pago de la seguridad social y el pago FIC correspondiente al mes de Abril de 2023. En este sentido, se le reitera al contratista de obra la entrega de tales documentos, teniendo en cuenta que, una vez revisada la documentación del informe mensual No.4 no se encontraron tales certificados y como es de conocimiento de los presentes, esta es una obligación contractual.

Por su parte, el personal de obra interviene diciendo que se encuentran adelantando las gestiones internas para el cumplimiento de dichos compromisos y en este orden de ideas, consideran que para la semana siguiente se puede hacer entrega de los soportes requeridos y los del periodo en curso, los cuales se harán llegar con el informe mensual de mayo.

El residente de la interventoría trae a colación el oficio emitido por Acuatodos de manera errónea frente a unas posibles afectaciones en el Hotel Villa Isa y aprovecha para reiterar la necesidad de tomar precauciones a la hora de intervenir las zonas cercanas a viviendas y estructuras construidas.

Finalmente, habiendo quedado establecido el compromiso por parte del Consorcio Macro Noronental de allegar los soportes de pago de la seguridad social y FIC del mes de abril y Mayo como anexos al informe mensual No.5, el cual corresponde al presente periodo de ejecución, se da por terminada la reunión.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre: Luis Dano Gantiva Garzón	Nombre: YERLY CHAPARRO LOPEZ
Cargo: Residente de Obra	Cargo: Yerly Chaparro López, Residente de Interventoría
Nombre: JAVIER VERGARA	Nombre: Henry Daniel O.
Cargo: Javier Vergara Muñoz, Director de Interventoría	Cargo: Henry Daniel Orot Pinto, Profesional Apoyo
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
