ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Tipo de Contrato: OBRA [X]	INTERVENTORÍA ☐
Informe Número: 6	Periodo comprendido entre el (03/12/2023) hasta el (06/12/2023)

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4151.010.26.1.0810 DE 2022	
Nombre Completo del Contratista: HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ	
Documento de identificación del contratista: 10.548.685	
Nombre (s) del Supervisor (es): FERNANDO PAZ MERA	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 10.19%	*Obra Física Ejecutada Acumulada:* 99.99%
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO VIAL EN LOS BARRIOS TERRON COLORADO Y AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI 26003967	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
8 de Julio de 2022	31 de Diciembre de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato: Modificación No 1: se Cede el contrato de CISA ENGINEERING EXTREME S.A.S a Harold Alberto Muñoz Muñoz de fecha 29 de agosto del 2022 Modificación No 2: Prorrogar el contrato del 8 de octubre de 2022 Modificación No 3: adición del 4 de noviembre de 2022 Modificación No 4: Suspensión del 23 de diciembre de 2022 Modificación No 5 Reanudación y Prorroga del 25 de enero de 2023 Modificación No 6 Prorrogar el contrato del 28 de marzo de 2023 Modificación No. 7 Prorrogar el contrato hasta el 30 de junio de 2023 Modificación No. 8 Prorrogar el contrato hasta el 30 de julio de 2023 Modificación No. 10 Prorrogar el contrato hasta el 13 de octubre de 2023 Modificación No. 11 Prorrogar el contrato hasta el 15 de noviembre de 2023 Modificación No. 12 Prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 Modificación No. 13 Aclaración u otra modificación del contrato
Suspensión No 1: Desde el 26 de diciembre de 2022 hasta el 25 de enero de 2023, en 31 días calendario Suspensión No 2 desde el 31 de julio hasta el 15 de agosto de 2023 15 días calendario
Reanudación: Reanudación No 1: Reanudar la ejecución del contrato desde el 26 de enero de 2023 Reanudación No 2: Reanudar la ejecución del contrato desde el 15 de agosto de 2023
Cesión:
Terminación anticipada:
Acta de recibo final de obra:
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($819.947.310,00)
Adición Por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($37,742. 637.00)
Prórroga No 1: prorrogar el contrato de ejecución en 85 días calendarios desde el (8) ocho de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Prórroga No 2: prorrogar el contrato de ejecución en 60 días calendarios desde el (ocho de febrero hasta el 1 de abril de 2023
Prorroga No 3. prorrogar el contrato de ejecución en 45 días calendarios desde el (1 de abril hasta el 15 de mayo de 2023)
Prorroga No 4. prorrogar el contrato de ejecución en 45 días calendarios desde el (16 de mayo hasta el 29 de junio de 2023)
Prorroga No 5. prorrogar el contrato de ejecución en 30 días calendarios desde el (30 de junio hasta el 30 de julio de 2023)
Prorroga No 6. prorrogar el contrato de ejecución en sesenta (60) días calendario desde quince (15) de agosto de 2023 hasta trece (13) de octubre de 2023.
Prorroga No 7. prorrogar el contrato de ejecución en treinta (30) días calendario desde el dieciséis (16) de octubre de 2023 hasta el quince (15) de noviembre de 2023
Prorroga No 8. prorrogar el contrato de ejecución en cuarenta y seis (46) días calendario desde (16) de noviembre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo a pendiente por cancelar
$ 857.689.947. oo	$ 51.284264, oo	$ 763.318.508. oo	$43.087.175. oo

OBSERVACION : SE REALIZA RETEGARANTIA DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR DE CUARENTA Y DOS MILLOONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (42.834.587.oo)

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 7 de diciembre de 2023
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA NATURAL N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: 9458937990
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 278236309
Operador: aportes en línea
Fecha de Pago: 2023-11-15
Periodo de pago: NOVIEMBRE DE 2023

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 20 OESTE Y 21 OESTE – AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 22 OESTE Y 25 OESTE – BARRIO TERRON = total avance del Frente: 100%

Actividades preliminares: localización y replanteo
Demoliciones: demolición de carpeta, demolición de losa, corte.
Movimientos de tierras y transporte: excavación a máquina, retiro de material.
Rellenos y bases: escarificación, conformación, base, roca muerta, geotextil.
Pavimento asfaltico: emulsión y carpeta asfáltica.

AVENIDA 4 1BIS OESTE ENTRE LA AVENIDA 4 OESTE HASTA LA PLACA 7-186 – BARRIO AGUACATAL = total avance del Frente: 100%

Actividades preliminares: localización y replanteo
Demoliciones: demolición de carpeta, demolición de losa, corte.
Movimientos de tierras y transporte: excavación a máquina, retiro de material.
Rellenos y bases: escarificación, conformación, base, roca muerta, geotextil.
Pavimento asfaltico: emulsión y carpeta asfáltica

AVENIDA 7 OESTE ENTRE LAS PLACAS 23B-02 Y 23B 114 BARRIO TERRON COLORADO = total avance del Frente: 99.5%

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Actividades preliminares: localización y replanteo
Demoliciones: demolición de carpeta, demolición de losa, corte.
Movimientos de tierras y transporte: excavación a máquina, retiro de material.
Rellenos y bases: escarificación, conformación, base, roca muerta, geotextil.
Pavimento asfaltico: emulsión y carpeta asfáltica

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

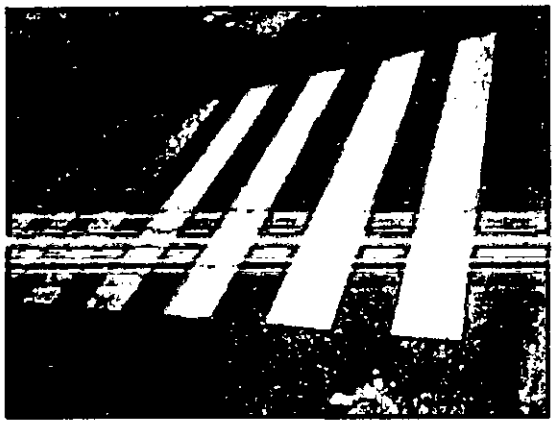


Foto No. 1	Descripción: Demarcación y señalización vial


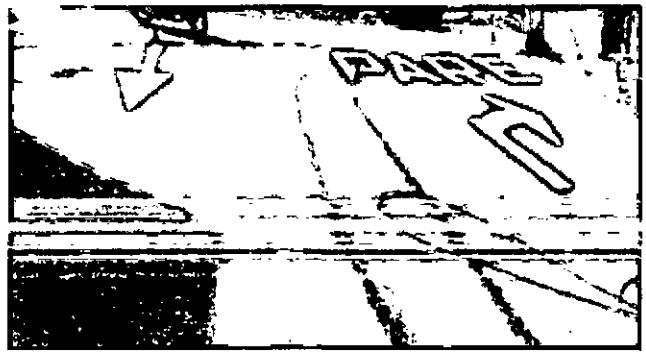


Foto No. 2	Descripción: Demarcación y señalización vial



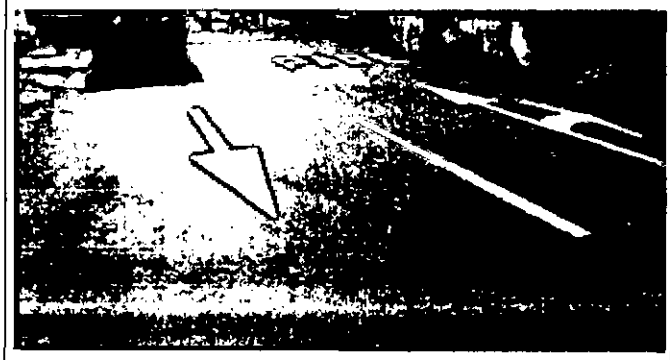

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Foto No. 3	Descripción: Demarcación y señalización vial	Foto No. 4	Descripción: Demarcación y señallzación vial

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, las obras o interventoría con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Supervisor
FERNANDO PAZ MERA

Carlos Alberto Perlaza Ochoa
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 07 de diciembre de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
