XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUEXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuexua.	HORA DE INICIO: 7:27 am.
FECHA: 27 de enero de 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoría	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Seguimiento del cto obra.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Revisión del acta anterior.
2.	Verificacion de los compromisos del acta anterior.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité Técnico a las 7:27 am, con la entrega de los compromisos del acta anterior haciendo entrega del diseño de muro de la via cll 55 con Cra 26G, entrega de Presupuestos de las vias entregadas. esta información es entregada a la interventoria. para su validacion.

El contratista de obra informa que el día de ayer 26 de enero realizó entrega de un oficio donde solicita el recibido de las vías que tiene listas en subbase para instalación de adoquin.


El contratista informa que los sistemas constructivos presentados serán en placa huella a las vias entregadas en diciembre y enero, ya que para él esa es la solución técnica de las vias de concreto.


El muro de la cra 50 entre cllr 32 este y Cra 31 se realizara Finalizando el contrato teniendo en cuenta que las lluvias desestabilizan el terreno.


el Secretario de Infraestructura Jhon Mono solicita a epuexua realizar un cronograma en compañia con la Secretaria de Infraestructura. para el control de instalación de pisos de adoquin de la comunidad.

la via de ciudadela Sacre no se realizara en este contrato ya que debe contener obras hidraulicas.

Se determina que el diseño tipo será en cintas de 60 cms de concreto, cintas de confinamiento cada 5 mts, y se hara nostra en vías de mas de 12 % de pendiente., con cunetas laterales de 30 cms. asi:

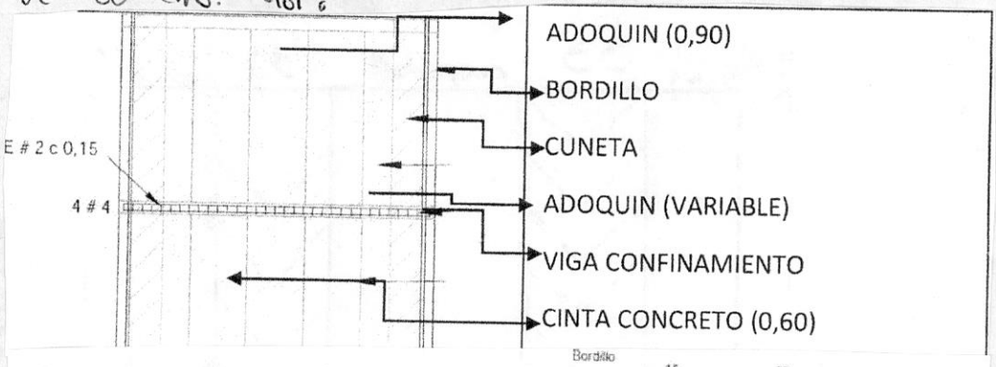

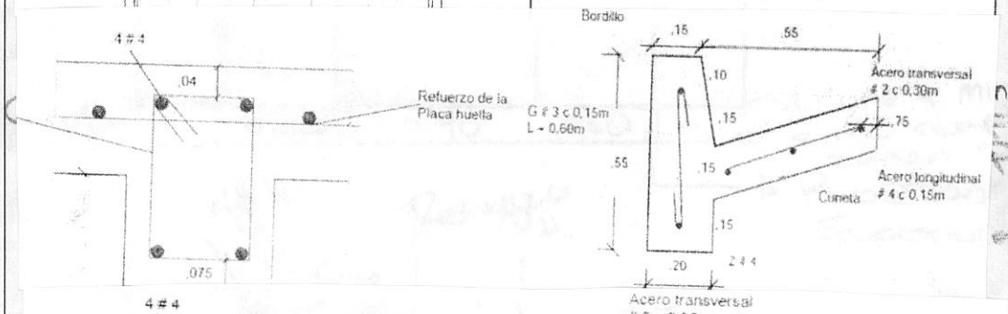

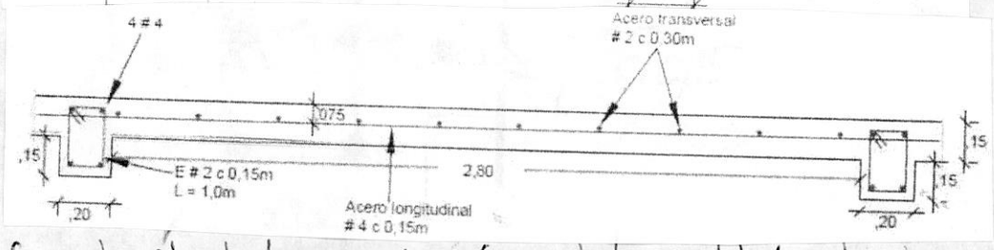

nimo 0,30
ramiento
placas
ccu Pendientes
es 12%

Se da claridad que la comunidad instalaría el adoquin en estas vias con este nuevo diseño. Adoquin que es entregado a la comunidad por epuxua.

El día 28 de enero se realizara recorrido a las 7:00 am para hacer entrega de las placa huellas que estan finalizadas a la fecha en los barrios luis carlos Galan II y Villas de casa loma.

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUEXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	**RESPONSABLE:**	**FECHA:**

ANEXOS	
1.	
2.	

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Alejandro Yate	Director Epuexpato	312-842 1576	
Nelson Rincon	Contratista	3102938197	
Leonardo Quiroz V.	Contratista.	3212759255	
EDGAR E. URIBE C.	INTERVENTORIA COCOSERING	3108032525	
Milton S. Rivera R.	Contratista	315-346-76-36	
Sibella Cespedes	Cocosering	3134699929	
Javier Arevalos	Cocosering SAS	3105209036	
Juan Pablo Cano	Epuexua	3124821154	
Luis Mauricio	Alcalde Soacha	3203431318	

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUEXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
