NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

CONTRATISTA: ELECTROALARMAS ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍAS S.AS. R/I LUIS FERNANDO PÉREZ ROLÓN **SUPERVISOR**: JUAN JOSÉ COLMENARES NÚÑEZ - SECRETARIA DE PLANEACION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PERIODO REPORTE: Del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023 **No. CONTRATO:** PC-MT-MC-044-2023 **FECHA INICIACIÓN**: (05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)
FECHA DE TERMINACIÓN: (04 DE OCTUBRE DE 2023).

No. De INFORMES A PRESENTAR: UNO (01) **No. DEL PRESENTE INFORME** UNO (01)

OBJETO: SERVICIO DE DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, SIRENA DE ALTA POTENCIA Y CONTROL DE HORARIO Y ASISTENCIA PARA LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PLAZO ADICIONADO: N/A **VALOR ADICIONADO:** N/A **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA**: N/A **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** N/A

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
1. SERVICIO DE DISEÑO DEL CIRCUITO	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista realizo el respectivo diseño del circuito atendiendo las necesidades presentes	X			TÉCNICAMENTE: Se reviso el informe presentado por el contratista y se verificó que se cumplió, suministro, instalo y ejecuto en su totalidad las tareas de las metas relacionadas con el cumplimiento del contrato durante las fechas establecidas.
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DVR DE 16 CANALES, 4 EN 1 AI 16CH GRABACIÓN HASTA 5M-N@10FPS MÁS 8 CH IP MAX 6MP H.265+ 2 SATA HASTA 10TB 1P HDMI	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el contratista suministro e instalo el respectivo equipo DVR de 16 canales, con las especificaciones y calidad requerida,	X			
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO 4 TERAS PURPLE	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 2 discos duros de 4 teras purple con las especificaciones y calidad requerida	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS TIPO BALA PLÁSTICA LENTE 2,8MM FOV 103° DWDR IR 20M IP67	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 6 camaras tipo bala plásticas con las especificaciones y calidad requerida	X			ADMINISTRATIVAMENTE: Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, mediante el cual, se evidencia el cumplimiento total con las obligaciones pactadas en el objeto contractual con lo cual se aprueba el pago correspondiente al avance total presentado por el contratista. FINANCIERA: La supervisión verifico que la entidad cuenta con la debida apropiación de recursos para pagar el costo de las labores ejecutadas y que permite el pago correspondiente al acta final uno 01, el cual se encuentra soportado con el registro presupuestal No 2023000708 JURÍDICA: Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones, así como también, las pólizas se encuentran vigentes aprobadas y actualizadas.
5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP BALA SEMIMETÁLICA FULL COLOR 2MP@30FPS LENTE 2.8MM FOV 110° DWDR LED 10M H.265+ POE IP67	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 1 camara tipo bala semimetálica cumpliendo con las especificaciones y calidad requerida	X			
6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS TIPO BALA STARLIGHT-CÁMARA 4 EN 1 1/2.8"3,6MM FOV 89,5° WDR 120DB CON MIC	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 9 camaras tipo bala starlight con las especificaciones y calidad requerida	X			
7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES 12V- 4A	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 17 adaptadores según diseño y necesidad segun especificaciones y calidad requerida	X			
8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOS BALUN HD	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 16 puntos de videos balun hd según las especificaciones del diseño y calidad requerida	X			
9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS INTERACTIVA 3000VA, 6 SALIDAS REGULADAS, ARRANQUE EN FRIO, ONDA CUADRADA, MODIFICADA, AVR AUTOMÁTICO, PUERTO RS232+CD SOFTWARE, TRANSFERENCIA 4 MS A 8 MS, INDICADORES LED MULTICOLOR,	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 6 camaras tipo bala plásticas con las especificaciones y calidad requerida	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

CHASIS METÁLICO Y FRENTE EN ABS (NO INFLAMABLE)					
10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE L	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 1 gabinete según especificaciones de diseño y calidad requerida	X			
11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DE ALTA POTENCIA-HD 4 TIPO INDUSTRIAL	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 1 sirena de alta potencia cumpliendo con especificaciones bomberiles y calidad requerida	X			
12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO T&A FUNCIONES DE ACCESO VISIBLE LIGHT 100 ROSTROS 500 HUELLAS 500 TARJETAS ID 125KHZADMS	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista contratista suministro e instalo 1 dispositivo T&A con funciones de acceso visible ligth 100 rostros 500 huellas, 500 tarjetas Id cumpliendo con especificaciones de diseño y calidad requerida	X			
13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR 40"	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 1 monitor de 40 pulgadas con las especificaciones y calidad requerida	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".


14. SOPORTE PARA MONITOR DE 40"	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo 1 soporte para monitor de 40 pulgadas que concordara con el item anterior cumpliendo con especificaciones y calidad requerida	X			
15. CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista suministro e instalo cables y accesorios eléctricos para que todos quedara en respectivo funcionamiento según diseño, especificaciones y calidad requerida	X			
16. PUNTO DE INSTALACIÓN CÁMARAS	Se constato que, durante el periodo del 05 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023, el Contratista instalo 20 puntos de cámaras según diseño, necesidades, especificaciones y calidad requerida	X			

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

JUAN JOSE COLMENARES NÚÑEZ
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".



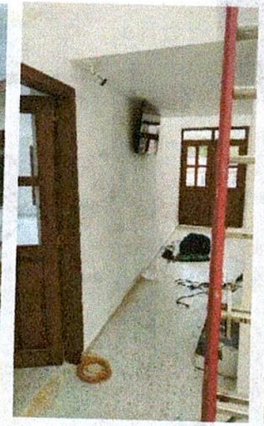



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".
