



ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

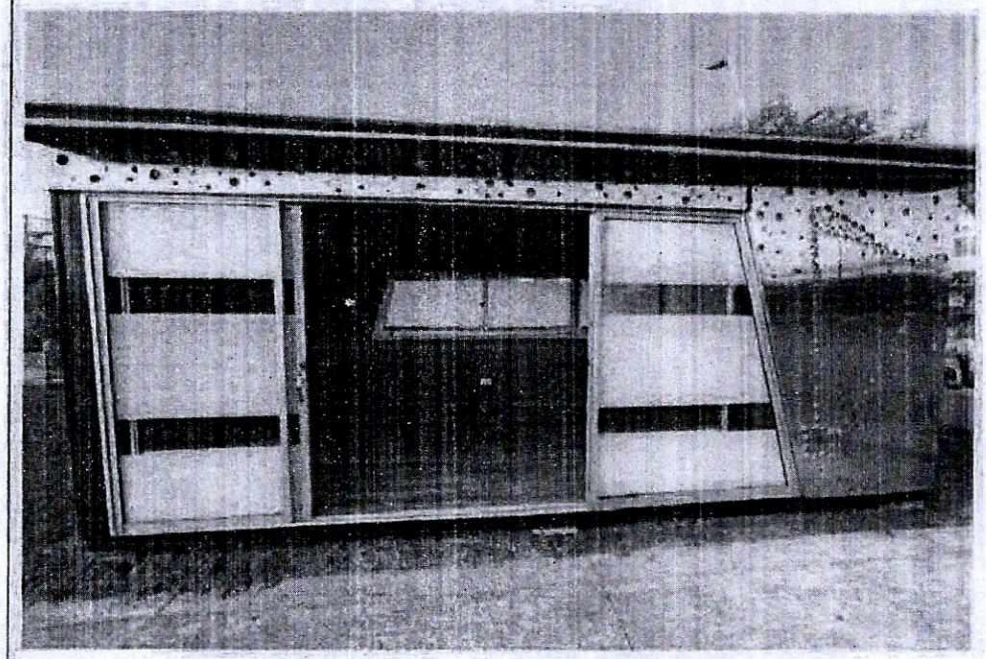

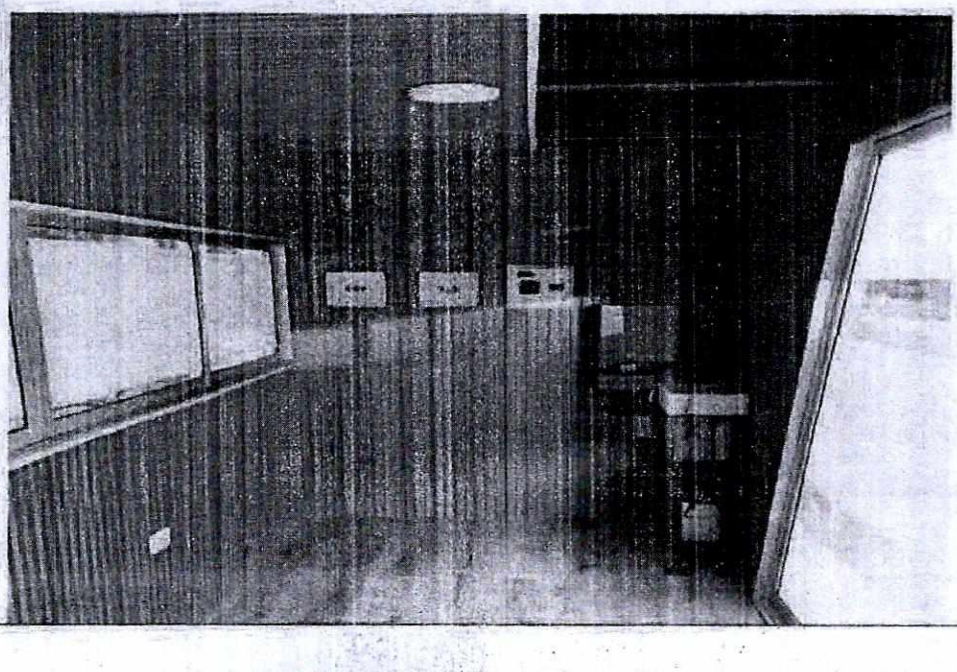


	INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

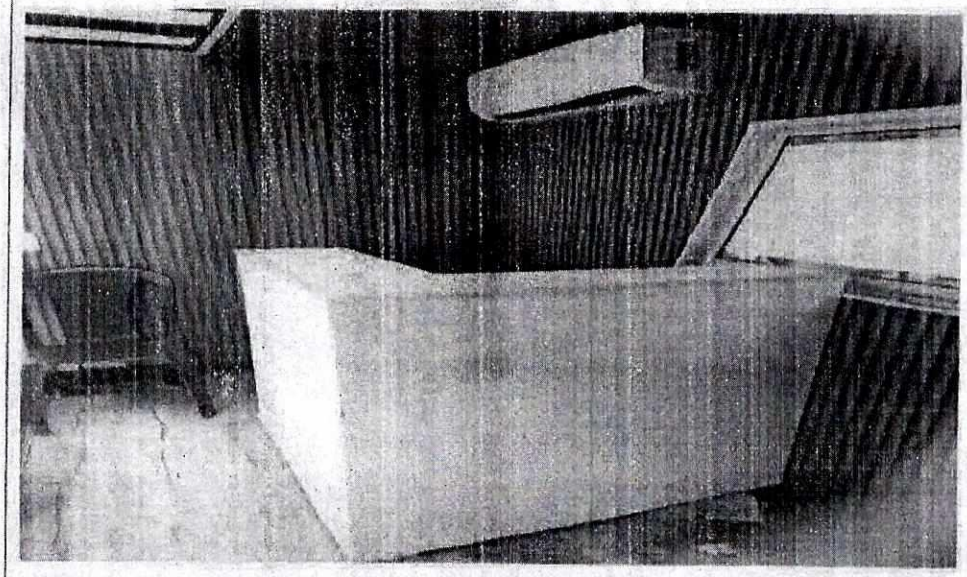

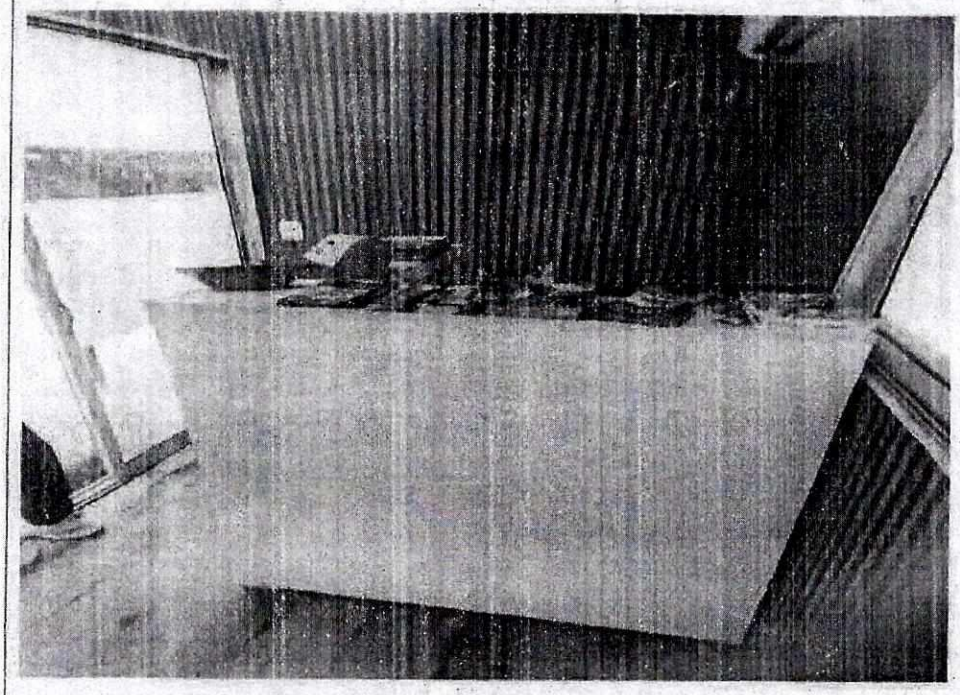

	INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

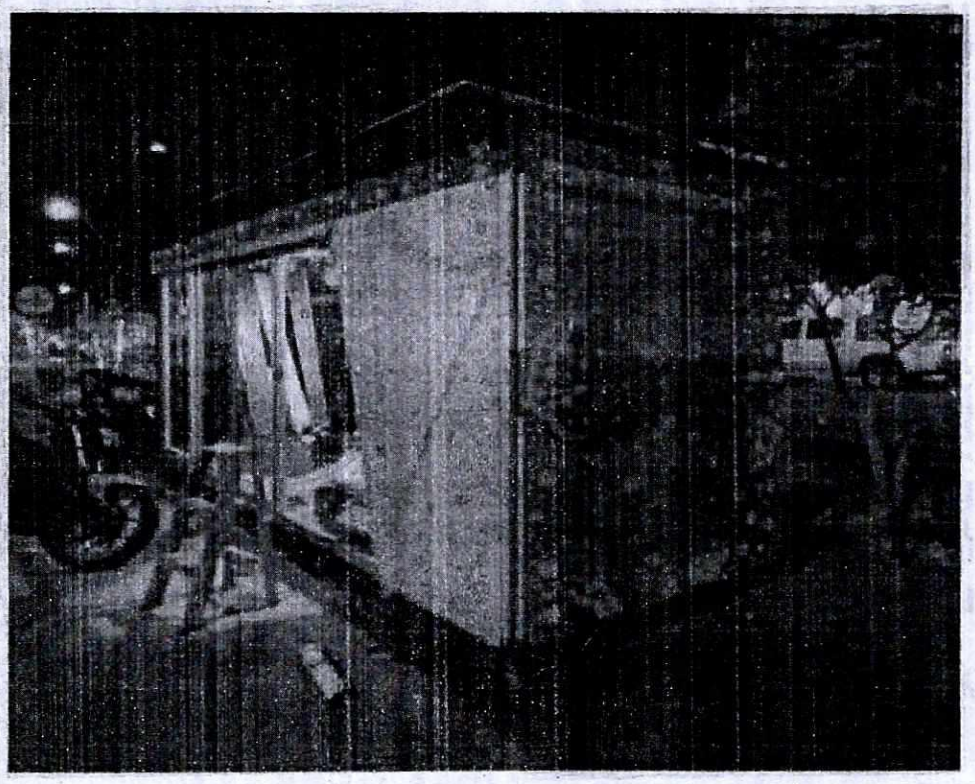

- **OBSERVACIONES:** Con la construcción e instalación de estos dos (02) módulos, se implementarán puntos turísticos autosuficientes que no le generen costos de sostenimiento y funcionamiento al municipio de puerto López, y aportan al crecimiento de la económica por fines turísticos. En estos puntos de información, es ofrecerle a los visitantes y turistas una guía de los lugares emblemáticos y actividades que pueden realizar en el municipio de puerto López Meta.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Código: F – 095
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

INVERSION ANTICIPO
DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
01	ACTA DE INICIO	30/11/2022	$ 193,313,433.26	Cumplido con las obligaciones se suscribe Acta de inicio
02	ACTA PARCIAL N° 01	21/12/2022	$ 116.201.734,12	Se cuantifica actividades ejecutadas al corte y se realiza el primer pago parcial
03	ACTA PRORROGA N° 01	28/12/2022	N/A	Teniendo en cuenta que la fecha prevista de terminación no se tiene cumplido el 100% de las actividades contratas por problemas en suministro de materiales , se solicita a la entidad una prorroga por termino de veinte (20) días
04	ACTA PARCIAL N° 02	14/04/2023	$57.509.956,63	Se cuantifica actividades ejecutadas al corte y se realiza el segundo pago parcial
05	ACTA DE TERMINACION	18/01/2023	$ 193,313,433.26	En común acuerdo se suscribe recibo final
06	PRESENTE ACTA	18/12/2023	$ 19.601.742,51	Cumpliendo con el objeto contractual, se viabiliza y aprueba el pago final
07	ACTA DE LIQUIDACION	18/12/2023	$ 193,313,433.26	Cumpliendo con el objeto contractual, se viabiliza y aprueba el Acta de Liquidación de obra

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Código: F – 095
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

CONTROL AFILIACION PARAFISCAL.

NUMERO DE PLANILLA:			94359866555					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
RODRIGO VALENCIA CHAVEZ	DIRECTOR DE OBRA	17344951	NUEVA EPS	$625.000	COLFONDOS	$850.000	SURA	$12.0000
HECTOR ALFREDO FORERO	RESIDENTE DE OBRA	17306451	SANITAS	$150.000	PENSIONADO	NA	SURA	$83.600

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NUMERO DE PLANILLA			9444268271- 9444440342					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
RODRIGO VALENCIA CHAVEZ	DIRECTOR DE OBRA	17344951	NUEVA EPS	$625.000	COLFONDOS	$850.000	SURA	$12.0000
HECTOR ALFREDO FORERO	RESIDENTE DE OBRA	17306451	SANITAS	$150.000	PENSIONADO	NA	SURA	$83.600

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

PERIODO: 01 DE ENERO DE 2023 A 18 DE ENERO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA			9448640364-9448640740						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**CARGO Y/O OFICIO**	**C.C**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**RIESGOS PROFESIONALES**		**VALOR TOTAL**
RODRIGO VALENCIA CHAVEZ	DIRECTOR DE OBRA	1 7 3 4 4 9 5 1	NUEVA EPS	$625.000	COLFONDOS	$850.000	SURA	$12.000	RODRIGO VALENCIA CHAVEZ
HECTOR ALFREDO FORERO	RESIDENTE DE OBRA	17306451	SANITAS	$150.000	PENSIONADO	NA	SURA	$83.600	HECTOR ALFREDO FORERO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De manera conjunta con el contratista, se realizó la verificación , cuantificación de las actividades contratadas y ejecutadas conforme lo establecido por las partes. Constancia de lo expuesto es el Acta de Recibo Final suscrita y aprobada de manera conjunta por los intervinientes.

- El objeto del contrato de Obra Nº 100-103-13-09-0010-2022 cuyo objeto fue relacionado anteriormente se cumplió a satisfacción de la entidad contratante dentro de los términos tiempo y rubro establecido por las partes.

- Actuando en mi calidad de supervisor asignado se informa que el avance físico del contrato de obra del 100%, conforme lo mencionada y detallado en el presente informe , donde se menciona el proceso de ejecución de las

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

actividades contratadas .Dando como resultado la entrega al Municipio de Puerto López -Meta de dos (02) Puntos de Información Turística (PITS)

- Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los 01 DIC 2023

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR

YACON INGENIERIA SAS
NIT/901.368.672-8
R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE

CONTRATISTA

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA**	**Código: F – 256** Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

Fecha de Presentación: _____

LICITACIÓN PUBLICA N°	
OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"
OBJETO PROYECTO:	NA
CONTRATISTA:	YACON INGENIERÍA SAS NIT. 901.368.672-8 YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ C.C. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	NA
INTERVENTORÍA:	NA
SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ERIKA YESENIA NARVÁEZ GUTIÉRREZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	100-103-13-10-00244-2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1	**PITS**		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**		
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	18,00
1.2	**DESCAPOTES**		
1.2.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	18,00
1.3	**EXCAVACIONES**		
1.3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0-2.00M INCLUYE	M3	3,77
1.4	**CONCRETOS**		

1.4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	M3	0,58
1.4.2	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI- 20.7 MPA PIEDRA PORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	1,52
1.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A588 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	0,51
1.5	**ACEROS**		
1.5.1	CORREA PERFIL RECTPHR NEGRO 100x38x1.2 MM CALIBRE 18	ML	171,00
1.5.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A588 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	243,63
1.6	**PISOS**		
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR 1/8" TABLERO PUENTE PEATONAL	M2	17,00
1.6.2	PISO MODERNO COLOR HAYA NATURAL 8MM LAMINADO	M2	17,00
1.6.3	BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)	M2	17,00
1.7	**MUROS**		
1.7.1	LAMINA MICROPERFORADA 2MM EN ACERO INOXIDABLE	M2	12,30
1.7.2	LAMINA HR 2MM PINTURA ELECTROSTATICA NEGRO MATE	M2	20,04
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS	M2	15,20
1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE, PISAVIDRIOS PRES	M2	5,60
1.7.5	LISTON MADERA ZAPÁN 0.10 X 0.05 M	ML	69,80
1.7.6	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA. E=011 M. CAL 8 MM. INCLUYE PINTURA	M2	3,52
1.8	**AIRE**		
1.8.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ON-OFF DE 12000 BTU 220V INCLUYE UNIDAD INTERIOR. UNIDAD EXTERIOR Y	UND	1,00


	KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
1.9	**CUBIERTA**		
1.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	21,00
1.9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MADERA ROLLIZA D=0.12 M INMUNIZADA	ML	150,00
1.9.3	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE PERGOLA SOPORTE DE CUBIERTA	ML	21,00
1.9.4	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ANCHO DE 200 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,00
1.9.5	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ANTICORROSIVO D=0.6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,00
2	**PANER SOLAR**		
2.1	SISTEMA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	GGLB	2,00
2.1.2	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00
2.1.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00
2.1.4	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00
2.1.5	SALIDA TV PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00
2.1.6	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00
2.1.7	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14). L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3,00

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA**	**Código: F – 256** Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Condiciones actuales de las actividades desarrolladas.

PUNTO DE INFORMACION N°01 CLL 5 # 11-93 PUERTO LOPEZ -META

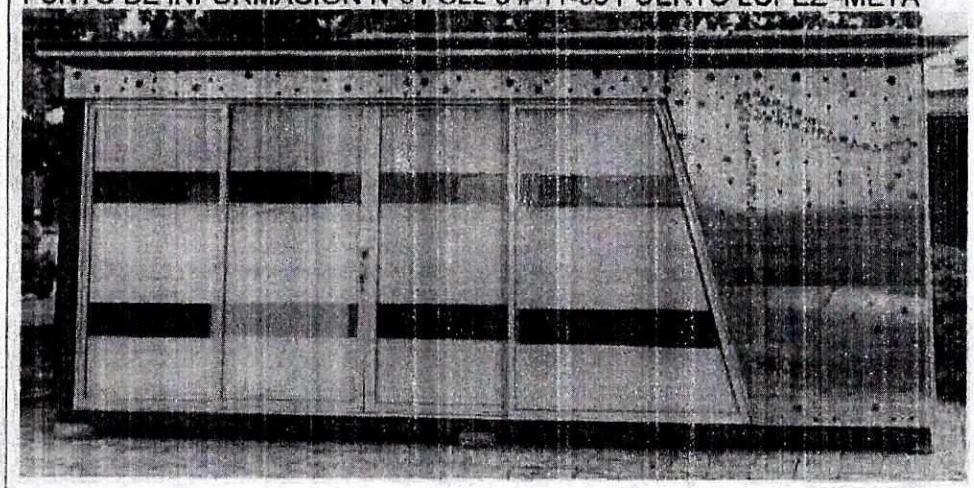



PUNTO DE INFORMACION N°02 AV. 14 #16-209ª 16-181 PUERTO LOPEZ -META

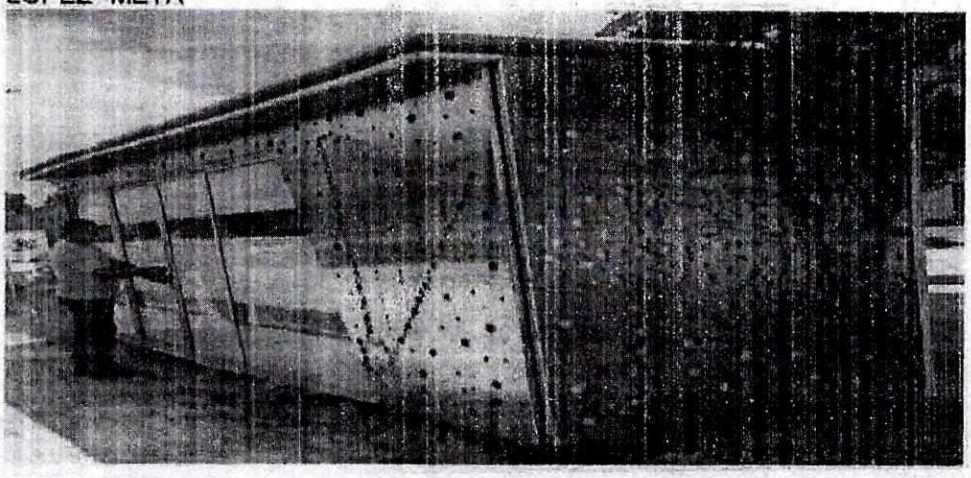


ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA**	**Código: F – 256** Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PUNTO DE INFORMACION N° 01 : CLL 5 # 11-93 A 11-3

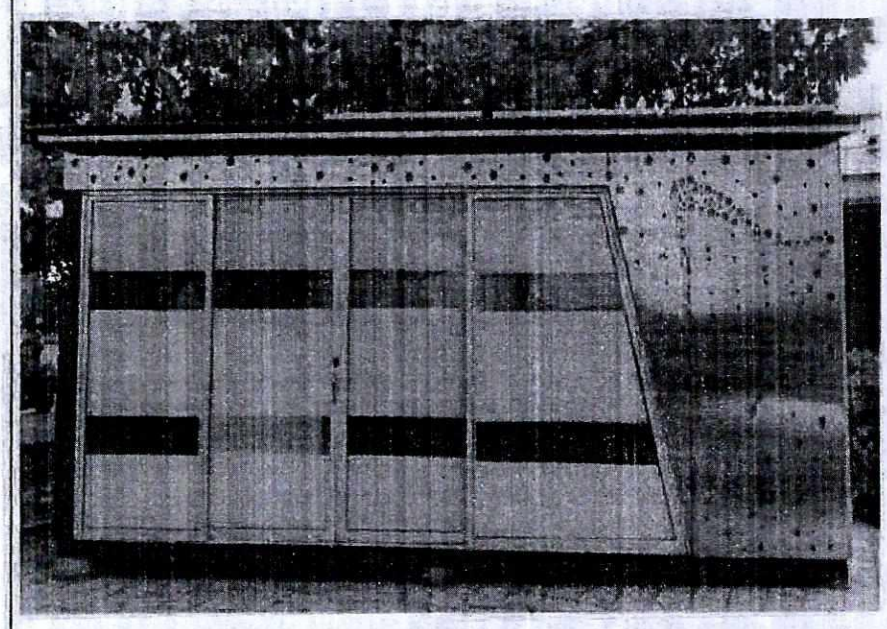


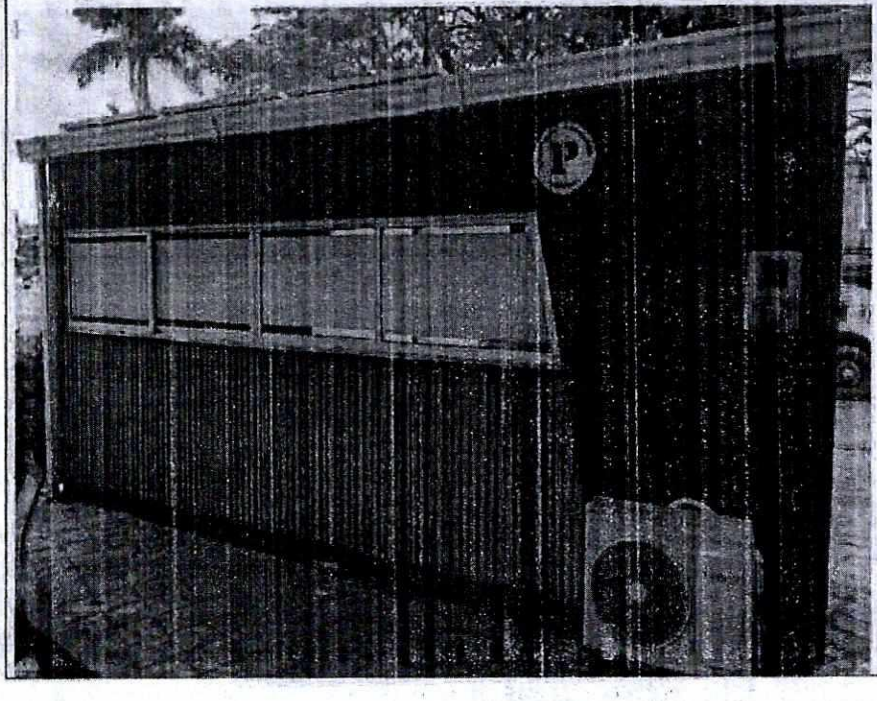


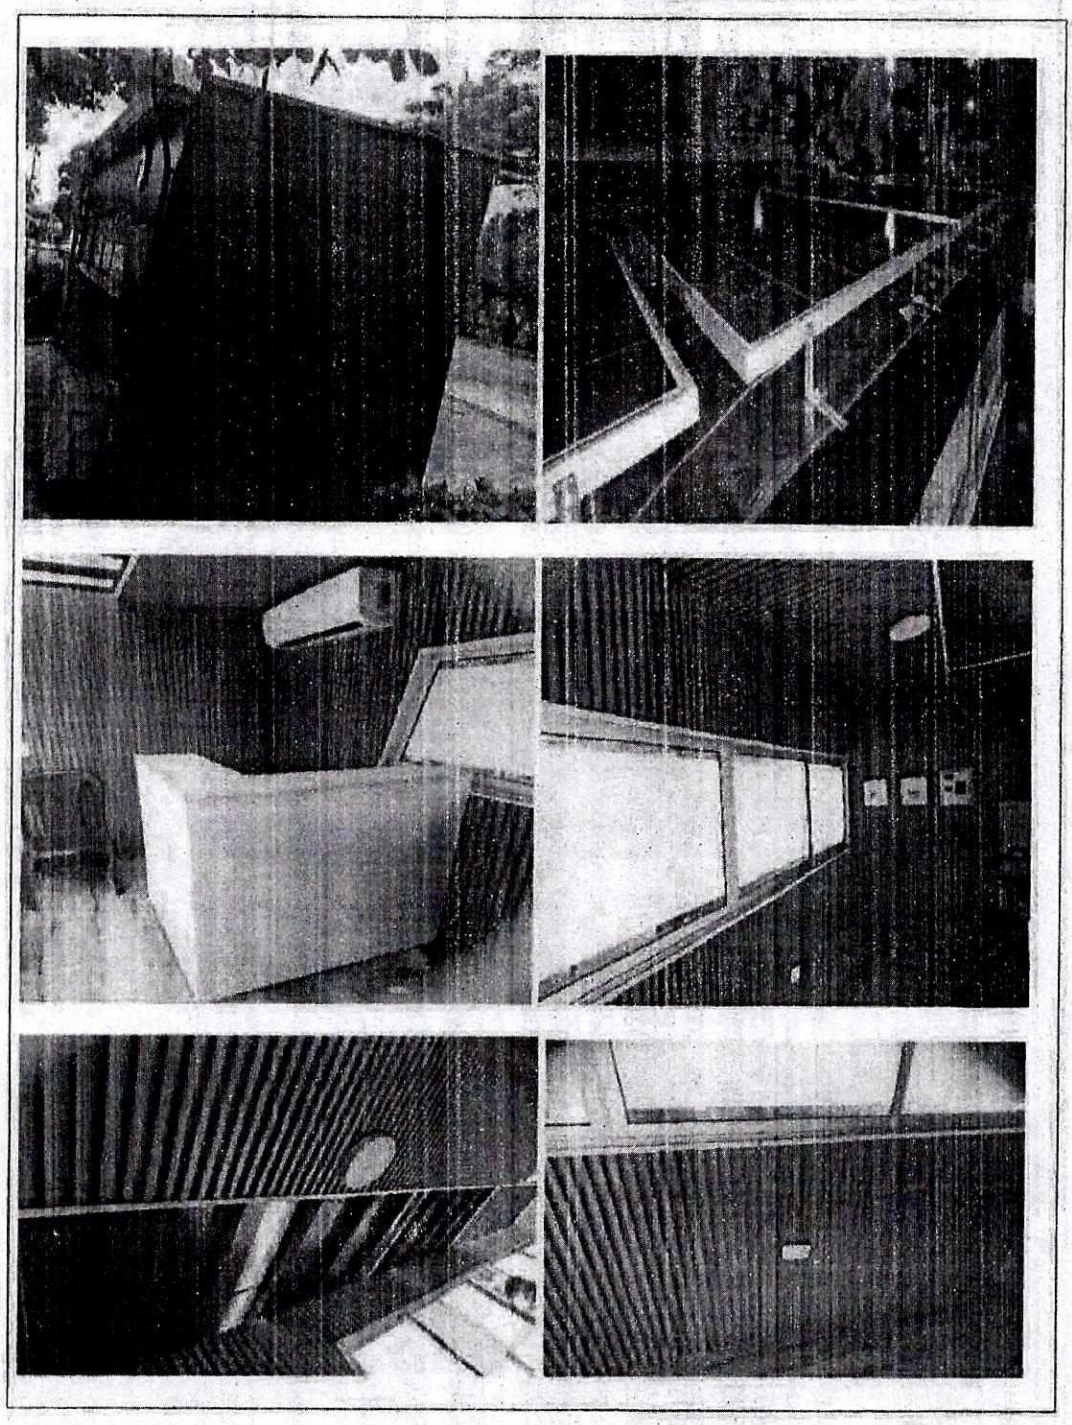


	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA	Código: F – 256
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PUNTO DE INFORMACION Nº 02 : AV. 14 # 16- 209 A 16- 181

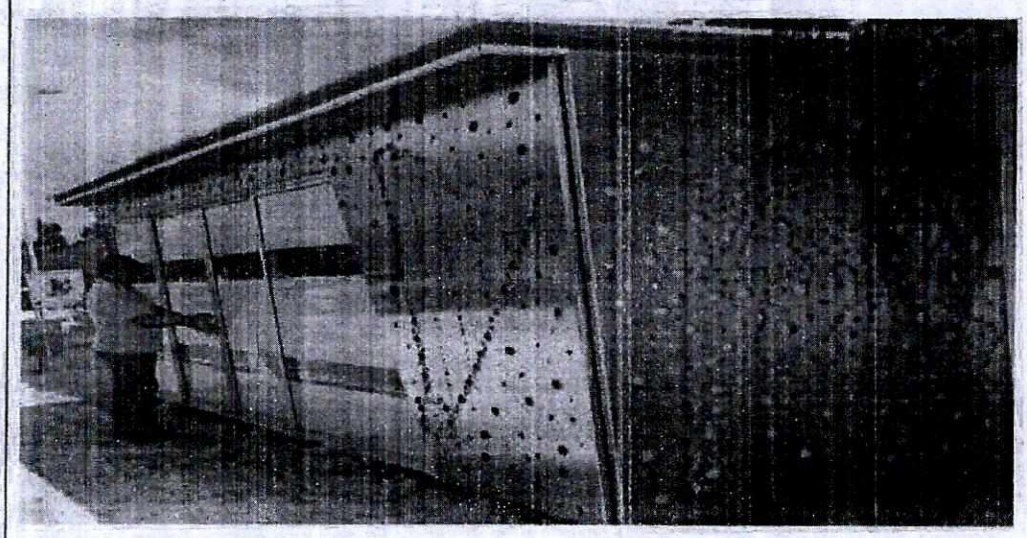

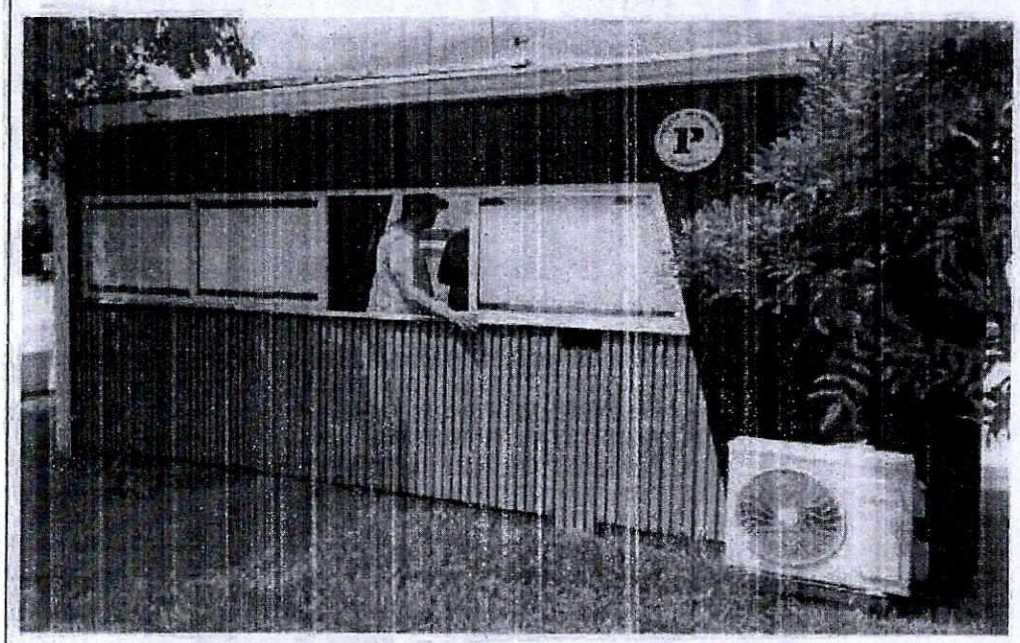

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA	Código: F – 256
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

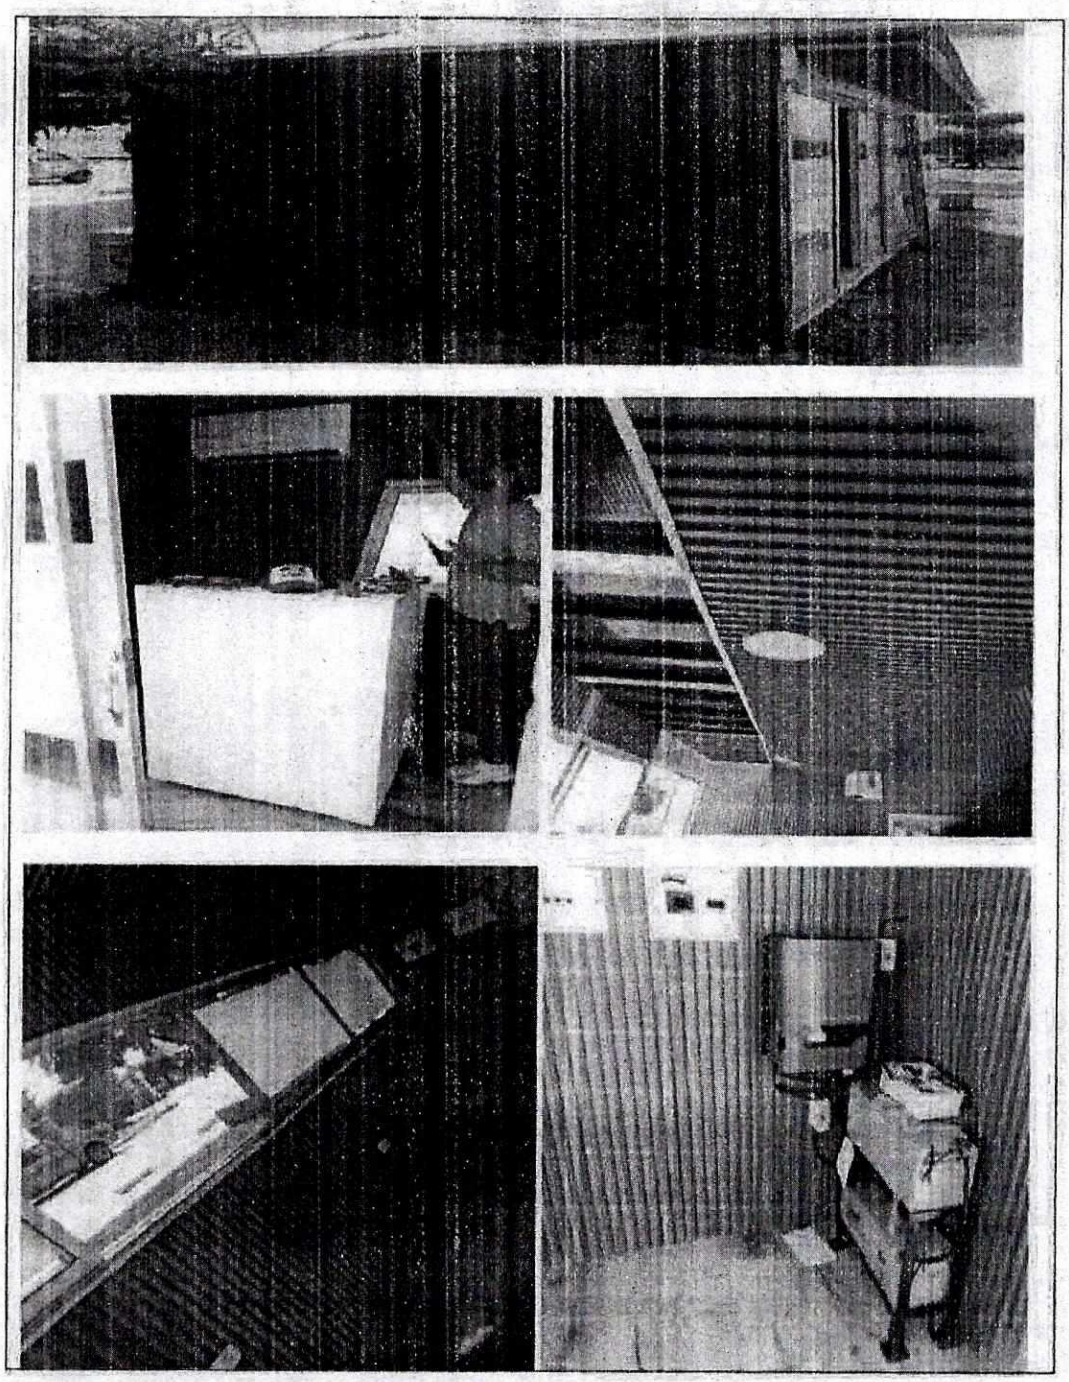

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO Y OPERACIÓN

- Los Puntos de Información (PITS), son casetas modulares hechas con estructuras metálicas, moduladas previamente en un taller, estos puntos de información, cuentan con un recubrimiento en lamina microperforada con diseños enfocados en la cultura llanera, acabados de muros en material Wood Plastic Composite (WPC) madera nogal, cubierta en lamina policarbonato y pisos en madera laminada, dotados con paneles solares para auto abastecimiento de energía solar, con unos ventanales en vidrio templado de seguridad con marcos en aluminio y en su interior dotado con un aire acondicionado de capacidad de 12000 BTU. Con la construcción e instalación de estos módulos, se implementaran puntos turísticos autosuficientes que no le generen costos de sostenimiento y funcionamiento al municipio de puerto López, y aportan al crecimiento de la económica por fines turísticos.

- Estos puntos de información, fueron construidos para ofrecerle a los visitantes y turistas una guía de los lugares emblemáticos y actividades que pueden realizar en el municipio de puerto López Meta, por lo que se recomienda dar el uso adecuado y utilizar para otro fin.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO

ACEROS

El acero ASTM A588 Grado A resistente a la corrosión es un acero resistente a la intemperie que podría denominarse con mayor precisión como un "Acero resistente a la corrosión atmosférica", Este material forma su propia capa protectora cuando se expone a elementos atmosféricos. Esencialmente, la capa superior corroe y protege el acero debajo de ella. El acabado natural normalmente no requiere ningún tipo de mantenimiento, como pintura, lo que hace que el material sea una alternativa altamente rentable a otros aceros estructurales.

PISOS

Para la limpieza del piso laminado instalado en los Puntos de Información (PITS) se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Es importante y necesario realizar la limpieza diaria , preferiblemente con una escoba de cerdas suaves y un trapero levemente humedecido. Deja secar completamente el piso entre pasada y pasada. Nunca uses detergentes en polvo o industriales, productos abrasivos o con virutas de plástico o metal, ya que pueden rayar tu piso durante el restregado

- Los pisos laminados con una mayor resistencia al agua y a los derramamientos de líquidos, e incluso te ofrece mayor tiempo para retirarlos. Sin embargo, lo ideal es secarlos en cuanto sea posible. En ese caso limpia las manchas de pisadas y de sustancias como el café o jugo frotando con un trapo humedecido en agua caliente. No utilices ACPM, barsol, thinner, ni limpiadores a base de hipoclorito de sodio (límpido, lejía, entre otros).

- Jamás pulir, ni lijar la superficie de los pisos laminados, ya que al hacerlo se retira su capa superficial y eso provoca daños irreparables en el acabado. Levanta los muebles y electrodomésticos cada vez que debas moverlos para evitar el rayado de la cara vista del producto.

- Contrario a lo que hayas escuchado, no uses ceras para el mantenimiento de los pisos de madera laminada, pues estas opacan el brillo natural de las piezas y permiten que la humedad se aloje en los acoples o juntas.

- Recubrir el extremo de las patas de las sillas, mesas, electrodomésticos, lámparas y demás elementos del mobiliario con protectores plásticos, para impedir que rayen el piso con el movimiento diario.

MUROS

Para el mantenimiento y preservación de la puerta acceso vidrio templado 10 mm y ventana aluminio instaladas en los Puntos de Información (PITS), se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Tener precaución ante choque de alto impacto a los vidrios, sin embargo des de resaltar que el vidrio templado (FT), cuando se rompe, se fractura en muchas pequeñas partículas. Esto es por diseño y es una excelente prueba de que un producto esta bien templado, y no está defectuoso. Es rotura la característica que lo hace un producto excelente para aplicaciones de vidriado de seguridad.

- Realizar la limpieza diaria de vidrios y ventanas, se recomienda usar una mezcla de agua tibia y jabón. El primer paso es limpiar con un paño humedecido en agua, y luego limpiar vigorosamente cuando se haya acumulado en el vidrio suficiente suciedad o manchas causadas por grasa, suciedad u otros elementos que marcan el vidrio.

- Realizar la limpieza habitual del aluminio, utiliza una esponja o una bayeta de microfibra que no deje pelusa y algún producto neutro. No uses nunca esponjas viejas ni ásperas. Para manchas resistentes de grasa o pintura utiliza una solución compuesta por alcohol sanitario, agua y vinagre blanco

AIRE

- Se recomienda dar buen uso a los aires acondicionados instalados en la ejecución del contrato, donde se resalta que cada uno los Puntos de Información (PITS), cuenta con un (1) un aire acondicionado de capacidad de 12000 BTU , Como norma general, se recomienda revisar los equipos de aire acondicionado una vez al año para asegurar que se encuentren en pleno funcionamiento teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ Falta de poder de enfriamiento. ...
- ✓ Olores extraños. ...
- ✓ Humedad en las habitaciones. ...
- ✓ Ruido fuerte o excesivo. ...
- ✓ Daños en las ventilaciones. ...
- ✓ Aumento excesivo en la factura de energía eléctrica.

- Se recomienda un uso no mayor a ocho (8) horas diarias, en caso de ser necesario revisarlo más seguido y, en contraposición, si se lo usa muy poco como máximo se podrá esperar 2 años para su mantenimiento preventivo .
- Nunca se debe dejar pasar más de este tiempo para realizar el mantenimiento, ya que estaremos poniendo en riesgo a todo el artefacto por algo que quizá cuesta muy poco dinero y es muy simple de arreglar.

CUBIERTA

- Es importante y necesario realizar la limpieza diaria , preferiblemente con una escoba de cerdas suaves. Nunca uses detergentes en polvo o industriales, productos abrasivos o con virutas de plástico o metal, ya que pueden rayar tu piso durante el restregado

PANER SOLAR

Es preciso Indicar que cada uno de los Puntos de Información (PITS), fue suministrado e instalado un (1) SISTEMA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA , anexo al presente manual se hace entrega del Manual de Mantenimiento suministrado por el proveedor. (Ver Anexo 12 Folios)

CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
Limpieza de pisos , muros , vidrios , ventanas, puerta	Diario , teniendo en cuenta recomendaciones impartidas en el presente manual
Mantenimiento de aires acondicionados	Dependiendo el uso que se de a cada uno de los Aires Acondicionados instalados, teniendo en cuenta las recomendaciones de periodicidad Uso no mayor a ocho (8) horas diarias: Mantenimiento una vez al año contado a partir de la fecha de recibido de la obra Uso menor a ocho (8) horas diarias: Mantenimiento una vez cada dos años, contados a partir de la fecha de recibido de la obra
Paner solar	Tener en cuenta recomendaciones del manual entregado como anexo al presente documento

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los Puntos de Información (PITS), son casetas modulares hechas con estructuras metálicas, moduladas previamente en un taller, para posteriormente realizar la instalación en los puntos seleccionados por la administración municipal, de tal manera que se puedan ensamblar y desarmar con facilidad para poder reubicarlas donde se prefiera, estos puntos de información, cuentan con un recubrimiento en lamina microperforada con diseños enfocados en la cultura llanera, acabados de muros en material Wood Plastic Composite (WPC) madera nogal, cubierta en lamina policarbonato y pisos en madera laminada, dotados con paneles solares para auto abastecimiento de energía solar, con unos ventanales en vidrio templado de seguridad con marcos en aluminio y en su interior dotado con un aire acondicionado de capacidad de 12000 BTU. Con la construcción e instalación de estos módulos, se implementaran puntos turísticos autosuficientes que no le generen costos de sostenimiento y funcionamiento al municipio de puerto López, y aportan al crecimiento de la económica por fines turísticos. En estos puntos de información, es ofrecerle a los visitantes y turistas una guía de los lugares emblemáticos y actividades que pueden realizar en el municipio de puerto López Meta.

- Se puede determinar de manera general que cada uno de los Puntos de Información Turística (PITS) constan de una construcción cuyos cimientos están en concreto reforzado y la estructura es un suministro y ensamble de las cuatro (04) caras en perfilería de 4x 1 ½", cuatro (04) caras en acero inoxidable y lamina en RH color negro mate, la fachada se construyó en lamina en acero inoxidable microperforado, con diseños establecidos de la cultura llanera, se dispuso un mobiliario diseñado y construido en muro super board doble cara. e=011 m. cal 8 mm. Debidamente pintado se dispuso según diseño entregado por la entidad contratante acabados de muros en material Wood Plastic Composite (WPC) madera nogal, cubierta en lamina policarbonato y pisos en madera laminada, cuenta con ventanales en vidrio templado de seguridad con marcos en aluminio; con el fin de no le generen costos de sostenimiento y funcionamiento al municipio de puerto López según lo dispuesto en el presupuesto oficial se instaló sistema energía solar fotovoltaica; teniendo en cuenta las condiciones climáticas del municipio cada uno de los Puntos de Información Turística (PITS) fue dotado con un (01) aire condicionado de capacidad de 12000 BTU.

- Con la construcción e instalación de estos módulos, se implementarán puntos turísticos autosuficientes que no le generen costos de sostenimiento y funcionamiento al municipio de puerto López, y aportan al crecimiento de la económica por fines turísticos. En estos puntos de información, es ofrecerle a los visitantes y turistas una guía de los lugares emblemáticos y actividades que pueden realizar en el municipio de puerto López Meta.

- Las garantías del contrato son actualizadas conforme las actividades y cantidades aprobadas por la supervisión asignada al contrato de obra N°100-103-13-09-0010-2022, según lo dispuesto en el Acta de Recibo Final aprobada por las partes

Para constancia de lo anterior, se firma el presente manual bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los _____

YACON INGENIERÍA SAS
NIT. 901.368.672-8
R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE

RODRIGO VALENCIA CHAVEZ
N° Matricula Profesional: 25202-58611 CND
DIRECTOR DE OBRA

Anexo Manual de Mantenimiento Paneles Solares (12 Folios)



Manual del Usuario

PROYECTO PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ

SCES (SISTEMA DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA SOLAR)

Preparado por:

Wilmar Mauro Sierra B.
Ingeniero Electricista U.T.P

Mauro Sierra
INGENIERO ELECTRICISTA
U.T.P

1 Definiciones básicas

1.1 Relacionadas con electricidad:

Corriente: Movimiento de electrones por un material. Se simboliza con una A (amperios) y se clasifica en: corriente directa (dc) o corriente alterna (ac). La corriente directa es la producida por paneles solares y baterías, mientras la alterna es el tipo de corriente común de los hogares (la obtenida de la caja de distribución o de los tomacorrientes).

Voltaje: Tensión entre dos puntos. Se simboliza con una V (voltios). Ejemplo: El voltaje de la tomacorriente es de 120Vac (Voltaje de corriente alterna), midiendo entre la fase y el neutro (dos ranuras del tomacorriente). El voltaje de la batería es 12Vdc (Voltaje de corriente directa), midiendo entre el terminal rojo y el negro.

Potencia: Es el producto entre el voltaje y la corriente, se simboliza con una W (vatios). Permite medir el consumo eléctrico de un electrodoméstico o bombillo.

Ejemplo: Un bombillo ahorrador consume 20W, en una hora consumiría 20Wh (20 vatios-hora), si está encendida 5 horas en un día, consumiría 100Wh/día. Este término es muy importante ya que es lo que va a permitir que el sistema solar funcione correctamente.

Breaker: También conocido como taco o fusible. Es la protección contra sobrecarga (demasiada corriente) o cortocircuito.

Caja de distribución: Caja donde se encuentran ubicados las protecciones (breakers) de los diferentes circuitos de la instalación eléctrica.

Electrocución, choque eléctrico o descarga eléctrica: Corriente que circula por el cuerpo humano que puede causar lesiones o en el peor de los casos, la muerte.

Electrodoméstico: Aparato que funciona con electricidad para brindar algún beneficio. Ejemplo: Televisor, Equipo de sonido, Video beam.

1.2 Relacionadas con el sistema solar

SCES: Sistema de Conversión de Energía Solar. Sistema que convierte la energía del sol en electricidad. También llamado simplemente: sistema solar.



Panel Solar: Llamado también panel fotovoltaico, módulo solar, módulo fotovoltaico, o simplemente módulo o panel. Es el dispositivo encargado de convertir la energía solar (rayos solares) en energía eléctrica (electricidad). Se compone de varias celdas de Silicio amorfo o Policristalino, conectadas entre sí para generar 12V o 24V, tienen un recubrimiento de vidrio de protección en la parte frontal.

Matriz solar: Conjunto de paneles solares.

Baterías recargables de GEL: Acumuladores de energía como las pilas AA (dedo) tradicionales pero son de mayor capacidad y pueden ser recargadas para extender su duración. Le brindan al sistema solar un tiempo de independencia, es decir, un periodo de tiempo en el cual no se necesita de la corriente de los paneles solares para que funcionen las luces y electrodomésticos.

Banco de baterías: Se le llama así a todo el conjunto de baterías recargables.

Regulador de carga: Dispositivo que permite realizar una adecuada recarga de las baterías.

Inversor Hibrido o UPS: Dispositivo que convierte la corriente directa de las baterías en corriente alterna tradicional de los hogares (120Vac).

Rack: Estructura de metal donde se encuentran seguros las baterías y el inversor.

Mauro Sierra
INGENIERO ELECTRICISTA
U.T.P

2 Instrucciones de seguridad

2.1 Generales

- ✓ Lea completamente este manual antes de usar su sistema solar.
- ✓ Guarde estas instrucciones que le servirán para realizar los mantenimientos recomendados.
- ✓ Sólo personal de GENAIR ENERGY puede realizar cambios o reparaciones a su sistema solar.
- ✓ No desinstale los paneles solares, ni quite ningún componente del sistema instalado, pues esto anula la garantía.
- ✓ No tire, no deje caer, no apoye objetos sobre los paneles solares, no se apoye sobre ellos.
- ✓ No concentre luz solar sobre los paneles solares con espejos, reflectores o lentes, ni de ninguna otra manera. Esto también anula toda garantía.
- ✓ No toque los paneles solares o la estructura de soporte una vez instalada. Cuando estas superficies están expuestas al sol se vuelven extremadamente calientes.
- ✓ Los paneles solares tienen un frente de protección de vidrio. Romper este vidrio es un riesgo eléctrico (Cortocircuito y fuego). Estos módulos no pueden ser reparados y deben ser reemplazados inmediatamente. Si tiene un módulo roto apague su sistema.
- ✓ No abrir sin autorización o guardar algo en el rack de las baterías e inversor. Adecuada ventilación debe ingresar a ellos.

Mauro Serra
INGENIERO ELECTRICISTA
U.T.

2.2 Exenciones de responsabilidad

Tanto la observancia de estas instrucciones, así como [illegible] condiciones y [illegible] métodos de instalación, operación, aplicación y mantenimiento del [illegible]ema de conversión de energía solar son imposibles de controlar por GENAIR ENERG[illegible]. Una ejecución incorrecta de la instalación puede provocar daños materiales y, en con[illegible]uencia, representar un riesgo para la seguridad de personas.

Por tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por perdid[illegible] daños y cos[illegible] causados por o relacionados de cualquier forma con una instalaci[illegible] incorrecta, una operación inadecuada o un uso o mantenimiento incorrectos.

Igualmente no asumimos ninguna responsabilidad por [illegible]aciones del derecho del diseño o violaciones de derechos de terceros que resulter[illegible] empleo de este sistema de conversión de energía solar.

GENAIR ENERGY se reserva el derecho de efectuar cambios [illegible]tivos al sistema solar, a los datos técnicos, o a las instrucciones de montaje y manej[illegible]n previo aviso.

2.3 Paneles solares

Riesgos relacionados con los paneles solares:

Cuando decida realizar mantenimiento (ver capítulo 8.1) se reco[illegible]da hacerlo desde el suelo, pero en caso de subir al techo siempre está el riesgo de [illegible].

2.4 Baterías

Riesgos relacionados con las baterías recargables:

- ✓ Explosión debido a gas hidrógeno
- ✓ Unir las terminales (tornillos rojo y **negro**) de cada una o de todo el banco de baterías.

⚠ **Precaución:** Para reducir los riesgos se recomienda no fumar ni acercar fuego al banco de baterías.

No tocar los tornillos de las baterías o cables desnudos, puede recibir choque eléctrico.

2.5 Inversor

⚠ **Precaución:** El inversor eleva el voltaje (convierte los 48Vdc en 220Vac Monofásica), tenga cuidado, pues la salida del inversor es 110-220Vac Monofásica.

⚠ **Advertencia:** Cualquiera que haga contacto con algún cable desnudo de la salida del inversor puede recibir un choque eléctrico.

2.6 Caja de distribución y circuitos

⚠ **Advertencia:** Cualquiera que haga contacto con algún cable desnudo o alguna terminal (tornillos de conexión) de la caja de distribución (donde se encuentran los breakers), puede recibir un choque eléctrico.

⚠ **Advertencia: No meter ningún objeto metálico extraño en las ranuras del tomacorriente.** Esto podría producir un cortocircuito que dañaría el sistema o el que introduzca ese objeto podría recibir graves daños por electrocución, incluso la muerte.

⚠ **Advertencia:** Cualquiera que haga contacto con algún cable desnudo o alguna terminal (tornillos de conexión) del partidor de voltaje o electrobomba puede recibir graves daños por electrocución, incluso la muerte.

Mauro Sierra
INGENIERO ELECTRICISTA
U.T.P

3 Disfrute su SCES

Su SCES (Sistema de Conversión de Energía Solar) de GENAIR ENERGY le permite al Polideportivo de la Inspección Remolinos del municipio de Puerto Lopez disfrutar de luz eléctrica y del uso de dispositivos eléctricos. Ha sido diseñado para proveer muchos años de operación sin producir ruido o contaminación y sin necesitar combustible o mantenimiento.

3.1 Los beneficios del SCES ahora son suyos

3.1.1 Protección del medio ambiente y menos contaminación

Por medio del sol se genera electricidad. La electricidad producida por un SCES elimina la necesidad de tener la electricidad típica (conectada a la red nacional) o a través de combustibles fósiles. Se estima que por cada 1000W de generación solar instalada previene 14000 libras de CO_2 (contaminación al medio ambiente) y 30 libras de NO_x (una fuente de humo que contamina el ambiente) durante su vida funcional.

3.1.2 Electricidad gratis

Luego de la inversión inicial, y dado a que el sol es una energía abundante y libre, cada kilovatio-hora (KWh) generado es gratis, y además, el mantenimiento del sistema es poco frecuente y sus componentes poseen varios años de vida útil, entre los cuales, se destacan los paneles solares que sólo hasta los 25 años empiezan a generar un poco menos de electricidad.

.Mantenimiento

4.1. Mensual

⚠ **Advertencia:** Se deben realizar inspecciones mensuales desde el suelo.

- ✓ Revise que sobre los paneles solares no caiga sombra entre las 9 a.m. y las 3 p.m. por vegetación o estructuras de construcción.


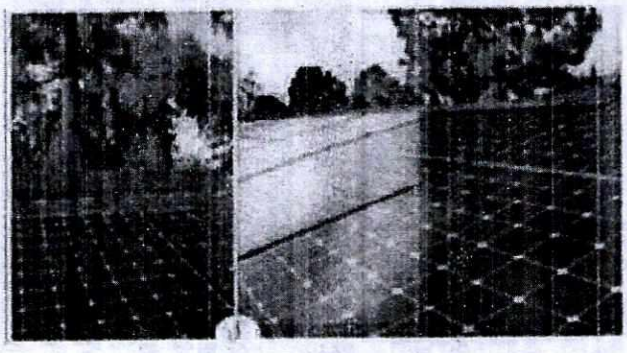


Ilustración 5 Ejemplo de sombra de árboles sobre paneles solares.

Corte la vegetación si es necesario.

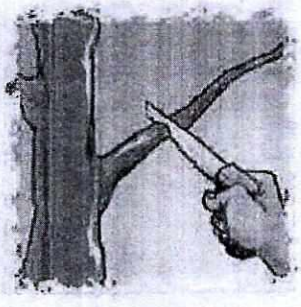

- ✓ Revise desde el suelo que los paneles solares no tengan ningún daño. Los paneles solares tienen una cobertura de vidrio que se puede romper por algún objeto pesado (mayor de 50 libras por metro cuadrado), por granizo (mayor de 1" viajando a 50 MPH), o por otras causas como tirarle piedras. Cuando el vidrio del panel solar se rompe, lucirá diferente de los otros paneles solares. Si se

descubre que se ha roto un panel solar, solicite inmediatamente el servicio y apague el sistema.

- ✓ **Opcional:** Revise que la superficie de los paneles no tenga mucha basura, o mucho desecho de pájaros. No es necesario limpiar los paneles solares gracias a las lluvias que quitan todos los residuos y la suciedad en los paneles, pero usted decide si realizar la limpieza o no. Para limpiar la superficie de los paneles, primero verifique que no hay paneles rotos en la matriz. Luego con una manguera desde el suelo lave los paneles. Sólo si tiene los mecanismos de seguridad necesarios puede subir al techo, de lo contrario no lo haga.

⚠ **Advertencia: NO** limpie los paneles solares durante el mediodía cuando el vidrio está caliente. El choque térmico con el agua fría puede hacer que el vidrio se rompa. Limpie solamente cuando el vidrio del panel este frío.

⚠ **Advertencia:** Los paneles solares tienen un frente de protección de vidrio. Romper este vidrio es un riesgo eléctrico (Cortocircuito y fuego). Estos paneles no pueden ser reparados y deben ser reemplazados inmediatamente. Si tiene un panel solar roto apague su sistema.

4.2. Encendido y apagado del sistema

- ✓ Si en algún momento es necesario apagar o volver a encender la electricidad que viene del sistema solar, siga el procedimiento que a continuación se describe, para cortar o conectar el paso de la corriente eléctrica hacia los diferentes circuitos eléctricos.

4.2.1. Apagado

Procedimiento de apagado:

4.2.1.1. Vaya a la caja de distribución rack de control

4.2.1.2. Desactive el Breaker de la siguiente forma:

Mauro Sierra
INGENIERO ELECTRICISTA
U.T.P

5. Para que el sistema funcione siempre bien

5.1. Diseño del sistema

Es importante que usted entienda que el sistema solar del polideportivo no fue diseñado para gastar toda la electricidad que se quiera. La siguiente ilustración muestra algunos datos en el diseño del sistema solar, hace parte de la carta de garantía para el funcionamiento de las luces del polideportivo.

DC VOLTAJE NOMINAL	48

PERIODO SOLAR	
Puntuación. Horas pico sol/día	5,5
Para la temporada de diseño	Invierno

PROPUESTA FV-MODULO DE SELECCIÓN

ENTRE AQUÍ, ASUMIENDO MODULOS 12V

Propuesta de modulos	12	230	Modulos en Vatios	Total	2760	Propuesta total en Vatios
Propuesta de unidades	12	230	Modulos en Vatios	Total	2760	Propuesta total en Vatios

SI USA MODULOS 24V

Propuesta de modulos	6	460	Modulos en Vatios
Propuesta de unidades	6	460	Modulos en Vatios

PV REGULADOR DE CARGA			CONTROLADOR DE CARGA con MPPT		
Corriente total	41	amps	con 25% impulso de corriente	51	amps
para la matriz propuesta	41	amps	para la matriz propuesta	51	amps
			MPPT= poder maximo		
N° UNID	1		Impulsa la corriente enco	diciones favorables	

CAPACIDAD DE LA BATERIA					
Dias de almacenamiento de energia	1		En la máxima profundidad de descarga	80%	
			Porcentaje de temperatura mínima	90%	
RESULTADO			Requiere banco de baterias mínimo	312	Amp-Hora
200			Para dos lineas paralelas	156	amp-hrs
N° UNID			Para tres lineas paralelas	104	amp-hrs PELIGRO
8			Para cuatro lineas paralelas	78	NO RECOMENDADO
			Para cinco lineas paralelas	62	NO RECOMENDADO

Ilustración 2 Parámetros de diseño sistema solar

Mauro Sierra
INGENIERO ELECTRICISTA
U.T.P

5.2. Horario de funcionamiento de las luminarias

> ⚠ **Advertencia:** Se debe tener siempre en cuenta NO DESPERDICIAR ELECTRICIDAD. No exceder el tiempo de operación de las luminarias.

El diseño del sistema solar que se mostró anteriormente se basó en la siguiente tabla de horario de funcionamiento de las luminarias.

Tabla 1. Duración máxima de funcionamiento de las luminarias.

AC LOADS	Cantidad	Consumo W	Hrs/Dia	Dias/Sem	WH/Dia
CARGA	1	1600	5	7	8000
				TOTAL CARGAS AC	8000
	PICO DE CARGA	1600	Vatios		

Iluminación:

En el polideportivo se deben utilizar lámparas LED de energía de 100W/120V o bombillas tipo LED.



✎ **Nota:** Si se utilizan las luces por más tiempo, el sistema puede funcionar bien, siempre y cuando sean pocas horas extra.

6. Solución de problemas

Problema	Posible causa	Qué hacer?
Cuando conecta las luminarias no enciende	1. Breakers desactivados (OFF), sistema apagado. 2. Sistema descargado. 3. Sobrecarga (Mucho consumo eléctrico). 4. Luces dañadas.	1. Encienda el sistema ver capítulo 8.2. 2. Espere unas horas (durante el día) a que sea cargado nuevamente. 3. Revise alarmas del inversor, si esta sobrecargado, solicite servicio. 4. Busque servicio técnico
Alarma de la UPS (inversor)	Batería baja: Beep[1] cada segundo	1. Desactivar los breakers. 2. Si persiste apague el inversor (UPS)
	Falla de UPS: Beep continuo	Apague el inversor (UPS). Solicite servicio
	Sobrecarga: Beep dos veces por segundo	Apague el inversor (UPS). Solicite servicio
	Temperatura de operación: 0 - 40ºC	Limpie las rejillas de ventilación del Rack, desactive los breakers por un tiempo

[1] **Beep:** Sonido que se puede escuchar de la bocina del inversor (UPS)

Para más información escribir al correo wmaurosb14@gmail.com o visitar nuestras oficinas que están ubicadas en la Calle 37A #19-09 barrio la Florencia

Teléfono: 3206781805

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

ACTA PARCIAL DE PAGO

F-169
Version 002
FECHA: AGOSTO DE 2023

ACTA PARCIAL DE PAGO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATO Nº	100-103-13-09-0010-2022		
OBJETO	"CONSTRUCCION PUNTO S DE INFORMACION TURISTICOS (PITO) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"				
CONTRATISTA	YACON INGENIERIA SAS	NIT Ó CÉDULA	901 348 872-8		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ	CEDULA	1.118.542.109 YOPAL CASANARE	No. CELULAR	
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	NA	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	NA		
NIT O CEDULA	NA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	NA		
NOMBRE SUPERVISOR	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 193.313.433,28	FECHA DEL CONTRATO	23/11/2023		
PLAZO DE EJECUCION	DIAS 20 MESES 1	HASTA			
FECHA DE INICIO	30/11/2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	29/12/2022		

FORMA DE PAGO: El municipio pagará al contratista un único pago parcial hasta el 90% del valor del contrato al presentar acta de terminación, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para la cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El valor del acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidados por el sistema de Precios Unitarios, pactados en el contrato y debidamente aprobadas por la interventoría, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados.
c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	01859	FECHA:	25/10/2022	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	01865 FECHA: 23/11/2022
VALOR	$ 193.561.259,00			VALOR :	$ 193.313.433,28
FUENTES DE FINANCIACION	FUENTE: PROPIOS			VALOR:	$ 193.313.433,28
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	2.3.3.35.3502.0200.04 BPIN (2021505730337 Construccion mantenimiento adecuacion mejoramiento e implementacion de los sitios turisticos la señalizacion y puntos de informacion 2.3.3.35.3502.0200.12 BPIN 2021505730937 Construccion mantenimiento adecuacion mejoramiento e implementacion de los sitios turisticos la señalizacion y puntos de informacion				

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nº	FECHA ACTA	TIEMPO MES	TIEMPO DIAS
1	29/12/2022		20

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA ACTA	TIEMPO MES	TIEMPO DIAS
NA			

C. REINICIO

ACTA Nº	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION MES	TIEMPO SUSPENSION DIAS
NA			

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 19/01/2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA Nº	FECHA ACTA	VALOR ($)
NA		$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($): $ 193.313.433,28

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nº	FECHA ACTA	VALOR ($)
NA		$ -

NA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA:		No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	FECHA:
VALOR				VALOR :	
FUENTES DE FINANCIACION	FUENTE:			VALOR:	$
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	NA				

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($): $ 193.313.433,28

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 193.313.433,28			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	20	DIAS	1	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	19/01/2023			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los [illegible] se reunieron YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.118.542.109 de Yopal - Casanare, Representante Legal de YACON INGENIERIA SAS actuando en calidad de contratista y MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de OBRA No 100-103-13-09-0010-2022 DE 2023 suscrito el día 23 de Noviembre de 2022 , con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL Nº 01 del contrato mencionado anteriormente así:

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS (d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	ACTAS ANTERIORES (g) CANT	(e) VR UNIT	PRESENTE ACTA (i) CANT	(e) VR UNIT	ACOMULADO A LA PRESENTE ACTA (g+i) CANT	(e) VR UNIT	(f=d)VR TOTAL
1	PITS				$ 82.517,94		$ 82.517,94		$ -			$ 82.517,94
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	M2	18,00	$ 4.584,33	$ 82.517,94	18,00	$ 82.517,94	0,00	$ -	18,00	$ 4.584,33	$ 82.517,94
					$ 115.801,20		$ 115.801,20		$ -			$ 115.801,20
1.2	DESCAPOTES											
1.2.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	18,00	$ 6.433,40	$ 115.801,20	18,00	$ 115.801,20	0,00	$ -	18,00	$ 6.433,40	$ 115.801,20
					$ 242.539,22		$ 242.539,22		$ -			$ 242.539,22
1.3	EXCAVACIONES											
1.3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.2 CON INCLUYE	M3	3,77	$ 64.334,01	$ 242.539,22	3,77	$ 242.539,22	0,00	$ -	3,77	$ 64.334,01	$ 242.539,22
					$ 2.143.449,36		$ 2.144.897,86		$ -			$ 2.143.449,36
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	SOLADO, DUPLIZA EN CONCRETO 13.5 Mpa (2000 PSI)	M3	0,58	$ 540.636,67	$ 313.569,27	0,58	$ 313.569,27	0,00	$ -	0,58	$ 540.636,67	$ 313.569,27
1.4.2	PEGA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI. 20.7 MPA PIEDRA	M3	1,52	$ 546.902,77	$ 831.510,30	1,52	$ 831.322,81	0,00	$ -	1,52	$ 546.902,77	$ 831.510,30
1.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A588	M3	0,51	$ 1.964.539,57	$ 995.370,33	0,51	$ 1.001.915,18	0,00	$ -	0,51	$ 1.964.539,57	$ 995.370,33
					$ 5.896.843,39		$ 5.896.967,66		$ -			$ 5.896.843,39
1.5	ACEROS											
1.5.1	CORREA PERFIL RECTFIN NEGRO 100x38x1.5 MM CALIBRE 18	ML	171,00	$ 25.906,13	$ 4.429.948,23	171,00	$ 4.429.943,23	0,00	$ -	171,00	$ 25.906,13	$ 4.429.948,23
1.5.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A588	KG	243,63	$ 22.435,72	$ 5.466.090,16	243,63	$ 5.466.014,46	0,00	$ -	243,63	$ 22.435,72	$ 5.466.090,16
					$ 9.914.729,84		$ 9.914.729,84		$ -			$ 9.914.729,84
1.6	PILOS											

F-199
Version:002
FECHA: AGOSTO DE 2023

ACTA PARCIAL DE PAGO

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES (d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(d) CANT	(e) VR UNIT					
1.0.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ALFAJOR UN TABLERO PUENTE PEATONAL	M2	17,00	$ 250.399,37	$ 4.256.789,29	17,00	$ 4.256.789,29	0,00	$ -	17,00	$ 250.399,37	$ 4.256.789,29
1.0.2	PISO MODERNO COLOR HAYA NATURAL 8MM LAMINADO	MO	17,00	$ 89.395,27	$ 1.519.719,59	17,00	$ 1.519.719,59	0,00	$ -	17,00	$ 89.395,27	$ 1.519.719,59
1.0.3	SARDINEL Y SELLADOR PARA PISOS EN MODERNA (4 MAGOS)	MT	17,00	$ 14.012,88	$ 238.220,66	17,00	$ 238.220,66	0,00	$ -	17,00	$ 14.012,98	$ 238.220,66
1.1	MUROS				$ 51.894.899,64		$ 46.106.980,47		$ 3.790.983,14			$ 51.894.899,64
1.1.1	LAMINA MICROPERFORADA 2MM EN ACERO INOXIDABLE	M2	12,30	$ 1.426.000,00	$ 17.564.400,00	12,30	$ 17.564.400,00	0,00	$ -	12,30	$ 1.426.000,00	$ 17.564.400,00
1.1.2	LAMINA HR 2MM PINTURA ELECTROSTATICA NEGRO MATE	M2	20,04	$ 690.000,00	$ 13.825.530,00	20,04	$ 13.827.600,00	0,00	$ -	20,04	$ 690.000,00	$ 13.825.530,00
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS	MO	15,20	$ 1.065.964,99	$ 16.202.515,85	15,20	$ 16.202.515,85	0,00	$ -	15,20	$ 1.065.964,99	$ 16.202.515,85
1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE PSAVIDRIOS PRES	M2	5,60	$ 295.057,34	$ 1.652.321,10	-	$ -	5,60	$ 1.652.321,10	5,60	$ 295.057,34	$ 1.652.321,10
1.1.5	LISTON MADERA ZAPAN 0.10 X 0.05 M	M	69,80	$ 30.548,92	$ 2.132.314,62	-	$ -	69,80	$ 2.132.314,62	69,80	$ 30.548,92	$ 2.132.314,62
1.1.6	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA E DIT M CAL 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	3,52	$ 147.107,10	$ 517.816,99	3,48	$ 511.470,58	0,04	$ 6.346,42	3,52	$ 147.107,10	$ 517.816,99
1.2	AIRE				$ 1.863.384,82		$ -		$ 1.863.384,82			$ 1.863.384,82
1.2.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ON-OFF DE 12000 BTU 220V INCLUYE UNIDAD INTERIOR UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACION	UND	1,00	$ 1.863.384,82	$ 1.863.384,82	-	$ -	1,00	$ 1.863.384,82	1,00	$ 1.863.384,82	$ 1.863.384,82
1.3	CUBIERTA				$ 6.956.886,17		$ -		$ 6.956.886,17			$ 6.956.886,17
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM	M2	21,00	$ 85.056,51	$ 1.796.765,71	-	$ -	21,00	$ 1.796.765,71	21,00	$ 85.056,51	$ 1.796.765,71
1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MADERA ROLLIZA D=0.12 M IMPUNIZADA	ML	150,00	$ 22.363,26	$ 3.354.489,00	-	$ -	150,00	$ 3.354.489,00	150,00	$ 22.363,26	$ 3.354.489,00
1.3.3	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE PERGOLA SOPORTE DE CUBIERTA	M2	21,00	$ 26.119,03	$ 548.499,63	-	$ -	21,00	$ 560.499,63	21,00	$ 26.119,03	$ 548.499,63
1.3.4	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ANCHO DE 200 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,00	$ 85.606,82	$ 856.068,20	-	$ -	10,00	$ 856.068,20	10,00	$ 85.606,82	$ 856.068,20
1.3.5	BOCATE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ANTICORROSIVO D=0.9 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,00	$ 65.674,07	$ 591.066,63	-	$ -	9,00	$ 591.066,63	9,00	$ 65.674,07	$ 591.066,63
2	PANER SOLAR				$ 88.324.256,57		$ 86.000.000,00		$ 2.324.257,93			$ 88.324.256,57
2.1	SISTEMA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	GLB	2,00	$ 33.000.000,00	$ 66.000.000,00	2,00	$ 66.000.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 33.000.000,00	$ 66.000.000,00
2.1.2	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNO	1,00	$ 369.472,84	$ 369.472,84	0,00	$ -	1,00	$ 369.472,84	1,00	$ 369.472,84	$ 369.472,84
2.1.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNO	4,00	$ 98.029,59	$ 392.118,36	0,00	$ -	4,00	$ 392.118,36	4,00	$ 98.029,59	$ 392.118,36
2.1.4	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 210.479,93	$ 841.919,71	0,00	$ -	4,00	$ 841.919,71	4,00	$ 210.479,93	$ 841.919,71
2.1.5	SALIDA TV PVC SUMINISTRO E INSTALACION	UNO	1,00	$ 77.824,15	$ 77.824,15	0,00	$ -	1,00	$ 77.824,15	1,00	$ 77.824,15	$ 77.824,15
2.1.6	SALIDA TV EMBUTIDO CON TUBO CONDUIT METALICO 1 1/4" SUMINISTRO E	UNO	2,00	$ 82.482,97	$ 164.965,94	0,00	$ -	2,00	$ 164.965,94	2,00	$ 82.482,97	$ 164.965,91
2.1.7	SALIDA TOMA BIFASICO 220 15A INSTALACION SUMINISTRO E	PTO	3,00	$ 159.378,97	$ 478.134,56	0,00	$ -	3,00	$ 478.136,91	3,00	$ 159.378,97	$ 478.134,56
				COSTO DIRECTO	$ 147.567.666,36		$ 133.684.344,07		$ 14.966.511,84			$ 147.567.666,36
				ADMINISTRACION 26%	$ 38.367.661,84		$ 34.677.129,46		$ 3.892.072,87			$ 38.367.661,84
				IMPREVISTOS 1%	$ 1.475.676,66		$ 1.328.643,44		$ 149.696,11			$ 1.475.676,66
				UTILIDAD 4%	$ 5.902.706,26		$ 5.304.173,76		$ 598.799,64			$ 5.902.706,26
				AIU 31%	$ 45.746.926,86		$ 41.307.346,86		$ 4.640.543,42			$ 45.746.926,86
				COSTO TOTAL	$ 193.313.433,36		$ 173.711.686,75		$ 19.610.865,64			$ 193.313.433,36

Nota: Anexo a la presente acta se hace entrega de Memorias de Calculo F-266 , donde se hace la cuantificacion de cada una de las actividades objeto de cobro de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta- a los _____

YACON INGENIERIAS
NIT 9 0 1 . 5 4 2 . 5 7 2 - 8
YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. 1.116.542.109 de Yopal - Casanare
CONTRATISTA

NA
INTERVENTORIA

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota: Diligencias sacta de supervision segun aplique

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS A RECIBO FINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101050107	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2023	30	11	2022	00:00	20	01	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
YACON INGENIERIA SAS	NIT: 901.368.672-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG DIAGONAL DG NRO. 42 110 - 25	VILLAVICENCIO, META	3115782296

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	NIT: 892.099.325-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 6 NRO 4 40	PUERTO LOPEZ, META	6450411

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 100-103-13-09-0010-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/11/2022	20/05/2023	$19,331,343.33	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/11/2022	20/01/2026	$9,665,671.66	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS *		$38,662,686.65	$38,662,686.65

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA A PARTIR DEL 20/01/2023 AL 20/01/2028, (5 AÑOS) SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 100-103-13-09-0010-2022 FIRMADA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON EL 20 DE ENERO DE 2023, DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUARON VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******67,659,701.64	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ALIANZA EXPRESS	225470	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101050107

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101050107	7

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2023	30	11	2022	00:00	20	01	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	YACON INGENIERIA SAS		NIT: 901.366.672-8
DIRECCION:	DG DIAGONAL DG NRO. 42 110 - 25	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELEFONO:** 3115782296

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCION:	CALLE 6 NRO 4 -40	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELEFONO:** 6450411

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 28 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101050107

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zerante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

GINAMONROY

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN DE APROBACION DE GARANTIAS

Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

RESOLUCIÓN NÚMERO 249
FECHA: 26 JULIO 2023

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA ÚNICA"

El Jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Puerto López en ejercicio de las funciones delegadas por decreto 35 de 2016 expedido por el alcalde de Puerto López Meta y con base en lo señalado en la ley 80 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Puerto López celebró el CONTRATO DE OBRA Número 100-103-13-09-00010-2022 con **YACON INGENIERÍA SAS, IDENTIFICADA CON NIT 901368672-8 REPRESENTADA LEGALMENTE POR YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 1.118.542.109 DE YOPAL** el cual tiene por objeto **CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ** y en el cual se exigió una garantía única con los siguientes coberturas y vigencias así:

Contrato No.	100-103-13-09-00010-2022
Contratista/ tomador	YACON INGENIERÍA SAS
Nit/CC	901368672-8
Plazo del Contrato	1 MES
Valor del contrato	$ 193.313.433.26
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6
Pólizas Numero:	**Cumplimiento 30-44-101050107 anexo 7** De conformidad con la suscripción del acta de terminación del contrato de fecha 20/1/2023, se definen las vigencias. **Responsabilidad civil extracontractual 30-40-101017883 anexo 3.** De conformidad con la suscripción del acta de prorroga N 1 del contrato de fecha 28/12/ 2022, se definen las vigencias.
Fecha de expedición de garantías	05 enero de 2023 18 abril de 2023
Amparos (vigencia y suma asegurada)	el proveedor constituyo garantías a favor del Municipio de Puerto López Meta:

RIESGO	PORCENTAJE	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor del	Del Contrato	Por el término

Codigo Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451807
Email:contratacion@puertolopezmeta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN DE APROBACION DE GARANTIAS

		contrato		del contrato y 4 meses mas
	Estabilidad y calidad de la obra	20% del valor final del contrato	Del Contrato	Por el termino de 5 años más contados a partir del acta de recibo.
	Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones	5 % del valor del contrato	Del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.
	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smmlv	Salarios Mínimos	Igual al plazo de ejecución
Cumplimiento del contrato	Vigencia: Desde el 30/11/2022 Hasta: 20/05/2023 Suma asegurada: $19.331.343.33			
Estabilidad y Calidad de la obra	Vigencia: 20/01/2023 hasta 20/01/2028 Suma asegurada: $ 38.662.686.65			
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Vigencia: Desde el 30/11/2022 Hasta: 20/01/2026 Suma asegurada: $ 9.665.671.66			
Póliza de responsabilidad civil Extracontractual	Vigencia: 30/11/2022 Hasta 20/01/2023 Suma asegurada: 200 SMLMV			

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar la garantía otorgada por **YACON INGENIERÍA SAS, IDENTIFICADA CON NIT 901368672-8 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 1.118.542.109 DE YOPAL.** quien allegó la póliza de cumplimiento No. **30-44-101050107 anexo 7** expedida el día 18/04/2023 y póliza de responsabilidad civil extracontractual N **30-40-101017883 anexo 3,** expedida el día 05/01/2023 por la COMPAÑÍA SEGUROS DEL

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451857
Email contratacion@puertolopezmeta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE GARANTIAS

ESTADO SA con NIT 860.009.578-6, la cual ampara la responsabilidad civil extracontractual y cumplimiento del contrato de obra No. **100-103-13-09-00010-2022**, de conformidad con la suscripción del acta de prorroga N 1 del contrato de fecha 28/12/ 2022 y del acta de terminación del contrato de fecha 20/1/2023, se actualizan las vigencias referente al contrato "**CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ**"

ARTÍCULO 2- Comunicar lo resuelto a **YACON INGENIERÍA SAS** y a la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO SA.

ARTÍCULO 3.- Si el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, es obligación del contratista ampliar el valor de la garantía otorgado o en su defecto extender su vigencia según sea el caso.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe de Oficina de Contratación

Proyectó: Laura Catalina Enciso Moreno
Profesional Universitaria

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451807
Email contratacion@puertolopezmeta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

ACTA DE LIQUIDACION

F-104
Version:002
Agosto de 2023

ACTA DE LIQUIDACION

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO	: OBRA		
CONTRATO N°	: 100-103-13-09-0010-2022		
OBJETO	: "CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"		
CONTRATISTA	: YACON INGENIERÍA SAS		
NIT O CÉDULA	: 901.368.672-8	No. CELULAR:	3115782296
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	: YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ		
NIT O CÉDULA	: 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE	No. CELULAR:	3115782296
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	: NA		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	: NA		
NIT Ó CÉDULA	: NA		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	: NA		
SUPERVISOR	: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
CARGO	: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	: 40325106	No. CELULAR	3134117087
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:		
FECHA INICIACION :	30/11/2022		
PLAZO DE EJECUCION:	0 DIAS	1	MESES
	HASTA	NA	
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2022		
PRORROGA N° 01	28/12/2022		
PLAZO DE EJECUCION:	20 DIAS	0	MESES
FECHA SUSPENSIÓN N° :			
TIEMPO:	DIAS		MESES
FECHA AMPLIACION N° DE LA SUSPENSIÓN N° :			
TIEMPO:	DIAS		MESES
FECHA REINICIO:			
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:			
FECHA DE TERMINACION FINAL :			
FECHA DE RECIBO	6/06/2023		

CONTRATOS ADICIONALES :	No.	VALOR	FECHA

MODIFICACIONES AL CONTRATO :	No.	VALOR	FECHA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO :

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, a los _____, se reunieron RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN , en calidad de Jefe de la Oficina de Contratacion ,MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ como supervisora y YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ como Representante Legal del Contratista YACON INGENIERÍA SAS, con el objeto de liquidar el contrato de Obra No. 100-103-13-09-0010-2022 de 2022 , suscrito el 23 del mes Noviembre de 2022, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato.

Las actividades se desarrollaron a satisfaccion de acuerdo al informe de activiades que se presente para la liquidación correspondiente.

2. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	193.313.433,26
VALOR TOTAL DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO	$	-
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	193.313.433,26
VALOR EJECUTADO	$	193.313.433,26
VALOR NO EJECUTADO	$	193.313.433,26
VALOR SANCIONES	$	-
	$	-

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE LIQUIDACION	F-104 Version:002 Agosto de 2023

ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO DE 60%	NA	$ -
ACTA PARCIAL No.01	22/12/2023	$ 116.201.734,12
ACTA PARCIAL No.02	14/04/2027	$ 57.509.956,63
VALOR TOTAL		$ **173.711.690,75**
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION		$ **19.601.742,51**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -

2.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
PROPIOS	01965	$ 193.313.433,26	$ 173.711.690,75	$ **19.601.742,51**	$ -
SGR					
TOTALES					

3. RECLAMOS Y GARANTIAS

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

3.1. GARANTIAS.

ASEGURADORA	SEGUROS EL ESTADO S.A
POLIZA UNICA No	30-44-1010500107
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	30-40-101017883
DIRECCION DE NOTIFICACIONES	CRA 38 N° 33-45/49 Villavicencio

3.1.1. BUEN MANEJO Y COORECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
VALOR ASEGURADO : $ -
VIGENCIA : DESDE HASTA:

3.1.2. DE CUMPLIMIENTO
VALOR ASEGURADO : $ 19.331.343,33
VIGENCIA : DESDE 30/11/2022 HASTA: 20/05/2023

3.1.3. PAGO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
VALOR ASEGURADO : $ 9.665.671,66
VIGENCIA : DESDE 30/11/2022 HASTA: 20/01/2023

3.1.4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
VALOR ASEGURADO : $ 38.662.686,65
VIGENCIA : VIGENCIA SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 1 DIAS

3.1.5. CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS
VALOR ASEGURADO : $ -
VIGENCIA : DESDE HASTA:

3.1.6. OTRA:
VALOR ASEGURADO : 200 SMLMV
VIGENCIA : DESDE 30/11/2022 HASTA: 20/01/2023

4. ANEXOS PRESENTADOS AL TRAMITE .
Acta de Terminacion : 3 Folios, Acta de Recibo: 3 Folios, Acta de Pago:3 Folios , Cantidades de Pago: 3 Folios
Memorias de Calculo : 30 Folios, Informe Final de Contratista de Obra :32 Folios, Informe de Supervisor : 15 Folios
Manual de Mantenimiento y Operacion : 25 Folios, Acta Parcial de Pago: 3 Folios, Aprobacion de polizas : 4 Folios
Acta de Liquidacion : 3 Folios, Acta de entrega a la Comunidad : 3 Folios, Legalizacion Gastos Admon : 15 Folios
Certificacion Calidad de Materiales : 10 Folios, Certificacion de Supervisor : 1 Folio, Entrada Almacen : 1 Folio
Relacion de Personal y Planillas de seguridad : 11 Folios, Factura y Rut : 4 Folios, Justificacion Imprevistos : 8 Folios
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los _____

YACON INGENIERIA SAS
EL YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
CONTRATISTA

NA
INTERVENTOR

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION

CARGO :

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR ASIGNADO

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

ACTA DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

ACTA DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO

Código: F - 105
Versión: 001
Fecha: Agosto de 2017

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	100-103-13-09-0010-2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"
CONTRATISTA:	YACON INGENIERIA SAS NIT. 901.368.872-8 R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	NA
SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ

2. DATOS ESPECÍFICOS

(a) REQUERIMIENTO INCUMPLIDO	(b) FECHA	(c) NOTIFICADO POR OFICIO	(d) RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES
Por incumplimiento en las garantías			NA
Por incumplimientos en los requisitos de personal mínimo			NA
Por incumplimiento de las actividades y procedimientos de interventoría			NA
Por incumplimiento en la presentación de informes			NA
Por no solicitar el inicio del procedimiento de imposición de multas o recomendar la declaratoria de caducidad al contratista de obra			NA
Por mala calidad o deficiencias de acabado en obras recibidas por la Interventoría			NA
Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el clausulado del contrato			NA
Por incumplimiento de las instrucciones que imparta el Secretario de Despacho o Supervisor (la Agencia Logística) para evitar que se ejerza inadecuadamente sus funciones de inspección, vigilancia y control			NA
Por presentar información errada a nivel general y específicamente en los formatos del manual de Interventoría			NA
Otros: ____ Cuales?			NA

Anexos: _____ folios

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez - Meta , a los _____

Elaboró :	Aprobó
NA Firma del Interventor	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ Firma del Supervisor

	ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD	Código: F - 106
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

1. INFORMACION GENERAL

No. DE ACTA :		FECHA/HORA:	
BARRIO/VEREDA :	NA	DIRECCION/SITIO:	NA
CONTRATO N° :	100-103-13-09-0010-2022	VALOR:	$ 193.313.433,26
OBJETO :	"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"		
CONTRATISTA :	YACON INGENIERIA SAS R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ	DIRECCION Y TELEFONO:	Direccion: DG 6 SUR No. 42-110 Celular: 3115762298
INTERVENTOR :	N/A	DIRECCION Y TELEFONO:	N/A
SUPERVISOR :	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	DIRECCION Y TELEFONO:	ALCALDIA MUNICIPAL
LIDER COMUNITARI :	NA	DIRECCION Y TELEFONO:	NA

2. LISTADO DE ASISTENCIA A LA VISITA

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1		
2		
3		

3. ENTREGA DE LOS SERVICIOS O BIENES.

En el el sitio, fecha y hora señalda en la presente acta, se reunieron quienes participan en la presente reunión, con el propósito de hacer entrega a la comunidad o beneficiarios los servicios o bienes derivados del contrato ejecutado, los cuales se asumen recibidos a entera y completa satisfacción de quienes ostentan la representación de la comunidad o de los beneficiarios, en desarrollo del control social que ejercen los ciudadanos sobre los programas y proyectos del Municipio de Puerto Lopez Meta

N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE ENTREGA	BENEFICIARIOS DEL BIEN O SERVICIO	COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD	COMPROMISO DEL MUNICIPIO
	DOS (02) Puntos de Información (PITS),que son casetas modulares hechas con estructuras metálicas, modulados previamente en un taller, para posteriormente realizar la instalación en los puntos seleccionados por la administración municipal, de tal manera que se puedan ensamblar y desarmar con facilidad para poder reubicarlas donde se prefiera, estos puntos de información, cuentan con un recubrimiento en lamina microperforada con diseños enfocados en la cultura llanera, acabados de muros en material Wood Plastic Composite (WPC) madera nogal, cubierta en lamina policarbonato y pisos en madera laminada, dotados con paneles solares para auto abastecimiento de energía solar, con unos ventanales en vidrio templado de seguridad con marcos en aluminio y en su interior dotado con un aire acondicionado de capacidad de 12000 BTU PUNTO DE INFORMACION N° 01 : CLL 5 # 11-93 A 11-3 PUNTO DE INFORMACION N° 02 : AV. 14 # 16- 209 A 16- 181	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ IMDERCUT – INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE, CULTURA Y TURISMO	NA	1.Hacer mantenimiento preventivo a las conexión instaladas para el servicio de energia 2.Dar buen uso a los elementos entregados conforme Acta de Recibo Final 3.Tener presente recomendaciones del manual para los paneles solares instalados y entregados conforme los documentos entregados por el provedor que son entregados en la presente acta 4.Implementaren puntos turisticos autosuficientes que no le generen costos de sostenimiento y funcionamiento al municipio de puerto López, y aportan al crecimiento de la económica por fines turisticos. En estos puntos de información, se ofrecerla a los visitantes y turistas una guia de los lugares emblemáticos y actividades que pueden realizar en el municipio de puerto López Meta

5. APROBACION DEL ACTA

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Entidad : ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

Nombre: VICTOR MANUEL ANZUETA MARTHA
Cargo: DIRECTOR DE IMDERCUT
Entidad : ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

YACON INGENIERIA SAS
R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
Cargo: Contratista

	ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD	Código: P - 106 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

1. INFORMACION GENERAL

No. DE ACTA :	1	FECHA/HORA:	
BARRIO/VEREDA :	NA	DIRECCION/SITIO:	NA
CONTRATO N° :	100-103-13-09-0010-2022	VALOR:	$ 193.313.433,26
OBJETO :	"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"		
CONTRATISTA :	YACON INGENIERIA SAS R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ	DIRECCION Y TELEFONO:	Dirección: DG 6 SUR No. 42-110 Celular: 3115782296
INTERVENTOR :	N/A	DIRECCION Y TELEFONO:	N/A
SUPERVISOR :	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	DIRECCION Y TELEFONO	ALCALDIA MUNICIPAL
LIDER COMUNITARI :	NA	DIRECCION Y TELEFONO	NA

2. LISTADO DE ASISTENCIA A LA VISITA

N°	(a) NOMBRES	(b) REPRESENTA A:
1		
2		
3		

3. ENTREGA DE LOS SERVICIOS O BIENES.

En el el sitio, fecha y hora señalda en la presente acta, se reunieron quienes participan en la presente reunión, con el propósito de hacer entrega a la comunidad o beneficiarios los servicios o bienes derivados del contrato ejecutado, los cuales se asumen recibidos a entera y completa satisfacción de cuienes ostentan la representación de la comunidad o de los beneficiarios, en desarrollo del control social que ejercen los ciudadanos sobre los programas y proyectos del Municipio de Puerto Lopez Meta

N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE ENTREGA	BENEFICIARIOS DEL BIEN O SERVICIO	COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD	COMPROMISO DEL MUNICIPIO
	DOS (02) Puntos de Información (PITS),que son casetas modulares hechas con estructuras metálicas, moduladas previamente en un taller, para posteriormente realizar la instalación en los puntos seleccionados por la administración municipal, de tal manera que se puedan ensamblar y desarmar con facilidad para poder reubicarlas donde se prefiera, estos puntos de información, cuentan con un recubrimiento en lamina microperforada con diseños enfocados en la cultura llanera, acabados de muros en material Wood Plastic Composite (WPC) madera nogal, cubierta en lamina policarbonato y pisos en madera laminada, dotados con paneles solares para auto abastecimiento de energía solar, con unos ventanales en vidrio templado de seguridad con marcos en aluminio y en su interior dotado con un aire acondicionado de capacidad de 12000 BTU PUNTO DE INFORMACION N° 01 : CLL 5 # 11 93 A 11-3 PUNTO DE INFORMACION N° 02 : AV. 14 # 16- 209 A 16- 181	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ IMDERCUT - INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE, CULTURA Y TURISMO	NA	1.Hacer mantenimiento preventivo a las conexión instaladas para el servicio de energia 2.Dar buen uso a los elementos entregados conforme Acta de Recibo Final 3.Tener presente recomendaciones del manual para los paneles solares instalados y entregados conforme los documentos entregados por el provedor que son entregados en la presente acta 4.Implementaran puntos turisticos autosuficientes que no le generen costos de sostenimiento y funcionamiento al municipio de puerto López, y aportan al crecimiento de la económica por fines turisticos. En estos puntos de información, es ofrecerle a los visitantes y turistas una guia de los lugares emblemáticos y actividades que pueden realizar en el municipio de puerto López Meta.

6. APROBACION DEL ACTA

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Entidad: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

Nombre: VICTOR MANUEL ANZUETA MARTHA
Cargo: DIRECTOR DE IMDERCUT
Entidad : ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

YACON INGENIERIA SAS
R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
Cargo: Contratista

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

INFORME Y DOCUMENTOS SOPORTES DE LIQUIDACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

ROZO CONTADORES SAS NIT: 901441057-1

Villavicencio , 24 de Noviembre de 2023

EL SUSCRITIO
CONTADOR PUBLICO
CERTIFICA QUE:

YACON INGENIERIA SAS con Nit: 901.368.672-8, para el contrato de obra No. 100-103-13-09-0010-2022 del 2022 cuyo objeto es la " CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ" presenta la siguiente relación de gastos administrativos para la legalización del AIU del mismo:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	Descuento realizado pago parcial No. 1	$ 10.599.231,00
2	Gastos de polizas obligatorias	$ 3.335.785,00
3	Descuentos realizados pago parcial No. 2	$ 16.693.689,00
4	Alquiler vehiculo periodo de diciembre 2022 a enero 2023	$ 3.000.000,00
5	Impresiones y Papeleria	$ 2.000.000,00
6	Descuento Proyectado pago Final	$ 2.816.770,40
TOTAL		$ 38.445.475,40

Cordialmente,


Adriana María Rozo Barreto
Contador Publico
TP: 274589- T

Cra 3 No. 30 a -58 Villavicencio - Meta
Cel: 3123954935, Email: rozocontadores@gmail.com

ROZO CONTADORES SAS

ROZO CONTADORES SAS



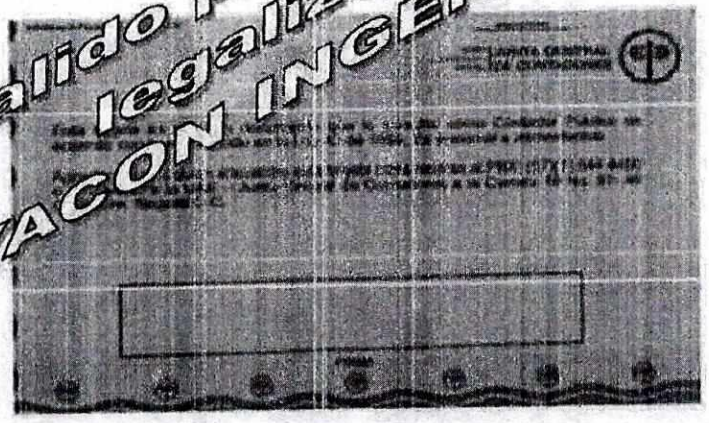

valido para certificado
legalizacion AIU
YACON INGENIERIA SAS

Cra 3 No. 30 a -58 Villavicencio - Meta
Cel: 3123954935, Email: rozocontadores@gmail.com

Fecha: 22/06/2023

Cuenta de cobro No 1

YACON INGENIERIA SAS
Nit. 901368672-8

DEBE A:

SERVICIO MATAPALOS
NIT: 901 243 496-0

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DE PESOS ($2,000,000.00)

Por concepto de: IMPRESIONES, SCANNERS Y PAPELERIA EN GENERAL

- IMPRESIÓN DE INFORMES MENSUALES
- IMPRESIÓN DE INFORMES PARCIALES
- IMPRESIÓN DE LIQUIDACIONES

SERVICIOS MATAPALO

casino matapalo s.a.s
NIT 901.243.496-0
CRA 10 MZ E CS 86
Tel: (038) 3102220238
Puerto López - Colombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14797760508

(415)7707212469984(8020) 000014797760508 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 4 3 4 9 6 | 6. DV 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CASINO MATAPALO S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Puerto López 5 7 3

41. Dirección principal: CR 19 6 A 58 BRR VILLA MODELIA

42. Correo electrónico: didier.ospina.matapalo@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 0 2 2 2 0 2 3 8

45. Teléfono 2: 3 2 4 6 6 8 1 0 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 1	2 0 1 9 1 2 1 0	0 2 4 0	2 0 1 9 1 2 1 0	4 3 2 1	4 9 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 11 - 22 / 09 : 01: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: OSPINA VARGAS DIDIER
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-11-2021 09:01:44AM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14797760508

(415)7707212489984(8020) 000001479776050 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 3 4 9 6	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 3 4 3 9 4 0	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	5 7 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 1 1 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 1 2 1 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Licenciado a MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha 27/12/2022
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 04202

Fecha : Diciembre 27 de 2022
A favor de : YACON INGENIERIA SAS
Por menor :
primer pago parcial contrato 100-103-13-09-0010-2022

Dependencia:42 SECCION 03 SECTOR
Identifiación: 901368672 - 8
Clase orden: 05 construccion

VALOR A PAGAR $116.201.734,12

Descuentos antes de Iva

TURISMO	2,000	1.774.072,00
CULTURA	2,000	1.774.072,00
Retencion ICA Servicios	0,800	709.629,00
Retencion Construccion -	2,000	461.000,00
MPIO - ANCIANATO	4,000	3.548.145,00
TASA DEPORTE	2,500	2.217.590,00
Pro electrificación rural	1,000	887.000,00
DPTO -UNILLANOS	1,000	887.000,00
MPIO SEGURIDAD	5,000	4.435.181,00

Requisitos
contrato 10308081 23/11/2022
acta de inicio INICIO 30/11/2022

Anexos:
FEV-17* BASE DESCUENTOS $88.703.613,83

CONTRATO/ORDEN
Número 00010 Fecha 23/11/2022
Registro 01965 Fecha poliza / /
Valor $193.313.433,26 Inicio 30/11/2022
Plazo 30 días Terminación29/12/2022
Objeto: CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ

Subtotal descuentos	16.693.689,00
I.V.A.	$0,00
Rete Iva 0,00	$0,00
Impuesto al Consumo	$0,00
Saldo neto a pagar	$99.508.045,12

Gastos de Inversion
Registro Nro: 01965 Fecha: 23/11/2022

Son : CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS********** TREINTA Y CUATRO PESOS CON 12/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
42 SECCION 03 SECTOR COMERCIO,	2.3.3.35.3502.0200.04	BPIN 2021505730037 Construcción mantenimiento	$100.000.000,00
42 SECCION 03 SECTOR COMERCIO,	2.3.3.35.3502.0200.12	BPIN 2021505730037 Construccion mantenimiento	$16.201.734,12

SECRETARIA DE HACIENDA | REVISO Y CONTABILIZO | TESORERO GENERAL

REGISTRO DE PAGO

Cheque No:T000013269 Cta : 8028547566-3
Nro de giro:04082 Fecha :Diciembre 27
Banco : 23 BANCOLOMBIA
Fuente : Impuesto al Transporte po oleoducto Superavit Recibí: C.C.

Procesado por : AMPARO BARRETO

Licenciado a MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha 24/04/2023
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00821

Fecha : Abril 24 de 2023
A favor de : YACON INGENIERIA SAS
Por menor :
construccion de puntos de informacion turisticos (pits) en el casco urbano de puerto lopez

Dependencia:98 RESERVAS
Identifiación: 901368672 - 8
Clase orden: 05 construccion

VALOR A PAGAR $57.509.956,63

Descuentos antes de Iva

TURISMO	2,000	1.150.000,00
CULTURA	2,000	1.150.200,00
Retencion ICA Servicios	1,000	178.281,00
Retencion Construccion -	2,000	357.000,00
MPIO - ANCIANATO	4,000	2.300.400,00
TASA DEPORTE	2,500	1.437.750,00
Pro electrificación rural	1,000	575.100,00
DPTO -UNILLANOS	1,000	575.000,00
MPIO SEGURIDAD	5,000	2.875.500,00

Requisitos

Anexos:
FEV22*BASE RETEFTE $17.828.086,56*

CONTRATO/ORDEN
Número 00010 Fecha 23/11/2022
Registro 01965 Fecha poliza / /
Valor $193.313.433,26 Inicio / /
Plazo 30 días Terminación / /
Objeto: CONSTRUCCION DE PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ

Subtotal descuentos		10.599.231,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Impuesto al Consumo		$0.00
Saldo neto a pagar		$46.910.725,63

Gastos de Inversion
Registro Nro: 01965 Fecha: 23/11/2022

Son : CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS******
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 63/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
98 RESERVAS	E2.3.3.35.3502.0200.12	BPIN 2021505730037 Construccion mantenimiento	$57.509.956,63

SECRETARIO DE HACIENDA | REVISO Y CONTABILIZO | TESORERO GENERAL

REGISTRO DE PAGO
Cheque No:T000014976 Cta : 8028547566-3
Nro de giro:00911 Fecha :Abril 27 de2023
Banco : 23 BANCOLOMBIA
Fuente : Impuesto al Transporte po oleoducto Superavit Recibí: C.C.

Procesado por : DIANA RAMIREZ

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

EVALUACION DE PROVEEDORES

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	EVALUACION DE PROVEEDORES	Código: F - 093
		Versión: 001
		Fecha: Agosto de 2017

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del bien

FECHA EVALUACION	18/01/2023	No. CONTRATO	100-103-13-09-0010-2022	DE	2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR (CONTRATISTA)	YACON INGENIERÍA SAS R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ C.C 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	NIT 901 368.672-8				
NOMBRE DEL INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ				

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION SERVICIOS		SUMINISTRO		OBRA	X

Marque con una X en la casilla frente a la opcion que evalua la ejecucion, solo una vez por item

Para el item 1, 2 y 4 solo hay 2 opciones de Rango de Evaluación con puntaje de 1 ó 5; para los demás items existen 3 Rangos de Evaluación 1-3 y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE					
		1		3		5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple				Cumple	
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple				Cumple	
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente.		Cumple	
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple				Cumple o no se presentaron	

Consolidar Puntaje por Item		
	ITEM 1	5
	ITEM 2	5
	ITEM 3	3
	ITEM 4	5
	TOTAL	18

EVALUACION DE ACUERDO A TOTAL DEL PUNTAJE	
	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

OBSERVACIONES

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Firma del Supervisor

YACON INGENIERÍA SAS
R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
Firma de Enterado por parte del Contratista

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS

CERTIFICATE

TÜV NORD CERT GmbH
herewith declares that

VILLARREAL DIVISIÓN EQUIPOS S.A. DE C.V.
Morelos 905 Sur
Col. Centro Allende N.L.,
México C.P. 67350

is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated:

Description of product (details see Annex 2):

PV Modules with Half-cut Mono-crystalline Silicon Solar Cells

Valid from: 2021-05-10
Valid until: 2026-04-13

Tested according to:	IEC / EN 61215-1:2016; IEC / EN 61215-1-1:2016; IEC 61215-2:2016 / EN 61215-2:2017 + AC:2017 + AC:2018; IEC 61730-1:2016 / EN IEC 61730-1:2018 + AC:2018; IEC 61730-2:2016 / EN IEC 61730-2:2018 + AC:2018.
Registered No.:	44 780 21 406749 - 075
Manufacturer:	see Annex 1
Test Report No.:	492011669.001
File No.:	PVP04024/21P

Essen, 2021-05-10

TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body
Consumer Products

Please also pay attention to the information stated overleaf.

TÜV NORD

Anlage 2 zum Zertifikat Nr.: / *Annex 2 to Certificate No.* 44 780 21 406749 - 075

Aktenzeichen: / *File reference:* PVP04024/21P

2021-05-10

Description of product(s):

Module types:	**PV Modules with Half-cut Mono-crystalline Silicon Solar Cells** 144 cells: ASTRALXxxx-MH144 (xxx=525-545, in increment of 5) 144 cells: ASTRALXxxx-MH144 (xxx=430-460, in increment of 5) 132 cells: ASTRALXxxx-MH132 (xxx=480-500, in increment of 5) 132 cells: ASTRALXxxx-MH132 (xxx=395-420, in increment of 5) 120 cells: ASTRALXxxx-MH120 (xxx=440-455, in increment of 5) 120 cells: ASTRALXxxx-MH120 (xxx=360-380, in increment of 5) 108 cells: ASTRALXxxx-MH108 (xxx=395-405, in increment of 5)
Maximum system voltage:	1500V
Fuse rating:	20A
Electrical protection class:	Class II
Pollution degree:	1
Material group:	I
Design load (positive / negative):	1600Pa / 1600Pa or 3600Pa / 1600Pa, refer CDF for details
Safety factors:	1.5
Fire safety class:	Class C according to ANSI/UL 1703-2018 (as per ANSI/UL 790-2018)

Remark:
For detailed product information, please refer to CDF (Constructional Data Form) in Annex 1 of test report.

TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body
Consumer Products

TÜV NORD

Certificate of conformity with the following European Directives

Registered No.:
44 799 21 406749 - 047

Low-Voltage Directive 2014/35/EU

Date of application	File reference	Test report No.	Date of issue	Place of issue
2020-11-01	PVP04024/21P	492011669.001	2021-05-10	Essen

This is to certify that the following products comply to the essential requirements of the above mentioned European Directive and the following standards, taking into account the German national deviations:

Product: Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules

Type designation: See Annex 1

Applicant: **VILLARREAL DIVISIÓN EQUIPOS S.A. DE C.V.**
Morelos 905 Sur, Col. Centro Allende N.L.,
México C.P. 67350

Standard(s): EN IEC 61730-1:2018; EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018; EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

This Certificate of conformity is based on the evaluation of samples of the product. It does not imply an assessment of the production and it does not permit the use of a mark of conformity or of a safety mark of the TÜV NORD CERT GmbH. The holder of this certificate may use this Certificate together with his EC-Declaration of Conformity.

Certification Body
Specialist Manager Consumer Products

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstrasse 20
D-45141 Essen
P.O.Box 10 32 61
D-45032 Essen
Fon: +49 (0)201 825-5120
Fax: +49 (0)201 825-3209
Email: prodcert@tuev-nord.de

CE The CE marking may be affixed on the product if all relevant and effective Directives are complied with

TÜV NORD

Anlage 1 zum Zertifikat Nr.: / *Annex 1 to Certificate No.:* 44 799 21 406749 - 047

Aktenzeichen: / *File reference:* PVP04024/21P

2021-05-10

Description of product(s):

Module types:

PV Modules with Half-cut Mono-crystalline Silicon Solar Cells:

144 cells: ASTRALXxxx-MH144 (xxx=525-545, in increment of 5)
144 cells: ASTRALXxxx-MH144 (xxx=430-460, in increment of 5)
132 cells: ASTRALXxxx-MH132 (xxx=480-500, in increment of 5)
132 cells: ASTRALXxxx-MH132 (xxx=395-420, in increment of 5)
120 cells: ASTRALXxxx-MH120 (xxx=440-455, in increment of 5)
120 cells: ASTRALXxxx-MH120 (xxx=360-380, in increment of 5)
108 cells: ASTRALXxxx-MH108 (xxx=395-405, in increment of 5)

TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body
Consumer Products

tempel group

DOCUMENTO DE GARANTÍA

BATERÍA INDUSTRIAL ESTACIONARIA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA - VALVE REGULATED LEAD ACID)

Modelo: KBG12200

Número de Serie desde: BF15409 Hasta: BF15416

Número de la factura: TCO 7836 Fecha: 18 - ene - 2023

Instalación: Febrero 2023

Las baterías detalladas en la factura están amparadas por este Certificado de Garantía, desde que sean cumplidas las condiciones descritas a continuación:

A. **Plazo de Garantía**: La garantía es de 12 meses, conforme contrato específico y cumpliéndose las condiciones de garantía del contrato.
B. **Daños ocurridos en la batería**: Daños en tapas, cajas o terminales durante el transporte, negligencia, mal uso, daños ocurridos en instalaciones por personas no capacitadas, inundación, fuego, agentes corrosivos, explosivos o por cualquier otra acción de la naturaleza no serán soportadas por este Certificado. Observaciones: En caso de algún tipo de violación o avería durante el recibimiento de los productos, informar a la transportadora responsable para reembolso por parte del asegurador.
C. **Batería sin garantía** para aplicaciones móviles.
D. **Garantía**: Será garantizada al cliente final cuando esté debidamente comprobadas, justificadas las razones de su aplicación , observadas y cumplidas las siguientes condiciones:
   1) Las especificaciones técnicas del manual o catálogo deben ser atentamente observadas y cumplidas.
   2) La utilización de las baterías en flotación deberá seguir las especificaciones técnicas del manual o catálogo y las instrucciones en el propio producto, conforme a lo indicado, así:
   - Debe ser garantizado una separación mínima de 10 mm. entre las baterías y entre la batería y la pared del gabinete, si fuera el caso.
   - Voltaje de carga en flotación: 2,25 a 2,30 Vpc (voltios por celda) – recomendable 2,27 Vpc – en 25°C.
   - En temperaturas diferentes de 25°C, debe haber compensación de voltaje de carga de flotación, debido a la variación de temperatura:
   - Para temperaturas debajo de 25°C – añadir 0,003 Vpc al voltaje de flotación (en 25°C) para cada °C de variación.
   - Para temperaturas más de 25°C – disminuir 0,003 Vpc al voltaje de flotación (en 25°C) para cada °C de variación.
   - No permitir descargar la batería bajo al voltaje de corte para evitar daños de sulfatación de la placa.

tempel group

3) Para almacenamiento de batería, cuando sea necesario, la batería debe estar totalmente cargada y debe ser recargada en intervalos regulares conforme a la siguiente tabla:

Temperatura de Almacenamiento	Intervalos de carga
20°C o menos	A cada 9 meses
20°C hasta 30 °C	A cada 6 meses
30°C hasta 40 °C	A cada 3 meses

Superados los periodos en almacenamiento descrito para cada temperatura, sin no se realiza el proceso de recarga, las baterías corren riesgo de daños irreversibles.

4) Control de Temperatura: La temperatura ambiente media anual no debe sobrepasar 25°C y la temperatura de la celda no debe exceder 33°C, por tiempo superior a 30 días por año.
5) Las válvulas de seguridad no deben ser adulteradas o removidas.
6) Las baterías no deben ser contaminadas por cualquier producto corrosivo o solvente.
7) Carga de la batería: Todas las baterías deben ser recargadas inmediatamente después de la descarga. No ocurriendo esa recarga, las baterías poden sufrir un proceso irreversible de sulfatación, dañando las permanentemente; en esta condición la batería no es cubierta por la garantía.
8) Libro de Registro: Debe ser mantenido en el sitio de la instalación de las baterías, un libro de registro conteniendo informe de instalación, anotaciones periódicas y actualizadas de las condiciones de uso, condición general de cada batería, condiciones ambientales (temperatura constantes o no, limpieza, etc...), voltaje individual y total de las baterías, corriente de carga, así como registrar anormalidades, si ocurrieran. La presentación de esos datos es esencial siempre que se sea solicitada reposición en garantía o en ocasiones de inspección técnica realizada por TEMPEL.
9) Todos los procidimientos de instalación y de mantenimiento deben ser ejecutadas conforme Manual Técnico del modelo adquirido.

E. **Etiqueta de Identificación:** La etiqueta de identificación con la fecha (código de barra) sobre la batería debe ser mantenida legible; su remoción y o ruptura implicará automáticamente la perdida de garantía.
F. **Tipo de Garantía:** Todos los costos de envío de las baterías por solicitud de garantía a las instalaciones de Tempel son de responsabilidad del cliente remitente.
G. **Responsabilidades:** Es de responsabilidad del distribuidor informar a todos los clientes el contenido y las condiciones de este certificado. En caso de duda, contactar a TEMPEL.
H. **Reposición en garantía:** Todos los productos substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de TEMPEL.

Ver. 06/01/16

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 07488

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
ENCERRAMIENTOS METÁLICOS	PARA ALOJAR EQUIPO ELÉCTRICO	RC-A, RC-AM, RC-ABT, RC-GM

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

ELECTROINDUSTRIAL V&V S.A.S

Carrera 26 No. 30-14, Villavicencio, Meta, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO de MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.23.1.1)

Fecha de Certificación: 2019/08/22
Fecha de Renovación: 2022/09/13
Fecha de Vencimiento: 2025/09/13

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/09/13 y 2024/09/13

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.09.14 17:08:41 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07488

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2019/08/22
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/13
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/13

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ENCERRAMIENTOS METÁLICOS

tipo		Para alojar Equipo eléctrico
Referencia		RC-A, RC-AM, RC-ABT, RC-GM
Marca		ELECTROINDUSTRIAL V&V
Dimensiones	Alto	300 mm hasta 2000 mm
	Ancho	200 mm Hasta 2000 mm
	Profundo	180 mm Hasta 500 mm
Calibre lámina de la estructura		16 BWG, 18 BWG Cold Rolled y Galvanizado
Calibre lámina de las tapas		16 BWG, 18 BWG Cold Rolled y Galvanizado
Calibre lámina de las puertas		16 BWG, 18 BWG Cold Rolled y Galvanizado
Tipo de cierre		Chapa de buje trifásico y chapa T.N. Hexagonal
Característica de la pintura		Pintura electrostática
Proceso de pintura		ELECTROINDUSTRIAL V&V S.A.S
Resistencia a la corrosión		240 horas
Resistencia contra impactos y Grado de protección sin accesorios IK / IP		IK 10 / IP 54
Grado de protección con equipos de control y/o monitoreo en puerta / IP		N.A. No posee equipos de control y/o monitoreo en puerta
Grado de protección con ventilación y/o extractor / IP		N.A. No posee ventilación y/o extractores.
Resistencia contra impactos para ventana de inspección / IK / IP		Visor en policarbonato 3 mm / IK 08 / IP 54
Aplicación		Para alojar Equipo eléctrico
Referencial		RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23.1.1.)

ISO/IEC 17065:2012
09-CFR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07488

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2019/08/22
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/13
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/13

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ENCERRAMIENTOS METÁLICOS

Fabrica	Planta
ELECTROINDUSTRIAL V&V S.A.S	VILLAVICENCIO, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

Shenzhen Testing Center (S.H.E)
Floor, No.1, Building 10, Maoye Industrial Zone,
Nanshan District, Guangdong, 518067, China
TEL: 0086-755-26627338 FAX: 0086-755-26627238
www.ntc.com.cn

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Registration No.:SZNTC2112097SV00

Applicant	:	MUST ENERGY(GUANGDONG) TECHNOLOGY., LTD
Address	:	1-5F, 7F, 9F, 10F of No.8 building, No.115, Zhangcha Road 1, Chancheng district, Foshan city, Guangdong Province, P.R. China
Manufacturer	:	MUST ENERGY(GUANGDONG) TECHNOLOGY., LTD
Address	:	1-5F, 7F, 9F, 10F of No.8 building, No.115, Zhangcha Road 1, Chancheng district, Foshan city, Guangdong Province, P.R. China
Factory	:	MUST ENERGY(GUANGDONG) TECHNOLOGY., LTD
Address	:	1-5F, 7F, 9F, 10F of No.8 building, No.115, Zhangcha Road 1, Chancheng district, Foshan city, Guangdong Province, P.R. China
Product Name	:	SOLAR INVERTER
Brand Name	:	MUST
Identification	:	Model No. : PV18-2524 VPM, PV18-1012 VPM
		Rating : Refer to test report
Test Report No.	:	SZNTC2112097SV30
Standard	:	EN 62109-2 : 2011 EN 62109-1 : 2010

CE

Vic Wang
April 08, 2022

The certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above-mentioned product. Technical data and declarations are of the applicant's responsibility. The sample submitted/tested sample is in conformity with all provisions of Article of Council Directive 2014/35/EU, referred to the Low Voltage Directive. This certificate does not imply assessment of the production and does not permit the use of CE mark.

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

CERTIFICACION DE SUPERVISION

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**CERTIFICACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 313** Versión: 001 Fecha: Enero de 2021

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. : 100-103-13-09-0010-2022 DE 2022

CERTIFICA

Que, el contratista YACON INGENIERÍA SAS identificada con **NIT: 9 0 1 . 3 6 8 . 6 7 2 – 8** y Representada legalmente por **YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ**, quien se identifica con cedula de ciudadanía No. **1.118.542.109 YOPAL-CASANARE** han cumplido a satisfacción con el **100%** de las actividades derivadas del contrato de obra **N: 100-103-13-09-0010-2022 DE 2022** , cuyo objeto es **""CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"** ; durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2022 al 18 de enero de 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban a los_____

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

ENTRADA A ALMACEN MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
NIT: 892099325-0

Fecha 26/07/2023
Página. 1

ENTRADA NRO: 00186

Entrada por

Nro de Entrada : 00186
Fecha : Marzo 22 de 2023
Proveedor: 901368672 YACON INGENIERIA SAS
Transacción: 001 Entrada por Compras
Observaciones: CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS PITS EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ- META

Factura : FEV 28 13/07/2023
Contrato Nro: 100103130900102022

Referencia	Detalle	Unid	Cantidad	Vlr unit con Iva	Iva	Vlr Total
Categoria:	102022 ELEMENTOS CONTRATO PITS					
1020220201	CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS PITS (SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ON-OFF DE 12000 BTU INCLUYE UNID INTERI Y EXTER Y SISTEMA -	UND	2,00	96.656.716,62	0,00	193.313.433,24
				Total Categoria:		193.313.433.,24

Totales altas por compra Nro: 00186 193.313.433,00
Fecha : Marzo 22 de 2023 Proveedor: 901368672 YACON INGENIERIA SAS

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
	Total:		

MARIA JOSE GUTIERREZ BERMUDEZ
ALMACENISTA GENERAL
Quien Recibe

YACON INGENIERIA SAS
CC 901368672
Quien Entrega

Elaboro: VALENTINA ESTRADA URREGO

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

ROZO CONTADORES SAS
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONTABLES FINANCIERAS

ROZO CONTADORES SAS **NIT: 901441057-1**

Villavicencio , 30 de agosto de 2023

EL SUSCRITIO
CONTADOR PUBLICO
CERTIFICA QUE:

YACON INGENIERIA SAS con Nit: 901368672-8, representada legalmente por el señor **YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1. 1 1 8. 5 4 2. 1 0 9 de Yopal (Casanare) ha efectuado en forma correcta y oportuna durante los últimos seis meses, los aportes correspondientes al sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, y Aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y que las liquidaciones contenidas en las declaraciones de autoliquidación de aportes a estos sistemas y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos base de cotización es correcta y se ajusta a esta normatividad; todo esto de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 9° de la ley 828 de 2003. y ley 1607 de diciembre de 2012.

Por lo tanto, YACON INGENIERIA SAS Y YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.


Cordialmente,


Adriana María Rozo Barreto
Contador Publico
TP: 274589- T

Cra 3 No. 30 a -58 Villavicencio - Meta
Cel: 3123954935, Email: rozocontadores@gmail.com

ROZO CONTADORES SAS
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONTABLES FINANCIERAS

ROZO CONTADORES SAS

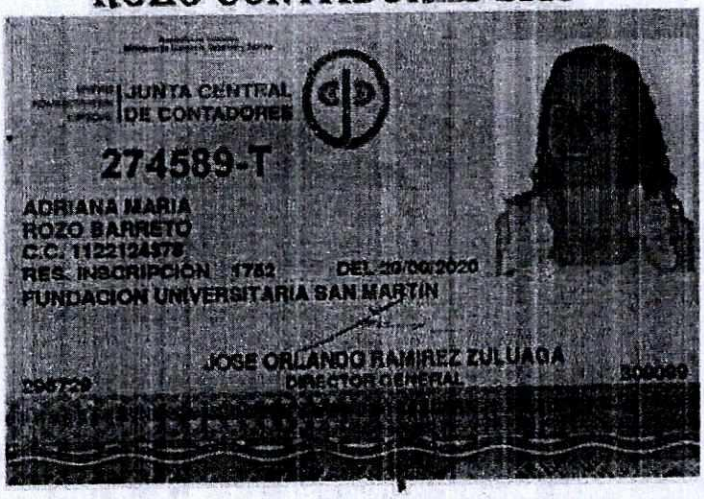

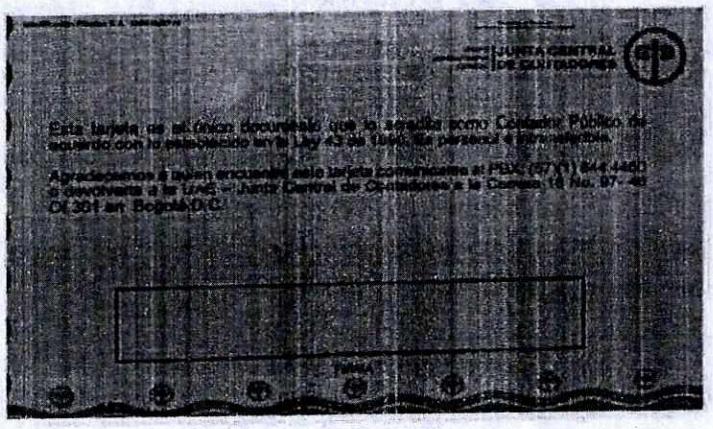

Cra 3 No. 30 a -58 Villavicencio - Meta
Cel: 3123954935, Email: rozocontadores@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 5 5 8 9 1 F 9 6 2 D 5 E E A F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MARIA ROZO BARRETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122124376 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 274589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA

	ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA	Codigo: F - 244 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

CONTRATO N°	100-103-13-09-0010-2022	PROYECTO N°	NA
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"		
OBJETO DEL PROYECTO:	NA		
CONTRATISTA:	YACON INGENIRIA SAS R.L. YAURIS CONTRERA RODRIGUEZ		
NIT:	901.368.672-8		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	NA		
SUPERVISOR	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	23/11/2022 A 30/11/2022
PLANILLA N°	9435986655-9459123575		

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION			Caja de Compensación	Ingreso Base de Cotización
							EPS	PENSION	ARL		
RODRIGO VALENCIA CHAVEZ	DIRECTOR DE OBRA	17.344.951	INDEPENDIENTE	27/11/2022	NA	$ 2.000.000,00	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	NA	$ 2.000.000,00
HECTOR ALFREDO FORERO	RESIDENTE DE OBRA	17.306.451	INDEPENDIENTE	27/11/2022	NA	$ 1.200.000,00	SANITAS	PENSIONADO	SURA	NA	$ 1.200.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos, incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

YACON INGENIRIA SAS
R.L. YAURIS CONTRERA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

RODRIGO VALENCIA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-58611 CND

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ASIGNADO

ADRIANA MARIA ROZO BARRETO
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: TP 274589-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente todas las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1734[illegible]		VALENCIA CHAVEZ RODRIGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 23 62	GRANADA-META	7[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-11	2022-11	[illegible]	[illegible]	I	2022/12/12	2022/12/09	BANCO DAVIVIENDA		$1,475,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1734[illegible]	VALENCIA CHAVEZ RODRIGO	3[illegible]	30	$5,000,000	$[illegible]			$5,000,000	$[illegible]			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Total Afiliados(1)					$5,000,000	$[illegible]			$5,000,000	$[illegible]			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/12/09 07:24 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1734951		VICTHCIA CHAVEZ RODRIGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 25 62	GRANADA-META	7951097	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	94865 40522	94359886S5	1	2022/12/12	2022/12/09	BANCO DAVIVIENDA		$1,475,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$0	$850,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	0	1	$850,000	$0	$850,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$625,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$625,000	$0	$625,000
TOTAL				1	$1,475,000	$0	$1,475,000

2022/12/09 07:24 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17344953		VALENCIA CHAVEZ RODRIGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 23 62	GRANADA-META	7955097	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1496540522	5439986455	I	2022/12/12	2022/12/09	BANCO DAVIVIENDA		$1,475,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: GRANADA Depto: META (1 Afiliados)					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
X	CC	17344953	VALENCIA CHAVEZ RODRIGO	220301	30	$5,000,000	$95617	30	$5,000,000	$625,000		1	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/12/09 07:24 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17306451		FORERO VELASQUEZ HECTOR ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 26 # 41 A -43 BARRIO LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	6640102	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	292045280	94593123575	I	2022/12/14	2023/11/22	BANCOLOMBIA	343	$403,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	17306451	FORERO HECTOR	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$62,400	$0	$222,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$62,400	$0	$222,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$2,100	$0	$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$2,100	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$48,800	$0	$173,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$48,800	$0	$173,800
TOTAL				1	$290,300	$113,300	$0	$403,600

2023/11/22 10:47 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17306451		FORERO VELASQUEZ HECTOR ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 26 # 41 A -42 BARRIO LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	6640102	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	292045280	94591 21575	I	2022/12/14	2023/11/22	BANCOLOMBIA	343	$403,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD						
	Fecha Inicio ret	Fecha Fin ret		Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl		Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	
						$ 1.000.000	No		COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	16.0%	DI RIESGO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000		SANITAS	30	$ 1.000.000	12.5%	$ 125.000	$	
																					$ 160.000						$ 125.000		

2023/11/22 10:47 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$ 125.000			0	$ 0	0%	$	CAJA SURA	30	$ 1.000.000	0.522%	I	$ 5.300	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	No
	$ 125.000						$ 0						$ 5.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2023/11/22 10:47 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17304451		FORERO VELASQUEZ HECTOR ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 26 # 41 A -43 BARRIO LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	6640102	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	292045282	94589123575	I	2022/12/14	2023/11/22	BANCOLOMBIA	343	$403,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$62,400	$0	$222,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$62,400	$0	$222,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$2,100	$0	$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$2,100	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$48,800	$0	$173,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$48,800	$0	$173,800
TOTAL				1	$290,300	$113,300	$0	$403,600

2023/11/22 10:47 AM

	ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA	Código: F - 244 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

CONTRATO N°	**100-103-13-09-0010-2022**	**PROYECTO N°**	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"		
OBJETO DEL PROYECTO:	NA		
CONTRATISTA:	YACON INGENIRIA SAS R.L. YAURIS CONTRERA RODRIGUEZ		
NIT:	901.368.672-8		
CONTRATO DE	NA		
SUPERVISOR	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01/01/2023 A 18/01/2023
PLANILLA N°	9448640364-9448640740-		

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION			Caja de Compensación	Ingreso Base de Cotización
							EPS	PENSION	ARL		
RODRIGO VALENCIA CHAVEZ	DIRECTOR DE OBRA	17.344.951	INDEPENDIENTE	27/11/2022	NA	$ 2.000.000,00	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	NA	$ 2.000.000,00
HECTOR ALFREDO FORERO	RESIDENTE DE OBRA	17.306.451	INDEPENDIENTE	27/11/2022	NA	$ 1.200.000,00	SANITAS	PENSIONADO	SURA	NA	$ 1.200.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos, incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

YACON INGENIRIA SAS
R.L. YAURIS CONTRERA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Rodrigo Valencia Chavez

RODRIGO VALENCIA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-58611 CND

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ASIGNADO

ADRIANA MARIA ROZO BARRETO
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: TP 274589-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Adjuntar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, tal como lo indican los N° de matrícula profesional, deben ser diligenciados en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901368672	8	YACON INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YACON	DG 6SUR N 42 110 TRR 25	VILLAVICENCIO-META	477777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1827717565	94444403 42	E	2023/01/18	2022/12/22	BANCOLOMBIA	0	$341,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YACON (1 Afiliados)					$0	$0			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$83,600		$1,200,000	$69,000
Centro de Trabajo: YACON (1 Afiliados)					$0	$0			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$83,600		$1,200,000	$60,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$83,600		$1,200,000	$60,000
1	CC 17394451	FONSECA VELASQUEZ HECTOR ALFREDO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$1,200,000	$60,000
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$83,600		$1,200,000	$60,000

ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PL

Resumen General de Pago

enlínea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901368672	8	YACON INGENIERIASAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YACON	DG 6SUR N 42 110 TRR 25	VILLAVICENCIO-META	4777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1827717565	94444403-42	E	2023/01/18	2022/12/22	BANCOLOMBIA	0	$341,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$0	$0	$83,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$83,600	$0	$0	$83,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,000	$0	$0	$150,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$0	$0	$36,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$36,000	$0	$0	$36,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$24,000	$0	$0	$24,000
TOTAL				1	$341,600	$0	$0	$341,600

YACON INGENIERIA SAS
NIT 901.368.672-8
DG 6 SUR 42 110 TO 25 AP 104 HC ROSABLANCA
Tel: (038) 3115782296
Villavicencio - Colombia
yacon.ingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 34

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		
NIT	892.099.325-0	**Teléfono**	6451867
Dirección	CL 6 4 40 BRR GUADALUPE	**Ciudad**	Puerto López - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2023, 09:23
Expedición	19/12/2023, 09:24
Vencimiento	19/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS PITS EL EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ	1.00	19,601,742.51

Total items: 1

Valor en Letras: Diecinueve millones seiscientos un mil setecientos cuarenta y dos pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Total Bruto	19,601,742.51
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,601,742.51

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 19,601,742.51

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060592327 aprobado en 20231123 prefijo FEV desde el número 31 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5 x 1000
CUFE: d1abfbf026aa906d0653ea6f27a6e28614c0eb411ec2802f49fb079eb25909d6d8613ac0727a24153f477355d591810e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 14769819099

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 6 8 6 7 2 — 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio — 2 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: YACON INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Meta — 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio — 0 0 1

41. Dirección principal: DG 6 SUR 42 110 TO 25 AP 104 H C ROSABLANCA

42. Correo electrónico: yacon.ingenieria@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 1 5 7 8 2 2 9 6

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 0 0 1 1 1	4 2 9 0	2 0 2 0 0 1 1 1	1: 4 3 3 0	2: 4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 07 - 21 / 12 : 33 : 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CONTRERAS RODRIGUEZ YAURIS

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-07-2021 12:41:19PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14769919099

6. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 8 6 7 2	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 1 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	3 6 3 3 9 5	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 2 1 0	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 1 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 2 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 21-07-2021 12:41:19PM

DIAN
POR UNA EDUCACIÓN MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14769919099

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 6 8 6 7 2 | 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio — 2 2

14. Buzón electrónico:

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN — 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 9 1 2 1 0

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní — 1 3

101. Número de identificación: 1 1 1 6 5 4 2 1 0 9

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: CONTRERAS

105. Segundo apellido: RODRIGUEZ

106. Primer nombre: YAURIS

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

2

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido:

105. Segundo apellido:

106. Primer nombre:

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

3

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido:

105. Segundo apellido:

106. Primer nombre:

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

4

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido:

105. Segundo apellido:

106. Primer nombre:

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

5

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido:

105. Segundo apellido:

106. Primer nombre:

107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

COPIA CONTROLADA SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-07-2021 12:41:19PM

YACON INGENIERIA SAS
NIT: 901.368.672-8

CONTRATO DE OBRA N° 100-103-13-09-0010-2022

"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"

ACTA JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	YACON INGENIERÍA SA NIT. 9 0 1 . 3 6 8 . 6 7 2 - 8 YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ C.C. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR TÉCNICO	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
OBJETO:	"CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ"
VALOR:	$193.313.433,26
FORMA DE PAGO:	El municipio pagará al contratista un único pago parcial hasta el 90% del valor del contrato al presentar acta de terminación, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor del acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (90%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la Interventoría, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados. c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.
VALOR ACTUALIZADO:	$193.313.433,26
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA	28 DE DICIEMBRE DE 2022
TIEMPO DE PRORROGA	VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	18 DE ENERO DE 2023

TIEMPO	01	MES	20	DIAS

JUSTIFICACION

En el municipio de Puerto López: Departamento de Meta a los, treinta (30) días del mes de agosto del 2023, se suscribió la siguiente acta por parte YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ, en calidad de representante legal de YACON INGENIERÍA SAS, quien actúa

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021

como CONTRATISTA, La Ingeniera MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa como Supervisor del contrato ; con el fin de liquidar los costos de los imprevistos que se presentaron en el Contrato No. 100-103-13-09-0010-2022 DE 2023 SUSCRITO EL 23 DE noviembre de 2022, en cumplimiento con las obligaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2022 y 18 de enero de 2023.

En la ejecución del proyecto fue necesario realizar reparaciones locativas y mejorar el proceso constructivo diseñado inicialmente para la cubierta de los puntos de información (PITS), como quiera que por las condiciones climáticas del municipio de Puerto Lopez-Meta registran altas temperaturas; lo que genera una exposición directa del sol a la cubierta instalada en lamina de policarbonato alveolar 6 mm , por ende esto género que al instalar la madera rolliza d=0.12 m inmunizada , que es la cubierta a la vista de los PITS. Durante el tiempo de ejecución previo a la entrega presentara un efecto de pandeo por falta de aislante al calor entre cubiertas.

La solución adoptada fue el retiro del módulo, cubierta en madera rolliza d=0.12 m inmunizada y previo a su instalación se implemento con la ayuda de espuma en fibra de vidrio, un aislante de calor para que ayuda a que el efecto del sol contrarreste al contacto con madera y garantice que esta actividad ejecutada cumpla con las condiciones de durabilidad, estabilidad y calidad para la cual fue diseñada.

A la fecha los dos (2) puntos de información (PITS),, no presentan pandeamiento ni fracturas en la cubierta en madera rolliza.

OBJETO CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA: GBL			
DESCRIPCION	**CANTIDAD (UND)**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
REPARACIONES LOCATIVAS A CUBIERTA CONSTRUIDA EN MADERA ROLLIZA D=0.12 M INMUNIZADA	1	$1.500.000	$1.5|00.000

YACON INGENIERIA SA
NIT.901.368.672-8
YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


Código Postal 503001
Calle 6 No 4 – 40
Teléfonos 6450417 – 6451647

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021


REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO PREVIO A LA INTERVENCION

PUNTO DE INFORMACION N°01 CLL 5 # 11-93 PUERTO LOPEZ -META

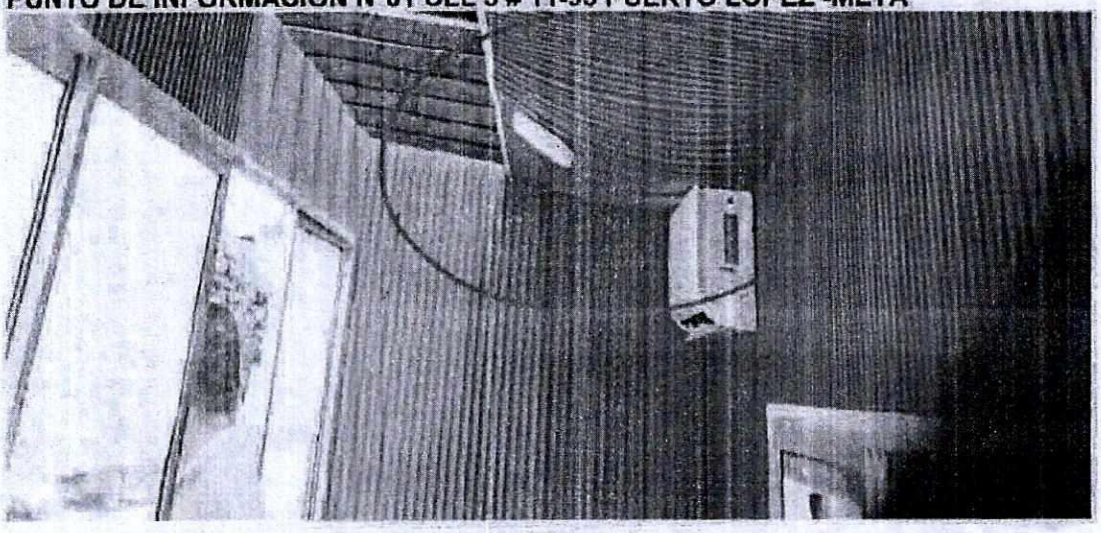


PUNTO DE INFORMACION N°02 AV. 14 #16-209ª 16-181 PUERTO LOPEZ -META

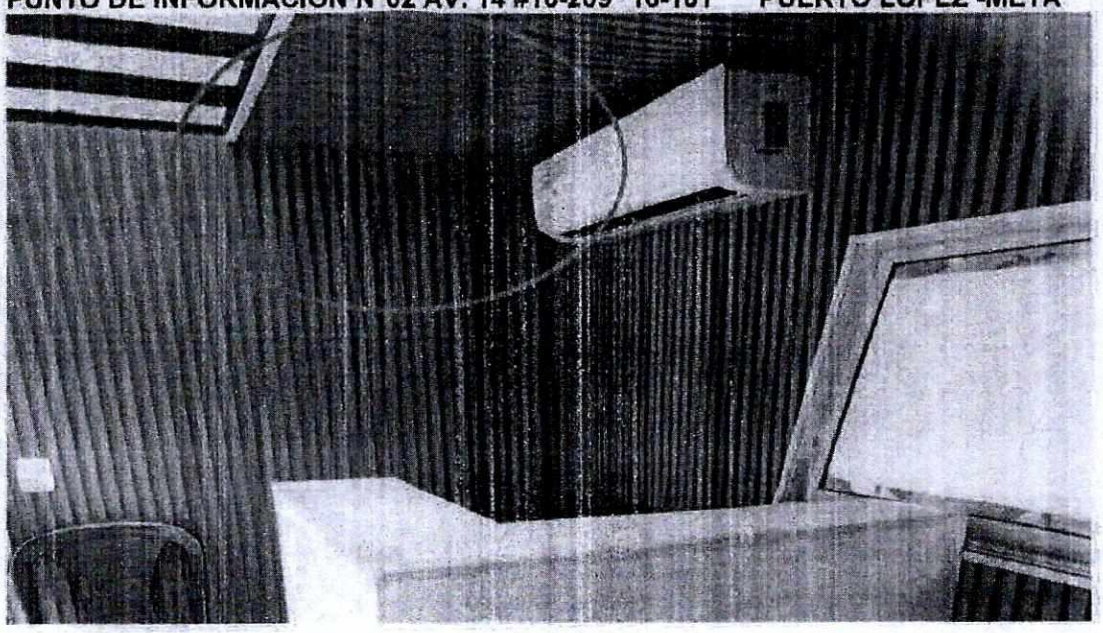

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021

REGISTRO PREVIO ACTUAL DE LOS PUNTOS DE INFORMACION

PUNTO DE INFORMACION N°01 CLL 5 # 11-93 PUERTO LOPEZ -META

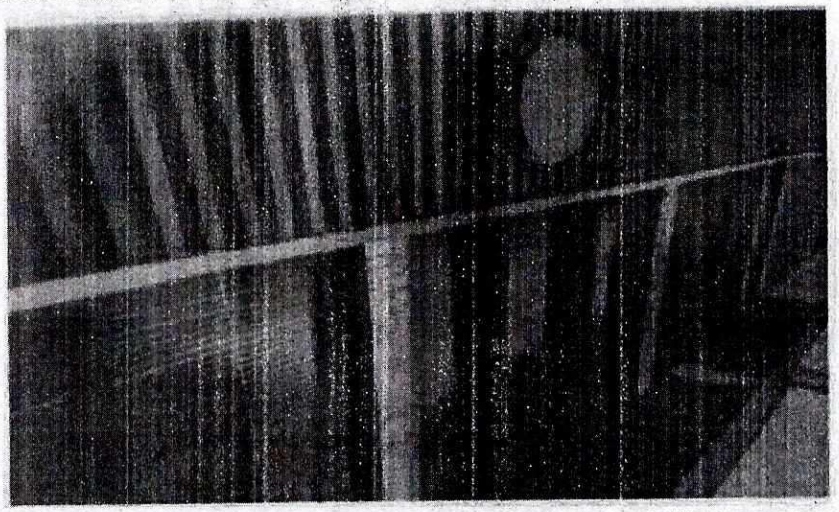


PUNTO DE INFORMACION N°02 AV. 14 #16-209ª 16-181 PUERTO LOPEZ -META


ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021

REGISTRO PREVIO ACTUAL DE LOS PUNTOS DE INFORMACION

PUNTO DE INFORMACION N°01 CLL 5 # 11-93 PUERTO LOPEZ -META

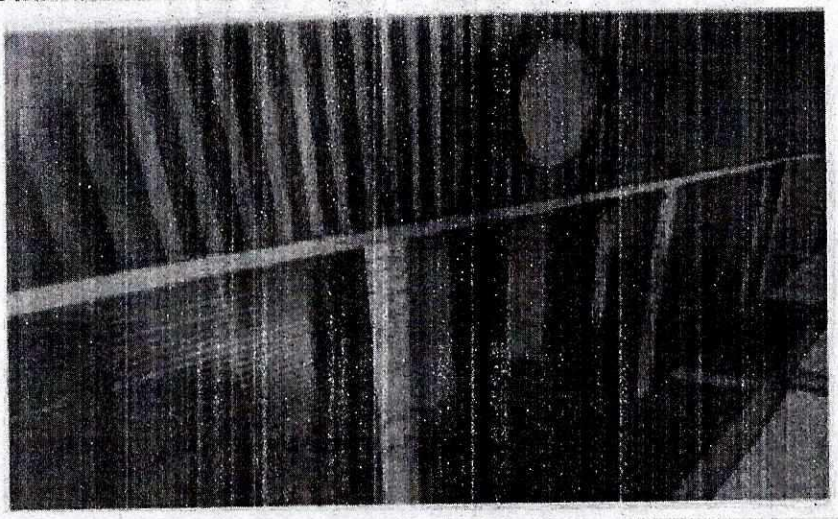

PUNTO DE INFORMACION N°02 AV. 14 #16-209ª 16-181 PUERTO LOPEZ -META

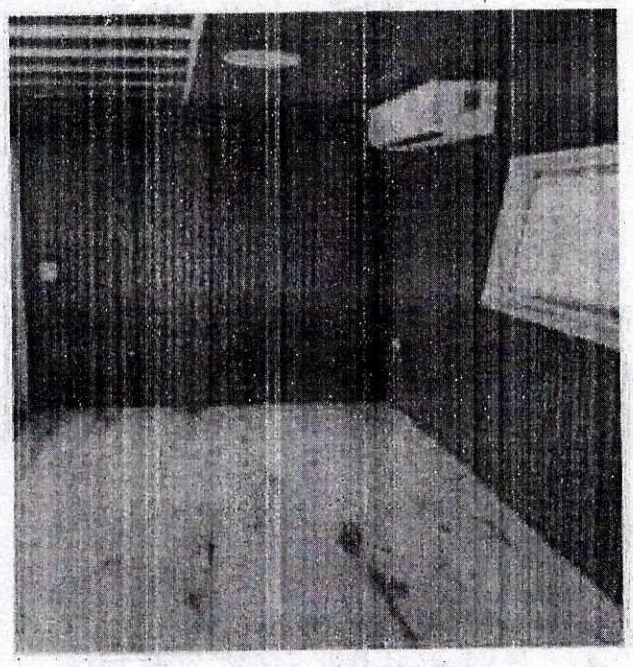

Código Postal 502001
Calle 8 No. 4 – 30
Teléfono 6450417 – 6451580



CONTRATO DE OBRA CIVIL

Entre los suscritos, de una parte, el señor(a) **YACON INGENIERÍA SA** mayor y vecino(a) de la ciudad de **PUERTO LOPEZ- META**, identificado(a) con. **NIT. 9 0 1. 3 6 8. 6 7 2 - 8**, quien en adelante se denominará el Contratante, y de otra parte el señor **JAVIER EMIGDIO ROMERO MUÑOZ,** mayor y vecino de la ciudad de **PUERTO LOPEZ- META**, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. **17.386.372**, quien en adelante se denominará el Contratista, celebran por medio de este documento un Contrato de Obra Civil, que se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las siguientes cláusulas:

Primera. Objeto. En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga con el contratante a ejecutar las obras de REPARACION LOCATIVO CUBIERTA CONSTRUIDA EN MADERA ROLLIZA D=0.12 M INMUNIZADA".

INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	JAVIER EMIGDIO ROMERO MUÑOZ C.C. 17.386.372 PUERTO LOPEZ-META			
CONTRATISTE	YACON INGENIERÍA SA NIT. 9 0 1 . 3 6 8 . 6 7 2 - 8 YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ C.C. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**			
OBJETO:	"REPARACION LOCATIVO CUBIERTA CONSTRUIDA EN MADERA ROLLIZA D=0.12 M INMUNIZADA"			
VALOR:	$1.500.000			
FORMA DE PAGO:				
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022			
FECHA DE TERMINACION	10 DE ENERO DE 2023			
TIEMPO	00	MES	20	DIAS

YACON INGENIERÍA SA
NIT. 9 0 1 . 3 6 8 . 6 7 2 - 8
YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE

JAVIER EMIGDIOROMERO MUÑOZ
C.C. 17.386.372 PUERTO LOPEZ-META

PUERTO LOPEZ, META 25 DE DICIEMBRE 2022

Cuenta de cobro 001

YACOM INGENIERIA SA
Nit. 901.368.672-8

O

YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. No. 1.118.542.109 YOPAL-CASANARE

DEBE A:

JAVIER EMIGDIO ROMERO MUÑOZ con C.C. No. **17.386.372** de **PUERTO LOPEZ META**, por concepto de reparación locativas a la cubierta en madera rolliza D=0.12 M inmunizada en el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 100-103-13-09-0010-2022** cuyo objetivo es **CONSTRUCCION PUNTOS DE INFORMACION TURISTICOS (PITS) EN EL CASCO URBANO DE PUERTO LOPEZ. LA SUMA DE: $1.500.000 m/cte**

Cordialmente,

JAVIER EMIGDIO ROMERO MUÑOZ
C.C. No. 17.386.372 de PUERTO LOPEZ META
Teléfono. 3208282366
Dirección. CL 13ª 41-32 BRR CIUDADELA SAN ANTONIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

17.386.372
ROMERO MUÑOZ

JAVIER EMIGDIO





DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

14824[illegible]4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 17386377 | 3 — 6. DV — 12. Dirección seccional 22 — 16. Fecha inscripción

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13
26. Número de identificación: 17386377
27. Fecha expedición: 19821119
Lugar de expedición: COLOMBIA
28. País: 169
29. Departamento: Meta 50
30. Ciudad/Municipio: Puerto López 573
33. Primer apellido: ROMERO
32. Segundo apellido: MUÑOZ
31. Primer nombre: JAVIER
34. Otros nombres: EMIGDIO
35. Razón social
36. Nombre comercial
37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169
39. Departamento: Meta 50
40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 001
41. Dirección principal: CL 13 A 41 32 ESTE BRR CIUDADELA SAN ANTONIO
42. Correo electrónico: [illegible]
44. Teléfono 1: 3206282366
45. Teléfono 2
46. Código postal

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
42. Código	43. Fecha inicio actividad	42. Código	43. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2 3	51. Código	52. Número establecimientos
4230	20060926	4752	20170308	4023	1210	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 40
05 - Impto renta y cmplm régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Semestral 1 2 3
57. Monto
58. CIIU

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexa: SI [ ] NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2022-04-21 10:05:05

La inscripción efectuada a través del Formulario Único de Inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz. En caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.29 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

964. Nombre: ROMERO MUÑOZ JAVIER EMIGDIO
965. Cargo: CONTRIBUYENTE
