

“CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA”

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME TÉCNICO N° 12
1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES 1
1. INTRODUCCION 3
2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 3
2.1 CONTRATO DE OBRA No. 024-2022 4
2.2 GENERALIDADES..... 5

3 OBJETIVOS 6
4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 7
5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO 8
6 POLIZAS DEL CONTRATO 9
7 CAPITULO FINANCIERO 13
8 VIAS ASIGNADAS 14
9 ACTIVIDADES REALIZADAS 18
9. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 24
10. CONCLUSIONES 25
11. ANEXOS 26

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion 4
Ilustración 2.Localizacion general 6
Ilustración 3. Localización Cazuca…… 6

1. INTRODUCCION

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales de un país y refleja el estado del Progreso de una sociedad; visto así, como un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de individualidad para su desenvolvimiento físico, social, cultural y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que lleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país.

La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, quiénes con su compromiso de gestión de autocuidado en salud y de y con el firme apoyo de la organización actuarán contra los peligros y riesgos laborales en busca de prevención de incidentes, accidentes y de enfermedades de en el ámbito laboral.

El consorcio Gamer Soacha, reconoce el talento humano como su recurso más valioso, entendiendo que la seguridad y la salud en el trabajo es una condición necesaria, para el bienestar de sus trabajadores y la productividad. Por lo tanto realizará acciones para promover preservar y mejorar las condiciones del ambiente laboral la salud de los trabajadores de las personas que intervienen en la ejecución de los procesos productivos

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

2.1 <u>CONTRATO DE OBRA No. 024-2022</u>

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.


NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO GAMER SOACHA**
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**3443-2021**
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	<u>04 DE MAYO DE 2022</u>
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($

	4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
MODIFICATORIO N° 1 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PRORROGA N° 1 FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUCION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 11 DE OCTUBRE DE 2022 4 MESES 31 ENERO DE 2023 31 MAYO DE 2023
PRORROGA N° 2	31 DE MAYO DE 2023
VALOR ADICION AL CONTRATO	$2.256.276.732.67
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICION	6.759.182.392.67
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

2.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Casuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

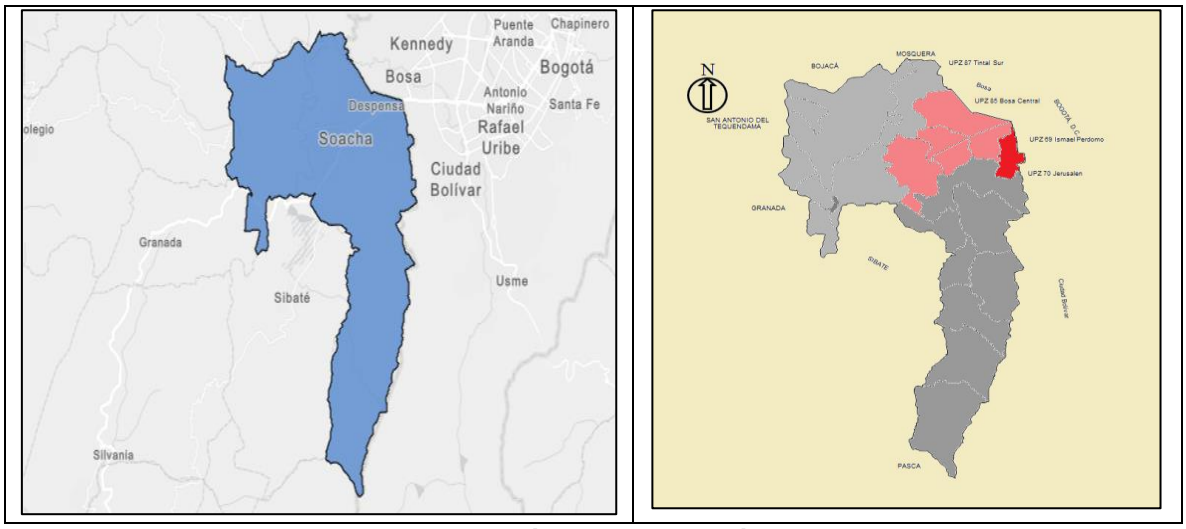

lustración 1.Localización

Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"** donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.

En el presente Informe Técnico No 06, durante al periodo comprendido entre 5 Marzo del 2023 al 8 abril de 2023, se resume la información relevante al avance en el periodo en reporte y a la vez se da alcance como soporte del acta N° 6 del contrato de obra 024-2022, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas por el CONSORCIO GAMER SOACHA, el personal, certificados de calidad de los materiales, consolidación del avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.

3 OBJETIVOS


Informar sobre las diferentes actividades adelantadas por el consorcio Gamer Soacha desarrolló en el período de diciembre a enero relevantes a la ejecución del contrato 024 de 2022 cuyo objeto "Construcción rehabilitación de las vías de obras de urbanismo en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca".


4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto "**CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".** El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).2 Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

Lustración 2.Localización General

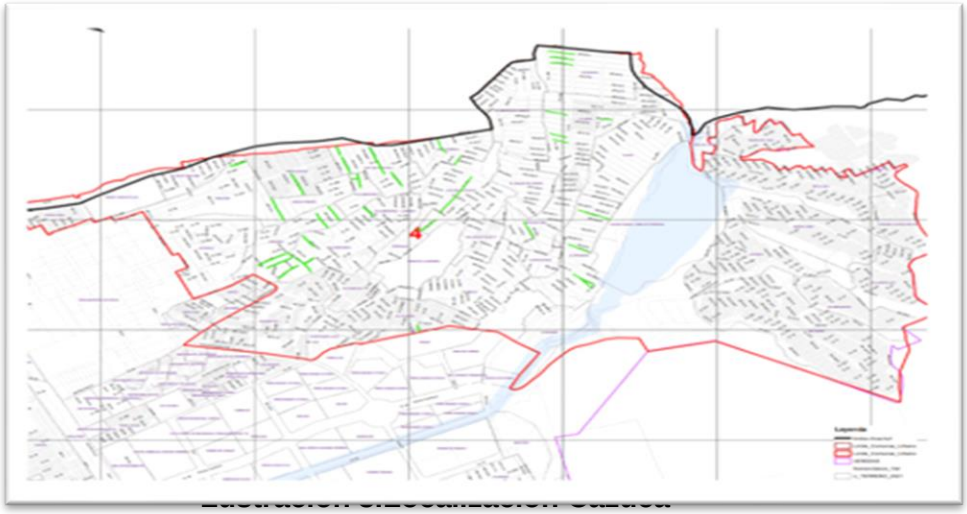

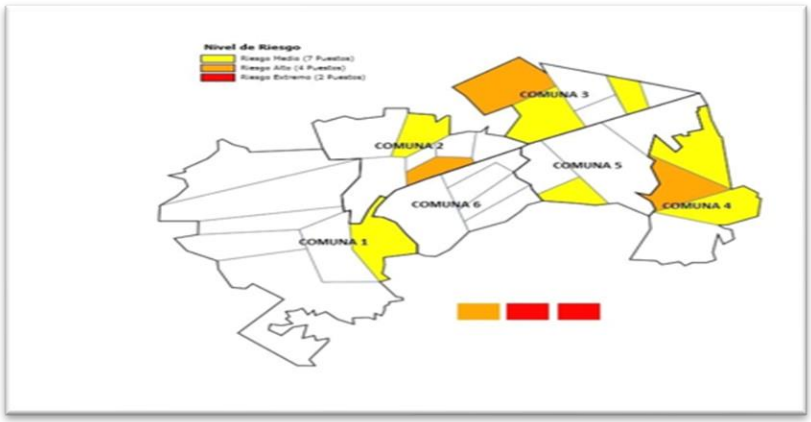

CAZUCA COMUNA 4.

BARRIÓ SANTO DOMINGO Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

4.2. Vías de Acceso a la comuna 4 – Cazuca

# TRAMO	DIRECCION
1	CRA 24 E 59-61
2	CRA 25 E 59-57
3	CRA 25 E 59-61
4	CRA 27 CON 39A -CURA
5	CALLE 27 E 43 D
6	CALLE 43D CON 27
7	CALLE 49 ENTRE 17C-19
8	CRA 19 ENTRE 59-51
9	CALLE 50 17C -21
10	CALLE 51 ENTRE 27-27D
11	CALLE 43D E TRE 27F 27D EMPALME
12	CRA 21 A ESTE 59-77 C -BOGOTA

4.2.1 Via Cra 2 entre 56-60 ZONA INDUSTRIAL CAZUCA

5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO

En el presente informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, lo cual se desarrolló a cabalidad para la entidad contratante que es la Epuxua Avanza E.I.C.E la empresa pública del municipio de Soacha.

Dando claridad que el contrato en mención se le dio inicio el 01 de agosto del 2022 y a su vez dando alcance a lo requerido contractualmente para el buen desarrollo y ejecución del contrato, se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.			
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	DIRECTOR DE OBRA	30 %	consorciogamer024@gmail.com
ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	RESIDENTE DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	INSPECTOR 1	100 %	consorciogamer024@gmail.com
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	INSPECTOR 2	100 %	consorciogamer024@gmail.com
DEICY LORENA BELLO RIVERA	PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com

6 POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocosering SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 5 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual) Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023

Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101023833	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,20	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/05/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/11/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 1 Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$4.055.509.435,60	01/06/2023	01/11/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$1.351.836.478,53	01/06/2023	01/05/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$675.918.239,27	01/06/2023	01/11/2026
	Estabilidad de la obra.		$2.027.754.717,80	01/11/2023	01/11/2028

Anexo 6 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/11/2023

7 CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO **.**
EL contrato tiene una adicion de $2.256.276.732.67 para un valor total del contrato y adicion $6.759.182.392.67

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	$ 6.759.182.392.67
Acta No. 1	$ 649.376.068,00
Acta No. 2	$ 727.213.483,00

Acta No. 3	$ 1.003.532.431,00
Acta No. 4	$ 451.030.346
Acta No .5	$ 666.543.025
Acta No .6	$4864.672.910
Acta No .7	$ 520.537.357
Acta No. 8	$ 528.988.355
Saldo Actual	$ 1.727.288.377.67
Avance ejecutado financiero	74.25%

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

8 VIAS ASIGNADAS

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura:

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaría de infraestructura previa aprobación y

aceptación de los interesados, Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

A corte del acta N° 8 en reporte, se relaciona las vías en intervención e intervenidas a la fecha corte .

Tabla 4. Vías en intervención

NUM_CONV	VIA	ESTADO
1	CRA 24 B ESTE ENTRE 59 -58	INTERVENIDA
2	CRA 24 ESTE 59-61	INTERVENIDA
3	CALLE 49 CRA 19 E -17	INTERVENIDA
4	CALLE 50 ENTRE 17C-21	INTERVENIDA
5	CRA 26 A ESTE CALLE 56B-59	INTERVENIDA
6	CRA 25 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
7	CRA 25 ESTE CALLE 57-59	INTERVENIDA
8	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 58	INTERVENIDA
9	CALLE 55 ENTRE CRA 26 Y 26 C ESTE	INTERVENIDA
10	CALLE 53 A ENTRE CRA 26 Y 26 CESTE	INTERVENIDA
11	CALLE 55 ENTRE CRA 26 C Y 27	INTERVENIDA
12	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
13	CRA 26 ESTE ENTRE CSLL 58-59	INTERVENIDA
14	CRA 26 B ESTE CALLE 56A-59	INTERVENIDA
15	CRA 24B ESTE 59-60	INTERVENIDA
16	CALLE58 ENTRE 26A ESTE- 26 B ESTE	INTERVENIDA
17	CRA 26 C ESTE ENTRE 53- 57	INTERVENIDA
18	CRA 19 ESTE CON 49-50	INTERVENIDA
19	CRA 27C ESTE ENTRE CALLE 39 A SUR (VIA CURA)	INTERVENIDA
20	CRA 27 D ENTRE CALLE 50-51	INTERVENIDA
21	CRA 27 CON CALLE 43 D Y 43F	INTERVENIDA
22	CALLE 43D CRA 27 ESTE	INTERVENIDA
23	CRA 27D ESTE CON CALLE 44 -50	INTERVENIDA
24	CALLE 50 ENTRE 27 F Y 27D	ENTREGADA
25	CRA 27 ESTE CALLE 51-53	INTERVENIDA
26	CRA 22 B ESTE 56A-59	ENTREGADA
27	CALLE 51 CRA 27	INTERVENIDA
28	CRA 22B ESTE ENTRE CALLES 50-54	ENTREGADA
29	CALLE 52 ENTRE CRA 20-22	ENTREGADA
30	CRA 27 A ESTE CALLE 56 A -59	INTERVENIDA
31	CRA 26 ESTE CALLE 59-61	INTERVENIDA
32	CALLE 56 A CRA 26-27	INTERVENIDA
33	CALLE 57 CRA 26C-26B	INTERVENIDA

34	CALLE 56B CRA 27 ESTE -CRA 27AESTE	INTERVENIDA
35	CALLE 56 B CRA 26A-CRA 26	INTERVENIDA
36	CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 59 Y 61	INTERVENIDA
37	CALLE 43 BIS ETRE TV 19 A ESTE -19 ESTE	ENTREGADA
38	CALLE 42A ENTRE TV 19 ESTE -19	ENTREGADA
39	CRA 39 ESTE ENTRE CALLE 42 -ESCALERAS	ENTREGADA
40	CARRERA 32 A-CLL 44-59	FINALIZADA
41	DIAGONAL 44 A TV 35 E-CRA 37 E	FINALIZADA
42	TRANSVERSAL 35 ESTE	FINALIZADA
43	CRA 37 ESTE DG 43J-DG.45	FINALIZADA
44	CALLE 50 CRA 32 A CRA 31	FINALIZADA
45	CALLE 48 CRA 31E-32 E	FINALIZADA
46	TRANSVERSAL 34 ESTE 44B DG 43J	FINALIZADA
47	DIAGONAL 44 A TV 34 E-CRA 33 A E	FINALIZADA
48	CALLE 54 32 A ESTE-32ESTE	FINALIZADA
49	CRA 32 ESTE ENTRE CL 53 Y 54	FINALIZADA
50	CRA 28 ESTE CL 56A CL-59	FINALIZADA
51	CALLE 53 30-29	FINALIZADA
52	CRA 30 ESTE-CLL53 - CLLE 44	FINALIZADA
53	CRA 30 E CALLE 43C-44	FINALIZADA
54	CALLE 48 CRA 30E-31E	FINALIZADA
55	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
56	CRA 27 F ENTRE CALLE 43 B Y 44	FINALIZADA
57	CRA 27 D ENTRE CALLE 43 D Y 43F	FINALIZADA
58	CRA 27 D ENTRE CALLE 43F Y CALLE 44	FINALIZADA
59	CALLE 43 D ENTRE CR 27 Y CRA 27 D	FINALIZADA
60	CALLE 43 C ENTRE CRA 27F Y CRA 27 D	FINALIZADA
61	CRA 27 F ENTRE CALLE 44 Y 43B	FINALIZADA
62	CRA 28 ENTRE CALLE 43F	FINALIZADA
63	CRA 17 B ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
64	CRA 17 ESTE ENTRE CALLE 60A 61	FINALIZADA
65	CRA 17 A ESTE ENTRE CALLE 60A Y 61	FINALIZADA
66	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 B Y 30	FINALIZADA
67	CRA 26 C ESTE CLL 59	ENTREGADA
68	CRA 21 B ESTE DESDE CLL 61 HASTA CLL 50	ENTREGADA
69	CRA 33 A ESTE HASTA CLL 44	ENTREGADA
70	CRA 33 ESTE HASTA CLL 44	ENTREGADA
71	CRA 27 B ESTE CLL 59	ENTREGADA
72	CRA 21A ESTE ENTRE CALLE 59 -77C BTA	ENTREGADA
73	CRA 19 ENTRE CALLE 49 -50	INTERVENIDA



Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9 ACTIVIDADES REALIZADAS


Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades constructivas en los barrios Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán, El minuto, Los pinos, relacionadas a continuación con las respectivas vías intervenidas:

- Se retan actividades en la calle 50 entre 32ª -31 Muro Gabio, excavación en roca , geotextil , escaleras y rampa de acceso .
- Se inician excavaciones en conglomerado y maquina en la cra 2 entre 56-60 zona industrial cazuca
- Se realizan renivelaciones por lluvias según informe adjunto .
- Se realiza nivelación de rajon en la cra 2 entre 56-60 zona industrial
- Se realiza nivelación de sub base en la cra 2 entre 56-60 zona industrial
- Instalación de geotextil t2000 en cra 2 zona industrial cazuca
- Se realiza nivelación de base en la cra 2 entre 56-60 zona industrial
- Ejecución de concretos, mallas , aceros en la calle 50 entre 32a-31
- se reanudan actividades en la cra 24 entre 59-61 ya que se tenía en espera de la adicion del contrato por el municipio de Soacha, quien dio aval para continuar con la intervención en la vía. Se realiza renivelación, fundida de cintas , cunetas.
- Se realiza topografía de la cras 2 entre 56-60 zona industrial cazuca
- Ser reañoza entrega de mortero en la calle 50 entre 17-21, cra 19 con 50-49, calle 49 cra 48d cra 17b , cra 24 entre 59-61 ,calle 50 cra 32ª-31
- se realiza la instalación de Bordillos lateral para el confinamiento de la vía.
- Se realiza muro según diseño en la cra 27 d calle 43f -44
- Se realizan nivelaciones de cajas, nivelación pozos, reparación acometidas
- Instlacion de adoquin en la cra 50 entre 32ª-31 y cra 27 b calle 43c – 43f
- Se realizó en trasporte de material de excavación a la escombrera Magir Y Fundación semilleros de emprendimiento del municipio de Soacha, dia azul futuro verde.


Nota: Se realizaron las actividades anteriormente descritas y todas las relacionadas en el acta parcial 8

10 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

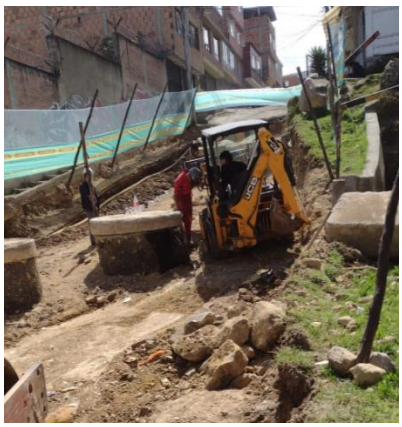  	EXCAVACION ROCA EN LA CALLE 50 ENTRE 32ª -31- CALLE 49 CRA 48D -17B; CALLE 50 ENTRE 17-21
 	EXCAVACION EN CONGLOMERADO CRA 2 ENTRE 56-60
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
  	SUBASE GRANULAR SBG1 CRA 2 ZONA INDUSTRIAL

	INSTALACIÓN BASE GRANULAR CRA 2 ZONA INDUSTRIAL
 	INSTALACIÓN RAJON CRA 2 ZONA INDUSTRIAL
	MEJORAMIENTO SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE
 	CONCRETO CLASE D f C 3000 PSI

 	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE REFUERZO 60000 PSI
 	CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR
 	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI
 	GAVION

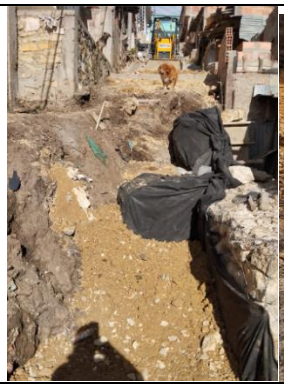 	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800
 	LOCALIZACION Y REPLANTEO
 	INSTALACION DE MORTERO 1:4
 	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO

 	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA DE 5/16 e 15
 	CAJAS DE INSPECCION DE 60*60
 	NIVELACION DE POZOS
	INSTLACION DE ADOQUIN DE 20*10*6 CM
  	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE 20*10*6

11 ACTAS DE COMITE

Según la fecha de la presenta acta se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos:

Tabla 8. Comités

COMITÉ N.	FECHA
36	29/06/2023
37	05/07/2023
38	07/07/2023
39	13/07/2023
40	27/07/2023
41	27/07/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el presente informe se radico la siguiente correspondencia:

Tabla 8. Correspondencia Recibida

No CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	RECIBIDO DE	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	17-04-2023	COCOSERING SAS	ENTREGADE DISEÑO DE ESCALERAS CRA 27F ESTE- CL 43D
CORREO ELECTRONICO	25-04-2023	COCOSERING SAS	SOLICITUD DE ARREGLO DE SARDINELES BRACARRERA 9 ENTRE CALLE 11 Y TV 7 VÍA INDUMIL.
CORREO ELECTRONICO	25-04-2023	COCOSERING SAS	SOLICITUD CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE 50 ENTRE CARRERA 31 Y 32 A ESTE DEL BARRIO SANTO DOMINGO.
CORREO ELECTRONICO	26-04-2023	COCOSERING SAS	RESPUESTA SOLICITUDES NP 13,14, 15.
CORREO ELECTRONICO	18-05-2023	COCOSERING SAS	ALCANCE A SOLICITUD DE ADICION CTO 3443-21 ID 23028 4-05-2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

Tabla 9. Correspondencia Enviada

No CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	18-07-2023	CONSORCIO GAMER SOACHA	DISEÑO GEOMETRICO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA ZONA INDUSTRIAL CRA 2 ENTRE CLL 56 Y CLL 60
CORREO ELECTRONICO	21-07-2023	CONSORCIO GAMER SOACHA	AJUSTE ÍTEM NP 10 NO APROBADO

10. CONCLUSIONES

.

- Las vías intervenidas son priorizadas por el municipio así mismo se emplean métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.

- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía.

- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, se han presentado reprocesos que han llevado a la ejecución de actividades como re nivelaciones para el mejoramiento de las subrasantes por ende se extiende un informe de las afectaciones climáticas soportando estos ítems de la presente acta.

- Para las vías según informe donde se realizaron cintas de concreto se debe tener claro que es para uso de vehiculo pequeño de poco peso, un mal uso como se ha visto en las vias fraguado de 28 dias o uso (carro pesado) puede afectar las cintas y los adoquines .

- El adoquin es instalado por la comunidad por lo cual el contratista no cubre garantía alguna..

11. ANEXOS

Certificado de Aportes del mes en reporte y planillas
Actas de comité técnicos
Certificados de materiales
Reporte de afectaciones por lluvia
Relación de material para disposición final
RUT
RIT



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

ANEXOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS

CONSORCIO GAMER SOACHA

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME
FACTOR CLIMATICO

CONSORCIO GAMER SOACHA

DISPOSICION FINAL DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

RUT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

RIT.

CONSORCIO GAMER SOACHA
