"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES 1

1. INTRODUCCION 3

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 4

2.1 CONTRATO DE OBRA No. 024-2022 4
2.2 GENERALIDADES 5

3 OBJETIVOS 6

4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 7

5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO 8

6 POLIZAS DEL CONTRATO 8

7 CAPITULO FINANCIERO 14

8 VIAS ASIGNADAS 15

9 ACTIVIDADES REALIZADAS 18

9. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA .....¡Error! Marcador no definido.

10. CONCLUSIONES 21

11. ANEXOS 22

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion 4
Ilustración 2.Localizacion general 6
Ilustración 3. Localización Cazuca 6

1. INTRODUCCION

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales de un país y refleja el estado del Progreso de una sociedad; visto así, como un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de individualidad para su desenvolvimiento físico, social, cultural y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que lleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país.

La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, quiénes con su compromiso de gestión de autocuidado en salud y de y con el firme apoyo de la organización actuarán contra los peligros y riesgos laborales en busca de prevención de incidentes, accidentes y de enfermedades de en el ámbito laboral.

El consorcio Gamer Soacha, reconoce el talento humano como su recurso más valioso, entendiendo que la seguridad y la salud en el trabajo es una condición necesaria, para el bienestar de sus trabajadores y la productividad. Por lo tanto realizará acciones para promover preservar y mejorar las condiciones del ambiente laboral la salud de los trabajadores de las personas que intervienen en la ejecución de los procesos productivos

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

2.1 CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.


NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO GAMER SOACHA**
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**3443-2021**
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023

VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
MODIFICATORIO N° 1 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PRORROGA N° 1 FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUCION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 11 DE OCTUBRE DE 2022 4 MESES 31 ENERO DE 2023 31 MAYO DE 2023
PRORROGA N° 2	31 DE MAYO DE 2023
VALOR ADICION AL CONTRATO	$2.256.276.732.67
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICION	6.759.182.392.67
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

2.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Casuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

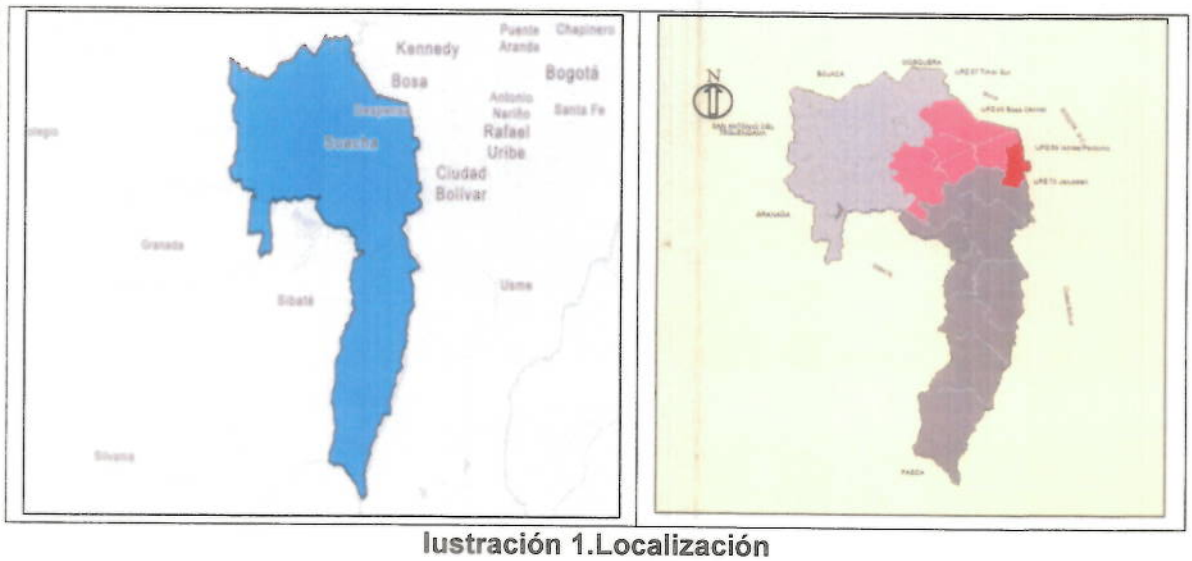

Iustración 1.Localización

Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"** donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.

En el presente Informe Técnico No 15, durante al periodo comprendido entre 1 AL 30 SEPTIEMBRE de 2023, se resume la información relevante al avance en el periodo en reporte y a la vez se da alcance como soporte de obra 024-2022, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas por el CONSORCIO GAMER SOACHA, el personal, certificados de calidad de los materiales, consolidación del avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.

3 OBJETIVOS


Informar sobre las diferentes actividades adelantadas por el consorcio Gamer Soacha desarrolló en el período de diciembre a enero relevantes a la ejecución del contrato 024 de 2022 cuyo objeto "Construcción rehabilitación de las vías de obras de urbanismo en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca".


4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto "**CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".** El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).2 Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

Lustración 2.Localización General

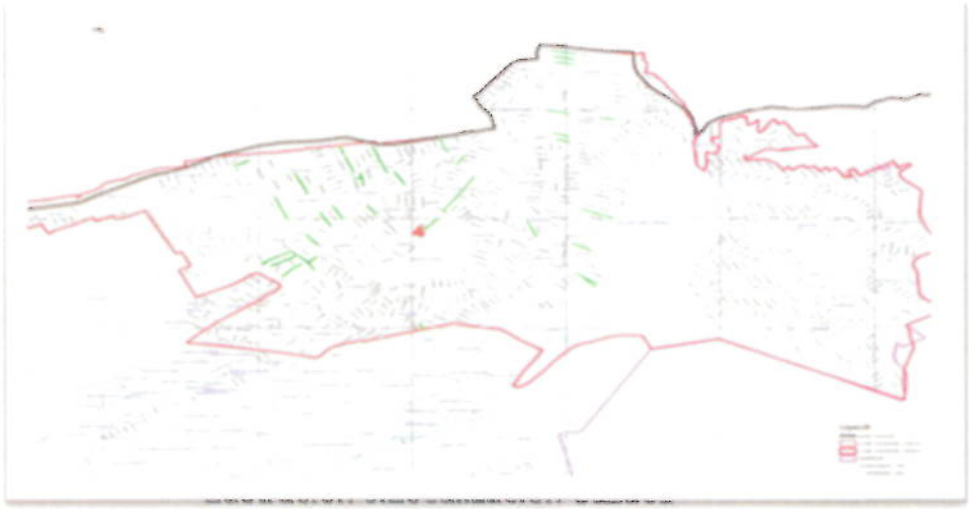

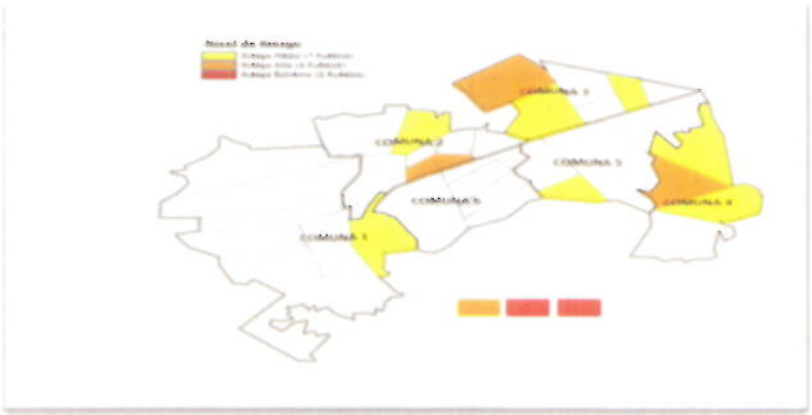

CAZUCA COMUNA 4.

BARRIÓ SANTO DOMINGO Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

4.2. Vías de Acceso a la comuna 4 – Cazuca

84 CARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60

5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO

En el presente informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, lo cual se desarrolló a cabalidad para la entidad contratante que es la Epuxua Avanza E.I.C.E la empresa pública del municipio de Soacha.

Dando claridad que el contrato en mención se le dio inicio el 01 de agosto del 2022 y a su vez dando alcance a lo requerido contractualmente para el buen desarrollo y ejecución del contrato, se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.			
NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	DIRECTOR DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON		100 %	consorciogamer024@gmail.com
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	INSPECTOR	100 %	consorciogamer024@gmail.com
DEICY LORENA BELLO RIVERA	PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com

6 POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocosering SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 5 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual) Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023

Anexo 5 Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$4.055.509.435,60	01/06/2023	01/11/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$1.351.836.478,53	01/06/2023	01/06/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$675.918.239,27	01/06/2023	01/12/2026
	Estabilidad de la obra.		$2.027.754.717,80	01/11/2023	01/11/2028

Anexo 8 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/12/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/12/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

7 CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO .

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	$ 4.506.567.898,67
Acta No. 1	$ 649.376.068,00
Acta No. 2	$ 727.213.483,00
Acta No. 3	$ 1.003.532.431,00

Acta No. 4	$ 451.030.346
Acta No .5	$ 666.543.025
Acta No .6	$484.672.910
ACTA 7	$ 520.537.357
ACTA 8	$528.9808.355
ACTA 9	$471.851.569
ACTA 10	$ 351.093.317
ACTA 11	$228.362.540
Saldo Actual	$ 6.083201.441
Valor por cobrar	$ 675.980.951.67

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

8 VIAS ASIGNADAS

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura:

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaría de infraestructura previa aprobación y aceptación de los interesados, Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

Tabla 4. Vías en intervención

N_NUEVO	DIRECCION POR CUADRAS
1	CRA 37 ESTE ENTRE CLL44-CLL43J
2	DIAGONAL 44 ENTRE CRA 37- TRANSV 35
3	TRANSVERSAL 35 ENTRE 43J-44A
4	TRANSVERSAL 35 DE DIAG 44A - 44B
5	TRANSVERSAL 34 ENTRE DIAGONAL 44 A - CRA 33A
6	TRANSVERSAL 34 ENTRE DIAGONAL 44A-43J
7	DIAGONAL CRA 44 A CRA 33B -CRA 34
8	DIAGONAL CRA 44 A CRA 33A -CRA 33B
9	CARRERA 32 A ENTRE CALLE 59- CALLE 54
10	CARRERA 32A ENTRE CALLE 54 Y CALLE 53
11	CARRERA 32A ENTRE CALLE 53 Y CALLE 50
12	CARRERA 32A ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48
13	CARRERA 32A ENTRE CALLE 48 Y 44
14	CARRERA 32 ENTRE CALLE 53 Y 54
15	CALLE 54 ENTRE CRA 32 Y CRA 32 A
16	CARRERA 28 ESTE ENTRE CALE 59-CALLE 56A
17	CALLE 50 ENTRE CRA 32A- CRA 31
18	CALLE 48 ENTRE CRA 32 A - CRA 31
19	CALLE 53 ENTRE CRA 29- CRA 30
20	CARRERA 30 ENTRE CALLE 53- CALLE 48
21	CALLE 48 ENTRE CRA 30 - CRA 31
22	CARRERA 30 ENTRE CALLE 48- CALLE 44
23	CARRERA 30 ENTRE CALLE 43C-CALLE 44
24	CALLE 43 F ENTRE CARRERA 30- CARRERA 28
25	CARRERA 28 ENTRE CALLE 43 F - CALLE 43 D
25	CALLE 43F ENTRE CRA 28- CRA 27 F
27	CARERA 27 F NTRE CALLE 44- CLLE 43 F
28	CARRERA 27 F ENTRE CALLE 43 F - CALE 43D
29	CRA 27F ENTRE CALLE 43 D- CALLE 43C
30	CRA 27F ENTRE CALLE 43 C- CALLE 43B
31	CALLE 43 C ENTRE CRA 27D- CRA 27 F

32 CALLE 43 D ENTRE CRA 27D- CRA 27 F
33 CARRERA 27 D ENTRE CALLE 43D- CALLE 43 F
34 CARRERA 27 D ENTRE CALLE 43F- CALLE 44
35 CALLE 43 F ENTRE CRA 27 F-CRA 27 D
36 CALLE 43 F ENTRE CRA 27 D -CRA 27 B
37 CALLE 56 A ENTRE CRA 27- CRA 26 C
38 CALLE 56 A ENTRE CRA 26C- CRA 26 B
39 CALLE 56 A ENTRE CRA 26B- CRA 26
40 CALLE 55 ENTRE CRA 26C- CRA 26
41 CALLE 55 ENTRE CRA 27 - CRA 26 C
42 CARRERA 26C ENTRE CALLE 56 A - CALLE 53
43 CARRERA 26C ENTRE CALLE 55 - CALLE 53 A
44 CARRERA 26C ENTRE CALLE 53A - CALLE 53
45 CALLE 53 A ENTRE CRA 26C- CRA 26
46 CARRERA 24 B ENTRE CALLE 59- CALLE 61
47 CARRERA 24 B ENTRE CALLE 59- CALLE 57
48 CRA 25 ENTRE CALLE 57 - CALLE 61
49 CARRERA 26 ENTRE CALE 59- CALLE 61
50 CARRERA 26 A ENTRE CALLE 59 - CALLE 61
51 CARRERA 26 A ENTRE CALLE 59 - CALLE 58
52 CARRERA 26 A ENTRE CALLE 58 - CALLE 56B
53 CALLE 56 B ENTRE CRA 26A- CRA 26
54 CARRERA 26 B ENTRE CALLE 59 CALLE 57
55 CARRERA 26 B ENTRE CALLE 57 CALLE 56A
56 CARRERA 24 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61
57 CARRERA 25 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59
58 CARRERA 26 ENTRE CALLE 58 7 CALLE CALLE 59
59 CALLE 58 ENTRE CARRERA 26 A Y CARRERA 26B
60 CALLE 57 ENTRE CARRERA 6 C Y CARRERA 26B
61 CARRERA 26 A ENTRE CALLE 59 CALLE 61
62 CALLE 55 ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 25
63 CARRERA 27 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53
64 CALLE51 ENTRE CARRERA 27
65 CARRERA 27 D ENTRE CALLE 50 Y CALLE 51
66 CARRERA 27 D ENTRE CALLE 44 Y CALLE 50
67 CARRERA 27 C ENTRE CALLE 39A Y 43 F
68 CARRERA 27 C ENTRE CALLE 43F Y CALLE 5 B
69 CARRERA 27 C ENTRE CALLE 5 B Y CALLE 5 A
70 CARRERA 27 C ENTRE CALLE 5 A Y CARRERA 20 B SUR
71 CARRERA 20 B SR ENTRE CALL 5 A Y CARRERA 11 ESTE
72 CALLE 43 D ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 27 A
73 CARRERA 27 ENTRE CALLE 43 D Y CALLE 43 F
74 TRANSVERSAL 28 ESTE ENTRE CRA 42A Y 42
75 CALLE 50 ENTRE TRANSVERSAL17C Y CARRERA 19
76 CALLE 50 ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 21 A
77 CALLE 50 ENTRE CARRERA 21 A Y CARRERA 21 C
78 CALLE 50 ENTRE CARRERA 21 A Y TRANSVERSAL 21 D
79 CARRERA 19 ENTRE CALLE 49 Y CALLLE 50
80 CALLE 49 ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 17
81 CARRERA 17 B ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 61
82 CARRERA 17 A ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 61

83 CARRERA 17 ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 61
84 CARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades :

Cra 2 entre 56-50

- Excavaciones en conglomerado
- Se realiza instalación Sardinel confinamiento
- Instalación de base
- Nivelación y compactacion
- Figurado de acero
- Instalacion concreto placas
- Se realizó en trasporte de material de excavación a la escombrera Magir Y Fundación semilleros de emprendimiento del municipio de Soacha.
- Se hace renivelación con base por fuertes lluvias presentadas durante el mes de septiembre en el frente obra cra 2

10 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS









FUNDIDA CONCRETO PLACAS CRA 2 ZONA INDUSTRIAL





AFECTACIONES POR LLUVIAS



EXCAVACIONES Y RELLENOS
ESCALERA CALLE 43F CON CRA 27

11 ACTAS DE COMITE

Según la fecha de la presenta acta se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos:

Tabla 7. Comités

COMITE N.	FECHA
51	05/10/2023
52	12/10/2023
53	19/10/2023
54	26102023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

10. CONCLUSIONES

- Las vías intervenidas son priorizadas por el municipio así mismo se emplean métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.

- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía.

- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, se han presentado reprocesos que han llevado a la ejecución de actividades como re nivelaciones para el mejoramiento de las subrasantes por ende se extiende un informe de las afectaciones climáticas soportando estos ítems de la presente acta.

- Se hace instalación de concreto por parte del contratista ,cabe aclarar que se presentan dificultad por tiempo y por parte de los industriales presentando demoras en esta actividad

- El tránsito vehicular de las empresas ha retrasado las actividades en campo en la Cra 2 entre Cll 56 y Cll 60.

11. ANEXOS

Certificado de Aportes del mes en reporte y planillas
Actas de comité técnicos
Certificados de materiales



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

ANEXOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS

CONSORCIO GAMER SOACHA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA	CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoacharrhh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	23/11/2023	72656456	$8.011.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	20.700	0		0		0	6	200	0	20.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	206.700	0		0		0	6	1.300	0	208.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	445.800	0		0		0	6	2.700	0	448.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.500	0		0		0	6	700	0	109.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.900	0		0		0	6	400	0	55.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.200	0		0		0	6	800	0	133.000	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	64.700	0		0		0	6	400	0	65.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.532.600	0	0	25.500	25.500	6	9.200	400	1.593.200	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.293.300	0	0	0	0	6	13.700	0	2.307.000	13
231001	Colfondos	800227940-6	131.700	0	0	0	0	6	800	0	132.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	173.300	0	0	0	0	6	1.100	0	174.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.714.200				1.714.200	6	10.200	1.724.400			17.142	1.724.400	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.033.500	6	6.200	1.039.700	23

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA		CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoachanhh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	23/11/2023	72656456	$8.011.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.033.500	1.040.000
Pensión	4	4.181.900	4.207.100
Riesgos Laborales	1	1.714.200	1.724.400
CCF	1	1.033.500	1.039.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	7.963.100	8.011.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901587366-8	CONSORCIO GAMER SOACHA	CLL 44C 45-53 IN 2 AP 601	3158369463	gamersoachanthh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				23	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	23/11/2023	72656456	$8.011.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018475315	DEVIA VARGAS IVAN LEONARDO	1	0			S																230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	181.000	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
2	CC	52017004	RIVERA RINCON NUBIA CONSUELO	1	0			S		x														230201	5.100.000	816.000	0	0	25.500	25.500	EPS005	5.100.000	204.000	14-11	5.100.000	5	355.000	CCF24	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
3	CC	1002524721	CARO BERNAL YENI CLEMENCIA	1	0			S												x				230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS010	348.000	14.000	14-11	348.000	5	0	CCF24	348.000	14.000	0	0	0	0	0
4	CC	1002524721	CARO BERNAL YENI CLEMENCIA	1	0			S											x					230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS010	812.000	32.500	14-11	812.000	5	0	CCF24	812.000	32.500	0	0	0	0	0
5	CC	14318492	DEVIA RAMON	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	5973396	MORENO TIQUE JOSE YONNY	1	0			S																230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS002	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	5	78.100	CCF24	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
7	CC	5973396	MORENO TIQUE JOSE YONNY	1	0			S											x					230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	0	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
8	CC	1032392691	MARIN CORDOBA JOHN CAMILO	1	0			S																230201	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS010	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	5	107.900	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
9	CC	51910137	RIVERA RINCON FANNY EDITH	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	12194205	TRUJILLO COLLAZOS JAIRO	1	0			S		x														230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS005	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF24	812.000	32.500	0	0	0	0	0
11	PT	1246603	HIDALGO GRATEROL HENRRY JOSE	1	0			S								x								230301	1.617.021	258.800	0	0	0	0	EPS041	1.617.021	64.700	14-11	1.617.021	5	112.600	CCF24	1.617.021	64.700	0	0	0	0	0
12	PT	6347102	LOPEZ GONZALEZ JEAN CARLOS	1	0			S		x														230201	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS037	966.667	38.700	14-11	966.667	5	67.300	CCF24	966.667	38.700	0	0	0	0	0
13	CC	1092394234	AGUILAR SUAREZ JOSE GREGORIO	1	0			S	x															25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
14	PT	5045327	PRIETO PIÑERO JOHAN ENRIQUE	1	0			S	x															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
15	PT	6069611	ARNIAS HEREDIA EDGAR RAMON	1	0			S	x	x														230201	53.334	8.600	0	0	0	0	EPS017	53.334	2.200	14-11	53.334	5	3.800	CCF24	53.334	2.200	0	0	0	0	0
16	PT	7557797	BRACHO PADILLA LUIS GEOVANNY	1	0			S	x	x														230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS037	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF24	425.334	17.100	0	0	0	0	0
17	PT	7557812	CARRERO GARCIA EDIXON DANIEL	1	0			S	x															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS005	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
18	CC	1014309692	MOYANO MOYANO JUAN DIEGO	1	0			S	x	x														230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF24	386.667	15.500	0	0	0	0	0
19	CC	1134174703	RODRIGUEZ DURAN ALONSO SEGUNDO	1	0			S								x								230301	2.223.404	355.800	0	0	0	0	EPS002	2.223.404	89.000	14-11	2.223.404	5	154.800	CCF24	2.223.404	89.000	0	0	0	0	0
20	CC	1024526886	RUIZ OREJUELA LUIS ENRIQUE	1	0			S	x	x														230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS002	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF24	386.667	15.500	0	0	0	0	0
21	CC	1073668047	TEQUIA TORRES KEVIN ESTIGUAR	1	0			S	x								x							230201	515.007	82.500	0	0	0	0	CCFC33	515.007	20.700	14-11	515.007	5	35.900	CCF24	515.007	20.700	0	0	0	0	0
22	CC	1004236125	ARCINIEGAS INCHIMA DIEGO ARMANDO	1	0			S	x															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS017	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	0	0	0	0	0
23	CC	1063949470	SALINAS VERGARA DARIO ALFONSO	1	0			S	x															231001	320.000	51.200	0	0	0	0	EPS037	320.000	12.800	14-11	320.000	5	22.300	CCF24	320.000	12.800	0	0	0	0	0
24	CC	12190156	GOMEZ GOMEZ MARCO FIDEL	1	0			S	x															230201	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS002	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	0	0	0	0	0
25	CC	71240447	ORTEGA BERMEJO PABLO ANDRES	1	0			S	x	x														231001	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS037	502.667	20.200	14-11	502.667	5	35.000	CCF24	502.667	20.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADOS DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razon Social:	Ternium del Atlantico S.A.S	Pagina Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Telefono:	01 8000 423 724		
Direccion:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	FERRELUGUE S A S	Fecha Impresión:	23/01/06
Dirección:	AV 6 37 78 BOGOTA	No. Remisión:	82542888
Teléfono:	2010808-2010808	Página:	5 de 6

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	69C9473158	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.5	8.4	0.997	0.67
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0356286	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.2	0.975	0.75
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0356287	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.5	0.975	0.79
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0356504	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.3	8.6	0.961	0.80
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0356524	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.3	8.6	0.961	0.80
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0360035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.950	0.74
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0361044	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.6	8.4	1.014	0.68
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363926	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363935	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.6	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363541	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363971	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0363998	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.4	8.4	0.980	0.83
8001345	BARRA COR 1/2"(No 4) 6m NTC2289/G60	8TY0364021	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.5	8.3	0.988	0.84

Autorizo
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el area de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

CERTIFICADO LABORATORIO

Análisis de Materiales e Ingenieria Civil S.A.S.
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos
NIT – 900.260.470 -8


REGISTRO DE PENETRACIÒN CON CONO DINAMICO (P,D,C)
I.N.V.E - 172-13

CODIGO: AFS-5
VERSIÓN: 01
FECHA: 28-ene-15

PROYECTO:	CONTRATO 024-2022	FECHA ENSAYO:	17-jul-23
SECTOR:	CARRERA 2 ENTRRE CALLE 56 Y CALLE 57	FECHA MUESTREO:	19-jul-23
UBICACIÓN:	CAZUCA -SOACHA CUNDINAMARCA	APIQUE:	2 M 1
SOLICITANTE:	CONSOCIO GAMER	PROFUNDIDAD m:	1,10 1,72
MATERIAL:	Limo arcilloso amarillo con gravas finas	OSC:	115
CLASIFICACIÓN:	AASHTO (I.G.) A-4 (0)	U.S.C.S.: SM	ORDEN .T:

No. De Golpes	penetracion acumulado mm.	penetracion por golpe de caida mm.	penetracion por golpe mm.	factor martillo golpeador	Indice DCP	CBR.E1 = 292/(PDC^ 1,12)	CBR.E2 = 567*(PDC^- 1.4)	CBR.E3 = 239*(PDC^- 1.24)	Profundidad in.
(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)	(g)	(g)	(g)	(h)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,0	80	80	80,0	1	80,0	2,2	1,2	1,0	3,1
1,0	140	60	60,0	1	60,0	3,0	1,8	1,5	5,5
1,0	190	50	50,0	1	50,0	3,7	2,4	1,9	7,5
1,0	230	40	40,0	1	40,0	4,7	3,2	2,5	9,1
1,0	250	20	20,0	1	20,0	10,2	8,6	5,8	9,8
1,0	270	20	20,0	1	20,0	10,2	8,6	5,8	10,6
1,0	300	30	30,0	1	30,0	6,5	4,8	3,5	11,8
1,0	330	30	30,0	1	30,0	6,5	4,8	3,5	13,0
1,0	360	30	30,0	1	30,0	6,5	4,8	3,5	14,2
1,0	390	30	30,0	1	30,0	6,5	4,8	3,5	15,4
1,0	430	40	40,0	1	40,0	4,7	3,2	2,5	16,9
1,0	510	80	80,0	1	80,0	2,2	1,2	1,0	20,1
1,0	560	50	50,0	1	50,0	3,7	2,4	1,9	22,0
					CBR PROMEDIO %	5,0	3,7	2,7	

DIAGRAMA ESTRUCTURAL



CBR.E1 = 292/(PDC^1,12)
(USCOE) Recomendada como guia IDU-ET-2005

CBR.E2 = 567*(PDC^-1,4) (MOPT)

CBR.E3 = 239*(PDC^-1,24) (Flechas - pastrana)

(a) **No. De golpes entre los ensayos leidos**
(b) **penetracio acumulativa despues de cada ensayo de golpe de martillo**
(Penetracion minima entre lecturas de ensayo podra ser de 25 mm)

© **Diferencia en penetracion acumulada (b) en comienzo y final de ensayo de golpe con el martillo**
(d) **© dividido en (a)**
(e) **Ingrese 1 para un martillo de 17.6 lb; 2 para un martillo de 10.1 lb.**
(f) **(d) *©**
(g) **de CBR contra DCP Correlacion**
(h) **Previamente entre en (b) divida por 25.4 y redondee a 1 in.**

Cesar Cortes
Laboratorista

ANGEL CASTRO
Jefe Laboratorio

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos
NIT - 900.240.470 -5


LÍMITES DE CONSISTENCIA LÍQUIDO Y PLASTICO Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS

(NORMAS I.N.V. E-125 / E-126/ E-123-13)

CODIGO: AFS-2
VERSION: 01
FECHA: 28-ene-15

OBRA: CONTRATO 024-2022
SECTOR: CARRERA 2 ENTRRE CALLE 56 Y CALLE 57
UBICACIÓN: CAZUCA -SOACHA CUNDINAMARCA
SOLICITANTE: CONSOCIO GAMER
MATERIAL: Limo arcilloso amarillo con gravas finas arenosas
ABSCISA: N 4,5915 W 74,1866 SONDEO No: APIQUE 3

FECHA MUESTREO: 17-jul-2023
FECHA ENSAYO: 19-jul-2023
OSC: 218
O. T. : 522-02-02-23
Profundidad m. 0,75-1,50
MUESTRA 1

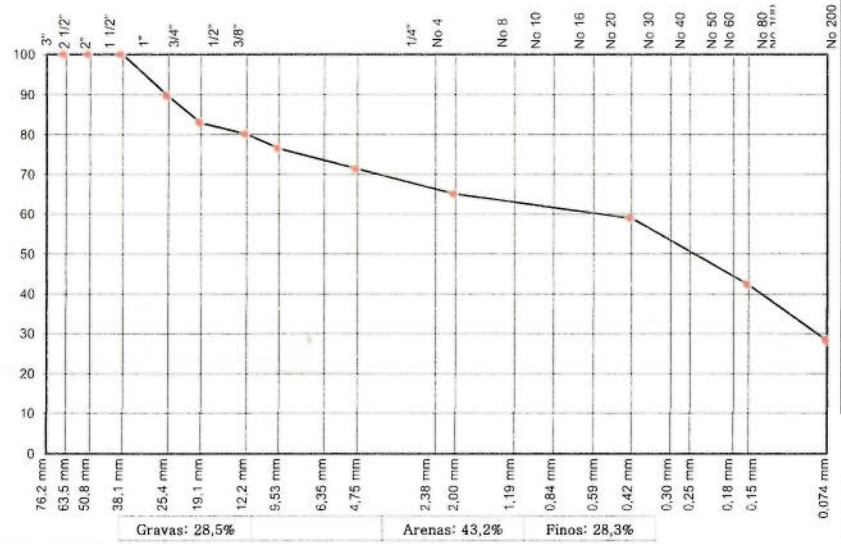

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

PESO INICIAL (g) : 5844,8

TAMIZ No	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% PASA
3"	0,0	0,0	100,0
2 1/2"	0,0	0,0	100,0
2"	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	0,0	0,0	100,0
1"	602,4	10,3	89,7
3/4"	388,0	6,6	83,1
1/2"	168,0	2,9	80,2
3/8"	208,0	3,6	76,6
No 4	300,0	5,1	71,5
10	372,0	6,4	65,1
40	359,2	6,1	59,0
100	971,2	16,6	42,4
200	821,6	14,1	28,3
Fondo	1654,4	28,3	0,0

	Especific.	Resultado
LÍMITE LÍQUIDO		32,0
LÍMITE PLASTICO		24,4
ÍNDICE DE PLASTICIDAD		7,6
HUMEDAD NATURAL		11,6

LIMITES DE ATTERBERG

LÍMITE LÍQUIDO


No GOLPES	35	25	15	
No DE LATA	16	42	88	
P_1 (gr)	38,87	41,35	43,61	
P_2 (gr)	31,76	33,25	34,32	
P_3 (gr)	8,06	7,63	6,73	
% HUMEDAD	30,00	31,62	33,67	

LÍMITE PLÁSTICO

w. Nral

No DE LATA	13	20		515
P_1 (gr)	23,89	23,79		1120,8
P_2 (gr)	21,14	20,74		1028,8
P_3 (gr)	9,81	8,31		235,2
% HUMEDAD	24,27	24,54		11,6

LÍMITES DE ATTERBERG

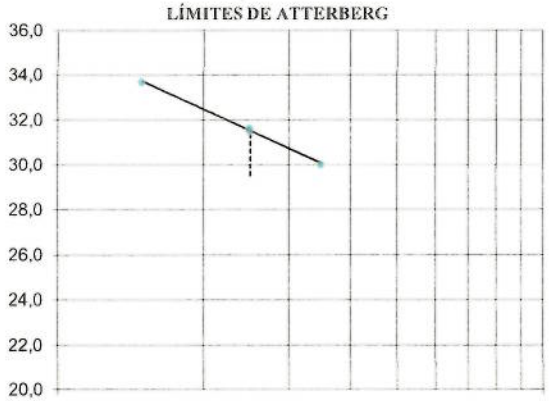

OBSERVACIONES:

NOEL RICO NAVARRO
Laboratorista

ANGEL CASTRO
Jefe Laboratorio

CLASIFICACIÓN

A A S H T O (I.G.): A-2-4 (0)
U. S. C. S.: SM

*Los resultados de los ensayos que se presentan en este informe son solo aplicables a las muestras ensayadas

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Cra 2 # 56 - 60	HORA DE INICIO:
FECHA: 05 de Octubre 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificación del estado actual del contrato de obra 024 del 2022.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	Pendientes por cumplir.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite de obra a las 11:25 am, se requiere nuevamente solucion al tramo de colectex de la ductoria expuesta

Se le informa a la entidad que se necesita la coordinación de la entrega de concreto con los industriales ya que el dia 6 de Octubre se va a iniciar la fundida de las placas.

NPS radicados en la secretaria de Infraestructura por parte de epuxua el dia 02 de Octubre. del 2023.

Por parte de epuxua se radicaron observaciones a los planos entregados por parte de secretaria de Infraestructura

Calle 13 N° 7-10 Soacha - Cundinamarca
Tel 57 - 1 - 7105500 Fax 57 1 5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

razón por la cual el contratista de obra e interventoría no las han recibido de manera oficial.

la prorroga solicitada por el contratista se encuentra en revisión y tramite por parte de epuxua.

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EPUXUA AVANZA I.E.C.E.

ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Juan Pablo Cano	Epuxua	3126826154	
Yamid Fuentes	EPUXUA	3166216313	
Paola Ochoa	Contratista	3124983919	
Edgar Ulises	Interventoria	3108032525	
Leonardo	Contratista	321 295 9253	
Alejandra Yate L.	D.E.V	3138421582	
Milton	Contratista	315.8487636	
Sergio Alv Torres R	Interventoria	7102731350	

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel 57 - 1 7305500 Fax 57-1 5770580
contactenosvirtual@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Cra 2 # 56 - 60	HORA DE INICIO:
FECHA: 12 de Octubre 2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria.	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificacion y avance del contrato de Obra 024 - 2023.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia la verificación del acta anterior y los compromisos establecidos. Epuxua informa que los NPS están radicados en la sec. de Infraestructura el contratista de obra solicita el estado dela solicitud de la prorroga N°3 del contrato de obra. e informan que se encuentra en Vtramite - Fue PARTE DE EPUXUA. Se cambio el diametro de los pasadores a 1 pulgada. se evidencia que el contratista tenia el armado para iniciar la fundida de los concretos y no llega el concreto por falta de pagos de la empresa sicla. por lo que se debio levantar todos los materiales para la fundida para evitar robos. la secretaria de Infraestructura va a realizar verificaciones en campo de los materiales instalados.

Se va a manejar una tolerancia de 1cm en las placas de concreto.

Se solicita a epuxua el tramite de la prorroga N° 3.

el contratista de interventoria solicita a epuxua y a la secretaria de infraestructura el recorrido para la entrega de las vias de la comuna 4.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Alejandra Yate L.	1. D. EV- SI	313-842 1556	
Guido Tulcán	Direcc. Equipami	3112657489.	
Marco Puentes	EPUXUA.	3166216313	
Freddy Ocaña	EPUXUA.	3006219283	
Leonardo Daniel	Contratista	321 2759255.	
Edgar Lleras	Interventoría	3108032525	
Fredy J. Jimenez	D. Equipamto	3005646939	
Milton Ruiz	Contratista	3102935167	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7505500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: CRA 2 N° 56 - 60	HORA DE INICIO: 8:30 AM
FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: INTERVENTORIA	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	VERIFICACION Y AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 024 - 2022

AGENDA PROPUESTA	
1.	VERIFICACION DEL ACTO ANTERIOR
2.	
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

YONTI ANCE PRESENCIO EN OBRA Y MANIFIESTO QUE EN LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE 23 Y 27 DE OCTUBRE REALIZARAN TRABAJOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL ABSISA 2.48 YA QUE A PROTEGER LA TUBERIA CON CONCRETO Y EN LA ABSISA 180 REALIZARON TRABAJOS PARA BUSCAR UNA TUBERIA Y VALVULA DE 3/4.

SE VERIFICA EL AVANCE DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA FUNDIO PLACA DE VIA DE LA ABSISA 3+10 A LA 2+88, CONTINUA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA ABSISA 180.

LA INTERVENTORIA RECOMIENDA QUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TOMA LAS MUESTRAS PARA LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS.
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CONTINUAN EN REVISION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA SU VERIFICACION Y APROVACION.
SE PROGRAMA FUNDIDA DE MAÑANA DE LOS PLACAS EN CONCRETO DE LA ABSISA 300 A 288
LA ENTIDAD SOLICITA LA INSTALACION DE LA REJILLA METALICA DE PROTECCION EN EL SUMIDERO DE LA ABSISA 280 Y SOLICITA LA VERIFICACION DE LOS NIVELES DE ENTREGA DE LA PLACA AL SUMIDERO.
LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORIA RECOMIENDAN AL CONTRATISTA NO CONTAMINAR LOS BORDILLOS CON LA MEZCLA DE LAS PLACAS
LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD RECOMIENDAN AL CONTRATISTA REVISAR LOS NIVELES ANTES DE LA FUNDIDA DE LA PLACA PARA EVITAR FALTANTES DE CONCRETO EN EL MOMENTO DE LAS FUNDIDAS DE LAS PLACAS DE CONCRETO.
LA INTERVENTORIA RECOMIENDA ORDEN Y ASEO GENERAL DE LA OBRA DESPUES DE LA FUNDIDA DE LAS PLACAS EN CONCRETO.
LA INTERVENTORIA RECOMIENDA EL USO DE LAS EPP DEL PERSONAL OPERATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
LA ENTIDAD SOLICITA A LA INTERVENTORIA EL PROCESO DEL CAMBIO DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA EJECUTARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
LA ENTIDAD SOLICITA AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL.
EL CONTRATISTA SOLICITA LA ENTREGA DEL LISTADO DE LOS NP DEFINITIVOS SEGUN LOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 DEL CONTRATO DE OBRA.

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7505500 Fax: 57 - 1 - 7170580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Alejandro Yate L	D.E.V	317-3422155	
Katherine Ospina	Vanti	316 4624235	
ROBERT ESCOBAR	VANTI BV.	3174948809	
PAOLO PUENTES	EPUXUA.	3166216313.	
Fabian Ocaña	Epuxua	3006219283	
Leonardo Duran V.	Contratista.	3212954255	
Edna Nuñez	D. Equipamiento	3153047057	
EDGAR MEJIA	INTERVENTORIA	3108032525	
Milton Pinto	Contratista	3102935[illegible]	
Jefferson Chiappe	contratista	3175982497	
Sergio Tovar	Interventoria	3107213500	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel. 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Cra 2 entre 56 - 60	HORA DE INICIO:
FECHA: 26 de Octubre 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE ACTA:

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificacion del estado actual del contrato de obra 024 - 2023.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior
2.	Recorrido en la vía Cra 2 entre 56 - 60.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comité con el recorrido de la vía verificando en la abscisa 220 el cárcamo existente que atraviesa la vía, para lo que se incrementara la pendiente desde la abs 230 a la 210 con el fin pasar por encima del nivel del cárcamo. con la placa de 28 cm. El contratista solicita la modulacion desde la abscisa 240 hasta la 0 y que se defina el lugar de los sumideros. o si se van a mantener en el mismo lugar.

los NPS serán pasados a epuxua por infraestructura para que se realicen unas observaciones y sean atendidas para

tramitar el modificatorio.

Para el tema de la aclaración de los modificatorios se realizara una mesa de trabajo el dia jueves 2 de Noviembre de 2093.

la entidad y la interventoria Solicitan pra Compactar la base en los laterales al Lado de los bordillos.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO 26 Octubre 2023

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Juan Pablo Cañón	Epuxua	3124821154	
ANGEL ULISES	INTERVENTORIA	3108032525	
Freddy Acaña	Epuxua	3006219283	
Stella Cespedes	Interventoria Social	3134699727	
Milton Pinzon	Contratista	315 3167636	
Alejandra Yuk L.	D.E.V	317-842 1556	
Pablo Pinzon	EPUXUA	3166216323	
Fredy Jimenez	D Equipo Ap	3005646979	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Jefferson Chiappe	Contratista	3176982497	
Sergio I. Torres	Interventoría	3102213500	
