favelco
ingeniería

ANEXOS CONTRATISTA


Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

0.1.1 CRONOGRAMA DE OBRA

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**INTERVENCION DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS**	**57 días?**	**jue 7/09/23**	**jue 16/11/23**
2		INICIO	1 día?	jue 7/09/23	vie 8/09/23
3		**PRELIMINARES**	**30 días**	**mar 12/09/2**	**mié 18/10/23**
4		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO.	30 días	mar 12/09/23	mié 18/10/23
5		**DEMOLICIONES**	**22 días**	**jue 7/09/23**	**mar 3/10/23**
6		demoliciones de pisos y andenes en concreto e=30 cm ,manual o mecanicamente	6 días	jue 7/09/23	jue 14/09/23
7		Corte para junta de piso 5 mm, incluye tratamiento sello de juntas base poliuretano para exteriores	2 días	sáb 30/09/23	mar 3/10/23
8		**MOVIMIENTOS DE TIERRA/LLENOS**	**20 días**	**vie 8/09/23**	**lun 2/10/23**
9		Excavación a maquina o manual de 0-2 m	20 días	vie 8/09/23	lun 2/10/23

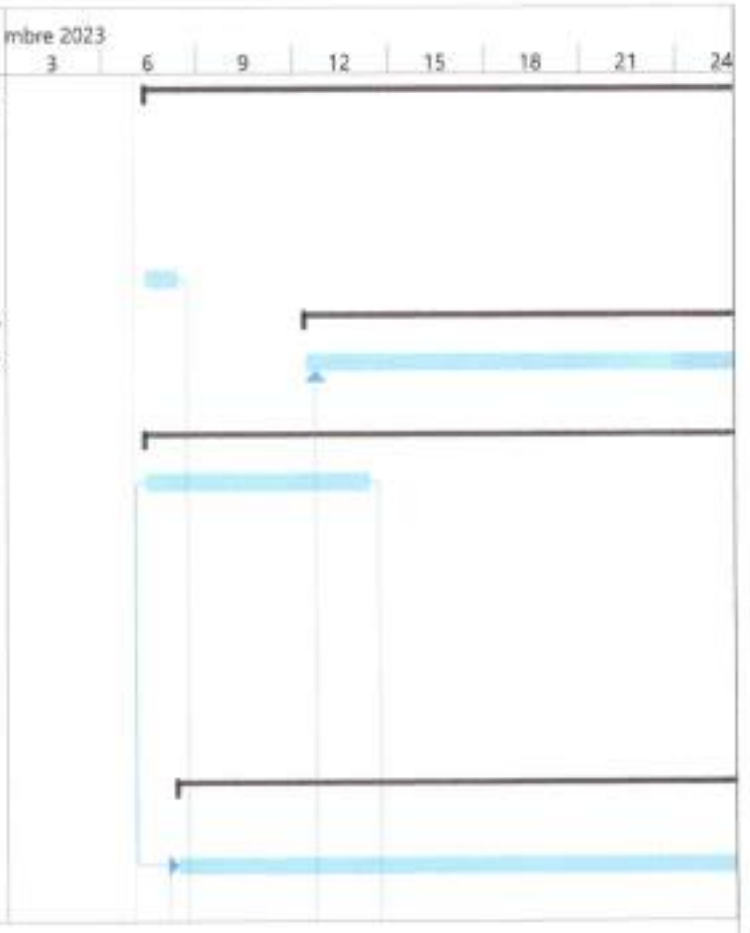

Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
10		Suministro, transporte,colocación, conformación y compactación de Base granular	16 días	sáb 9/09/23	jue 28/09/23
11		**PAVIMENTO Y ANDENES**	**31 días**	**mar 19/09/2**	**jue 26/10/23**
12		Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m.	5 días	mar 19/09/23	lun 25/09/23
13		Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa. Con un ESPESOR DE 0.10m.	5 días	lun 25/09/23	sáb 30/09/23
14		Colocación de LOSETA TACTIL GUÍA COLOR SEGUN DISEÑO PIZARRA de 20x20x6 cm.	5 días	lun 25/09/23	sáb 30/09/23
15		Suministro transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-13.	8 días	mar 17/10/23	jue 26/10/23
16		**ACERO DE REFUERZO**	**3 días**	**jue 14/09/23**	**lun 18/09/23**

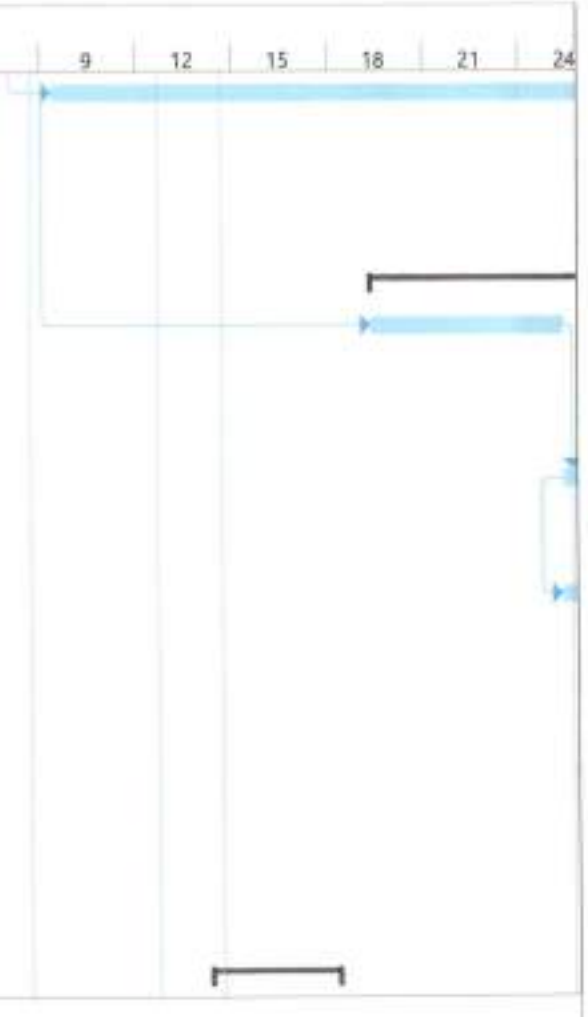

Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
17		Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	3 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23
18		**OTROS**	**51 días**	**jue 14/09/23**	**jue 16/11/23**
19		Suministro e instalacion de grama macana en talud, incluye nivelacion y paisajismo	2 días	jue 26/10/23	sáb 28/10/23
20		Construccion de sumideros tipo B, H:0,40-0,50, incluye concreto de 21 Mpa, refuerzo y rejilla	3 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23
21		Suministro, transporte e instalación de tubería novafort de 10"	1 día	jue 14/09/23	vie 15/09/23
22		Suministro, transporte e instalacion de concreto de 21 Mpa para atraque de tuberia.	1 día	jue 14/09/23	vie 15/09/23
23		Construccion de cuneta en concreto de 21 Mpa	3 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23
24		Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio	8 días	sáb 4/11/23	jue 16/11/23

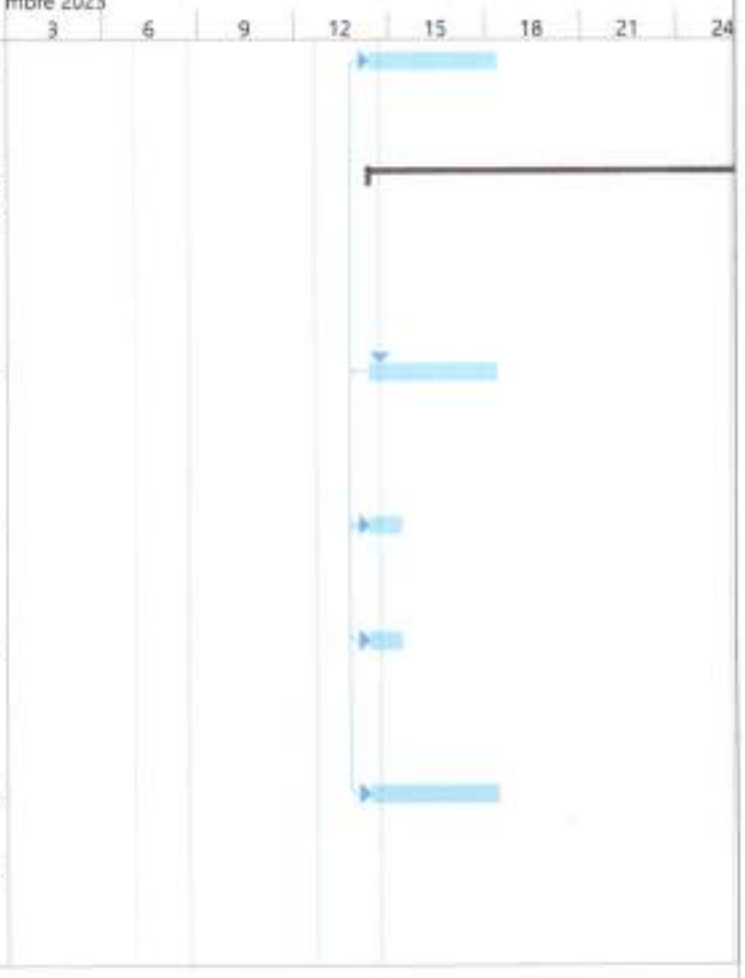

Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
25		Suministro, transporte e instalacion de topellantas en concreto de 12X30X60 cm.	3 días	sáb 4/11/23	jue 9/11/23
26		**OBRAS EXTRAS**	**57,88 días**	**vie 8/09/23**	**vie 17/11/23**
27		Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,10m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de tela y	3 días	vie 8/09/23	mar 12/09/23
28		Retiro de poste y luminarias. Incluye desmonte, traslado y reinstalación, excavación	2 días	jue 14/09/23	vie 15/09/23
29		Construcción de caja de inspección de 40x40 altura hasta 120 cm. En concreto de 21 Mpa, incluye tapa en	15 días	jue 14/09/23	lun 2/10/23
30		Demolición de pavimento asfáltico mecanicamente, cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y	3 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23
31		Suministro e instalación de tuberia de 2" conduit, no incluye excavacion y llenos	15 días	lun 2/10/23	vie 20/10/23

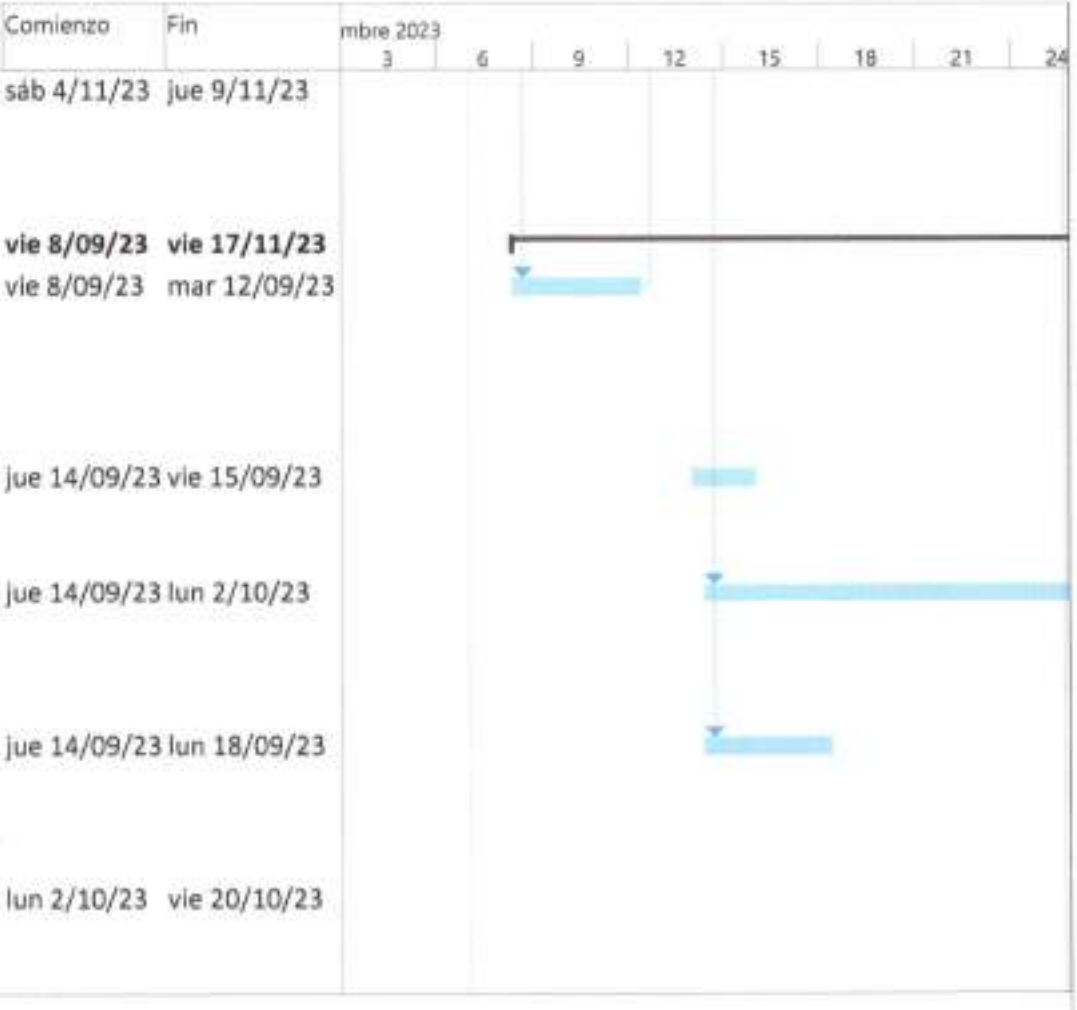

Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
32		Suministro e instalación de tuberia de 3/4" conduit, no incluye excavacion y llenos	15 días	lun 2/10/23	vie 20/10/23
33		Lleno para cimentaciones de redes en triturado D: 3/4" maximo	15 días	lun 2/10/23	vie 20/10/23
34		Construcción de ANDEN en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.15m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto.	15 días	lun 25/09/23	jue 12/10/23
35		Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio para demarcación de linea de 0,12 m blanca o amarilla para demarcación celdas. Según especificaciones técnicas del Manual de Señalización vial 2015.	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23
36		FIN	0 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23




Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

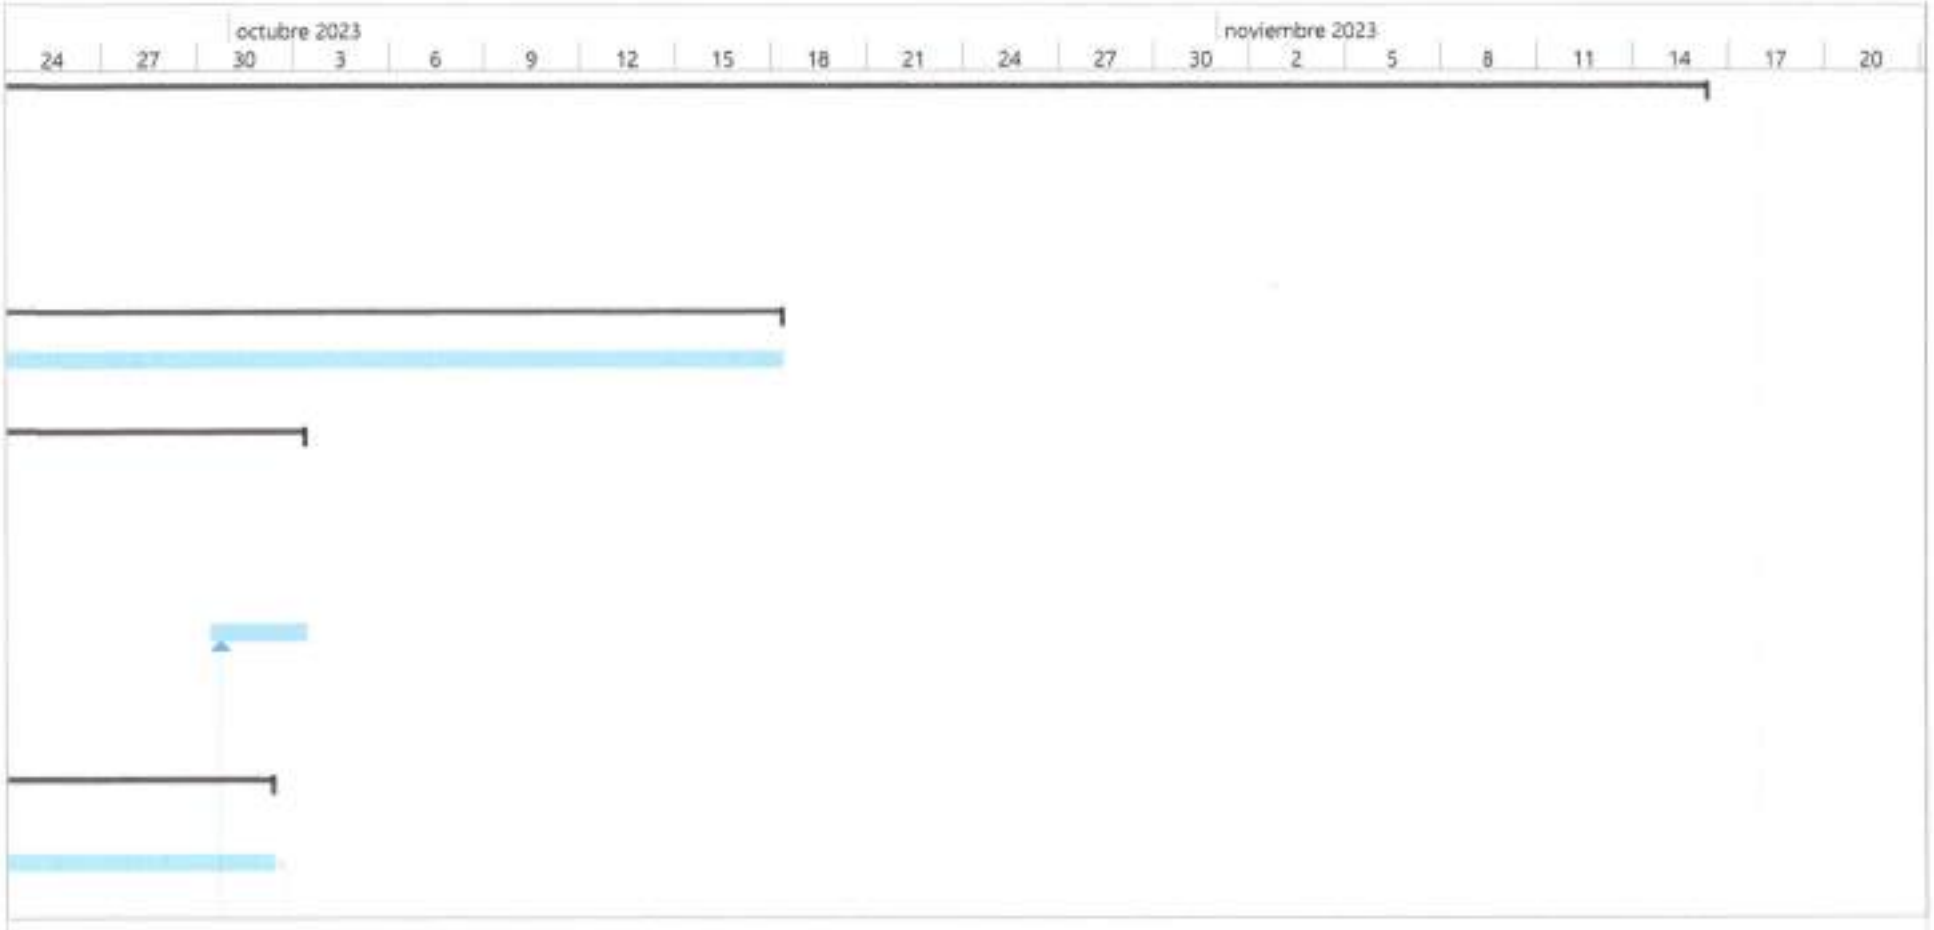


Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

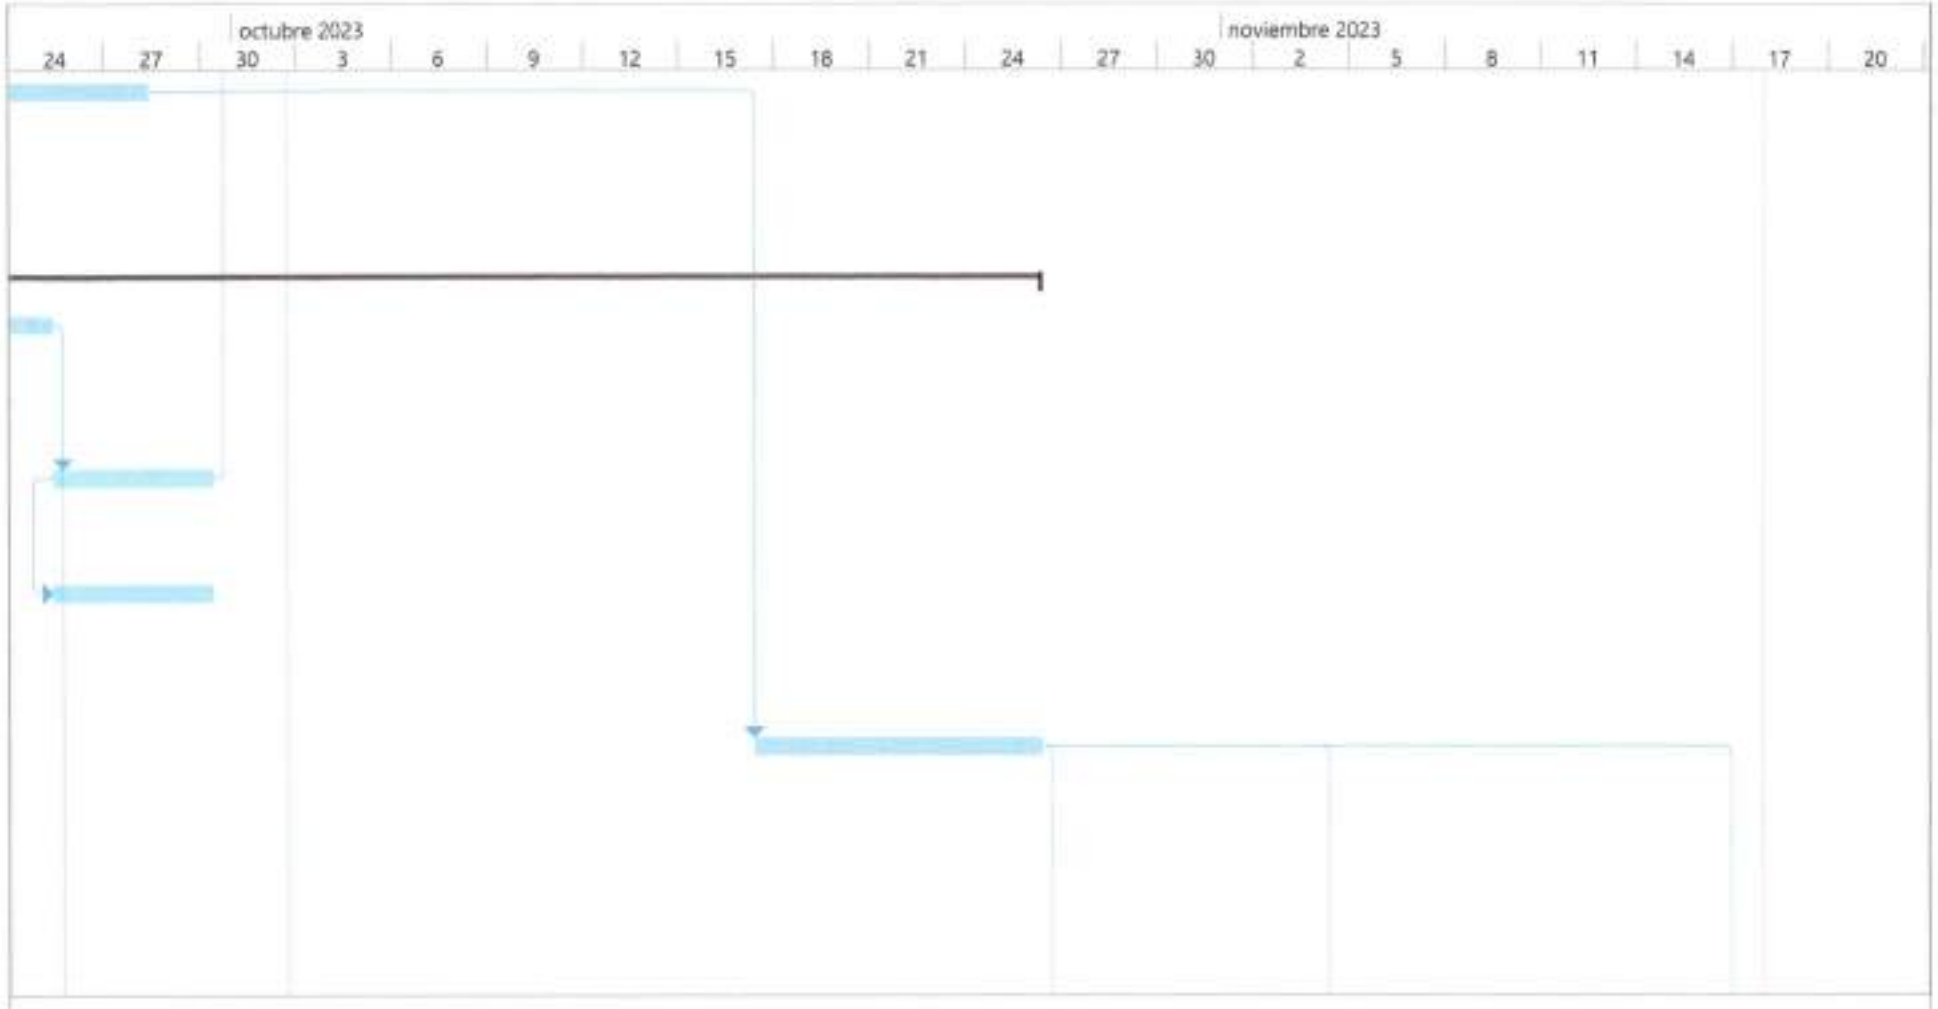

Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

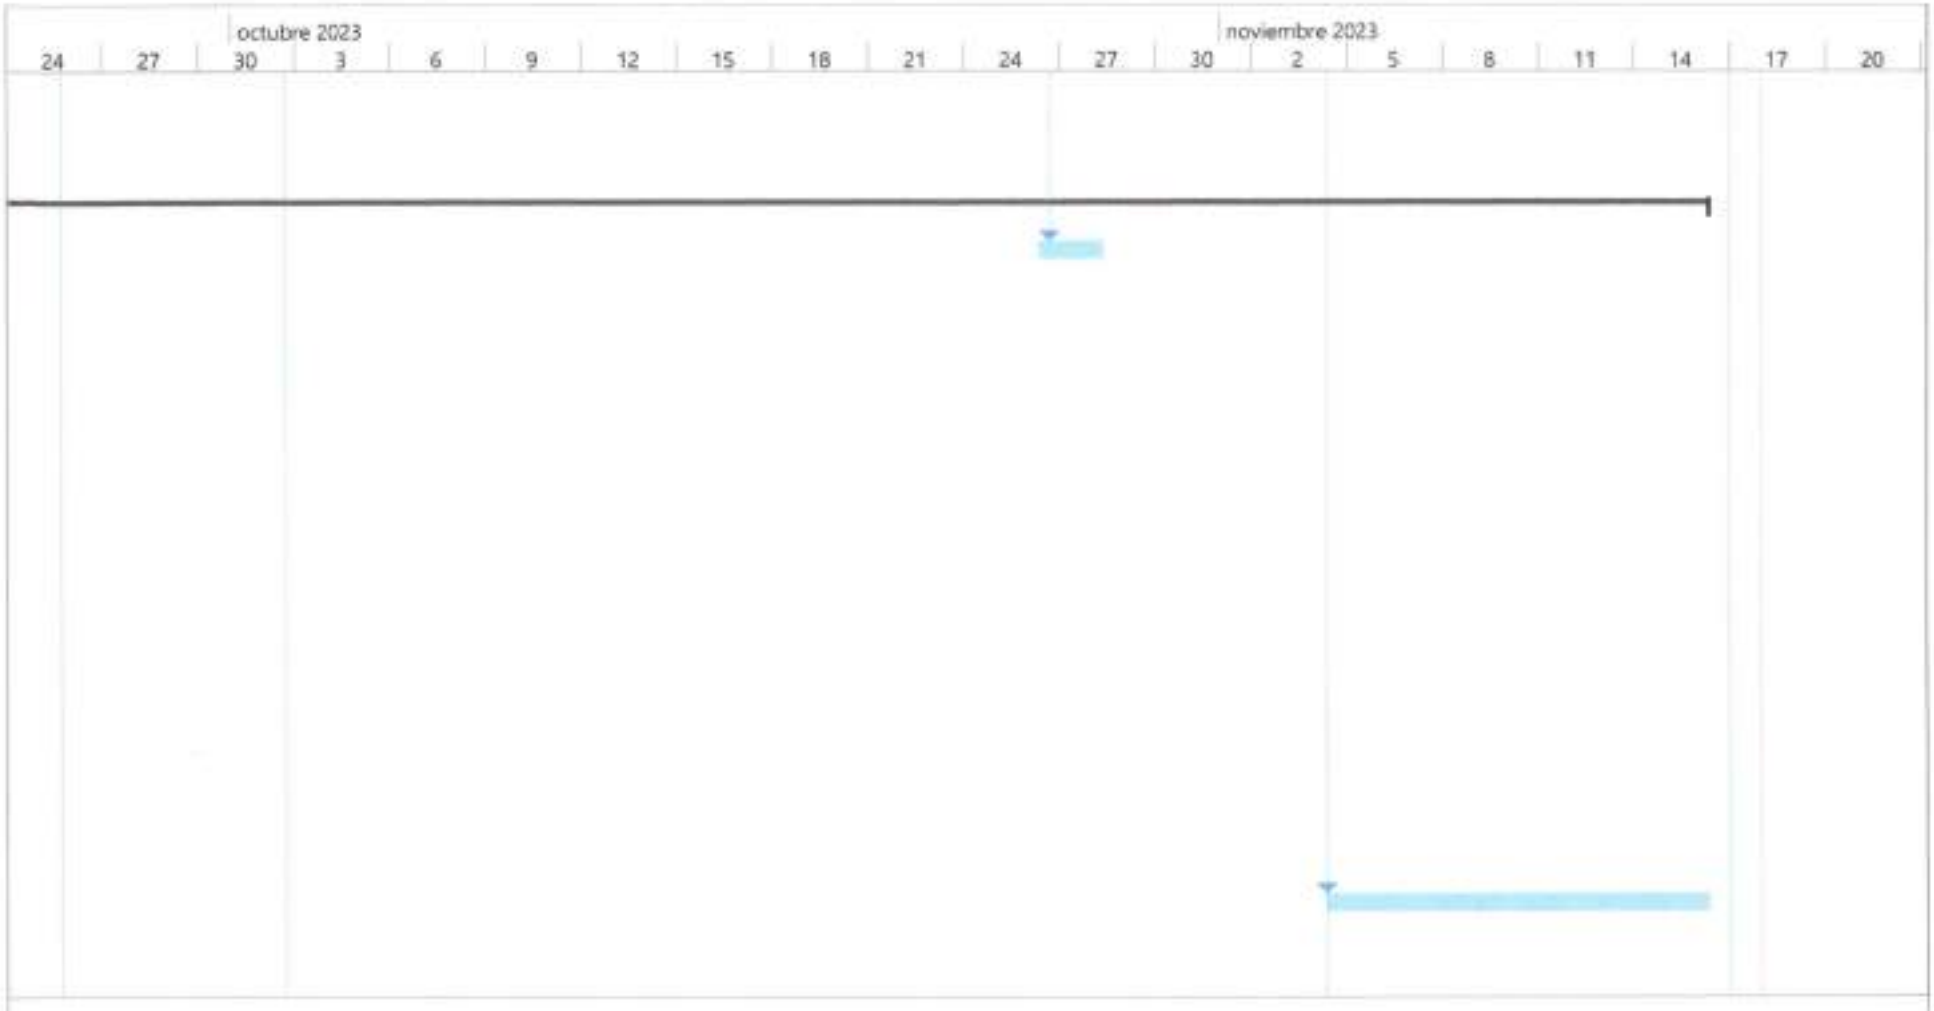


Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

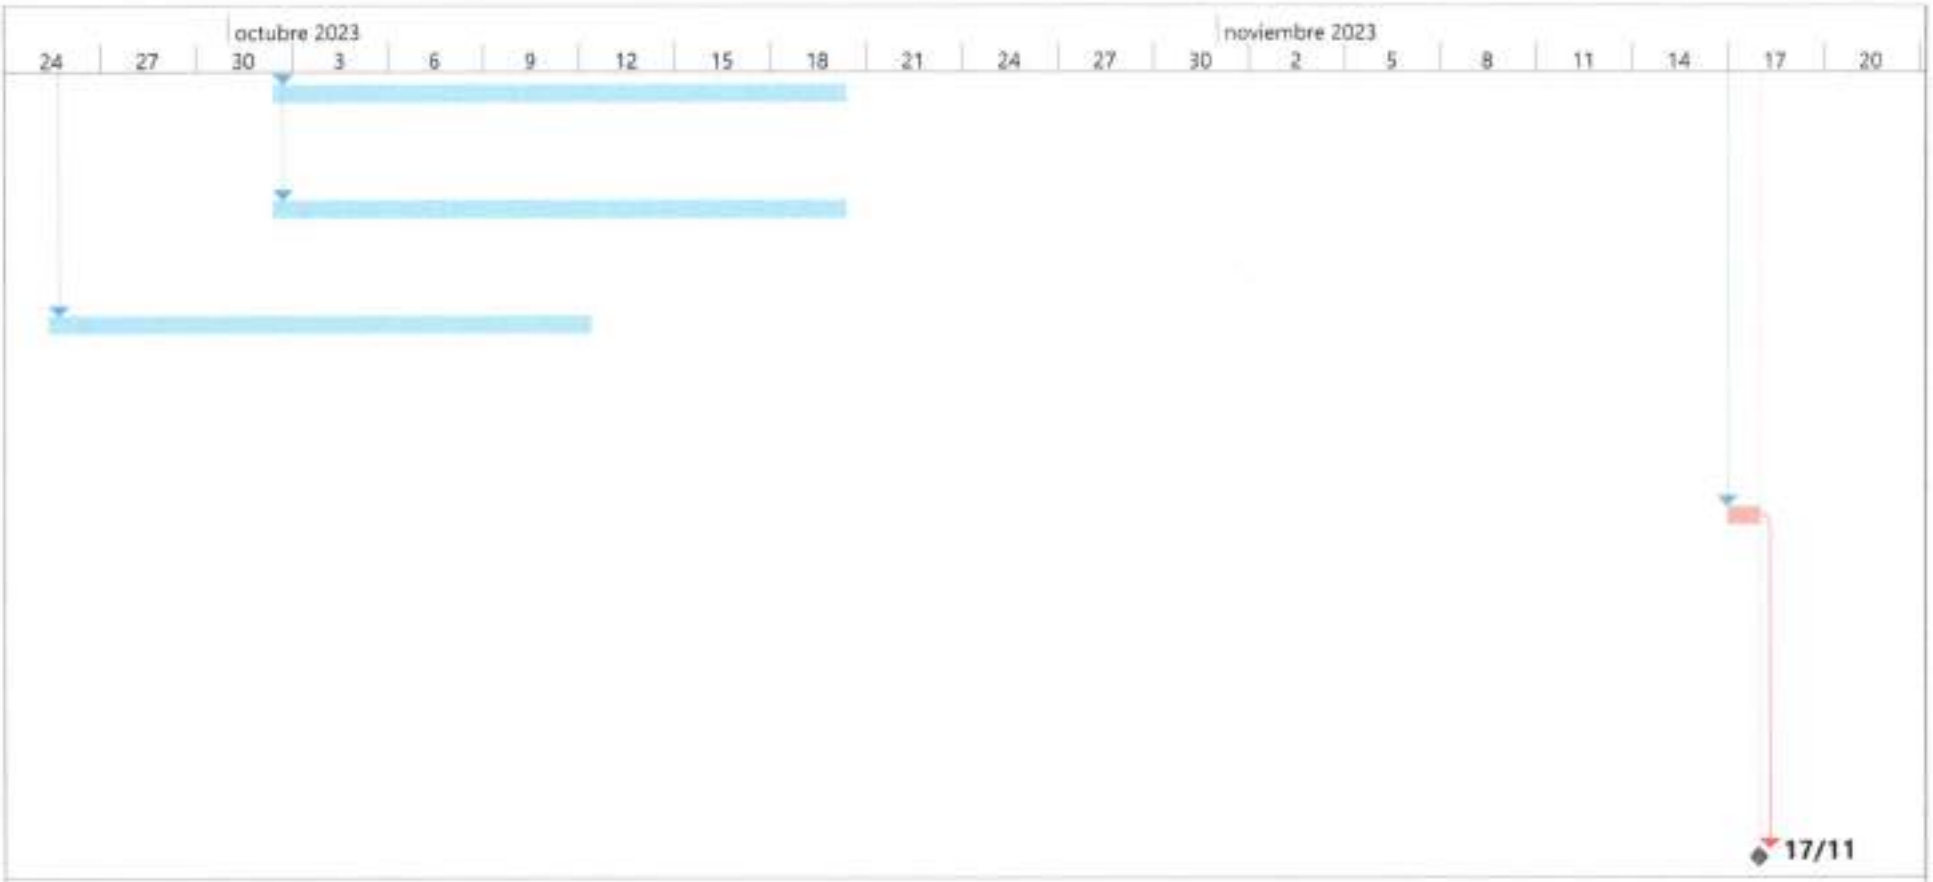

Proyecto: Cronograma parquea
Fecha: lun 4/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

favelco
Ingeniería

0.1.2 ACTA No.2 Y MEMORIAS

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

ACTA DE OBRA

OBJETO: "INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023"

En el Municipio de El Retiro a los 17 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en la oficina de FONDESER, el señor **JAROL ARMANDO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 71.556.550, gerente de FONDESER, en calidad **CONTRATANTE**; el señor **JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO** , identificado con cédula de ciudadanía número 98.639.809, en calidad **INTERVENTOR** y el señor **FADIEL VELASQUEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 15.437.149, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el acta de obra N°2 del contrato en referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. Se entregó acta N°2 correspondiente al periodo octubre 8 de 2023 a noviembre 17 de 2023.
2. Se realizó revisión de cada una de las cantidades ejecutadas, cuyas medidas fueron tomadas en conjunto con la supervisión.
3. Se entrega acta N°2 por valor de $ 301.271.272,00 Costo total.

El valor de la presente acta de obra N°2 asciende a 301.271.272,00

Informe financiero:

Valor contrato:	$ 533.560.605,00
Acta No1:	$ 232.286.398,00
Acta No2:	$ 301.271.272,00
Valor pagado anticipo:	$ 0
Valor Final Contrato:	$ 533.557.670,00
Saldo:	$ 2.935,00

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente
FONDESER

FADIEL VELASQUEZ GÓMEZ
Contratista

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Interventor

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

ACTA PARCIAL NRO 5 FINAL

EL RETIRO
Fondeser

OBJETO: INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO.-0-1-430-2021"				CONTRATISTA: FAVELCO INGENIERIA SAS INTERVENTOR: JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO CONTRATO DE OBRA: 674 de 2020		$ 533.560.000 $ 533.460.000	FECHA INICIO ADICION 1 SUSPENSIÓN 1	7/09/2020	FECHA TERMINACION REINICIO 1 REINICIO 2	11/1/2022	FINAL PRORROGA 1 PRORROGA 2	NOVIEMBRE 11 DE 2021	
ITEM	DESCRIPCION	OBRAS PRELIMINARES				MOVIMIENTO DE TIERRAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. De tiara con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pinturo, linea de trazado, corte de pies, Bordes y clavos.	Dia	4	728.644	$ 2.914.576,00	3	2.185.932,00	0,00	0,00	3,00	2.185.932,00	1,00	728.644,00
	DEMOLICIONES						0,00						
2	Demoliciones de placa y andenes en concreto e=30 cm. manual o mecanicamente.Incluye corte de concreto ,cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo o estructura de soporte, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria o botaderos certificados.	m2	82,56	53.480	$ 3.387.780,00	75,45	4.033.408,10		0,00	75,45	4.033.408,00	(11,69)	(625.615,62)
3	Corte para junta de piso, 5 mm, incluye tratamiento sello de juntas base poliuretano para exteriores	m	42,4	31.259	$ 1.325.653,00	0	0,00			0,00	0,00	42,40	1.325.653,00
	MOVIMIENTOS DE TIERRA LLENOS						0,00				0,00		
4	Excavacion a maquina o manual de 0-2 m en material común bajo cualquier grado de humedad incluye botada y disposición final de los materiales.	m3	883	81.900	$ 64.136.884,00	787,963	62.871.156,34	45,70	3.729.276,00	813,66	66.405.433,00	(150,26)	(12.282.948,62)
5	Suministro, transporte,colocación, conformación y compactación de Base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado	m3	958	259.002	$ 114.505.405,00	448,784	84.021.338,41	40,70	8.507.632,40	489,49	102.529.842,00	85,51	13.775.402,94
	PAVIMENTO Y ANDENES						0,00				0,00		
6	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.60 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas rasuradas. Referencia Bordillo Barrera Recta Tipo I(10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	598,17	83.766	$ 13.536.336,00	71,5	5.990.643,00	66,70	5.588.650,00	138,20	11.579.993,00	30,67	1.787.294,28
7	Construcción de ANDEN en concreto de 21 MPa, con un ESPESOR DE 0.10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección,cortes, pulida de ANDEN,malla electrosoldada D-84, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construcción. INCLUYE EXTRESUELO Y RECEBO EN BASE GRANULAR SEGUN DISEÑO	m2	78,11	178.137	$ 13.736.261,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	78,11	13.736.061,07
8	Colocacion de LOSETA TACTIL GUÍA COLOR SEGUN DISEÑO PUMPRA de 20x20x6 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales,perfilacion, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento segun diseño y recomendaciones del M.E.P.	m	62,07	121.757	$ 8.340.409,00	0	0,00	50,30	6.124.680,10	50,30	6.124.680,00	1,77	215.827,39
9	Suministro transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Rodiseo, que cumpla con el Artículo 450-13, incluye suministro y riego de emulsion asfáltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular, limpieza de la superficie y demarcación, compactación de la mezcla y todo el andamio constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad . No incluye demoliciones,excavaciones, Subbalaste y base granular para bacheo que se pagaran en el item correspondiente.	m3	157	1.498.224	$ 235.261.818,00	0	0,00	115,09	173.011.679,32	115,09	173.011.680,00	(6,68)	(10.308.651,32)
	ACERO DE REFUERZO						0,00				0,00		
10	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa , incluye amarrando y todo lo necesario para su correcta instalación	kg	200	8.353	$ 1.670.600,00	0	0,00	20,83	167.745,99	20,83	167.744,00	179,17	1.442.866,01
	OTROS						0,00				0,00		
11	Suministro e instalación de grama nacuna en rollo, incluye nivelación y paisajismo	m2	200	21.201	$ 4.240.200,00	0	0,00	196,91	4.194.379,91	196,91	4.194.380,00	3,09	65.820,09
12	Construccion de sumideros tipo S- H 0.60 0.60, incluye concreto de 21 Mpa refuerzo y rejilla	und	4	1.120.430	$ 4.481.720,00	0	0,00	3,00	3.361.290,00	3,00	3.361.290,00	1,00	1.120.430,00
13	Suministro, transporte e instalación de tuberia novafort de 10"	m	80	121.509	$ 9.720.720,00	22,5	2.855.491,20		0,00	23,00	2.855.493,00	56,50	6.865.226,50
14	Suministro, transporte e instalacion de concreto de 21 Mpa para atraque de tuberia. No incluye acero de refuerzo	m3	2	712.918	$ 1.425.836,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	1.425.836,00
15	Construccion de cuneta en concreto de 21 Mpa	m	41	93.894	$ 3.849.654,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	41,00	3.849.654,00
16	Suministro, transporte y aplicación de pintura plastico en frio para demarcación de lineas de 20,40 m blanca o amarilla para demarcacion de paso peatonal, cebras, lineas de pare, lineas longitrinicas, entre otras. Según especificaciones tecnicas del Manual de Señalización vial 2015	m	180	70.600	$ 11.294.000,00	0	0,00	8,40	593.040,00	8,40	593.040,00	151,60	10.702.960,00
17	Suministro, transporte e instalacion de tapaderas en concreto de 1210.30X80 cm	und	80	24.517	$ 1.961.360,00	0	0,00	110,00	2.696.570,00	110,00	2.696.575,00	(30,00)	(735.515,00)

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco

ACTA PARCIAL UNO Y FINAL

EL RETIRO
Fondeser

OBJETO: INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR INCENTIVANDO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO) SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 019 (2021)"

CONTRATISTA: FABIO VELASQUEZ GOMEZ
INTERVENTOR: JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO

CONTRATO DE OBRA: 019 de 2021

$ 533.560.805
$ 533.560.805

FECHA INICIO: 7/09/2021
ADICIÓN 1:
SUSPENSIÓN 1:
REINICIO 1:
REINICIO 2:
FECHA TERMINACIÓN: 17/11/2021
PRORROGA 1:
PRORROGA 2:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CONTRATO	TOTAL	PRESUPUESTO CANTIDAD	PRESUPUESTO TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO POR EJECUTAR TOTAL
	OBRA EXTRA										0,00		
OE-1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,10m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de tela y estructura de tela y estructura de tela en guaduas curvas, concreto de 17,5MPa para fijación de estructura en madera curvas. Incluye excavación manual, cargue, transporte y botada de material y los demas elementos necesarios para su correcta instalación.	m		19.645,00		268,4	5.272.718,00		0,00	268,40	5.272.718,00	(268,40)	(5.272.718,00)
OE-2	Retiro de puerta y luminarias. Incluye desmonte, traslado y reinstalación, excavación manual, cargue, transporte y botada de material y los demas elementos necesarios para su correcta instalación.	und		262.620,00		2	525.240,00		0,00	2,00	525.240,00	(2,00)	(525.240,00)
OE-3	Construcción de caja de inspección de 40cmE altura hasta 120 cm. En concreto de 21 Mpa, incluye tapa en concreto con su respectivo bombijo. Suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa hierrajo, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. segun diseño y especificaciones de E.P.M. la excavación, llenos, retiro/sobrante y acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	und		415.959,00		0	0,00	4,00	1.663.836,00	4,00	1.663.836,00	(4,00)	(1.663.836,00)
OE-4	Demolición de pavimento asfáltico incorporamiento cualquier espesor. Incluye corte con equipos según tramo, y cargue, transporte y disposición final de escombros	m2		37.701,00		9,72	366.745,32	9,72	366.745,32	19,44	733.491,00	(19,44)	(733.491,00)
OE-5	Suministro e instalación de tubería de 2" conduit, no incluye excavación y llenos	ml		21.233,00		0	0,00	58,80	1.197.541,20	58,80	1.197.541,20	(58,80)	(1.197.541,20)
OE-6	Suministro e instalación de tubería de 3/4" conduit no incluye excavacion y llenos	ml		8.437,00		0	0,00	41,15	347.182,55	41,15	347.182,55	(41,15)	(347.182,55)
OE-7	Usmo para cimentaciones de redes en mturado D: 3/4" maximo	m3		175.027,00		4,34	759.994,58		0,00	4,34	759.995,00	(4,34)	(759.994,58)
OE-8	Construcción de ANDEN en concreto de 21 MPa, con un ESPESOR DE 0.10m. incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección curias, pulido de ANDEN malla electrosoldada D-84, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construcción. INCLUYE ENTRESUELO Y RECEBO EN BASE GRANULAR SEGUN DISEÑO	m2		220.715,00				66,39	14.646.647,40	66,39	14.646.647,00	(66,39)	(14.646.647,40)
OE-9	Suministro, transporte y aplicación de pintura plastica en frio para demarcación de lineas de 0,12 en blanco o amarilla para demarcación calzadas. Segun especificaciones técnicas del Manual de Señalización vial 2015.	m		10.152,00				313,48	3.184.988,16	313,48	3.184.988,00	(313,48)	(3.184.988,16)
OE-10	Suministro e instalación de Cable nº 12 ftfmvialpolar para acometida luminarias parqueaderos	m		13.993,00				56,40	755.365,20	56,40	755.365,00	(56,40)	(755.365,20)
OE-11	Suministro e instalación de Cable nº 8 ftfmvialpolar para acometida luminarias parqueaderos	m		24.282,00				41,15	999.204,30	41,15	999.204,00	(41,15)	(999.204,30)
	COSTO DIRECTO				$ 410.431.234,80		$ 178.681.845,08		$ 231.747.132,08		$ 410.428.977,00		$ 2.257,80
	ADMINISTRACIÓN		0,25		$ 102.607.808,20		$ 44.670.461,08		$ 57.936.783,08		$ 102.607.244,00		$ 564,20
	UTILIDAD		0,05		$ 20.521.562,80		$ 8.934.092,08		$ 11.587.357,08		$ 20.521.449,00		$ 113,80
	VALOR TOTAL				$ 533.560.605,80		$ 232.286.398,08		$ 301.271.272,08		$ 533.557.670,00		$ 2.935,80

FABIO VELASQUEZ GOMEZ
CONTRATISTA

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
INTERVENTOR

JAROL GONZALEZ FRANCO
SUPERVISOR -FONDESER

EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA	C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
				CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO	MOVIMIENTO DE TIERRA/LLENOS					
ACTIVIDAD 4,0	Excavación a maquina o manual de 0-2 m,en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye botada y disposición final de los materiales.			UNIDAD M3	CANTIDAD ACUMULADA	813,66

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	M3		
excavacion para sumidero calle 22 lado sur salida via pantanillo, incluye mesa para cimentacion		0,8	0,60	4,30	2,06		
excavacion para sumidero lado oocidental parquedero el cipres, via interna* calle 22		0,8	0,6	19,20	9,22		
excavación para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres), calle 22* via salida pantanillo la ceja		0,6	32,1	6,2	119,41		
excavación para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres) lado occidental* via interna		1,1	9,2	18,5	187,22		
excavación para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres) lado occidental* via interna con parquedero existente		0,65	4,2	9,5	25,94		
excavacion para estructura de pavimento en parqueadero 2-3		0,65	12,3	46,8	374,17		
excavacion para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2 parqueadero 1 (el cipres), calle 22 lado sur* via pantanillo la ceja		0,2	1,5	33,00	9,90		
excavacion para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2 parqueadero 1 (el cipres), lado occidental, via interna* calle 22 parte baja		0,2	1,5	16,7	5,01		
excavacion para remplazo de fallo en parquadero 2-3 parte central		0,3	9	11,2	30,24		
excavación para remplazo de fallo en parqueadero 1 parte baja lado oriental al talud		0,2	4	6	4,80		
ACTA 1					767,96	1,0	767,96
excavacion para sumidero calle 22 lado sur salida via pantanillo, incluye mesa para cimentacion		0,6	0,60	4,30	1,55		
excavacion para sumidero lado oocidental parquedero el cipres, via interna* calle 22		0,6	0,6	19,20	6,91		
excavacion para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2		0,2	1,5	33,00	9,90		
excavacion para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2		0,2	1,5	16,7	5,01		
excavacion para remplazo de fallo en parquadero 2-3 parte central		0,3	9	9,73	26,27		
excavación para remplazo de fallo en parqueadero 1 parte baja lado oriental al talud		0,2	4	6	4,80		
Excavación para tuberia electrica parqueadero		0,5	0,4	53,05	10,61		

Guayacanes 1 Cipres							
Excavación para tubería electrica parqueadero Guayacanes 2		0,5	0,4	41,45	8,29		
excavación para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres), calle 22* via salida pantanillo la ceja parte alta de acuerdo con plano de topografia					95,79		
excavación para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres) lado occidental* via interna parte baja de acuerdo con plano de topografia					264,25		
excavacion para estructura de pavimento en parqueadero 2-3 de acuerdo con plano de topografia					380,28		
ACTA 2 (topografia final)					813,66	**2,0**	45,70
				SUBTOTAL	813,66	**ACUMULADO DE ACTAS**	813,66

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	7-sep-23	A	17-nov-23	**ACTA DE OBRA**	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023*			**INTERVENTORÍA**	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		MOVIMIENTO DE TIERRA/LLENOS					
ACTIVIDAD	5,0	Suministro, transporte,colocación, conformación y compactación de Base granular. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.			**UNIDAD** M3	**CANTIDAD ACUMULADA**	490,49

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	M3		
base para remplazo para sumidero calle 22 lado sur salida via pantanillo, incluye mesa		0,6	0,60	4,30	1,55		
base para sumidero lado oocidental parquedero el cipres, via interna* calle 22		0,6	0,6	19,20	6,91		
base granular para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres), calle 22* via salida pantanillo la ceja		0,4	32,1	6,2	79,61		
base granular estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres) lado occidental* via interna		0,4	9,2	18,5	68,08		
base granular para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres) lado occidental* via interna con parquedero		0,4	4,2	9,5	15,96		
base granular para estructura de pavimento en parqueadero 2-3		0,4	12,3	46,8	230,26		
base granular para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2 parqueadero 1 (el cipres), calle 22 lado sur* via pantanillo la ceja		0,2	1,5	33,00	9,90		
base granular para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2 parqueadero 1 (el cipres), lado occidental, via interna* calle 22 parte baja		0,2	1,5	16,7	5,01		
base granular para remplazo de fallo en parquadero 2-3 parte central		0,3	7	13,2	27,72		
base granular para remplazo de fallo en parqueadero 1 parte baja lado oriental al talud		0,2	4	6	4,80		
ACTA 1					449,79	1,0	449,79
base para remplazo para sumidero calle 22 lado sur salida via pantanillo, incluye mesa para cimentacion		0,4	0,60	4,30	1,03		
base para sumidero lado oocidental parquedero el cipres, via interna* calle 22		0,4	0,6	19,20	4,61		

base granular para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2 parqueadero 1 (el cipres), calle 22 lado sur* via pantanillo la ceja		0,2	1,5	33,00	0,00		
base granular para conformacion de anden, por debajo de estructura que se paga en el item 2 parqueadero 1 (el cipres), lado occidental, via interna* calle 22 parte baja		0,2	1,5	16,7	0,00		
base granular para remplazo de fallo en parquadero 2-3 parte central		0,3	7	9,73	20,43		
base granular para remplazo de fallo en parqueadero 1 parte baja lado oriental al talud		0,2	4	6	4,80		
base granular para estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres), calle 22* via salida pantanillo la ceja, Guayacanes 1			**Area**	**E**	**VOL**		
			187,34	0,4	74,94		
base granular estructura de pavimento en parqueadero 1 (el cipres) lado occidental* via interna, guayacanes 1			**Area**	**E**	**VOL**		
			320,28	0,4	128,11		
base granular para estructura de pavimento en parqueadero guayacanes 2-3			**Area**	**E**	**VOL**		
base granular para estructura de pavimento en parqueadero guayacanes 2-3			**Area**	**E**	**VOL**		
			641,43	0,4	256,57		
ACTA 2 (topografia final)					490,49	**2,0**	**40,70**
				SUBTOTAL	490,49	**ACUMULADO DE ACTAS**	490,49

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	**ACTA DE OBRA**	2
NOMBRE DEL PROYECTO		**INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"**			**INTERVENTORÍA**	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		PAVIMENTOS Y ANDENES					
ACTIVIDAD	6,0	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.			**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	138,20
					M		

UBICACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**			**TOTAL**	**ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
		ALTURA	**ANCHO**	**LARGO**	**M**		
cordon prefabricado parqueadero 1 (el cipres), lado norte parte alta* via pantanillo la ceja				30,80	30,80		
cordon prefabricado parqueadero 1 (el cipres), lado norte parte baja* via interna bicentenario				14,00	14,00		
cordon prefabricado parqueadero 1 (el				7,90	7,90		

cipres), lado norte parte baja* via pantanillo la ceja							
cordon prefabricado parqueadero 1 (el cipres), lado sur parte baja* via pantanillo la ceja				18,8	18,80		
ACTA 1					71,50	**1,0**	71,50
cordon prefabricado parqueadero 1 (el cipres), lado occidental parte alta* via pantanillo la ceja				6,6	6,60		
cordon parqueadero guayacanes 2-3 lado occidental talud				44,15	44,15		
cordon parqueadero guayacanes 2-3 lado sur				5,1	5,10		
cordon parqueadero guayacanes 2-3 lado norte colindante parqueadero				2,4	2,40		
cordon parqueadero guayacanes 2-3 lado oriente colindante edificios				7,7	7,70		
Descuento cordon prefabricado parqueadero 1 (el cipres), lado norte parte baja* via interna				-0,20	-0,20		
cordon prefabricado parqueadero 1 (el cipres), lado sur parte baja* via pantanillo la				0,95	0,95		
ACTA 2					66,70	**2,0**	**66,70**

	SUBTOTAL	66,70	**ACUMULADO DE ACTAS** 138,20

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO







EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	**ACTA DE OBRA**	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			**INTERVENTORÍA**	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		PAVIMENTOS Y ANDENES					
ACTIVIDAD	8,0	Colocación de LOSETA TACTIL GUÍA COLOR SEGUN DISEÑO PIZARRA de 20x20x6 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero			**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	50,30
					M		

UBICACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**			**TOTAL**	**ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
		ALTURA	**ANCHO**	**LARGO**	**M**		
Loseta guia sobre anden nuevo (cipres Guayacanes I), lado sur via pantanillo la ceja				33,40	33,40		
Loseta guia sobre anden nuevo (cipres Guayacanes I),parquedero parte baja, via interna				16,90	16,90		
ACTA 2					50,30	**2,0**	**50,30**
				SUBTOTAL	50,30	**ACUMULADO DE ACTAS**	**50,30**

OBSERVACIONES


DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





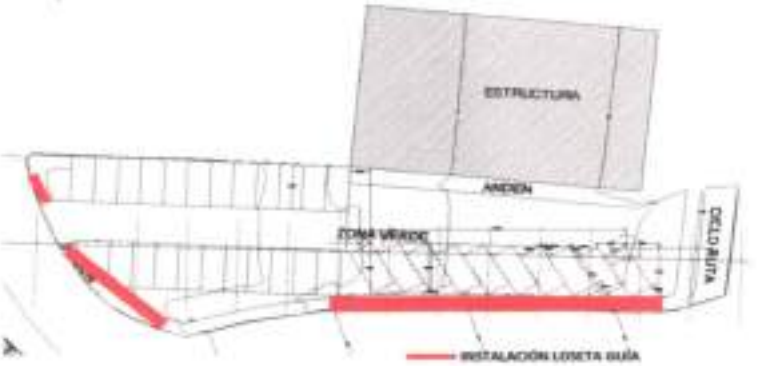

EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		PAVIMENTOS Y ANDENES					
ACTIVIDAD	9,0	Suministro transporte y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Bacheos, que cumpla con el Artículo 450-13. Incluye suministro y riego de emulsión asfáltica para el ligado de paredes			UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	115,88
					M3		

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
			Area	E	VOL		
mezcla asfaltica MDC 19,parqueadero guayacanes 1, via pantanillo (parte Alta)			187,34	0,1	18,73		
mezcla asfaltica MDC 19,parqueadero guayacanes 2-3			641,47	0,1	64,15		
mezcla asfaltica MDC 19,parqueadero guayacanes 1, via pantanillo (Parte baja)			320,28	0,1	32,03		
mezcla asfaltica MDC 19 en brecha para conexión de sumidero calle 22 lado sur * via pantanillo-laceja			0,06	2,50	0,15		
mezcla asfaltica MDC 19 en brecha para conexión para sumidero calle 22 lado			0,06	13,7	0,82		
ACTA 2 (areas topografia)					115,88	2,0	115,88
				SUBTOTAL	115,88	ACUMULADO DE ACTAS	115,88

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO









EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		ACERO DE REFUERZO					
ACTIVIDAD	10,0	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa , incluye engrasante y todo lo necesario para su correcta instalacion			UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	20,83
					KG		

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		L	ANCHO	peso	KG		
sumidero via calle 22* via la ceja pantanillo	5	0,8		0,56	2,24		
	2	0,8		0,56	0,90		
	2	3,4		0,56	3,81		
sumidero frente a edificio abedules* via la ceja pantanillo	5	0,8		0,56	2,24		
	2	0,8		0,56	0,90		
	2	3,4		0,56	3,81		
sumidero Guayacanes 2 y 3	5	0,8		0,56	2,24		
	2	0,8		0,56	0,90		
	2	3,4		0,56	3,81		
ACTA 2					20,83	2,0	20,83
				SUBTOTAL	20,83	ACUMULADO DE ACTAS	20,83

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA


Melissa Zuluaga C


RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





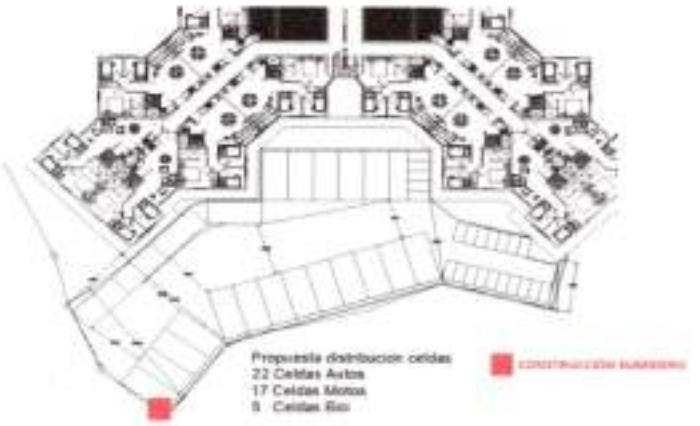

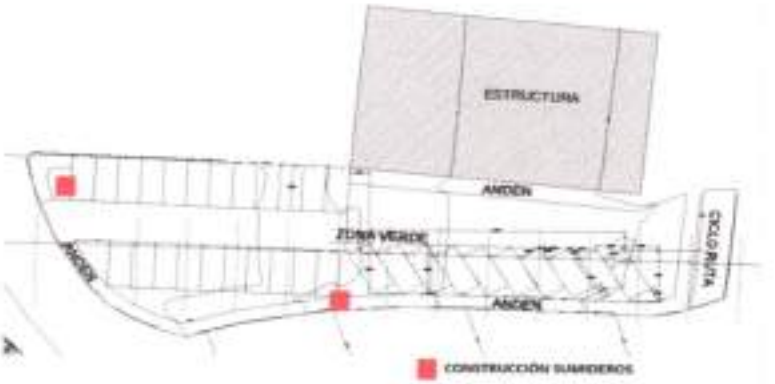

EL RETIRO

Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
CAPITULO		OTROS			CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
ACTIVIDAD	11,0	Suministro e instalacion de grama macana en talud, incluye nivelacion y paisajismo			UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	196,91
					M2		

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	M2		
engramado lado norte guayacanes 1 parqueadero parte alta			3,400	30,7	104,38		
engramado lado sur guayacanes 1 parqueadero parte baja			1,40	16,9	23,66		
engramado lado oriental guayacanes 1 parqueadero parte baja			3,40	7,8	26,52		
engramado lado norte guayacanes 1 parqueadero parte baja			1,10	7	7,70		
engramado guayacanes 2-3 lado occidental talud rio			0,60	44	26,40		
engramado guayacanes 2-3 lado sur			1,65	5	8,25		
ACTA 2					196,91	2,0	196,91
				SUBTOTAL	196,91	ACUMULADO DE ACTAS	196,91

OBSERVACIONES

Juan

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA









INSTALACIÓN GRAMA
Propuesta distribucion celdas
22 Celdas Autos
17 Celdas Motos
5 Celdas Bici

REGISTRO FOTOGRÁFICO





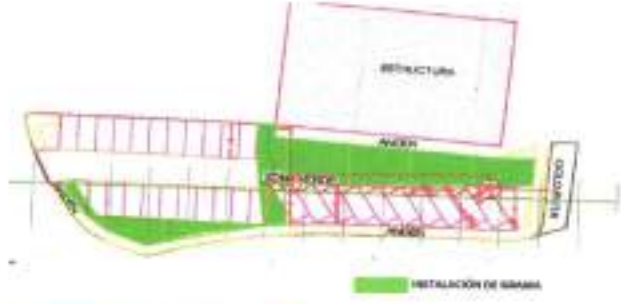





EL RETIRO

Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	7-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
CAPITULO		OTROS			CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
ACTIVIDAD	12,0	Construccion de sumideros tipo B, H:0,40-0,50, incluye concreto de 21 Mpa, refuerzo y rejilla			UNIDAD: UND	CANTIDAD ACUMULADA	3,00

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	UND		
sumidero guayacanes 1 parquedero parte alta	1				1,00		
sumidero guayacanes 1 parquedero parte baja	1				1,00		
sumidero guayacanes 2-3	1				1,00		
ACTA 2					3,00	2,0	3,00
				SUBTOTAL	3,00	ACUMULADO DE ACTAS	3,00

OBSERVACIONES

JMSM
DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga Cardona
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO













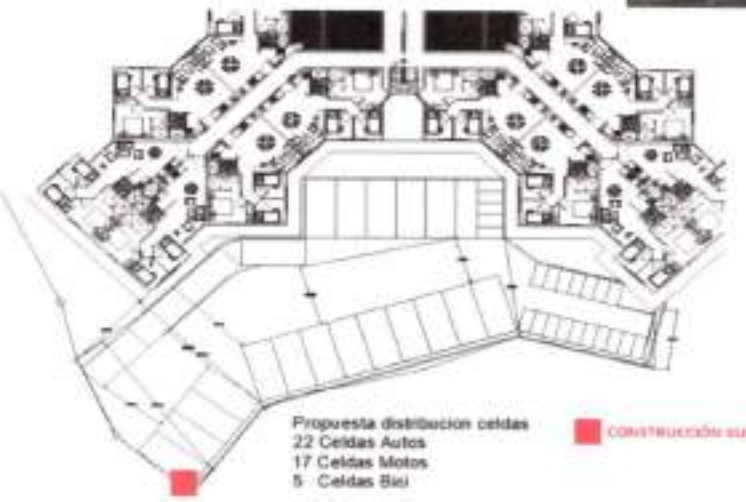

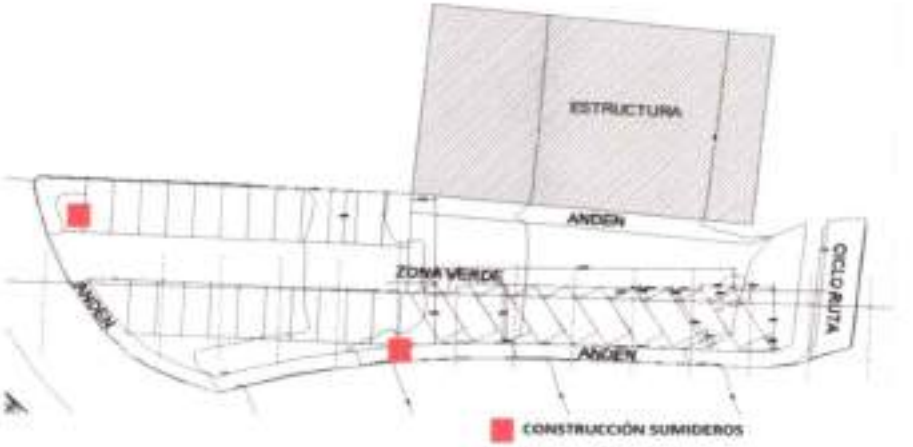

EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA	C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
				CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO	OTROS					
ACTIVIDAD 16,0	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio para demarcación de linea de 2*0,40 m blanca o amarilla para demarcación de paso peatonal, cebras, linea de pare, lineas logaritmicas, entre otras.			UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	8,40
				ML		

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	ML		
Parqueadero Guayacanes 2-3	7			1,20	8,40		
ACTA 2					8,40	1,0	8,40
				SUBTOTAL	8,40	ACUMULADO DE ACTAS	8,40

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	7-sep-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		OTROS					
ACTIVIDAD	17,0	Suministro, transporte e instalacion de topellantas en concreto de 12X30X60 cm.			UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	110,00
					UND		

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	UND		
Parqueadero Gayacanes 1 parte alta					26,00		
Parqueadero Gayacanes 1 parte baja					34,00		
Parqueadero Gayacanes 2-3					38,00		
Parqueadero Gayacanes 2-3					12,00		
ACTA 2					**110,00**	**2,0**	**110,00**
				SUBTOTAL	110,00	**ACUMULADO DE ACTAS**	110,00

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO







EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	7-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		OBRA EXTRA					
ACTIVIDAD	OE3	Construcción de caja de inspección de 40x40 altura hasta 120 cm. En concreto de 21 Mpa, incluye tapa en concreto con su respectivo herraje. Suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. según diseño y especificaciones de E.P.M. la excavación, llenos, estresuelo y acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.			UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	4,00
					UND		

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	UND		
Parqueadero Gayacanes 1 parte alta	2				2,00		
Parqueadero Gayacanes 2-3 Zona verde	2				2,00		
ACTA 2					4,00	2,0	4,00
				SUBTOTAL	4,00	ACUMULADO DE ACTAS	4,00

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO












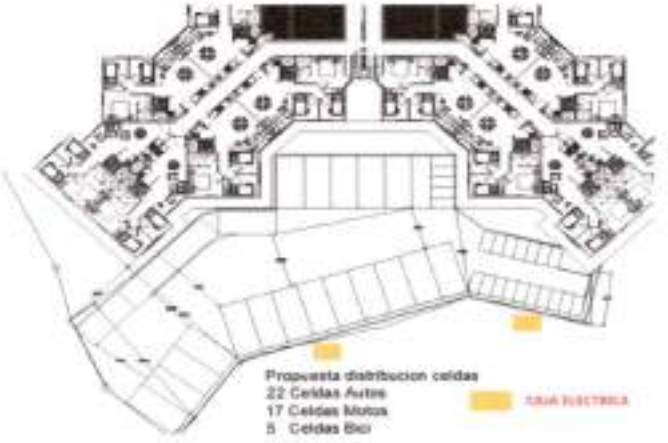



EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		OBRA EXTRA					
ACTIVIDAD	OE5	Suministro e instalación de tuberia de 2" conduit, no incluye excavacion y llenos			UNIDAD: ml	CANTIDAD ACUMULADA	56,40

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	ml		
Parqueadero Gayacanes 1 parte alta				56,40	56,40		
ACTA 2					56,40	2,0	56,40
				SUBTOTAL	56,40	ACUMULADO DE ACTAS	56,40

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		OBRA EXTRA					
ACTIVIDAD	OE6	Suministro e instalación de tubería de 3/4" conduit, no incluye excavacion y llenos			UNIDAD: ml	CANTIDAD ACUMULADA	41,15

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	ml		
Parqueadero Gayacanes 2-3 Zona verde				41,15	41,15		
ACTA 2					41,15	2,0	41,15
				SUBTOTAL	41,15	ACUMULADO DE ACTAS	41,15

OBSERVACIONES

JMQM
DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EL RETIRO

Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
CAPITULO		OBRA EXTRA			CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
ACTIVIDAD	OE8	Construcción de ANDEN en concreto de 21 MPa. con un **ESPESOR DE 0.15m**. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección,cortes, pulida de ANDEN,malla electrosoldada D-84, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. INCLUYE ENTRESUELO Y RECEBO EN BASE GRANULAR SEGUN DISEÑO			UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	66,36
					m2		

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	m2		
Concreto para anden lado sur guayacanes 1 parqueadero parte alta via retiro pantanillo			1,35	33,60	45,36		
Concreto para anden lado occidental guayacanes 1 parqueadero parte baja via interna			1,25	16,8	21,00		
ACTA 2					66,36	2,0	66,36
				SUBTOTAL	66,36	ACUMULADO DE ACTAS	66,36

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO












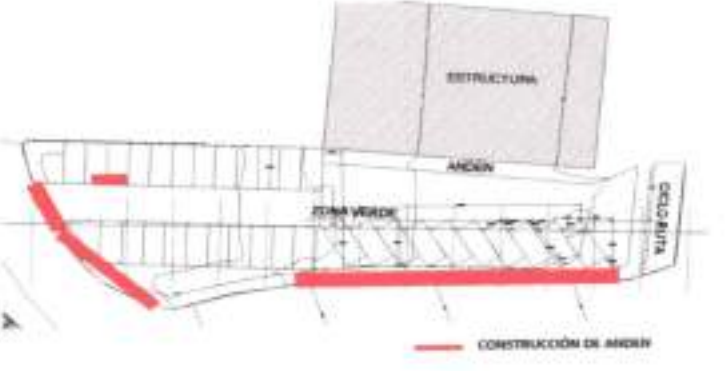

EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA	C - 074 - 2023	6-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023"			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
				CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO	OBRA EXTRA			UNIDAD		
ACTIVIDAD	OE9	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio para demarcación de linea de 0,12 m blanca o amarilla para demarcación celdas. Según especificaciones técnicas del Manual de Señalización vial 2015.		ml	CANTIDAD ACUMULADA	313,48

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	ml		
Guayacanes 1 (Cipres) parqueadero, parte alta	14			4,45	62,30		
Guayacanes 1 (Cipres) parqueadero, parte baja	16			4,45	71,20		
Guayacanes II y III parqueadero (carro) lado zona verde	14			4,51	63,14		
Guayacanes II y III parqueadero (carro)	5			4,93	24,65		
Guayacanes II y III parqueadero (linea longitudinal división entre edificios y celdas)	1			7,34	7,34		
Guayacanes II y III parqueadero (linea longitudinal división entre edificios y celdas)	1			4,9	4,90		
Guayacanes II y III parqueadero (motos)	23			2	46,00		
Guayacanes II y III parqueadero (edificios carro)	7			4,85	33,95		
ACTA 2					313,48	2,0	313,48
				SUBTOTAL	313,48	ACUMULADO DE ACTAS	313,48

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO







EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		OBRA EXTRA					
ACTIVIDAD	DE10	Suministro e instalación de Cable n° 12 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos			UNIDAD: ml	CANTIDAD ACUMULADA	56,40

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	ml		
Guayacanes 1 (Ciprés) parqueadero, parte alta				56,40	56,40		
					0,00		
Guayacanes II y III parqueadero							
ACTA 2					56,40	1,0	56,40
				SUBTOTAL	56,40	ACUMULADO DE ACTAS	56,40

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EL RETIRO
Fondeser

MEMORIA DE CANTIDADES
ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

favelco ingeniería

CONTRATO DE OBRA		C - 074 - 2023	8-oct-23	A	17-nov-23	ACTA DE OBRA	2
NOMBRE DEL PROYECTO		INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 080-			INTERVENTORÍA	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	98.639.809
					CONTRATISTA	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	15.437.149
CAPITULO		OBRA EXTRA					
ACTIVIDAD	OE11	Suministro e instalación de Cable n° 8 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos			UNIDAD: ml	CANTIDAD ACUMULADA	41,15

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL	ACTA	CANTIDAD A PAGAR
		ALTURA	ANCHO	LARGO	ml		
Parqueadero Gayacanes 2-3 Zona verde				41,15	41,15		
ACTA 2					41,15	2,0	41,15
				SUBTOTAL	41,15	ACUMULADO DE ACTAS	41,15

OBSERVACIONES

JMAM
DIRECTOR DE OBRA

Melissa Zuluaga C.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

favelco
ingeniería

0.1.3 APU OBRA EXTRA

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS DE OBRA EXTRA 002

NÚMERO	074 de 2023
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023.
CONTRATISTA	Fadiel Velásquez Gómez Orozco C.C. 15.437.149
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER)
VALOR	Quinientos treinta y tres millones quinientos sesenta mil seiscientos cinco pesos M/L ($533.560.605).
PLAZO INICIAL	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 17 de noviembre de 2023.
PLAZO	17 de noviembre de 2023.

Fecha de iniciación: 7 de septiembre de 2023.
Fecha de terminación: 17 de noviembre de 2023.

En el Municipio de El Retiro (Antioquia) a los 12 días del mes de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de FONDESER, el señor **JAROL ARMANDO GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **71.556.550**, gerente de FONDESER, en calidad **CONTRATANTE;** el señor **JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía número **98.639.809**, en calidad **INTERVENTOR;** el señor **FADIEL VELASQUEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **15.437.149**, en calidad de **CONTRATISTA;** el señor **CAMILO VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.040.182.805**, en calidad de **SUPERVISOR** por parte del Municipio, con el fin de elaborar la presente acta de aprobación de precios de obra extra.

Se deja constancia de lo siguiente:

El valor de los ítems incluyen AU.

Los ítems y precios de obra extra pactados son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO
			Pactado
OE-8	Construcción de ANDEN en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.15m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección,cortes, pulida de ANDEN,malla electroIsoldada D-84, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. INCLUYE ENTRESUELO Y RECEBO EN BASE GRANULAR SEGUN DISEÑO	m2	283.055,00
OE-9	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio para demarcación de linea de 0,12 m blanca o amarilla para demarcación celdas. Según especificaciones técnicas del Manual de Señalización vial 2015.	ML	13.250,00
OE-10	SSuministro e instalación de Cable n° 12 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos	ML	16.631,00
OE-11	Suministro e instalación de Cable n° 8 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos	ML	30.917,00

Observaciones:

De acuerdo con los APU presentados por el contratista y analizados en conjunto con la interventoria, se concluye que las actividades anteriormente descritas corresponden a actividades complementarias para el desarrollo del contrato. Actividades que no se encuentran dentro de las condiciones contractuales.

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Interventor.

FADIEL VELASQUEZ GÓMEZ
Contratista

CAMILO VALENCIA
Director de obras públicas e infraestructura

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente Fonderser

APUs PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

"INTERVENCION DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) No. C.I 030 – 2023"

ITEM: 06-8 | UNIDAD: m2 | CANTIDAD: | PRECIO UNITARIO: $227.000 | PRECIO TOTAL: $208.136

Construcción de ANDEN en concreto de 21 MPa, con un **ESPESOR DE 0.15m**. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección cortes, juntas de ANDEN,malla electrosoldada D-84, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. INCLUYE ENTRESUELO Y RECEBO EN BASE GRANULAR SEGUN DISEÑO

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor	4	$77.336	0.050000	$3.866
Vibrador electrico a gasolina	6	$82.573	0.040000	$3.303
			Sub-Total	$7.170

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto	m3	0.150000	$580.000	$87.000
base granular para estructura de entrevado	m3	0.300000	$115.000	$23.000
malla electrosoldada d84 4 mm	m2	1.200000	$6.800	$12.240
formaleta	gb	1.000000	$9.936	$9.936
			Sub-Total	$132.176

III. TRANSPORTES

Descripción	Incl.pase/Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Externo	0.950000	9	1	$7.936	$13.176
Interno	0.950000	0.1	1	$8.350	$327
			Sub-Total		$13.503

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$154.040	146.78%	$340.764	0.210000	$80.561
Ayudante	$86.708	146.78%	$127.276	0.210000	$26.729
			Sub-Total		$77.290

Total Costo Directo: $227.000

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	0.29%	$59.230
UTILIDAD	0.05%	$11.861
Sub-Total	0.00%	$208.136

JUSTIFICACIÓN deacuerdo a las determinaciones tomadas en campo y teniendo en cuenta que los andenes hacen parte de la circulación vehicular se hace necesario mejorar su especificación por lo que se aumenta el espesor del concreto

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA

Revisó: Melissa Zuluaga C. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Revisó: DIRECTOR DE OBRA

Aprobó: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisó por parte de la entidad: APOYO A LA SUPERVISIÓN

Visto bueno: SUPERVISOR

APUs REVISADOS POR LA INTERVENTORÍA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

"INTERVENCION DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) No. C.I 030 – 2023"

ITEM: 06-8 | UNIDAD: m2 | CANTIDAD: 5.00 | PRECIO UNITARIO: $227.794 | PRECIO TOTAL: $283.000

Construcción de ANDEN en concreto de 21 MPa, con un **ESPESOR DE 0.15m**. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección cortes, juntas de ANDEN,malla electrosoldada D-84, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. INCLUYE ENTRESUELO Y RECEBO EN BASE GRANULAR SEGUN DISEÑO

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta menor	4	$82.573	0.050000	$3.729
Vibrador electrico a gasolina	6	$82.573	0.080000	$3.916
			Sub-Total	$5.746

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto	m3	0.157500	$580.000	$91.350
base granular para estructura de entrevado	m3	0.209000	$118.000	$23.000
malla electrosoldada d84 4 mm	m2	1.200000	$6.800	$12.240
formaleta	gb	1.000000	$9.936	$9.936
			Sub-Total	$135.866

III. TRANSPORTES

Descripción	Incl.pase/Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Externo	0.950000	9	1	$7.936	$13.176
Interno	0.950000	0.1	1	$8.350	$327
			Sub-Total		$13.503

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$154.040	146.78%	$340.764	0.170000	$65.895
Ayudante	$86.708	146.78%	$127.276	0.170000	$21.637
			Sub-Total		$82.571

Total Costo Directo: $227.794

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	0.29%	$64.434
UTILIDAD	0.05%	$11.987
Sub-Total	0.00%	$283.000

JUSTIFICACIÓN de acuerdo a las determinaciones tomadas en campo y teniendo en cuenta que los andenes hacen parte de la circulación vehicular se hace necesario mejorar su especificación por lo que se aumenta el espesor del concreto

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA

Revisó: Melissa Zuluaga C. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Revisó: DIRECTOR DE OBRA

Aprobó: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisó por parte de la entidad: Varela B. APOYO A LA SUPERVISIÓN

Visto bueno: Camilo V. SUPERVISOR ALCALDIA

Bucaramanga 28 julio de 2023

Asunto: Listado de precios

LISTA DE PRECIOS

AÑO 2023

MATERIAL	PRECIO TONELADA SIN IMPUESTOS
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

Observaciones:

[illegible]

APUs PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

"INTERVENCION DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) No. C.1030 – 2023"

ITEM:	06-8	UNIDAD:	ml
Suministro, transporte y aplicacion de pintura plastico en frio para demarcación de linea de 0.12 m blanca o amarilla para demarcación celdas. Segun especificaciones tecnicas del Manual de Señalizacion vial 2015.		CANTIDAD:	
		PRECIO UNITARIO:	$10.830
		PRECIO TOTAL:	$20.301

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit
Herramienta menor	1	$1.981	0.080000	$194
				$194

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unit
Plastico en frio con resistencia al deslizamiento. Aplicado en spray	gl	0.040000	$168.500	$6.740
Alcohol antideslizante	kg	0.020000	$10.900	$220
Orfa de entrecalles (40m por pulgada)	Unidad	0.040000	$24.900	$996
Desbroche de limpieza	global	1.000000	$2.500	$2.500
				$10.580

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso/Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Externo	0.020000	5	1	$11.715	$1.172
Interno	0.020000	0.1	1	$9.350	$19
					$1.191

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$164.040	146,70%	$240.764	0.010000	$2.408
Ayudante	$99.706	146,70%	$127.276	0.010000	$1.273
					$3.681

Total Costo Directo: $15.456

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	3,5%	$540
UTILIDAD	5,0%	$781
Sub-Total	8,5%	$20.301

JUSTIFICACIÓN para la division de celdas de parqueadero por normatividad se utiliza linea en pintura plastico en frio de espesor de 0,12m

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA

Revisó: Melissa Zuluaga RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Revisó: DIRECTOR DE OBRA

Aprobó: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó por parte de la entidad: APOYO A LA SUPERVISION

Visto bueno: SUPERVISOR

APUs REVISADOS POR LA INTERVENTORIA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

"INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) No. C.1030 – 2023"

ITEM:	06-8	UNIDAD:	ML
Suministro, transporte y aplicación de pintura plastico en frio para demarcación de linea de 0,12 m blanca o amarilla para demarcación celdas. Segun especificaciones tecnicas del Manual de Señalización vial 2015.		CANTIDAD:	0,00
		PRECIO UNITARIO:	$10.150
		PRECIO TOTAL:	$10.150

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit
Herramienta menor	1	$1.843	0.050000	$92
				$92

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unit
Plastico en frio con resistencia al deslizamiento. Aplicado en spray	gl	0,040000	$168.500	$6.740
Alcohol antideslizante	kg	0,020000	$10.900	$218
Orfa de entrecalles (40m por pulgada)	Unidad	0,020000	$24.900	$498
Desbroche de limpieza	global	1,000000	$1.300	$1.300
				$8.756

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso/Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Externo	0,020000	5	1	$11.715	$1.172
Interno	0,020000	0,1	1	$9.350	$19
					$1.191

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial	$164.040	146,70%	$240.764	0,004000	$1.204
Ayudante	$99.706	146,70%	$127.276	0,002000	$636
					$1.840

Total Costo Directo: $10.787

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	5,0%	$540
UTILIDAD	5,0%	$813
Sub-Total	8,0%	$10.250

JUSTIFICACION para la division de celdas de parqueadero por normatividad se utiliza linea en pintura plastico en frio de espesor de 0,12m

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA

Revisó: Melissa Zuluaga RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Revisó: DIRECTOR DE OBRA

Aprobó: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó por parte de la entidad: APOYO A LA SUPERVISIÓN

Visto bueno: SUPERVISOR ALCALDIA

Ruta: Listado de precios

LISTA DE PRECIOS

AÑO 2023

MATERIAL	PRECIO TONELADA O M PUESTO

ESTOS VALORES NO TIENEN INCLUIDO EL IVA Y PRECIO SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Observaciones:

"Estos precios corresponden a los suministros en planta.

"Los precios pueden variar sin previo aviso.

APUs PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

"INTERVENCION DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) No. C.I 039 – 2023"

ITEM: 08.10

Suministro e instalacion de Cable n° 12 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos

UNIDAD: ML
CANTIDAD:
PRECIO UNITARIO: $10.000
PRECIO TOTAL: $10.000

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit
Herramienta menor	3	$7.480	0,050000	$380
			Sub-Total	$380

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unit
cable N° 12 thhn	m	1,000000	$2.120	$2.120
			Sub-Total	$2.120

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso/Cant	Distancia	$/Km	Tarifa	Valor Unit
Externo		20	$30		$600
Interno					$0
			Sub-Total		$600

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unit
Oficial electrico	$194.040	146,79%	$240.784	0,050000	$4.814
Ayudante electrico	$88.709	146,79%	$177.279	0,050000	$2.546
			Sub-Total		$7.360

Total Costo Directo: $10.080

I.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	0,05%	$4.802
UTILIDAD	0,05%	$780
Sub-Total	0,05%	$10.831

JUSTIFICACIÓN: se hace necesario revisar luminarias, las cuales se encontraban dentro del area de parqueaderos y para garantizar su funcionamiento se ejecuta acometida electrica para las mismas

Elaboró: Ameef
RESIDENTE DE OBRA

Revisó: Melissa Zuluaga
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Revisó
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó por parte de la entidad
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Visto bueno
SUPERVISOR

APUs PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"INTERVENCION DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) No. C.I 039 – 2023"

Suministro e instalacion de Cable n° 12 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit
Herramienta menor	3	$8.931	0,060000	$376
			Sub-Total	$376

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unit
cable N° 12	m	1,000000	$2.120	$2.120
			Sub-Total	$2.120

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso/Cant	Distancia	$/Km	Tarifa	Valor Unit
Externo			$30		$0
Interno					$0
			Sub-Total		$0

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unit
Oficial electrico	$194.040	146,79%	$240.784	0,015000	$3.612
Ayudante electrico	$88.709	146,79%	$177.279	0,015000	$2.659
			Sub-Total		$6.271

Total Costo Directo: $11.996

I.COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	0,05%	$5.198
UTILIDAD	0,08%	$840
Sub-Total	0,05%	$10.837

JUSTIFICACIÓN: se hace necesario realizar luminarias, las cuales se encontraban dentro del area de parqueaderos y para garantizar su funcionamiento se ejecuta acometida electrica para las mismas

Elaboró: Ameef
RESIDENTE DE OBRA

Revisó: Melissa Zuluaga
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Revisó
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó por parte de la entidad: Vardab
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Visto bueno: Cambio
SUPERVISOR ALCALDIA

APUs PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

"INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I.630 – 2023"

ITEM: 05.11 — UNIDAD: ML

Suministro e instalación de Cable n° 8 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos — CANTIDAD: — PRECIO UNITARIO: $28.015 — PRECIO TOTAL: $34.215

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit
Herramienta menor	e	$7.352	0,050000	$368
			Sub-Total	$368

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unit
cable 10*8 thhn	m	1,000000	$2.400	$17.985
			Sub-Total	$17.985

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol.pasa/Cam	Distancia	Mt-Km	Tarifa	Valor Unit
Externo		50	$50		$800
Interno					$0
			Sub-Total		$800

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unit
Oficial electrico	$164.040	146,79%	$240.794	0,015000	$3.612
Ayudante electrico	$86.708	146,79%	$127.319	0,015000	$1.909
			Sub-Total		$5.521

Total Costo Directo: $24.826

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	0,09%	$6.315
UTILIDAD	0,09%	$1.310
Sub-Total	0,09%	$34.210

JUSTIFICACIÓN: se hace necesario reubicar luminarias, las cuales se encontraban dentro del area de parqueadero y para garantizar su funcionamiento se ejecuta acometida electrica para las mismas

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA — Revisó: Melissa Zuluaga, RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Revisó: DIRECTOR DE OBRA — Aprobó: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó por parte de la entidad: APOYO A LA SUPERVISIÓN — Visto bueno: SUPERVISOR A

APUs PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I.630 – 2023"

ITEM: 05.11 — UNIDAD: ML

Suministro e instalación de Cable n° 8 thhn/unipolar para acometida luminarias parqueaderos — PRECIO UNITARIO: $28.015 — PRECIO TOTAL: $34.215

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor Unit
Herramienta menor	e	$7.352	0,050000	$368
			Sub-Total	$368

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unit
cable 10*8 thhn	m	1,000000	$2.400	$17.985
			Sub-Total	$17.985

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol.pasa/Cam	Distancia	Mt-Km	Tarifa	Valor Unit
Externo					$0
Interno					$0
				Sub-Total	$0

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unit
Oficial electrico	$164.040	146,79%	$240.794	0,015000	$3.612
Ayudante electrico	$86.708	146,79%	$127.319	0,015000	$1.909
				Sub-Total	$5.521

Total Costo Directo: $39.736

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	0,09%	$6.315
UTILIDAD	0,09%	$1.310
Sub-Total	0,09%	$34.210

JUSTIFICACIÓN: se hace necesario reubicar luminarias, las cuales se encontraban dentro del area de parqueadero y para garantizar su funcionamiento se ejecuta acometida electrica para las mismas

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA — Revisó: Melissa Zuluaga, RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Revisó: DIRECTOR DE OBRA — Aprobó: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó por parte de la entidad: APOYO A LA SUPERVISIÓN — Visto bueno: SUPERVISOR ALCALDIA



favelco
ingeniería

0.1.4 INFORME TÉCNICO

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

INFORME No.	2				
	DE:	8/10/2023	AL	17/11/2023	

DATOS CONTRATO/CONVENIO

OBJETO:	**"INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No C.I 030-2023".".**	**CO1.PCCNTR.5294316**
CONTRATISTA:	**FADIEL VELASQUEZ GOMEZ**	**Cto. No.:** **C.O 074 DE 2023**
INTERVENTORÍA	**NO APLICA**	

DATOS CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	**FAVELCO INGENIERIA**			
DIRECCIÓN:	CR 52 41 15 IN 1504	**NIT:**		1543/149
EMAIL:	favelcoingenieria@gmail.com	**TELEFONO:**		5318153

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Director de Obra	FADIEL VELASQUEZ	**C.C. No.**	15.437.149
Residente de Obra	ERIKA DANIELA GALLO RIVAS	**C.C. No.**	1.036.945.514
SST de Obra	LEIDY JOHANA BUSTAMANTE OSORIO	**C.C. No.**	1.035.885.217
SST de Obra	DIANA MARCELA ECHEVERRI ARCILA	**C.C. No.**	43.689.630

EQUIPO DE TRABAJO INTERVENTORIA

Director de interventoria	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO	**C.C. No.**	98.639.809
Residente de interventoria	MALISSA ZULUAGA CARDONA	**C.C. No.**	1.036.944.536
Residente SST	JEISSON AUGUSTO TIQUE PINZON	**C.C. No.**	1.032.362.193

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

URBANISMO SECTOR BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Empleos directos	10	**Mujeres**	3	**Hombres**	7	**De la zona**	3	

MODIFICACIONES CONTRATO OBRA

NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES PARA ESTE PERIODO

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIEROS


Valor Inicial ($):	$	533.560.605
Valor Actualizado ($): Después de modificaciones		**$533.560.605**
Inversión ejecutada acta No. 1		$232.286.396
Inversión ejecutada acta No. 2		$301.271.272
Saldo por invertir		$2.935,00

PAGOS REALIZADOS INCLUIDO ANTICIPO	**Valor factura**	**Valor Desembolso**
-	$ -	$ -
TOTALES ACUMULADOS		

PLAZOS

Fecha de Iniciación	7/9/2023	
Plazo Inicial en meses	2,3 meses	
Fecha de terminación plazo inicial	**17/11/2023**	
Ampliación en días N°1	0,00	
Fecha de terminación	**17/11/2023**	
Total Plazo del contrato + ampliaciones	2,30 meses	
Tiempo transcurrido en meses:	2,30 meses	100,00%

Avance del 8 de octubre - 17 de noviembre de 2023					
Avance mes		$ 301.271.272,00			
INSTITUCIÓN	VALOR INTERVENCIÓN CONTRACTUAL + ADICIÓN	INVERSION A LA FECHA	PORCENTAJE DE INVERSION	SALDO POR EJECUTAR / DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACTA #1		$ 232.286.398	43,54%	$ 301.274.207	
ACTA #2		$ 301.271.272	56,46%	$ 2.935	
TOTAL	$ 533.560.605	$ 533.557.670	100,00%	$ 2.935,00	
A.U 30%	$ -	$ -		$ -	
COSTO TOTAL	$ 533.560.605	$ 533.557.670		$ 2.935,00	

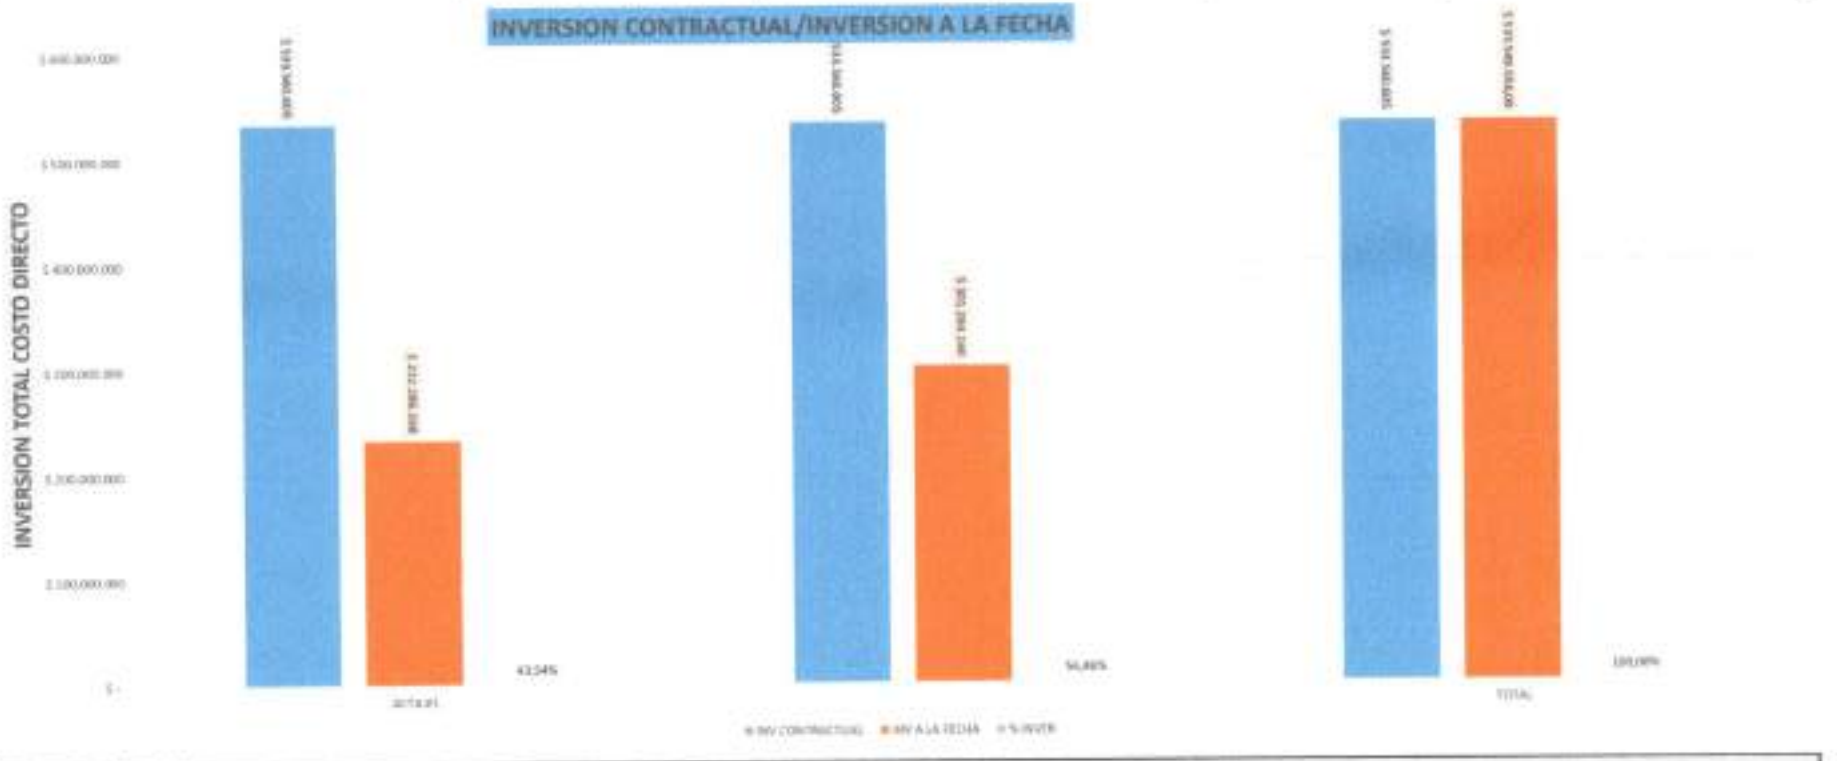

ASPECTOS TECNICOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS

TÉCNICO

INSTITUCION	Actividades realizadas frentes de obra
INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO	Excavaciones
	Construcción de andenes
	Instalación de grama
	Instalación de cordon prefabricado
	Construcción de caja de inspección eléctrica
	Instalación de malla electrosoldada
	Construcción de sumideros
	Llenos
	Paisajismo
	Instalación de base granular
	Aplicación de emulsión asfaltica y mezcla asfaltica en caliente
	Demarcación y aplicación de pintura en frio
	Instalación de topellantas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo	Cantidad	Observación
Volquetas	2	
Maquinaria Amarilla	3	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA

Se cumple en la actualidad con la programación entregada.

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

En la actualidad se han realizado intervenciones en parqueadero Guayacanes I-Cipres (parte alta y baja) y Guayacanes II y III, localizados en sector Bicentenario.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

Se realizó un seguimiento constante a las actividades que se realizan, se deposita el material sobrante en botadero oficial.

Se realiza monitoreo permanente del uso de los elementos de protección personal. No se presentan accidentes de trabajo.

SEGUIMIENTO LEGAL

Se realizó control de todas las pólizas del inicio del contrato con cada una de las exigencias del proyecto.
Póliza cumplimiento vigencia desde 14/08/2023 hasta: 17/03/2024. por un valor de: $ 106.712.121. Asegurado/Beneficiario: Fondo de Desarrollo Social de El municipio de El Retiro.
Póliza de estabilidad obra: vigencia desde 17/11/2023 hasta 17/11/2028 por un valor de: $ 53.356.060,50. Asegurado/Beneficiario: Fondo de Desarrollo Social de El municipio de El Retiro.
Póliza de salarios y prestaciones sociales: vigencia desde 14/08/2023 hasta 17/11/2026 por un valor de:$53.356.060,50. Asegurado/Beneficiario: Fondo de Desarrollo Social de El municipio de El Retiro.
Póliza de Responsabilidad Civil: Vigencia desde: 14/08/2023 hasta: 20/11/2023. Por un valor de: $232.000.000. Asegurado/Beneficiario: Fondo de Desarrollo Social de El municipio de El Retiro.

CONCLUSIÓN DEL CONTRATISTA

Se ejecutan las actividades manera intermitente debido a la fuerte temporada de lluvias que afectan el rendimiento.
Se tiene una ejecucion del contrato del 100% hasta la fecha del presente informe

TAREAS Y COMPROMISOS PROFESIONALES DE APOYO

CONTRATISTA	Continuar con el cumplimiento de los parametros de seguridad y salud en el trabajo
CONTRATANTE	
INTERVENTORIA	

FIRMAS

FADIEL VELASQUEZ GOMEZ
Contratista

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Interventor

INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No C.I 030-2023".".

ACTIVIDADES

PARQUEADEROS SECTOR BICENTENARIO



INSTALACIÓN DE GRAMA



INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA



INSTALACIÓN DE CORDÓN PREFABRICADO



INSTALACIÓN DE CORDON PREFABRICADO



CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE ELÉCTRICAS



VACIADO DE ANDEN E INSTALACIÓN DE MALLA



INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR



DEMOLICIÓN DE A SFALTO Y EXCAVACIONES



INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO



COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA



COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA



APLICACIÓN DE IMPRIMENTE



APLICACIÓN DE IMPRIMENTE



INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA



COMPACTACIÓN



INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA



DEMARCACIÓN Y APLICACIÓN



INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS



INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS



INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS



DEMARCACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA



REJILLAS EN SUMIDERO



REJILLAS EN SUMIDERO



REJILLAS EN SUMIDERO



APLICACIÓN DE PINTURA



APLICACIÓN DE PINTURA



DEMARCACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA



DEMARCACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA



APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA



INSTALACIÓN DE TUBERÍA



COMPACTACIÓN BASE GRANULAR

favelco
ingeniería

0.1.5 ENSAYOS DE LABORATORIO

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

JENN - LAB LABORATORIO

Diego Arnulfo Lopez Arango
NIT: 71556059-9
Cel: 3146228157
E-mail diloara@hotmail.com
Tecnico Certificado CHE 05001-2231-00000166

I.N.V. E - 410

OBRA: Parqueaderos Bicentenario
CLIENTE: Ingeniero Fadiel Velasquez Gomez
RESPONSABLE: Ingeniero Fadiel Velasquez Gomez

Diametro = 15,0 cm
Relacion altura diametro= h/D = 2
Area del cilindro = A= 176,7 cm^2

MEZCLA (VOL): 1:2,0:2,0 **ASENTAMIENTO (cm):** NR **RELACION A/C:**

CILINDRO Nº	REFERENCIA	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD EN DIAS	CARGA ROTURA kN	RESISTENCIA kgf/cm²					OBSERVACIONES
						ESPECIFICADA 28 DIAS	7 DIAS	14 dias	28 DIAS	PROBABLE A 28 DIAS	
1	Anderes Guayacanes 1	19-10-23	26-10-23	7	281	210	162			233	
2		19-10-23	26-10-23	7	278	210	160			231	
3		19-10-23	02-11-23	14	347	210		200		232	
4		19-10-23	02-11-23	14	345	210		199		231	
5		19-10-23	19-10-23			210					
6		19-10-23	19-10-23			210					

Diego Arnulfo López A.
Tecnico Certificado
CHE 05001-2231-00000166

JENN - LAB LABORATORIO

Diego Arnulfo Lopez Arango
NIT: 71556059-9
Cel: 3146228157
E-mail diloara@hotmail.com
Tecnico Certificado CHE 05001-2231-00000166

I.N.V. E - 410

OBRA: Parqueaderos Bicentenario

CLIENTE: Ingeniero Fadiel Velasquez Gomez

RESPONSABLE: Ingeniero Fadiel Velasquez Gomez

Diametro = 15,0 cm
Relacion altura diametro= h/D = 2
Area del cilindro = A= 176,7 cm^2

MEZCLA (VOL):1:2,0:2,0 ASENTAMIENTO (cm): NR RELACION A/C:

CILINDRO Nº	REFERENCIA	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD EN DIAS	CARGA ROTURA kN	RESISTENCIA kg/cm² ESPECIF A 28 DIAS	7 DIAS	14 dias	28 DIAS	PROBABLE A 28 DIAS	OBSERVACIONES
1	Anclenes Guayacanes 1	19-10-23	26-10-23	7	281	210	162			233	
2		19-10-23	26-10-23	7	278	210	160			231	
3		19-10-23	02-11-23	14	347	210		200		232	
4		19-10-23	02-11-23	14	345	210		199		231	
5		19-10-23	16-11-23	28	398	210			230		
6		19-10-23	16-11-23	28	401	210			231		
7		19-10-23	16-11-23	28	398	210			230		

Diego Arnulfo López A.
Tecnico Certificado
CHE 05001-2231-00000166

JENN - LAB LABORATORIO

Diego Arnulfo Lopez Arango
Nit 71000689-9
Cel 3145228197
Email dilcara@hotmail.com
tecnico Certificado CHE 0601-2231-0000166

CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA COMPACTADA

INV E-733

CLIENTE: Ingeniero Fadiel Velazquez Gomez
OBRA: Parqueaderos Bicentenario
RESPONSABLE: Ingeniero Fadiel Velazquez Gomez
LOCALIZACION: Municipio de El Retiro

FECHA DE EXTRACCION DE NUCLEOS	NUCLEO Nº	LOCALIZACIÓN (PR)	DIAMETRO (cm)	ESPESOR (cm)		PESO (g)			VOLUMEN (cm³)	PESO ESPECIFICO APARENTE	DENSIDAD (kg/m³)		% DE COMPACTACION		CONFORMIDAD
				DISEÑO	NUCLEO	AIRE	SSS	AGUA			NUCLEO	BRIQUETA	OBTENIDA	ESPECIFICADA	
22/11/2023	1	Guayacanes 1 ensayo # 1	10,16	10,0	10,1	1937	1946	1117	829	2,336	2,336	2,427	96,3	96,0	SI
22/11/2023	2	Guayacanes 1 ensayo # 2	10,16	10,0	10,3	1976	1985	1141	844	2,342	2,342	2,427	96,5	96,0	SI
22/11/2023	3	Guayacanes 3 ensayo # 1	10,16	10,0	10,8	2071	2080	1195	885	2,339	2,339	2,427	96,4	96,0	SI
			Observaciones:												

Diego Arnulfo Lopez A.
Tecnico Certificado
CHE 05001-2231-00000166

	CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (En planta)	Código: F-37 Versión: 1 Pagina: 1 de 1 Fecha: 01/12/2022

OBRA: PAVIMENTOS ABURRÁ S.A.S


LOCALIZACIÓN: PLANTA DE MEZCLAS SAN JAVIER FECHA: 10-nov-23

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19 MUESTRA No. 678

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial(gr.):	2043.7	Peso final (gr.):	1940.6	Peso asfalto (gr.):	103.1	% de Asfalto:	5.04

GRADACIÓN		P1		1940.6		P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.18	0.075	
Peso Retenido	0.0	278.3	183.6	374.2	395.5	349.6	151.0	100.1	108.3
% Retenido	0.0	14.3	9.5	19.3	20.4	18.0	7.8	5.2	5.6
% que Pasa	100.0	85.7	76.2	56.9	36.5	18.5	10.7	5.6	0.0
Formula de trabajo LI	100	83.1	72.9	51.3	32.3	15.6	9.6	4	
Formula de trabajo LS	100	91.1	80.9	59.3	38.3	21.6	15.6	7.1	
Máximo INV LI	100.0	80.0	70.0	49.0	29.0	14.0	8.0	4.0	
Máximo INV LS	100.0	95.0	88.0	65.0	45.0	25.0	17.0	8.0	

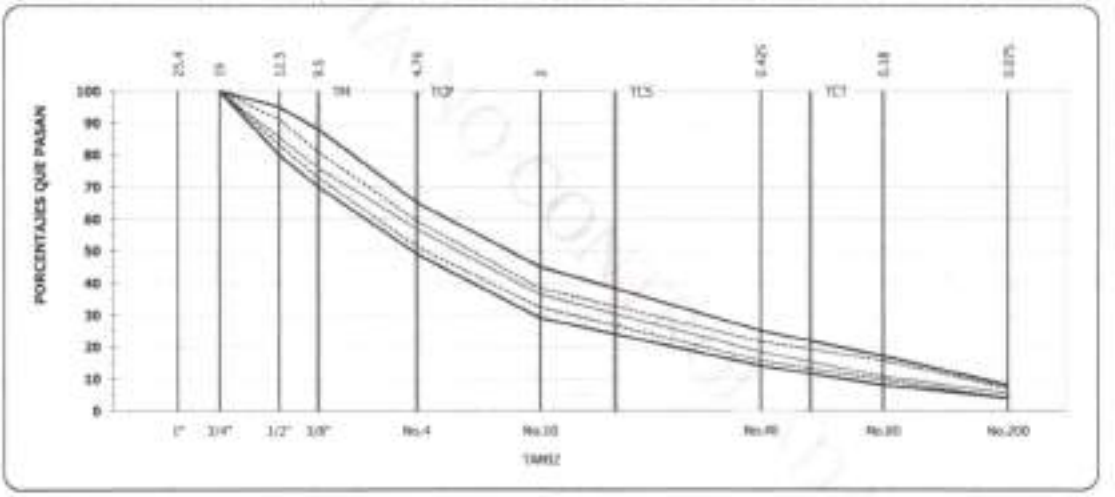

Nº	Gravedad especifica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (kg)	Flujo (mm)	Va	VAM	VFA	Est./flujo	R.P
PROMEDIO									
Especificación	---	---	Min. 9000	2 - 3,5	4 - 6	Min.15	65 - 75	3.0 - 5.0	0.8 - 1.2

Observaciones: 0

Gravedad especifica máxima teórica (Gmm)

ELABORÓ: SANTIAGO GARCIA GARCIA
Laboratorista

APROBÓ: RICAURTE DUQUE ECHEVERRI
Director de Planta y Producción

	CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (En planta)	Código: F-37 Versión: 1 Pagina: 1 de 1 Fecha: 01/12/2022

OBRA: PAVIMENTOS ABURRÁ S.A.S


LOCALIZACIÓN: PLANTA DE MEZCLAS SAN JAVIER **FECHA:** 10-nov-23

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19 **MUESTRA No.** 579

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial(gr.):	2058.8	Peso final (gr.):	1953.9	Peso asfalto (gr.):	104.9	% de Asfalto:	5.10

GRADACIÓN		P1	1953.9			P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.18	0.075	
Peso Retenido	0.0	269.5	191.7	368.0	410.3	352.5	140.2	108.5	113.2
% Retenido	0.0	13.8	9.8	18.8	21.0	18.0	7.2	5.6	5.8
% que Pasa	100.0	86.2	76.4	57.6	36.6	18.5	11.3	5.8	0.0
Formula de trabajo LI	100	83.1	72.9	51.3	32.3	15.6	9.6	4	
Formula de trabajo LS	100	91.1	80.9	59.3	38.3	21.6	15.6	7.1	
Máximo INV LI	100.0	80.0	70.0	48.0	28.0	14.0	8.0	4.0	
Máximo INV LS	100.0	95.0	88.0	65.0	45.0	25.0	17.0	8.0	

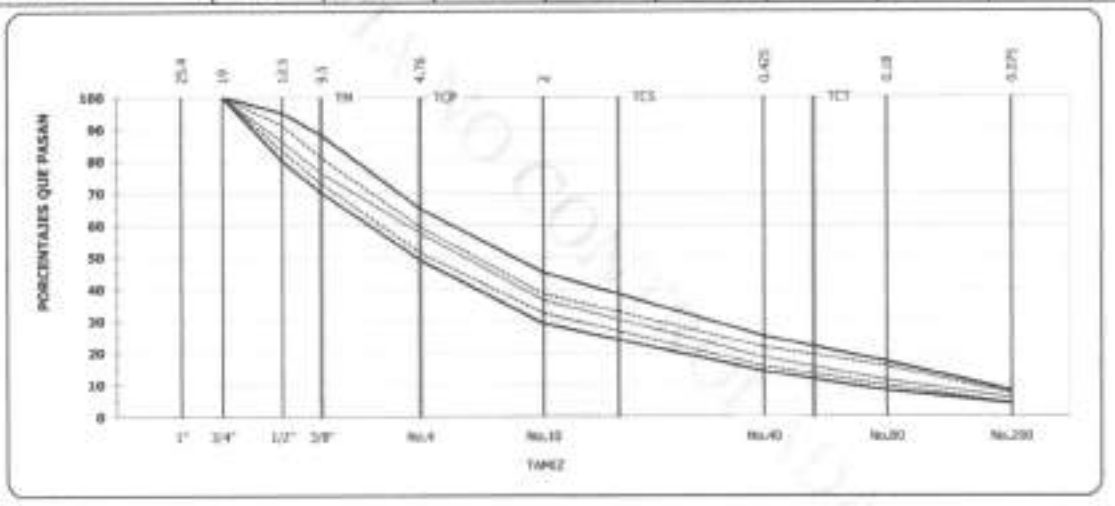

Nº	Gravedad específica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (kg)	Flujo (mm)	Vv	VAM	VFA	Est./flujo	R.P
PROMEDIO									
Especificación	---	---	Min. 9000	2 - 3.5	4 - 6	Min.15	65 - 75	3.0 - 6.0	0.8 - 1.2

Observaciones: 0

Gravedad específica máxima teórica (Gmm)

ELABORÓ:
SANTIAGO GARCIA GARCIA
Laboratorista

APROBÓ:
RICAURTE DUQUE ECHEVERRI
Director de Planta y Producción

CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
(En planta)

Código:	F-37
Versión:	1
Pagina:	1 de 1
Fecha:	01/12/2022

OBRA: PAVIMENTOS ABURRÁ S.A.S


LOCALIZACIÓN: PLANTA DE MEZCLAS SAN JAVIER **FECHA:** 10-nov-23

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19 **MUESTRA No.** 660

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial(gr.):	2045.9	**Peso final (gr.):**	1936.8	**Peso asfalto (gr.):**	109.1	**% de Asfalto:**	5.33

GRADACIÓN		P1	1936.8			P2			
Tamiz pulgadas	**3/4"**	**1/2"**	**3/8"**	**4**	**10**	**40**	**80**	**200**	**FONDO**
Tamiz mm.	19	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.18	0.075	
Peso Retenido	0.0	257.7	179.8	384.6	402.2	348.8	138.9	109.7	114.1
% Retenido	0.0	13.3	9.3	19.9	20.8	18.1	7.2	5.7	5.9
% que Pasa	**100.0**	**86.7**	**77.4**	**57.6**	**36.8**	**18.7**	**11.6**	**5.9**	**0.0**
Formula de trabajo LI	100	83.1	72.9	51.3	32.3	15.8	8.6	4	
Formula de trabajo LS	100	91.1	80.9	58.3	38.3	21.8	15.6	7.1	
Máximo INV LI	100.0	80.0	70.0	49.0	29.0	14.0	8.0	4.0	
Máximo INV LS	100.0	95.0	88.0	65.0	45.0	25.0	17.0	8.0	

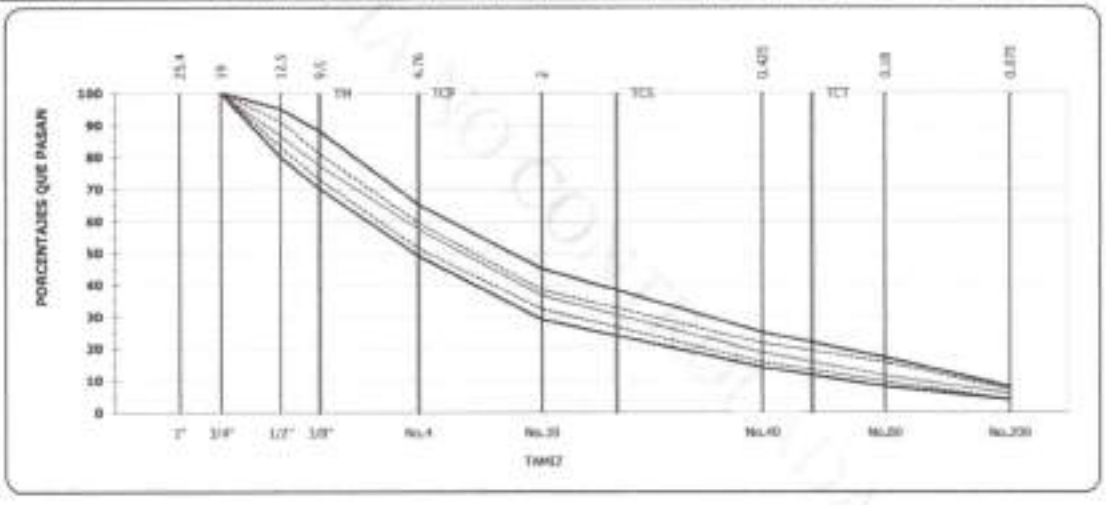

Nº	Gravedad especifica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (kg)	Flujo (mm)	Va	VAM	VFA	Est./flujo	R.P
897	2.396	2.379	17157.7	3.40	5.7	17.6	67.3	5.0	
898	2.397	2.380	18411.6	3.50	5.3	17.2	69.0	5.3	
899	2.403	2.395	17066.4	3.20	5.1	17.0	70.1	5.3	
950	2.394	2.387	18406.1	3.50	5.4	17.3	68.6	5.3	
PROMEDIO	**2.395**	**2.388**	**17760.5**	**3.40**	**5.4**	**17.3**	**68.7**	**5.2**	**1.17**
Especificación	---	---	**Min. 9000**	**2 - 3,5**	**4 - 6**	**Min.15**	**65 - 75**	**3.0 - 6.0**	**0.8 - 1.2**

Observaciones: 0

Gravedad específica máxima teórica (Gmm) **2.532**

ELABORÓ:
SANTIAGO GARCIA GARCIA
Laboratorista

APROBÓ:
RICAURTE DUQUE ECHEVERRI
Director de Planta y Producción

	CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (En planta)	Código: F-37 Versión: 1 Pagina: 1 de 1 Fecha: 01/12/2022

OBRA: PAVIMENTOS ABURRÁ S.A.S


LOCALIZACIÓN: PLANTA DE MEZCLAS SAN JAVIER **FECHA:** 9-nov-23

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19 **MUESTRA No.** 675

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial(gr.):	2083.8	Peso final (gr.):	1975.0	Peso asfalto (gr.):	108.8	% de Asfalto:	5.22

GRADACIÓN		P1		1975.0		P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.18	0.075	
Peso Retenido	0.0	280.0	209.6	380.0	394.6	347.1	151.1	96.6	116.0
% Retenido	0.0	14.2	10.6	19.2	20.0	17.6	7.7	4.9	5.9
% que Pasa	100.0	85.8	75.2	56.0	36.0	18.4	10.8	5.9	0.0
Formula de trabajo LI	100	83.1	72.9	51.3	32.3	15.6	9.6	4	
Formula de trabajo LS	100	91.1	80.9	58.3	38.3	21.6	15.6	7.1	
Máximo INV LI	100.0	80.0	70.0	49.0	29.0	14.0	8.0	4.0	
Máximo INV LS	100.0	95.0	88.0	65.0	45.0	25.0	17.0	8.0	

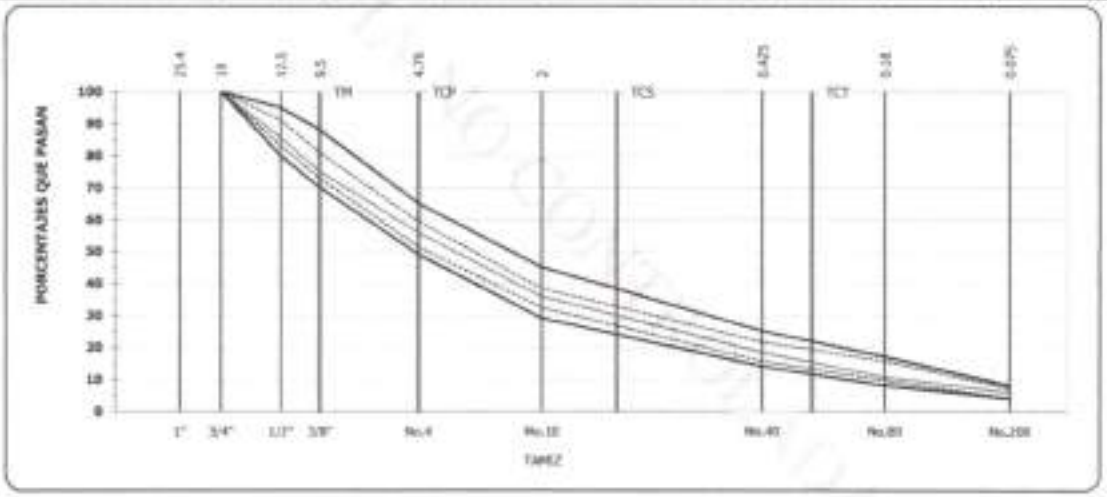

Nº	Gravedad especifica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (kg)	Flujo (mm)	Va	VAM	VFA	Est./flujo	RLP
PROMEDIO									
Especificación	---	---	Min. 9000	2 - 3,5	4 - 6	Min.15	65 - 75	3.0 - 5.0	0.8 - 1.2

Observaciones: 0

Gravedad especifica máxima teórica (Gmm)

ELABORÓ: SANTIAGO GARCIA GARCIA
Laboratorista

APROBÓ: RICAURTE DUQUE ECHEVERRI
Director de Planta y Producción

	CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (En planta)	Código: F-37 Versión: 1 Pagina: 1 de 1 Fecha: 01/12/2022

OBRA: PAVIMENTOS ABUFRÁ S.A.S


LOCALIZACIÓN: PLANTA DE MEZCLAS SAN JAVIER **FECHA:** 9-nov-23

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19 **MUESTRA No.** 676

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial(gr.):	2102.3	Peso final (gr.):	1993.8	Peso asfalto (gr.):	108.5	% de Asfalto:	5.16

GRADACIÓN		P1	1993.8			P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.18	0.075	
Peso Retenido	0.0	256.3	176.8	404.2	416.9	380.4	145.4	99.8	114.0
% Retenido	0.0	12.9	8.9	20.3	20.9	19.1	7.3	5.0	5.7
% que Pasa	100.0	87.1	78.3	58.0	37.1	18.0	10.7	5.7	0.0
Formula de trabajo LI	100	83.1	72.9	51.3	32.3	15.6	9.6	4	
Formula de trabajo LS	100	91.1	80.9	59.3	38.3	21.6	15.6	7.1	
Máximo INV LI	100.0	80.0	70.0	49.0	29.0	14.0	8.0	4.0	
Máximo INV LS	100.0	95.0	88.0	65.0	45.0	25.0	17.0	8.0	

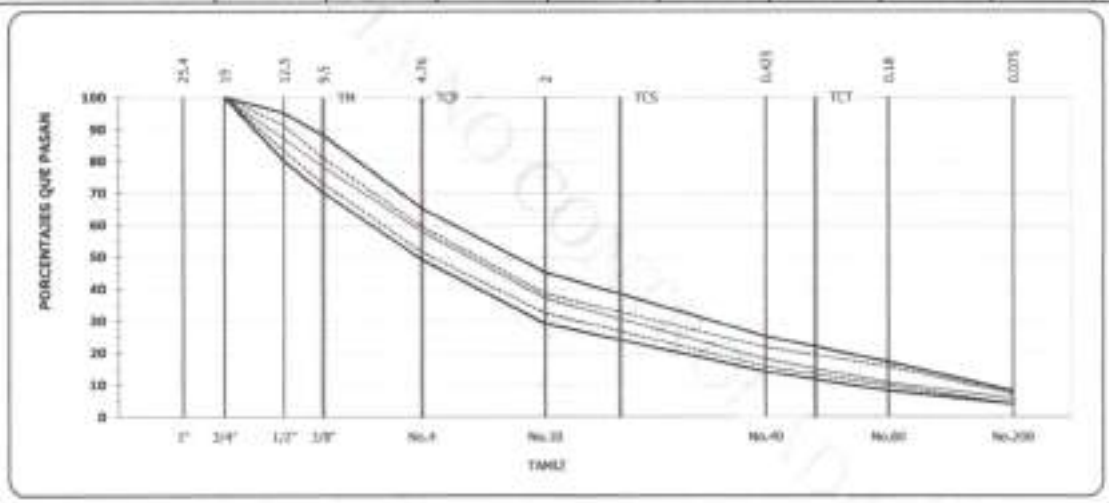

Nº	Gravedad especifica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (kg)	Flujo (mm)	Va	VAM	VTA	Est./flujo	R.F
PROMEDIO									
Especificación	---	---	Min. 9000	2 - 3,5	4 - 6	Min.15	65 - 75	3.0 - 6.0	0.8 - 1.2

Observaciones: 0

Gravedad especifica máxima teórica (Gmm)

ELABORÓ: SANTIAGO GARCIA GARCIA
Laboratorista

APROBÓ: RICAURTE DUQUE ECHEVERRI
Director de Planta y Producción

	CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (En planta)	Código: F-37 Versión: 1 Pagina: 1 de 1 Fecha: 01/12/2022

OBRA: PAVIMENTOS ABURRÁ S.A.S


LOCALIZACIÓN: PLANTA DE MEZCLAS SAN JAVIER — FECHA: 9-nov-23

TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19 — MUESTRA No. 677

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial(gr.):	2090.8	Peso final (gr.):	1983.8	Peso asfalto (gr.):	107.0	% de Asfalto:	5.12

GRADACIÓN		P1		1983.8		P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.18	0.075	
Peso Retenido	0.0	261.4	180.1	400.1	412.1	376.2	135.3	106.7	111.9
% Retenido	0.0	13.2	9.1	20.2	20.8	19.0	6.8	5.4	5.6
% que Pasa	100.0	86.8	77.7	57.6	36.8	17.8	11.0	5.6	0.0
Formula de trabajo LI	100	83.1	72.9	51.3	32.3	15.6	9.6	4	
Formula de trabajo LS	100	91.1	80.9	59.3	38.3	21.6	15.6	7.1	
Máximo INV LI	100.0	80.0	70.0	49.0	29.0	14.0	8.0	4.0	
Máximo INV LS	100.0	95.0	88.0	65.0	45.0	25.0	17.0	8.0	

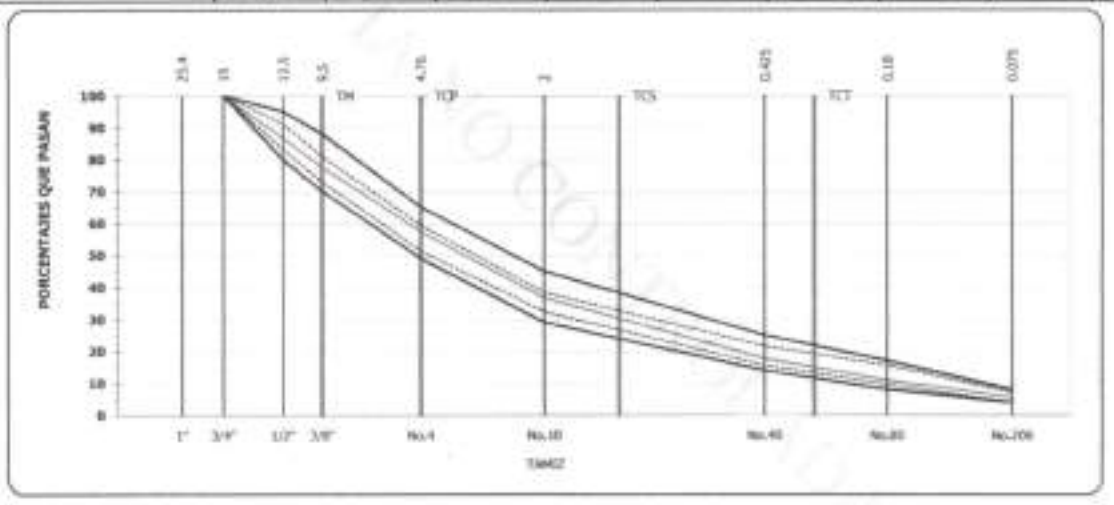

Nº	Gravedad especifica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (kg)	Flujo (mm)	Va	VAM	VFA	Est./flujo	R.P
893	2.390	2.382	19277.4	3.50	5.6	17.2	67.4	5.5	
894	2.387	2.380	19261.4	3.50	5.7	17.3	67.0	5.5	
895	2.392	2.385	19364.4	3.50	5.5	17.1	67.8	5.5	
896	2.397	2.389	19461.0	3.40	5.3	17.0	68.6	5.7	
PROMEDIO	**2.391**	**2.384**	**19341.1**	**3.48**	**5.5**	**17.2**	**67.7**	**5.8**	**1.14**
Especificación	---	---	**Min. 9000**	**2 - 3,5**	**4 - 6**	**Min.15**	**65 - 75**	**3.0 - 6.0**	**0.8 - 1.2**

Observaciones: 0

Gravedad especifica máxima teórica (Gmm): 2.532

ELABORÓ: SANTIAGO GARCIA GARCIA
Laboratorista

APROBÓ: RICAURTE DUQUE ECHEVERRI
Director de Planta y Producción

0.1.6 PÓLIZAS, CONTRATO Y ACTA DE INICIO

Entregadas en el informe No1. Para este periodo no se presentan modificaciones en el contrato.

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: fXc0gEA44wy2lWlOrJVOPQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 3815665 FAX 2851220 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1217-P-86-PPS0108000000027-0002

No. PÓLIZA	M-100045776	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14845363	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	14/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VELASQUEZ GOMEZ, FADIEL	No. DOC. IDENTIDAD	15.437.149
DIRECCIÓN	CRA 52 41-15 INT 1504	TELÉFONO	5318153
ASEGURADO	VELASQUEZ	No. DOC. IDENTIDAD	15.437.149
DIRECCIÓN	CRA 52 41-15 INT 1504	TELÉFONO	5318153
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICIACIÓN:

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS BENEFICIARIOS SON: FONDESER Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5294316 , CUYO OBJETO ES

INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	110.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ANDREIMAN SANCHEZ RUEDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.670

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR0000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100045776	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14845163	No RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	14/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA FADIEL VELASQUEZ GOMEZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Procege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

SE ENCUENTRA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
GR RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: k+UqOGkujSiQm1svFltt1g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO (601)460 1414 FAX (601)7431 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 05-04-2021-1217-P-05-PP1052000000059-0001

No. PÓLIZA	3-100206593	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14845362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VELASQUEZ GOMEZ, FADIEL	No. DOC. IDENTIDAD	15.437.149
DIRECCIÓN	CRA 52 41-15 INT 1504	TELÉFONO	5318153
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	TELÉFONO	4366628
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	TELÉFONO	4366629

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICIACIÓN:

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS BENEFICIARIOS SON: FONDESER Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CD1.PCCNTR.5294316 , CUYO OBJETO ES

INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTORBICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN YCONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCODEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATOSIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/09/2023	24:00 Horas Del 10/04/2024	106.712.121,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	53.356.060,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	53.356.060,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 213.424.242,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ANDREIMAR SANCHEZ RUEDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

COMPROMISO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935, O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURIAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000859-D001

No. PÓLIZA	R-100286593	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14845362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	11/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES POR 5 (AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA ENTRE LAS PARTES Y REPORTADO OPORTUNAMENTE POR ESCRITO ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Procege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.15 09:17:33 -05:00

Código de Seguridad: 092n38wc158xCjMp6vIX/fQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 12 Y 13 - BOGOTA
TELEFONO 2855600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU5200000000059-0000

No. PÓLIZA	9-100206593	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14852570	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	12/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VELASQUEZ GOMEZ, FADIEL	**No. DOC. IDENTIDAD**	15.437.149
DIRECCIÓN	CRA 52 41-15 INT 1504	**TELÉFONO**	5318153
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	**TELÉFONO**	4366620
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	**TELÉFONO**	4366620

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA DE FECHA 24/11/2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA COMO SE REFLEJA EN EL DOCUMENTO.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5294316 , CUYO OBJETO ES

INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTORBICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN YCONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCODEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATOSIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES POR 5 (AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA ENTRE LAS PARTES Y REPORTADO OPORTUNEMENTE POR ESCRITO ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/09/2023	24:00 Horas Del 10/04/2024	106.712.121,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/09/2023	24:00 Horas Del 11/12/2028	53.356.060,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/11/2023	24:00 Horas Del 24/11/2028	53.356.060,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 213.424.242,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ANDREINAN SANCHEZ RUEDA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO/, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935. O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: uVayaG2CVkg7XJAk9exMxQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	M-100206593	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14852981	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	24/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VELASQUEZ GOMEZ, PADIEL	**No. DOC. IDENTIDAD**	15.457.149
DIRECCIÓN	CRA 52 41-15 INT 1504	**TELÉFONO**	5318153
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	**TELÉFONO**	4366620
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDES	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	**TELÉFONO**	4366620

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:

SE DEJA NOTA ACLARATORIA DE LOS ASEGURADOS BENEFICIARIOS Y QUE EL NÚMERO DEL CONTRATO ES C.O. 074-2023.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO C.O. 074-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTORBICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN YCONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCODEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATOSIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/09/2023	24:00 Horas Del 10/04/2024	186.712.121,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/09/2023	24:00 Horas Del 11/12/2026	53.356.060,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/11/2023	24:00 Horas Del 24/11/2028	53.356.060,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 213.424.242,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ANDREIMAN SANCHEZ RUEDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PIMA - AIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R800000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100206593	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14852981	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	24/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS BENEFICIARIOS SON FONDESER Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES POR 5 (AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA ENTRE LAS PARTES Y REPORTADO OPORTUNEMENTE POR ESCRITO ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANT

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y los contratistas asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

NÚMERO	**C.O 074-2023**
CONTRATISTA	FADIEL VELÁSQUEZ GÓMEZ cc. 15.437.149
OBJETO	"INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023"
VALOR INICIAL	QUINIENTOS TREINTA TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($533.560.605)
PLAZO INICIAL	CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.
INTERVENTORIA **REP LEGAL**	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO cc 98.639.809
SUPERVISOR	JAROL ARMANDO GONZÁLEZ FRANCO
CDP:	295 del 18 de julio de 2023
CRP:	346 del 11 de agosto de 2023

CONSIDERANDO:

Que, en el Municipio de El Retiro, Antioquia, a los 24 días del mes noviembre de 2023, se reunieron JAROL ARMANDO GONZÁLEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadana No. 71.556.550, en su calidad de representante legal del FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - FONDESER, identificado con el NIT 901.198.194-5, en calidad de supervisor y JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.639.809, en calidad de interventor, y el Señor FADIEL VELÁSQUEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.437.149, en calidad de CONTRATISTA de Obra.

Que, el objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA FINAL Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRA del contrato C.O 074-2023, luego de adelantar inspección a las obras

realizadas, se estableció que estas se ejecutaron de acuerdo con las cantidades de obra contratadas e incluidas en la propuesta y sus modificaciones.

Que, según lo estipulado en el acta de actividades y cantidades y de acuerdo al período de ejecución contractual las actividades desarrolladas, se relacionan en el siguiente resumen de lo ejecutado así:

	%	VALOR
SUBTOTAL COSTO DIRECTO TOTAL EJECUTADO		$ 410.428.977,00
ADMINISTRACION + UTILIDAD	30%	$ 123.128.693,00
TOTAL (COSTO DIRECTOS + AU) EJECUTADO		$ 533.557.670,00
SALDO A FAVOR DE FONDESER		$ 2.935,00

Por lo anteriormente expuesto, las partes

ACUERDAN

Recibir las obras del contrato C.O 074-2023, cuyo objeto es el "INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023", toda vez que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por FONDESER y el municipio de El Retiro.

Que, el contratista de obra se compromete a realizar la actualización de las garantías presentadas acorde a lo establecido en el contrato en la cláusula novena. GARANTÍAS (…) donde se estipuló que: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de las obras de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14., del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

El recibo de las actividades objeto del contrato en esta fecha, no exonera al contratista de obra al cumplimiento de las obligaciones y calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Que, con la suscripción del acta de entrega y recibo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, FONDESER deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Que, el recibo de la obra terminada, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en el Municipio de El Retiro, a los 24 días del mes de noviembre de 2023.

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente
FONDESER

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Interventor

FADIEL VELÁSQUEZ GÓMEZ
Contratista

Proyecto: Marcela Bautista	Revisó: ASECOP APP S.A.S.	Aprobó: Jarol Armando González
Fecha: noviembre 2023	Fecha: noviembre 2023	Fecha: noviembre 2023

favelco
ingeniería

O.1.7 AU

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

El Retiro, 7 de noviembre de 2023.

SEÑOR
JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO.
Interventor.

Referencia: CONTRATO 074 DE 2023, INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023.**Asunto:** relación del AU.

Cordial saludo,

A continuación, relacionamos los valores parciales del AU, durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre y 7 de noviembre de 2023.

1. **Personal administrativo.** De acuerdo con la propuesta inicial en obra disponemos del siguiente personal: director y residente de obra y Residente SST. Se realizan aportes al sistema de seguridad social.

Se adjuntan documentos soporte.

Atentamente,

Fadiel Velásquez.
Contratista.

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

El Retiro, 6 de diciembre de 2023.

SEÑOR:
JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO.
Interventor.

Referencia: CONTRATO 074 DE 2023, INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023.

Asunto: relación del AU.

Cordial saludo,

A continuación, relacionamos los valores parciales del AU, durante el periodo comprendido entre el 8 de noviembre y 7 de diciembre de 2023.

1. **Personal administrativo.** De acuerdo con la propuesta inicial en obra disponemos del siguiente personal: director y residente de obra y Residente SST. Se realizan aportes al sistema de seguridad social.

2. **Ensayos de laboratorio.** Estudios realizados a puntos intervenidos durante la ejecución del proyecto.

Se adjuntan documentos soporte.

Atentamente,

Fadiel Velásquez.
Contratista.

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
Ingeniería

"INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE				
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$			533.557.670
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$			533.560.605
VALOR COST DIRECTO:	$			410.428.977
A.U. 30.% (SEGÚN PROPUESTA):	**$**			**123.128.693**
POLIZAS				
POLIZAS 100206593 CUMPLIMIENTO:	$			2.406.535,00
POLIZAS 100045775 RESPONSABILIDAD CIVIL:	$			302.453,00
	SUBTOTAL POLIZAS		**$**	**2.708.988,00**
ENSAYOS				
ENSAYOS FACTURA FDL 293			$	330.000,00
ENSAYOS FACTURA FDL 273			$	250.000,00
	SUBTOTAL		**$**	**580.000,00**
ESTAMPILLAS REALES				
PRO-ADULTO MAYOR 3%				16.006.730,00
PRO CULTURA 2%				10.671.153,40
PRO DEPORTE 2%				10.671.153,40
FONDO DE SEGURIDAD 5%				26.677.883,50
	SUBTOTAL ESTAMPILLAS		**$**	**64.026.920,30**
OTROS				
IMPUESTO 4 X MIL	0,5			1.067.115,34
	SUBTOTAL ESTAMPILLAS		**$**	**1.067.115,34**
PERSONAL				
RESIDENTE DE OBRA	3 MESES			11.613.333,69
DIRECTOR DE OBRA	3 MESES			11.025.000,00
RESIDENTE SST	3 MESES			5.953.500,00
		SUBTOTAL	**$**	**28.591.833,69**
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION SIN UTILIDADES			**$**	**96.974.857,33**
UTILIDAD:			**$**	**26.153.835,67**
	TOTAL		**$**	**123.128.693,00**

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

DIEGO ARNULFO LOPEZ ARANGO

CUFE:
a89dcc47b8e28e97e74ca6012bebca8ba8d849ccbe322680c99dc07cc23f12423b83ef0b3c17b52087df86ba0230602d111

Fecha de certificación: 2023-12-11 15:26:50

Información Emisor

Emisor: DIEGO ALNULFO LOPEZ ARANGO
Nit : 71556059-9
Dirección: CR 19 24 12 AP 201
Teléfono: 5410556
Ciudad: Retiro - Antioquia
NO SOMOS RESPONSABLE DE IVA

Factura Electrónica de Venta **FEDL 293**

Información Cliente

Cliente: FADIEL VELASQUEZ GOMEZ
Cédula de ciudadanía: 15437149
Dirección: Carrera 52 # 41-15 In 1504 - Rionegro
Teléfono: 5318153
Email: favelcoingenieria@gmail.com

Fecha Emisión:	2023-12-11 15:23:23
Fecha Expedición:	2023-12-11 15:29:07
Fecha Vencimiento:	2023-12-11
Moneda:	COP
Forma de pago:	CONTADO
Medio de pago:	EFECTIVO

Nro	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	% INC	Descuento	Valor Total
1	01	NUCLEOS DE MDC REALIZADOS EN PARQUEADERO BICENTENARIO	UNO	3	$ 110.000	0	0	$ 0	$ 330.000

Rete Fuente:	**$ 0**	Rete ICA:	**$ 0**
Descuento:	**$ 0**	Total Bruto:	**$ 330,000**
Total IVA:	**$ 0**	Rete IVA:	**$ 0**
Total INC:	**$ 0**	Total a Pagar:	**$ 330,000**
Total en letras:	**TRESCIENTOS TREINTA MIL CERO PESOS CON CERO CENTAVOS**		

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764055665734 Fecha: 2023-09-07 Factura FEDL273 al FEDL1000 con fecha de vencimiento: 2024-03-07

Observaciones: ENSAYOS REALIZADOS EN PARQUEADEROS BICENTENARIO, POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°10308668937 A NOMBRE DE DIEGO ARNULFO LOPEZ ARANGO

Documento generado en **www.PortalFactura.com** 3015158017

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

favelco
ingeniería

O.1.8 PAZ Y SALVOS

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

El Retiro, 23 de noviembre de 2023

PINTURAS& COLORES S.A.S
Lideres en Señalización Vial

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ**, identificado con cédula de ciudadania No. 71.785.655, representante legal de la firma P&C PINTURAS Y COLORES con NIT 901.359.375-7, certifico que el Ingeniero Fadiel Velásquez Gómez, se encuentra a paz y salvo por todo concepto laboral y contractual a la fecha por el contrato 074 de 2023. Desarrollado en el municipio de el Retiro, cuyo objeto es *"Adecuación de parqueaderos sector bicentenario"*

Cualquier duda sobre esta certificación será atendida con gusto en la linea telefónica (604) 444 2249 o en el correo electrónico gerencia@pinturasycolores.com

Como constancia se firma en El Retiro a los 23 dias del mes de noviembre de 2023.

JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
C.C. 71.785.655 de Medellín
Representante legal.
P&C Pinturas y Colores S.A.S

favelco
Ingeniería

Yo, **Juan David Baena Patiño** identificado con cédula de ciudadanía numero 15.443.914; expedida En Rionegro Antioquia, actuando a nombre propio, certifico que el Ingeniero Fadiel Velásquez Gómez se encuentra a paz y salvo por todo concepto de suministro y transporte de base granular, en el contrato de obra 074 de 2023. Desarrollado en el municipio de el Retiro, cuyo objeto es "Adecuación de parqueaderos sector bicentenario"

Rionegro, 16 de noviembre de 2023

Firma
Cédula. 15.443.914

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

VAOS
OBRAS Y PAVIMENTOS

350 582 57 09
vaoscivil@gmail.com
Medellín

Medellín, 23 de noviembre de 2023.

CERTIFICACIÓN

Yo **Juan José Valbuena Osorio,** identificado con cédula de ciudadanía número 1'152.462.804; actuando como representante legal de la empresa **VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS SAS,** identificado con NIT 901694238 certifico que el Ingeniero **Fadiel Velásquez Gómez,** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de suministro transporte y aplicación de mezcla asfáltica MDC 19, en el contrato de obra 074 de 2023. Desarrollado en el municipio de el Retiro, cuyo objeto es "Adecuación de parqueaderos sector bicentenario"

Cordialmente,

Juan José Valbuena Osorio
CC. 1.152.462.804
Representante Legal

favelco
ingeniería

Yo, **José Henry Baena Cardona,** identificado con cédula de ciudadanía numero 15.431.546; expedida En Rionegro Antioquia, actuando a nombre propio, certifico que el Ingeniero Fadiel Velásquez Gómez se encuentra a paz y salvo por todo concepto de alquiler de maquinaria, en el contrato de obra 074 de 2023. Desarrollado en el municipio de el Retiro, cuyo objeto es "Adecuación de parqueaderos sector bicentenario"

Rionegro, 16 de noviembre de 2023

Henry Baena

Firma
Cédula. 15431546

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

Yo, **Juan Carlos Echeverri Echeverri** identificado con cédula de ciudadanía numero 15.429.710; expedida En Rionegro Antioquia, actuando a nombre propio, certifico que el Ingeniero Fadiel Velásquez Gómez se encuentra a paz y salvo por todo concepto de transporte de material proveniente de excavación y demoliciones, en el contrato de obra 074 de 2023. Desarrollado en el municipio de el Retiro, cuyo objeto es "Adecuación de parqueaderos sector bicentenario"

Rionegro, 16 de noviembre de 2023

Juan Echeverri E.

Firma
Cédula. 15 429 710

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
Ingeniería

Yo, **Horacio De Jesús Pérez Giraldo** identificado con cédula de ciudadania numero 15.353.004; expedida En La Unión Antioquia, actuando a nombre propio, certifico que el Ingeniero Fadiel Velásquez Gómez se encuentra a paz y salvo por todo concepto de transporte de material proveniente de excavación y demoliciones, en el contrato de obra 074 de 2023. Desarrollado en el municipio de el Retiro, cuyo objeto es "Adecuación de parqueaderos sector bicentenario"

Rionegro, 16 de noviembre de 2023

Horacio Perez G

Firma
Cédula. 15 353004

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
Ingeniería

Yo, **Victor Hugo Rendon Echeverri** identificado con cédula de ciudadania numero 15.431.249; expedida En Rionegro Antioquia, actuando a nombre propio, certifico que el Ingeniero Fadiel Velásquez Gómez se encuentra a paz y salvo por todo concepto de transporte de material proveniente de excavación y demoliciones, en el contrato de obra 074 de 2023. Desarrollado en el municipio de el Retiro, cuyo objeto es "Adecuación de parqueaderos sector bicentenario"

Rionegro, 16 de noviembre de 2023

Victor Rendon

Firma
Cédula. 15431249

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, FADIEL VELASQUEZ GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 15.437.149, certificó que me encuentro a paz y salvo por todo concepto laboral y contractual a la fecha por el contrato No 074 de 2023 cuyo objeto es: **INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023**

El Retiro, 6 de diciembre de 2023,

FADIEL VELASQUEZ GÓMEZ
CC 15.434,149.

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
Ingeniería

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, ERICA DANIELA GALLO RIVAS, identificada con cedula de ciudadania No. 1.036.945.514, certificó que el sr Fadiel Velásquez Gómez, se encuentra a paz y salvo por todo concepto laboral y contractual a la fecha por el contrato No 074 de 2023 cuyo objeto es: **INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023**

El Retiro, 6 de diciembre de 2023,

ERICA DANIELA GALLO RIVAS
CC 1.036.945.514

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, LEIDY JHOANA BUSTAMANTE OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.035.865.217, certificó que el sr Fadiel Velásquez Gómez, se encuentra a paz y salvo por todo concepto laboral y contractual a la fecha por el contrato No 074 de 2023 cuyo objeto es: **INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023**

El Retiro, 19 de octubre de 2023,

Leidy J. Bustamante

LEIDY JHOANA BUSTAMANTE OSORIO
CC 1.035.865.217

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, DIANA MARCELA ECHEVERRY ARCILA, identificada con cedula de ciudadanía No. 43.689.630, certificó que el sr Fadiel Velásquez Gómez, se encuentra a paz y salvo por todo concepto laboral y contractual a la fecha por el contrato No 074 de 2023 cuyo objeto es: **INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) NO. C.I. 030-2023**

El Retiro, 6 de diciembre de 2023.

DIANA MARCELA ECHEVERRY ARCILA
CC 43.689.630 43689630

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

O.2 SG-SST, AMBIENTAL Y SOCIAL

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco
ingeniería

O.2.1 SEGURIDAD SOCIAL

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

SEGURIDAD SOCIAL VAOS

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-25, 08:39:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1057361901

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 09/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS SAS		
Documento	NI901694238	**Dirección**	CL 42B #92 - 44
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5385870
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VALBUENA OSORIO JUAN JOSE	**Identificación**	CC 1152462804
Total Afiliados	32	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																																												
CC 1004238618	THOMAS JULIAN VALBUENA OSORIO	03	00																													30	30	0													
CC 1006360928	JOSE ANDRES ACOSTA RODRIGUEZ	01	00	X																												30	30	0													
CC 1006501141	DANNY YAIR FLOREZ ALTAMIRA	01	00																													30	30	0													
CC 1007028866	MILEY PEREA MOSQUERA	03	00																													30	30	0													
CC 1007374042	JUAN FERNANDO OSPINA GONZALEZ	01	00	X																												3	3	0													
CC 1010153272	HENRY RIOS RODRIGUEZ	01	00																													30	30	0													
CC 1026131789	JOHN JADER PALACIO PALACIO	01	00	X																												30	30	0													
CC 1026421782	JULIAN ZAMIR MOSQUERA MOSQUERA	03	00	X																												4	4	0													
CC 1026441936	ALEX LEONEL MOSQUERA	01	00																													30	30	0													
CC 1026828865	JUAN CAMILO PEDRAHITA HERRERA	01	00																													30	30	0													
CC 1027485268	CRISTIAN HERRERA RAMIREZ	01	00																													30	30	0													
CC 1027648803	RONALDO HIMEROO SALAS	01	00																													30	30	0													
CC 1128059482	JHAVE HERRERA OSSIO	01	00																													30	30	0													
CC 1128107397	YOHAN ESTIVEN DELGADO GONZALEZ	01	00																													30	30	0													
CC 1152462804	JUAN JOSE VALBUENA OSORIO	01	00																													30	30	0													
CC 1152622151	EDUARDO ORTIZ LOZANO	01	00	X																												3	3	0													
CC 1152811139	BERNARDO MURILLO HENAO	01	00																													30	30	0													
CC 1152824552	BERNARDO CHALA PEMBERTHY	01	00																													30	30	0													
CC 1152825257	CARLOS WILSON QUINTO BENITEZ	01	00																													30	30	0													

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 3146669 - Bucaramanga: 607 6438900 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3015850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/10/2023 | Empresa NI901694238 VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS SAS | Planilla Nro: 1057361901 | Periodo Cotización: septiembre de 2023 | Periodo Servicio: octubre de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1014713358	JEFERSON CORREA SALAZAR	01	00	X	X															1	1	1	1	23 | 01 | PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	EPS037 | NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	0,522	$ 77.334	$ 1.000	COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 1036230563	YHOMAR ENRIQUE VALDES YEPEZ	01	00																	1	30	30	30	23 | 01 | COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS037 | NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.000	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000
CC 1065825256	EUGENIO VALDES MOSQUERA	01	00																	1	30	30	30	23 | 01 | PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS037 | NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.000	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000
CC 71216784	CAMILO ANDRES HERNANDEZ ARIAS	01	00	X																1	30	30	30	23 | 01 | PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 1.121.334	$ 44.800	0,522	$ 1.121.334	$ 5.800	COMFAMA	$ 1.121.334	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400
CC 71227852	LUIS ARMANDO SANCHEZ MOSQUERA	01	00																	1	30	30	30	23 | 01 | PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.000	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000
CC 71241451	YEISON ALBERTO GONZALEZ ARGUMEDO	01	00																	1	30	30	30	23 | 01 | COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS030 | EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.000	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000
CC 71271911	JORGE CELIDES BENITEZ MOSQUERA	01	00																	1	30	30	30	23 | 01 | PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.000	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000
CC 71945483	JOHN ALEXANDER CORDOBA MOSQUERA	01	00	X	X															1	30	30	30	23 | 01 | PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	EPS030 | EPS SURA	$ 696.000	$ 27.900	0,522	$ 696.000	$ 3.600	COMFAMA	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.700
CC 72139870	LACIDES MORILLO MENA	01	00	X																1	27	27	27	23- 10 | COLPENSIONES	$ 1.044.000	$ 167.100	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 1.044.000	$ 41.800	0,522	$ 1.044.000	$ 5.400	COMFAMA	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.400
CC 933911	ALVARO MATURANA CASTAÑEDA	01	00	X																1	4	4	4	23- 10 | COLPENSIONES	$ 154.667	$ 24.800	EPS010 | EPS SURA	$ 154.667	$ 6.200	0,522	$ 154.667	$ 800	COMFAMA	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800
CC 9071130	JAIME ALBERTO CESTARO CASTAÑEDA	01	00		X															1	2	2	2	23 | 01 | PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	EPS037 | NUEVA EPS S.A.	$ 77.334	$ 3.100	0,522	$ 77.334	$ 400	COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
PT 4620868	HECTOR ALFONZO RUIZ RAMOS	01	00																	1	30	30	30	23 | 01 | PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS037 | NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.000	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000
PT 5443443	ROLANDO GABRIEL RUIZ CAMEJO	01	00	X																1	4	4	4	23 | 01 | PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	0,522	$ 309.334	$ 1.600	COMFAMA	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.116.672	$ 30.110.672	$ 30.116.672	$ 30.110.672	$ 4.816.300	$ 1.204.900	$ 2.097.500	$ 1.204.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.323.600	$ 0	$ 9.323.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438805 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-10, 10:22:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1058148337

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 10/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS SAS		
Documento	NI901594236	**Dirección**	CL 42B #92 - 44
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5385870
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VALBUENA OSORIO JUAN JOSE	**Identificación**	CC 1152462804
Total Afiliados	29	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035832366	MEYER PEREA MOSQUERA	01	00	X																																			0	13	13	13	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pagado: 10/11/2023 | Empresa NI901694238 VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS SAS | Planilla Nro: 1058148337 | Periodo Cotización: octubre de 2023 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	SLN	INGRESO	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Mindeporte	Total
CC 1193[illegible]57	CARLOS WILSON QUINTE[illegible]	01	00																		0	30	30	30	230201 | PORVENIR	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS021 | NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.400	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200
CC 1[illegible]3	THOMY ENRIQUE VALDES TORRES	01	00																		0	30	30	30	230201 | COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS037 | NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.400	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200
CC 1[illegible]78	EUGENIO VALDES MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	230301 | PORVENIR	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS037 | NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.400	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200
CC 1[illegible]98	CARLOS MANUEL HERNANDEZ ARIAS	03	00	6																	0	1	1	1	230301 | PORVENIR	$ 30.467	$ 9.300	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 30.467	$ 1.600	0,522	$ 30.467	$ 2.700	CCF042 | COMFAMA	$ 30.467	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.300
CC 1[illegible]52	EVER ARMANDO SANCHEZ MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	230301 | PORVENIR	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200
CC 1[illegible]43	YESSIKA ALBERTO GONZALEZ MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	230301 | COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS010 EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200
CC 1[illegible]11	JORGE ELICIEO BENITEZ MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	230301 | PROTECCION	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200
CC 1[illegible]78	LACIDES MURILLO MENA	01	00	6																	0	6	6	6	230 | COLPENSIONES	$ 232.000	$ 67.200	EPS002 | SALUD TOTAL EPS	$ 232.093	$ 9.300	0,522	$ 232.000	$ 12.100	CCF042 | COMFAMA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.600
CC 9[illegible]11	ALIRIO BATURAMA CASTAÑEDA	01	00																		0	30	30	30	230 | COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS010 EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200
PT 4[illegible]64	VICTOR ALFONSO RUIZ RAMOS	01	00																		0	30	30	30	230301 | PORVENIR	$ 1.160.000	$ 350.000	EPS021 | NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 60.600	CCF042 | COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 28.409.334	$ 28.409.334	$ 28.409.334	$ 28.409.334	$ 4.545.600	$ 1.136.600	$ 1.978.900	$ 1.136.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.798.000	$ 0	$ 8.798.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 3540577 - Medellín: 604 5140569 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 571 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

SEGURIDAD SOCIAL ANTONIO OSORIO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			[redacted]
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA	DEPARTAMENTO	
DIRECCIÓN	CALLE 96 A 11 A 30	TELÉFONO	
TIPO APORTANTE	30-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN	OFICIO		

APORTANTE ENCARGADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (EDYCOMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4536771506	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN/GTROS	MES octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		20231113	NÚMERO AUTORIZACIÓN		[redacted]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25220	SERVIR PROTECCION	1	$ 1.760.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.760.000	$ 0	$ 1.760.000
PLAN	PLAN COLOMBIANES	1	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 150.000
25307	SERVIR PORVENIR	1	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 0	$ 130.000
SUBTOTALES										$ 2.041.000	$ 0	$ 2.041.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR MORA	COTIZACION	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 132.600
EPS037	EPS037 SURA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.900	$ 0	$ 0	$ 134.900
EPS018	EPS SURAMERICANA - NE SOMOS UNA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 132.900
SUBTOTALES													$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 132.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ATT			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	ENGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SURA	SURA - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 660.000	$ 660.000	$ 0	$ 0	$ 660.000
SUBTOTALES									$ 660.000	$ 0	$ 0	$ 660.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	COMFACUNDI SERVICIOS	11	$ 110.400	$ 0	$ 110.400
SUBTOTALES			$ 110.400	$ 0	$ 110.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| APORTANTE COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO	[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CALLE 36 # 23-30	TELÉFONO	6410126
TIPO APORTANTE	59-INDEPENDIENTE	CLAVE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades registradas a nombre de la red
FORMA DE PRESENTACIÓN	WEB		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NO FIRMA TARIFA ART.			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		42287779506	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN (FIN)	MES	mes(en) AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES	mes(en) AÑO	2023
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN				[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
CIUDAD/MUNICIPIO	NUMERO	DEPARTAMENTO	
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 23 -35	TELEFONO	
TIPO APORTANTE	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		402176519	TIPO DE PLANILLA		
PERIODO LIQUIDACIÓN ATRAS	MES		PERIODO COTIZACION VALOR		
DIAS DE MORA					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024-10-11	NUMERO AUTOLIQUIDAR		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

NOMBRE ENTIDAD		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
52001	52001 PROTECCION	1	$ 1.187.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.187.900	$ 0	$ 1.187.900
52014	52014 COLPENSIONES	1	$ 286.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.100	$ 0	$ 286.100
52027	52027 PORVENIR	1	$ 712.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.200	$ 0	$ 712.200
SUBTOTALES										$ 2.186.200	$ 0	$ 2.186.200

TOTAL APORTES A SALUD

NOMBRE ENTIDAD		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.200	$ 0	$ 0	$ 178.200
EPS040	EPS040 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 82.900
EPS046	EPS046 - SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400
SUBTOTALES													$ 372.500	$ 0	$ 0	$ 372.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

NOMBRE ENTIDAD		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	SALDO A OTROS PERIODOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ALL11	ALL11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 644.200	$ 644.200	$ 0	$ 0	$ 644.200
SUBTOTALES									$ 644.200	$ 0	$ 0	$ 644.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

NOMBRE ENTIDAD		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF02	CCF02 CCF DE ANTIOQUIA	11	$ 357.300	$ 0	$ 357.300
SUBTOTALES			$ 357.300	$ 0	$ 357.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RÉGIMEN TRIBUTARIO)

CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
RECIBIDO — DEPARTAMENTO
CALLE 46 # 23 -31 — TELÉFONO
SI/INDEPENDIENTE — CLASE APORTANTE
PENSIÓN — ACTIVIDAD ECONÓMICA
UNICO

710000
RAMON ANTONIO OSORIO FERNANDEZ
ANTIOQUIA
MANTA
INDEPENDIENTE
Actividades legislativas y facilitadoras de la act
01

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO Planilla
PERIODO COTIZACIÓN CTTAVS
DIAS DE MORA
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)

MES — septiembre - 2023

45217995156
2023
0
2023/10/10

TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN SALUD — MES — octubre - 2023
NUMERO AUTORIZACIÓN

1 EMPLEADOS
2023
210107842

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE	PENSIONADO
CC	1	[illegible]	01		$ 1.160.000	INTEGRAL				SI
CC	1	[illegible]	01		$ 1.160.000	INTEGRAL				SI

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SLP	ICT	AVP

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN	SUBCUENTA	IBC	COTIZACIÓN	TDP SUBVENTORA	TDP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIONES TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
PROTECCIÓN	AV	$ 1.160.000	$ 122.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 122.960
PROTECCIÓN	AV	$ 1.160.000	$ 122.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 122.960

SALUD

ADMIN	SUBCUENTA	IBC	COTIZACIÓN	VALOR UPC ADICIONAL	TOTAL APORTE
SUAMERIS CAJA DE SERVICIOS SAS	04	$ 1.160.000	$ 48.400	$ 0	$ 48.400
SUAMERIS CAJA DE SERVICIOS SAS	04	$ 1.160.000	$ 48.400	$ 0	$ 48.400

ARP

ADMIN	SUBCUENTA	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
ARL SURA	17	$ 1.160.000	7133502	$ 63.800
ARL SURA	17	$ 1.160.000	7133502	$ 63.800

APORTES PARAFISCALES

SUBCUENTA	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
04	$ 1.160.000	COMFAMA CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
04	$ 1.160.000	COMFAMA CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.957.900

Planilla Pagada
SOI

SEGURIDAD SOCIAL FADIEL VELASQUEZ

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-10-10, 02:44:40 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 89272729

Periodo Cotización 202309 **Periodo Servicio** 202309

Cliente

PAGADA 2023-10-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ				
Documento	CC 15437149	**Dirección**	CL 52 #1 - 1		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5316153		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15437149					**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00	**Residente**		**Extranjero**	N	VELASQUEZ GOMEZ FADIEL	5615000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades						**Pensión**						**Salud**					**Riesgos**				**Caja**				**Parafiscales**			

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 421.400	$ 0	$ 0	$ 329.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 90 77. Línea Ética: 018000 517066.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-15, 08:54:36 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 86256615

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 14/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ		
Documento	CC15437149	**Dirección**	CL 52 #1 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5318153
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VSM	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mín Educación	Total
CC 15437149	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	23	0																1	30	0	0	[illegible]	$ 2.633.400	$ 421.400	[illegible]	$ 3.333.400	$ 320.200	0.522%	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	(Incapacidades, Licencias, Sabático a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.633.400	$ 3.333.400	$ 0	$ 0	$ 421.400	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.600	$ 0	$ 750.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 90 77. Línea Ética: 018000 517866.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SEGURIDAD SOCIAL FAVELCO

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-10, 03:23:08 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 86363627

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 10/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ		
Documento	CC15437149	**Dirección**	CL 52 #1 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5318153
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	Ret	IBC P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	
CC 1035852217	LEIDY JOHANNA BUSTAMANTE OSORIO	01	00	7																	30	30	30	[illegible]	$ 1,289,667	$ 292,700	[illegible]	$ 1,289,667	$ 50,700	0.522	$ 1,289,667	$ 673,200	[illegible]	$ 1,289,667	$ 50,700	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 392,400
CC 1036441511	ERICA DANIELA GALLO ROJAS	01	00																		30	30	30	[illegible]	$ 2,400,000	$ 480,000	[illegible]	$ 2,400,000	$ 100,000	0.522	$ 2,400,000	$ 1,252,800	[illegible]	$ 2,400,000	$ 94,400	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 734,400
CC 1040342343	[illegible]	01	00																		30	30	30	[illegible]	$ 1,160,000	$ 185,600	[illegible]	$ 1,160,000	$ 46,400	0.522	$ 1,160,000	$ 605,520	[illegible]	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 354,800
CC 1040360290	[illegible]	01	00	4																	30	30	30	[illegible]	$ 1,090,000	$ 174,400	[illegible]	$ 1,090,000	$ 43,600	0.522	$ 1,090,000	$ 568,980	[illegible]	$ 1,090,000	$ 43,600	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 333,200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL $$$ INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6,009,667	$ 6,009,667	$ 5,009,667	$ 6,009,667	$ 961,100	$ 332,100	$ 343,000	$ 246,300	$ 21,600	$ 32,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,301,000	$ 0	$ 1,301,000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 90 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517586.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-13, 02:24:07 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 68986092

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 11/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ		
Documento	CC15437149	**Dirección**	CL 52 #1 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5318153
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días ARP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minducación	Total
CC 15437149	FADIEL VELASQUEZ GOMEZ	51	00																0	30	0	(25)(EPS) PROTECCION	$ 2.633.408	$ 421.408	(EPS010) EPS SURA	$ 2.633.408	$ 320.200	0.522	$ 0	$ 0	(CCF01) COMFAMA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.608

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios y Fpocol EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.633.408	$ 2.633.408	$ 0	$ 0	$ 421.408	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.608	$ 0	$ 741.608

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517886.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **FADIEL VELASQUEZ GOMEZ** identificado con **CC** No. **15437149**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
IC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA - N. 900091943	**Fecha de afiliación:** 01/08/2008 **Fecha de inicio de cobertura :** 22/04/2022 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5 **Cargo :** INGENIEROS CIVILES, INGENIEROS DE TRANSPORTE Y AFINES

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301022239132.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

favelco
ingeniería

O.2.2 CONSOLIDADO DE PERSONAL

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

favelco ingeniería

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 2023

CEDULA	AREA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA	TIPO DE SANGRE	GENERO	EPS	ARL	FDP	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	DIRECCION
15.437.148	Obra	Fadiel Velasquez Gomez	DIRECTOR DE OBRA	INDEPENDIENTE	O+	Masculino	SURA	POSITIVA	PROTECCION	5/09/2023		RIONEGRO
1.036.945.514	Obra	Erica Daniela Gallo Rivas	RESIDENTE DE OBRA	FAVELCO INGENIERIA	A+	Femenino	SURA	SURA	PORVENIR	6/09/2023		RIONEGRO
1.035.866.217	Obra	Laidy Jhoana Bustamante Osorio	RESIDENTE SST	FAVELCO INGENIERIA	O+	Femenino	SURA	SURA	PORVENIR	6/09/2023		RIONEGRO
43.988.830	Obra	Marcela Echeverry Arcila	RESISEDENTE SST	FAVELCO INGENIERIA	O+	Femenino	NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	5/09/2023	18/10/2023	RIONEGRO
1.001.980.256	Obra	Ana Maria Osorio Montes	ENCARGADA	ANTONIO OSORIO	O+	Femenino	SAVIA SALUD	SURA	PROTECCIÓN	5/09/2023		EL RETIRO
1.037.671.712	Obra	Emilio Jose Ronquin Olalvaro	OFICIAL	ANTONIO OSORIO	A+	Masculino	SURA	SURA	PROTECCIÓN	5/09/2023		EL RETIRO
3.587.678	Obra	Jose Gabriel Fernadez Vallejo	AYUDANTE	ANTONIO OSORIO	A+	Masculino	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	5/09/2023		EL RETIRO
1.039.062.411	Obra	Juan Pablo Fernandez Vallejo	AYUDANTE	ANTONIO OSORIO	O+	Masculino	SAVIA SALUD	SURA	PROTECCIÓN	5/09/2023		EL RETIRO
1079476 PEP	Obra	Diego David Jimenez	AYUDANTE	ANTONIO OSORIO	O+	Masculino	PROTECCIÓN	SURA	NUEVA EPS	5/09/2023		EL RETIRO
15353004	Obra	Horacio de Jesus Perez Giraldo	OPERADOR VOLQUETA	INDEPENDIENTE	A+	Masculino	PORVENIR	SURA	SURA	6/09/2023		RIONEGRO
15431249	Obra	Victor Hugo Rendon Echevarri	OPERADOR VOLQUETA	MOVITIERRAS	O+	Masculino	COLPENSIONES	SURA	SURA	6/09/2023		RIONEGRO

CONSOLIDADO SEGURIDAD SOCIAL

			CONTROL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA								
			PERIODO: OCTUBRE 2023								
			CONTRATISTA: FAVELCO								
		favelco Ingeniería	OBJETO: "INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023"								
N°	CEDULA	NOMBRE	CARGO	NIVEL DE RIESGO	PENSION	SALUD	ARL	EMPRESA	PLANILLA SS	PERIODO	
1	15.437.149	Fadiel Velasquez Gomez	Director De Obra	5	PROTECCIÓN	SURA	POSITIVA	INDEPENDIENTE	66286615	OCTUBRE	
2	43.689.630	Marcela Echeverry Arcila	SST	5	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA	FAVELCO	66363627	OCTUBRE	
3	1036945514	Erica Daniela Gallo Rivas	RESIDENTE DE OBRA	5	PORVENIR	SURA	SURA	FAVELCO	66363627	OCTUBRE	
4	1001660255	Ana Maria Osorio Morles	Encargado	5	PROTECCIÓN	SAVIA SALUD	SURA	ANTONIO OSORIO	4526775906	OCTUBRE	
5	1037671712	Evelio Jose Rondon Otalvaro	Oficial	5	PROTECCION	SURA	SURA	ANTONIO OSORIO	4526775906	OCTUBRE	
6	1.038.062.411	Juan Pablo Fernandez Vallejo	Ayudante	5	PROTECCIÓN	SAVIA SALUD	SURA	ANTONIO OSORIO	4526775906	OCTUBRE	
7	3587678	Jose Gabriel Fernadez Vallejo	Ayudante	5	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	ANTONIO OSORIO	4526775906	OCTUBRE	
9	15353004	Horacio de Jesus Perez	volqueta XWJ 587	5	PORVENIR	SURA	SURA	INDEPENDIENTE	1059002574	OCTUBRE	
10	154311249	Victor Hugo Rendon Echeverri	volqueta TBA 588	5	COLPENSIONES	SURA	SURA	MOVITIERRAA	66328901	OCTUBRE	
11	1.035.441.038	Alex Lozano	Ayudante	5	PORVENIR	SURA	COLPATRIA	VAOS	1057361901	OCTUBRE	
12	1.101.459.620	Ronaldo Camargo Salas	Ayudante	5	PORVENIR	SALUD TOTAL	COLPATRIA	VAOS	1057361901	OCTUBRE	
13	1.152.437.297	Edison Estiven Delgado Gonzales	Ayudante	5	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	VAOS	1057361901	OCTUBRE	
14	19935236	Eugenio Valdes Mosquera	Ayudante	5	PORVENIR	SALUD TOTAL	COLPATRIA	VAOS	1057361901	OCTUBRE	
15	1238338593	Thony Enrrique Valdes Torres	Ayudante	5	COLFONDOS	NUEVA EPS	COLPATRIA	VAOS	1057361901	OCTUBRE	

favelco
ingeniería

O.2.3 ENTREGA EPP

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro. Antioquia

ENTREGA DE EPP

favelco ingeniería

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANILLA DE ENTREGA EPP CONTRATISTA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN C.I. 030-2023"

DATOS PERSONALES			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				RECIBIDO	
Nº	CEDULA	NOMBRE	TAPA OIDOS	GAFAS	GUANTES	CHALECO	FIRMA	FECHA
1	3[illegible]	Jose [illegible]	X	X	X		Jose	07/11/2023
2	1[illegible]	Evilio [illegible]	X	X	X		Evilio Rondón	07/11/2023
3	1[illegible]	Juan [illegible]	X	X	X		JUAN P	07/11/2023
4								

favelco Ingeniería

JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
Ingeniero Civil

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANILLA DE ENTREGA EPP CONTRATISTA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN C.I. 030-2022"

DATOS PERSONALES			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				RECIBIDO	
Nº	CEDULA	NOMBRE	TAPA OIDOS	GAFAS	GUANTES	CHALECO	FIRMA	FECHA
1	3587618	Jose Gabriel F.			X		Jose	25/10/2023
2	1008029[illegible]	Juan Pablo F.		X			Juan P	25/10/2023
3								
4								

favelco
ingeniería

O.2.4 CAPACITACIONES

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

CHARLAS Y CAPACITACIONES

favelco

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA	25/10/2023.	CENTRO DE TRABAJO	Construcción de Parqueaderos				
EXPOSITOR	Marcela Echeverri			CARGO	R. SST		
CAPACITACION		ENTRENAMIENTO		CHARLA DE SEGURIDAD	x	DIVULGACIÓN		INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN	
TEMA	RIESGO ELECTRICO.							DURACIÓN	40 minutos.		

OBJETIVO: Reducir el impacto negativo que tiene para la salud de los trabajadores, la exposición a riesgos que puedan derivar en accidentes de trabajo.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jose	[illegible]	Ayudante	Peño	
Sergio Pardán	1032611[illegible]	Oficial	Antonio	
Juan pablo OF	1038062411	Ayudante	Antonio	

favelco

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA	31/10/2023	CENTRO DE TRABAJO		Construcción de parqueaderos			
EXPOSITOR	Pei Madera Ecuador			CARGO	R.S.S.T		
CAPACITACION	ENTRENAMIENTO	CHARLA DE SEGURIDAD		DIVULGACIÓN	INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN
TEMA	PELIGRO en excavaciones				DURACIÓN	30 minutos	

OBJETIVO: Conocer el terreno donde se va a trabajar y sus caracteristicas fisicas del suelo y el terreno - seguir instrucciones de el SST - Tener permisos firmados - No laborar con lluvias

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Juan Pablo T	1039006624111	Ayudante	Antonio	Juan P.
Jose	3558648	Ayudante	Toño	
Evelio Rondón	1039618??	Oficial	Antonio	

favelco ingeniería

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA	27/11/2023		CENTRO DE TRABAJO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADM					
EXPOSITOR	Mallela Echeverry				CARGO	R SST			
CAPACITACION		ENTRENAMIENTO		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	DIVULGACIÓN	INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN
TEMA	CONSCIENCIA AMBIENTAL						DURACIÓN	40 minutos	

OBJETIVO: Concientizar al personal sobre la importancia que debemos tener con el medio ambiente - teneld como Filosofia de vida.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Daniel Alexander Gonzalez	1007959690	Ayudante	Vaos	
Wilson Mosquera	1030622192	Ayudante	Vaos	
Danivair Florez	1.007.933.113	Liguero	VAOS	
Jose	3[illegible]678	Ayudante	Toño	
Aurelio Rondon	1037[illegible]712	Oficial	toño	
Erick Wilmer	1[illegible]240086	Ayudante	VAOS	
Thony Valdez	1[illegible]39593	Ayudante	Vaos	

Los suscritos firmantes del presente documento, hacemos constar que hemos recibido instrucción formal en el los tema(s) relacionados anteriormente, que la comprensión ha sido satisfactoria y nos comprometemos a aplicarlos cada vez que se requiera.

favelco
ingeniería

O.2.5 ACTAS DE ENTORNO Y VECINDAD

Se anexaron en el informe No.1, sin modificaciones para este periodo.

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro. Antioquia

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA	8/9/2023
ACTA No.	1

PROYECTO: PARQUEADEROS

Entidad contratante:

Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra:

Barrio: Guayacanes III Sector:

Dirección: Calle 20 N° 17-05

1. RECONOCIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO (señalar con X)

1.1 Tipo de vía		1.2 Flujo de transito		1.3 Partes que la conforman		1.4 Material		1.5 Estado general		1.6 Estado puntual	
Primaria		Muy alto		Calzada	X	Adoquín		Muy Buena		Hundimientos	
Secundaria		Alto		Cuneta		Afirmado		Buena	X	Asentamientos	
Terciaria		Medio		Anden		Agregado - Grava		Regular		Fisuras	
Privada	X	Bajo		Canal		Relleno		Mala		Grietas	
Herradura		Muy Bajo		Obras de Drenaje		Asfalto	X	Muy Mala		Desplazamientos	
Otros		Nulo		Otros		Concreto		Otro		Huecos	

Observaciones:

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Tramo	Observaciones
Equipamiento	
Sumideros	Sumidero 2: Se recomienda mantenimiento por exceso de maleza (triturado)
Cordones y cunetas	

Powered by CamScanner

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA		FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR
		PROYECTO:
ACTA No.:		

Entidad contratante:

Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra:

Barrio: Sector:

Dirección:

Linderos	Vía (pantanillo) Zona Verde
Vías peatonales	Internas
Cobertura vegetal (Grama, Arbolitos y Arbustos	Si Arbustos pequeños Conservar finos
Andenes	Andenes y cuneta en concreto

Powered by CamScanner

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA		FICHA TECNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
ACTA No.:		PROYECTO:

Entidad contratante:

Entidad ejecutora de la Obra:

Entidad interventora

Barrio: Sector:

Dirección:

3. OBSERVACIONES ADICIONALES
(Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

Anden apto 9912: con asentamiento

Anden apto 9911: anden con grieta

Poste luminarias: inclinados (Guayacanes II)

Via interna: Pavimento flexible en buen estado
cordon: deteriorado por uso

Fachada: en buen estado

Obras inconclusas desde la via principal y perimetrales de edificio

4. OBSERVACIONES DE CIERRE

5. ANEXOS
Fotografías [archivo fotografico o filmico]

Firma Representante Espacio Publico o Lider comunitario
Nombre: Luis Cantillo
cc. Legal Retiro

Firma Representante técnico
Nombre: Interventoria.
cc.

Representante legal
Nombre:
cc. 21954779

Powered by CamScanner

favelco
ingeniería

ACTA DE REUNIÓN

NÚMERO	074 de 2023
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023.
CONTRATISTA	Fadiel Velásquez Gómez Orozco C.C. 15.437.149
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER)
PLAZO INICIAL	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 17 de noviembre de 2023.
PLAZO	17 de noviembre de 2023.

En el Municipio de El Retiro (Antioquia) a los 8 días del mes de septiembre de 2023, se reunieron en la zona de intervención del proyecto sector Cipres, Guayacanes I para realizar las actas de vecindad, encontrándonos lo siguiente:

Accedimos al edificio, logramos inspeccionar y realizar el registro fotográfico de las zonas comunes: pinturas deterioradas, elementos estructurales sin continuidad (Columnas) y grietas en muros.

No fue posible acceder a ninguna de las unidades habitacionales.

Para constancia firman,

Alejandra Atehortúa
Social Municipio

Melissa Zuluaga Cardona
Residente Interventoria

Daniela Gallo
Residente Obra

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

Powered by CamScanner

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA	FICHA TECNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
29/08/2023	PROYECTO: PARQUEADEROS BICENTENARIO
ACTA No.:	

Entidad contratante: Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: Barrio: Sector: CIPRES Guayacanes I

Dirección:

1. RECONOCIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO (señalecon una X)

1.1 Tipo de vía		1.2 Flujo de transito		1.3 Partes que la conforman		1.4 Material		1.5 Estado general		1.6 Estado puntual	
Imaria		Muy alto	X	Calzada	X	Adoquín		Muy Buena		Hundimientos	
Secundaria	X	Alto		Cuneta		Afirmado		Buena		Asentamientos	
Terciaria		Medio		Andan	X	Agregado - Grava		Regular		Fisuras	
Privada		Bajo		Canal		Relleno		Mala		Grietas	
Herradura		Muy Bajo		Obras de Drenaje		Asfalto		Muy Mala		Desplazamientos	
Otros		Nulo		Otros		Concreto		Otro		Huecos	

Observaciones:

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Tramo	Observaciones
Equipamiento	
Sumideros	
Cordones y cunetas	

Powered by CamScanner

Versión	1	Acta de entorno
Vigencia	dic-22	
Código	FO-002	

PESAM

PESAM TECNICA PARA EL PROYECTO DEL ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

ACTA No.:

PROYECTO:

Entidad contratante:

Entidad ejecutora de la Obra:

Entidad interventora

Barrio: Sector:

Dirección:

Linderos	Edificio Guayacana Via : Cra 17 x Calle 22
Vías peatonales	
Cobertura vegetal (Grama, Arboles y Arbustos	Zona Verde 4 palmas
Cobertura vegetal (Grama, Arboles y Arbustos)	

Powered by CamScanner

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA		
ACTA No.:		

PROYECTO:

Entidad contratante:

Entidad ejecutora de la Obra: Entidad interventora

Barrio: Sector:

Dirección:

3. OBSERVACIONES ADICIONALES

(Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

Fachada Edificio:
Ventanas en mal estado
Muro superior de medidores con grietas y prefabricado
Pintura: embombada
Revoque con grietas
Muro fachada (medidas 3m, 4m, 2m): con falla estructural
Andén: en concreto con grietas

4. OBSERVACIONES DE OBRA

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario
Nombre:
C.C.

Melissa Zulvaga C
Firma Representante técnico Interventoria
Nombre:
C.C.

Representante Social
Nombre:
C.C.

Powered by CamScanner

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA	8/9/2023
ACTA No.:	1

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: PARQUEADEROS

Entidad contratante:

Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra:

Barrio: Guayacanes III Sector:

Dirección: Calle 28 N° 17-05

1. RECONOCIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO (señalecon una X)

1.1 Tipo de vía		1.2 Flujo de transito		1.3 Partes que la conforman		1.4 Material		1.5 Estado general		1.6 Estado puntual	
maria		Muy alto		Calzada	X	Adoquin		Muy Buena		Hundimientos	
Secundaria		Alto		Cuneta		Afirmado		Buena	X	Asentamientos	
Terciaria		Medio		Anden		Agregado - Grava		Regular		Fisuras	
Privada	X	Bajo		Canal		Relleno		Mala		Grietas	
Herradura		Muy Bajo		Obras de Drenaje		Asfalto	X	Muy Mala		Desplazamientos	
Otros		Nulo		Otros		Concreto		Otro		Huecos	

Observaciones:

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Tramo	Observaciones
Empalmiento	
Sumideros	Sumidero 2: Se recomienda mantenimiento por exceso de material (tierra)
Cordones y cunetas	

Versión	1	Acta de entorno
Vigencia	dic-22	
Código	FO-002	

PROA			ROAD TECHNICAL DIAGNOSTICS ON THE ESTADO BERACRUZ PUBLIC ROAD AXIS OF INTERVENTION
			PROYECTO:
ACTA No.:			

Entidad contratante:

Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra:

Barrio: Sector:

Dirección:

Linderos	Vía (pantanillo) Zona Verde
Vías peatonales	Internas
Cobertura vegetal (Grama, Arboles y Arbustos	Si Arbustos pequeños Conservar pinos
Andenes	Andenes y cuneta en concreto

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FICHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR
			PROYECTO:
ACTA No:			

Entidad contratante: Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra: Barrio: Sector:

Dirección:

3. OBSERVACIONES ADICIONALES

(Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

Anden apto 9912: con asentamiento

Anden apto 9911: anden con grieta

Poste luminarias: inclinados (Guayacanes II)

Via interna: pavimento flexible en buen estado
cordon: deteriorado por uso

Fachada: en buen estado

Obras monsvasales desde la via principal y perimetrales de edificio

4. OBSERVACIONES DE CIERRE

No se presenta ningun tipo de alteración durante la intervención de proyecto.

Nelson Alcalde
1095479

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario
Nombre: Luis Fernando Cortes
C.C. Legible

Firma Representante técnico
Nombre: Interventoria.
C.C.

Representante social
Nombre: Nelson Alcalde
C.C. 1095479

favelco
Ingeniería

ACTA DE REUNIÓN

NÚMERO	074 de 2023
OBJETO	INTERVENCIÓN DEL URBANISMO DEL SECTOR BICENTENARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 030-2023.
CONTRATISTA	Fadiel Velásquez Gómez Orozco C.C. 15.437.149
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER)
PLAZO INICIAL	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 17 de noviembre de 2023.
PLAZO	17 de noviembre de 2023.

En el Municipio de El Retiro (Antioquia) a los 20 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en la zona de intervención del proyecto sector Cipres, Guayacanes I para realizar el cierre de actas de vecindad, encontrándonos lo siguiente:

No fue posible acceder a ninguna de las unidades habitacionales, sin embargo en las zonas comunes que pudimos inspeccionar no encontramos ningún tipo de alteración.

Para constancia firman,

Alejandra Atehortúa
Social Municipio

Melissa Zuluaga Cardona
Residente interventoria

Daniela Gallo
Residente Obra

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA	29/08/2023
ACTA No.:	

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: PARQUEADEROS BICENTENARIO

Entidad contratante:

Entidad ejecutora de la Obra:

Entidad interventora

Barrio: Sector: Ciprés Guayacanes I

Dirección:

1. RECONOCIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO (señalizar una X)

1.1 Tipo de vía		1.2 Flujo de transito		1.3 Partes que la conforman		1.4 Material		1.5 Estado general		1.6 Estado puntual	
Primaria		Muy alto	X	Calzada	X	Adoquín		Muy Bueno		Hundimientos	
Secundaria	X	Alto		Cuneta		Afirmado		Buena		Asentamientos	
Terciaria		Medio		Anden	X	Agregado - Grave		Regular		Fisuras	
Privada		Bajo		Canal		Relleno		Mala		Grietas	
Herradura		Muy Bajo		Obras de Drenaje		Asfalto		Muy Mala		Desplazamientos	
Otros		Nulo		Otros		Concreto		Otro		Huecos	

Observaciones:

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Tramo	Observaciones
Equipamiento	
Sumideros	
Cordones y cunetas	

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FICHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
			PROYECTO:
ACTA No.:			

Entidad contratante:

Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra:

Barrio: Sector:

Dirección:

Linderos	Edificio Guayacano Via : Cra 17 x Calle 22
Vias peatonales	
Cobertura vegetal (Grama, Arboles y Arbustos	Zona verde 4 palmas
Cobertura vegetal (Grama, Arboles y Arbustos)	

Versión	1
Vigencia	dic-22
Código	FO-002

Acta de entorno

FECHA		
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO:

Entidad contratante:

Entidad ejecutora de la Obra: Entidad Interventora

Barrio: Sector:

Dirección:

3. OBSERVACIONES ADICIONALES

(utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

Fachada Edificio:
-Ventanas en mal estado
Muro superior de medidores con grietas y perforaciones
Pintura: embombada
Revoque con grietas
Muro fachada (medidores 3u, 4u, 2u): con falla estructural
Anden: en concreto con grietas

4. OBSERVACIONES DE CIERRE

No se presenta ningun tipo de alteración durante la intervenc del proyecto.

Audry Melo
21952019

5. ANEXOS

Fotografías (archivos fotografico o filmico)

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario
Nombre:
C.C.

Melissa Zulvaga C
Firma Representante técnico Interventoria
Nombre:
C.C.

Audry Melo
Representante Social
Nombre: Audry Melo
C.C. 21952019

favelco
ingeniería

O.2.6 VEHÍCULOS

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia

DOCUEMTOS VOLQUETA UFK 279

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	1	[redacted]	8	0	POSITIVA - 14-22	OMEA	0820	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-376	AUT MEDELLIN BOGOTA KM 32 VDA GARBIDO		8300080		MARIALUNA.A@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28131470	E	2023-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.284.000	0	CORFAVI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	28131415	2023-11-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LNR	LMP	VAC	VACP	ERST	LPVT	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	NOMBRE	IBC	Cot	FECHA	FINISE	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Tipo Cot	Mult. Tipo Cot.	Total	Exención Parafiscales	Aplicación Convenios
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																1	1	1	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																1	1	1	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	POSITIVA - 14-23	UNICA	[redacted]	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]			[redacted]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	E	2023-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[redacted]	0	CONFIAR
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	[redacted]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC FIAVP
4.717.334	4.717.334	4.717.334	4.717.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	754.800	0	0	0	754.800
PORVENIR	230301	800224808	5	2	191.800	0	0	0	191.800
PROTECCION	230201	800229739	0	3	377.400	0	0	0	377.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 3)				6	188.800	0	0	0	188.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	3	139.200	0	0	0	139.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	3.200	0	0	0	3.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				6	221.600	0	0	0	221.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	221.600	0	0	0	221.600
CCF(Administradoras: 1)				6	188.800	0	0	0	188.800
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	6	188.800	0	0	0	188.800
Gran Total					1.354.000	0	0	0	1.354.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1036957092

Libertad y Orden

NOMBRE

SANTIAGO MARIN ARIAS

FECHA DE NACIMIENTO

13-07-1996

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

29-09-2023



RES DEL CONDUCTOR

R CON LENTES

DE TRANSITO EXPEDIDOR

A DE MOVILIDAD DEL MCPIO DE GUARNE

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	29-09-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	29-09-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02005904220



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030404531

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
UFK279	PETERBILT	SIN LINEA	1996

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.700	BLANCO AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	22000

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
5EK48976	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
5EK48976	N	TN389057	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MARIN ARIAS SANTIAGO	C.C. 1036957092


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
I/E
I
FECHA IMPORT
PUERTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRICULA
23/05/2004
FECHA EXP. LIC. TTO
07/11/2023
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
INSP MCPAL TTOYTTE CARMEN DE BOLIVAR
LT03005157746


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.036.957.092
MARIN ARIAS
APELLIDOS
SANTIAGO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 13-JUL-1996
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
A+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
13-JUL-2014 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23 M HORAS DEL
2023-04-24	2023-04-26	2024-04-25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONS	MODELO
1508005249964000	UFK279	CARGA O MIXTO	PUBLICO	4700	1996

PASAJEROS	No. SERIE / LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	PETERBILT / SIN LINEA	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SEK48976	TN389057		22.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CARRILLO HERRERA, DADY LISSET	3104926291	CC	32353946	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12679	0	VILLAVICENCIO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYAT	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

Paola Hernandez

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2] 8,77	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS		
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS		

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 791, 792, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT sea impresa o en medio de archivo electrónico ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a los correos electrónicos suyos suministrados a la aseguradora guardada en los teléfonos móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas. La detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Convivencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la *Circular Externa* 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, *LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, tomando como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.*

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, diligenciados por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilización aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de las y pólizas(s) que he adquirido. Todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con los producto(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a los aseguradores o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que no me he informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer actualizar y rectificar mis datos personales solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, como mínimo, salvo nuevas consultas en la cuidad 07 de 5-07 de la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487500, y que para mas información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166217895

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

NIT: 900081357

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-016-003

Fecha de expedición: 2023/06/01

Fecha de vencimiento: 2024/06/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UFK279	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	PETERBILT	**MODELO:**	1996
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4700	**NRO. MOTOR:**	SEK48976
NRO. CHASIS:	TN389057	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	BLANCO AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: DADY L. CARRILLO H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ALBERTO DUQUE VILLEGAS

SEGURIDAD SOCIAL VOLQUETAS

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-14, 02:04:56 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 96328901

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 14/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOVITIERRAS EL CARRETERO SAS		
Documento	CC15431249	**Dirección**	CRA 56 N°45 47
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5611785
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SUS	INC	ING	VAC	AVP	VCT	IRP	Días LMA	Días AVP	Días VCT	Días IRP	Días SLN	Días IGE	Días VAC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Fondo	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeducación	Total
CC 1040[illegible]	[illegible]	51	00														0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 162.500	ÁRBC	$ 1.300.000	$ 60.840	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100	$ 0	$ 427.100

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 00 77. Línea Ética: 018000 517505.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-11, 02:18:33 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058240159

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 12/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HORACIO DE JESUS PEREZ GIRALDO		
Documento	CC15353004	**Dirección**	CL 42 #56 - 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5319630
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SUS	INC	ING	VAC	AVP	VCT	IRL	Días IRP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mín Educación	Total
CC 15353004	HORACIO DE JESUS PEREZ GIRALDO	57	00													1	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	COMFENALCO ANTIOQUIA EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	Cotizaciones, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100	$ 0	$ 381.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146869 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLI!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-14, 08:08:14 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059002574

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 14/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HORACIO DE JESUS PEREZ GIRALDO		
Documento	CC15353004	**Dirección**	CL 42 #56 - 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5319630
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	Ret TA	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Irl	Días Pens	Días EPS	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Men Educación	Total
CC 15353004	HORACIO DE JESUS PEREZ GIRALDO	01	00																		30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100


III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100	$ 0	$ 381.100

Líneas de Servicio PersoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146060 - Bucaramanga: 607 6436900 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3610050 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

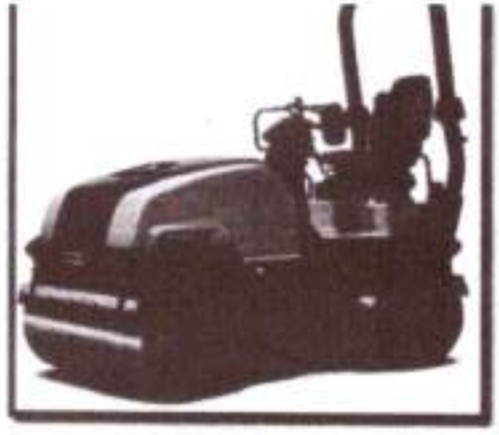

LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
RIEGO DE AGUA
RODILLOS
LUCES TRACERAS
FRENO ESTACIONARIO
FRENO DE MANO
EXTINTOR
ASIENTO
DIRECCION
PANEL DE INSTRUMENTOS

SERIAL LP6505 MOTOR COMBUSTIBLE ACPM

DESCRIPCIÓN


se utilizan en construcción para compactar materiales durante la construcción de carreteras, tanto en la sub-base como en las mezclas asfálticas, siendo utilizadas también para alisar superficies u otro tipo de tareas en obras diversas


EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

GUANTES PROTECCIÓN AUDITIVA MONO GAFAS BOTAS

CONSECUENCIAS QUE PODRIA GENERAR EL USO DE ESTA HERRAMIENTA

caídas al mismo y a diferente nivel, contusiones, estrés, cefaleas, mareos, Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Contactos térmicos y/o eléctricos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

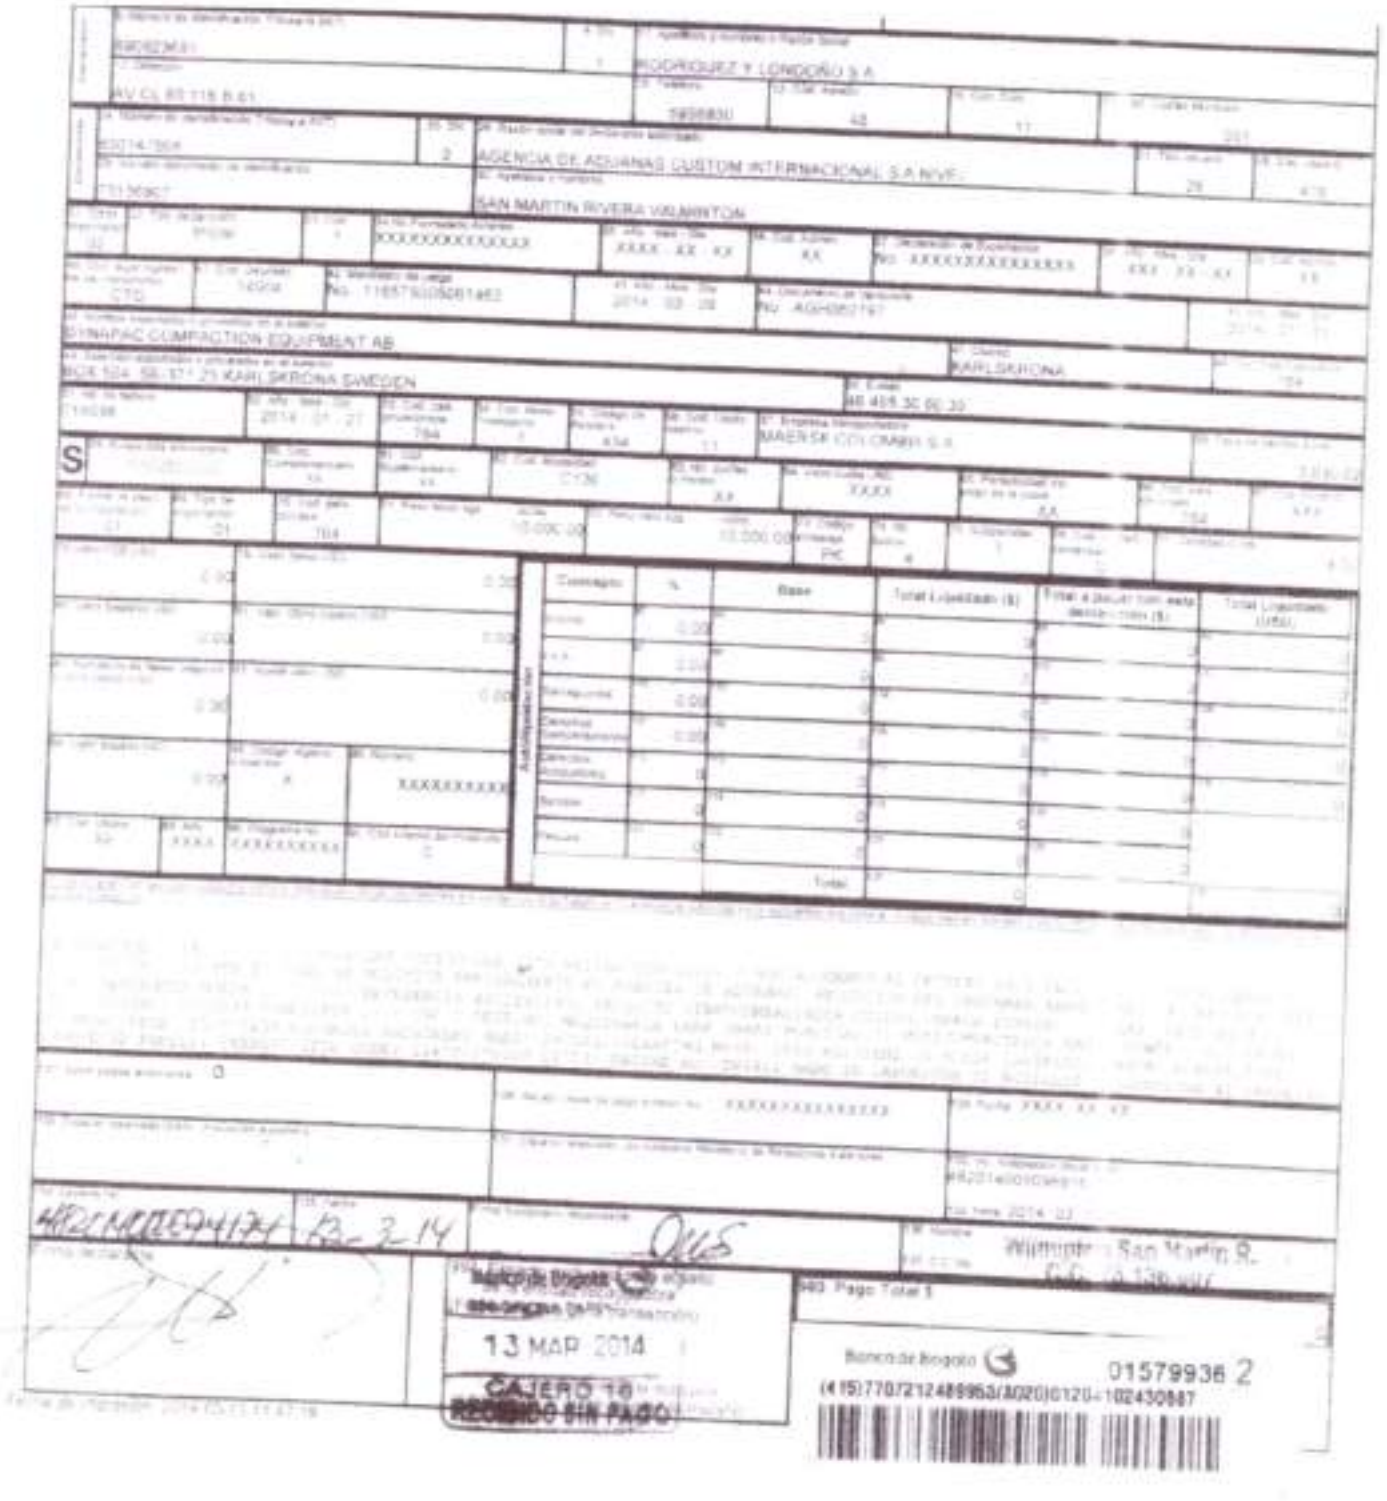
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A
AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A NIVEL
SAN MARTIN RIVERA WILMINTON
SYNAPAC COMPACTION EQUIPMENT AB
BOX 504 SE-371 25 KARLSKRONA SWEDEN
KARLSKRONA
MAERSK COLOMBIA S.A
13 MAR 2014
CAJERO 10
RECIBIDO SIN PAGO
Banco de Bogotá
01579936 2

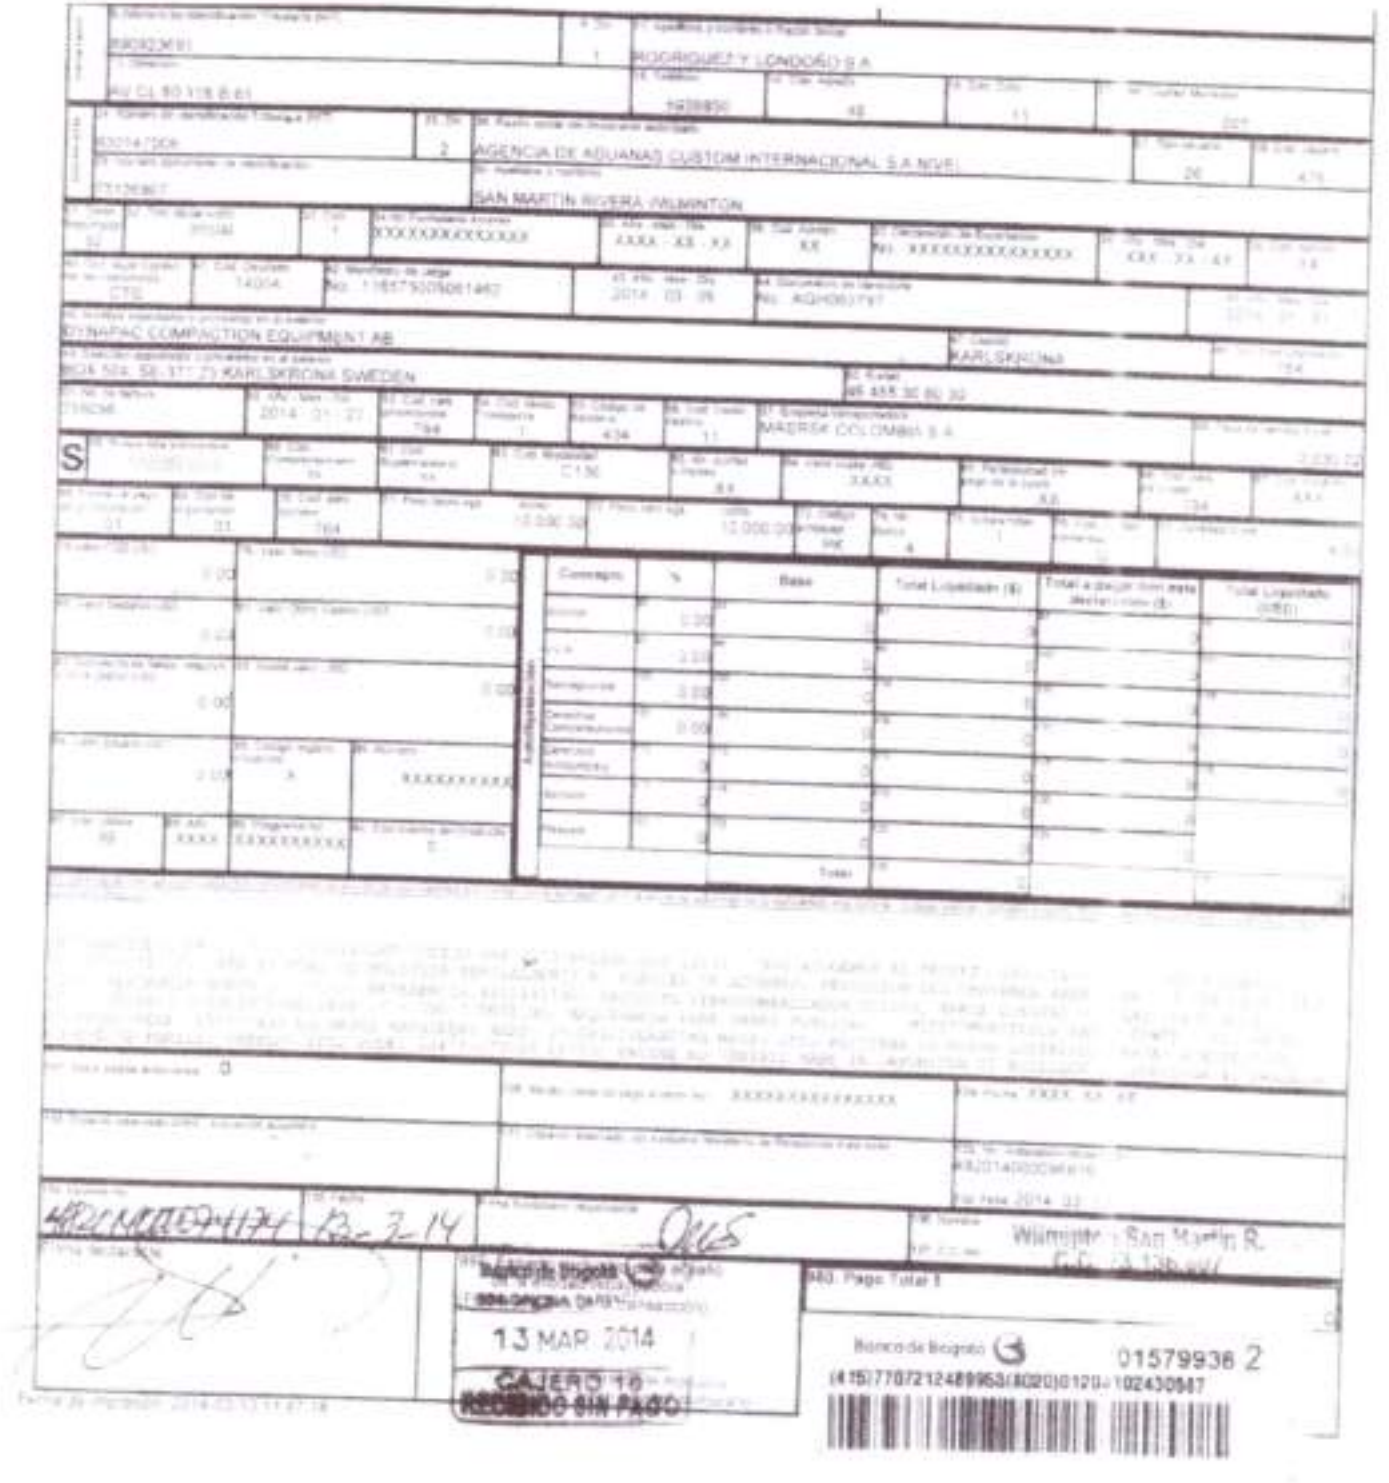
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A
AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A NIVEL
SAN MARTIN RIVERA PALMINTON
BOMAPAC COMPACTION EQUIPMENT AB
KARLSKRONA SWEDEN
MAERSK COLOMBIA S.A
Concepto
Base
Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta declaración ($)
Total Liquidado (USD)
Total
13 MAR. 2014
CAJERO 16
RECIBO SIN PAGO!
Banco de Bogotá
01579936 2



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-07, 08:29:51 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023 **Número Planilla:** 86802219

PAGADO 07/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JH COMPRESORES SAS				
Documento	NI901477809	**Dirección**	CR 50D #2 SUR - 52		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4483529		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	15
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HURTADO RIOS JULIAN ESTEBAN	**Identificación**	CC1037614419		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	03	00																					COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	04	00																					PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	03	00																					COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	03	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
[illegible]	[illegible]	01	00																					PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 6.960	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FDS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 17.400.000	$ 17.400.000	$ 17.400.000	$ 17.400.000	$ 2.784.000	$ 0	$ 0	$ 696.000	$ 1.103.400	$ 948.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.319.400	$ 21.600	$ 5.341.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 86 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

favelco
ingeniería

O.2.7 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Durante este periodo, no se dispuso de residuos en botadero.

Cra. 52 No. 41 - 15 Interior 1504
Tel: (4) 531 8153
Cel: (57) 313 684 0001
favelcoingenieria@gmail.com
Rionegro, Antioquia
