CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CORPOGUAJIRA.

INFORME DE INTERVENTORIA MENSUAL N° 9

CONTRATO 104 DE 2022

OBJETO : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS,CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032

CONTRATISTA PRIDA SAS

OCTUBRE DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas por el CONSORCIO PAC CESAR responsable del Contrato de obra pública No. 0078 de 2022, cuyo objeto es "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES ENZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA - LA GUAJIRA" en el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de octubre de 2023, de igual manera las actividades ejecutadas por la empresa interventora PRIDA S.A.S. responsable del contrato de consultoría N° 104 de 2022 el cual tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DEACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA - LAGUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032 en el mismo periodo de tiempo, las cuales corresponden alos componente, técnicos, administrativo, financiero, contable, social y jurídico.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra 0078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA LA GUAJIRA". Tiene varios componentes entre los cuales sobresalen la intervención de 1.391 Has en 66 puntos críticos, ubicados en varios arroyos o cuerpos de aguas importantes para el abastecimiento de agua de los ríos Cesar y Ranchería, la construcción de un vivero permanente y **Pagos por Servicios Ambientales de Regulación y Calidad Hídrica (PSA hídrico)** reconociendo a loshabitantes de la zona actividades de restauración pasiva o espontánea en las zonasabastecedoras de acueductos de las cuencas media y alta de los ríos Cesar y Ranchería en jurisdicción de los municipios de San Juan del Cesar y Riohacha.

2.1 Características Del Proyecto

El proyecto involucra 3 fases las cuales se describen a continuación.

FASE 1: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

- Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada.
- Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.

FASE 2: RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES

- Realizar construcción de vivero permanente.

- Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos.
- Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.
- Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.
- Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales.
- Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación yrestauración espontánea.

FASE 3: ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO A LAS ÁREAS RECUPERADAS Y PRESERVADAS

- Instalar parcelas de monitoreo.
- Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.
- Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.
- Seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.

3. CONTRATO DE OBRA


3.1. Información General Del Contrato.

NUMERO DE CONTRATO	0078 DE 2022
OBJETO	RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, BPIN 2022011000032
CONTRATISTA	CONSORCIO PAC CESAR
NIT	901661372-9
VALOR	$ 11.102.566.828.00
ANTICIPO 50%	$ 5.551.283.414.00
PLAZO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	2 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A
PRORROGAS	Prorroga 01 hasta el 02 de diciembre
ADICIONES	N/A
% OBRA PROGRAMADA	100%
% OBRA EJECUTADA	8,29%,
% DE ATRASO	91.71%
ACTAS PARCIALES	N/A

3.2. Obras Programadas Y Características Técnicas Del Contrato

Teniendo en cuenta el cronograma de obra ajustado con fecha de corte noviembre del 2023, tomando como referente el tiempo de prorroga otorgado para dar cumplimiento a las

actividades contratadas.

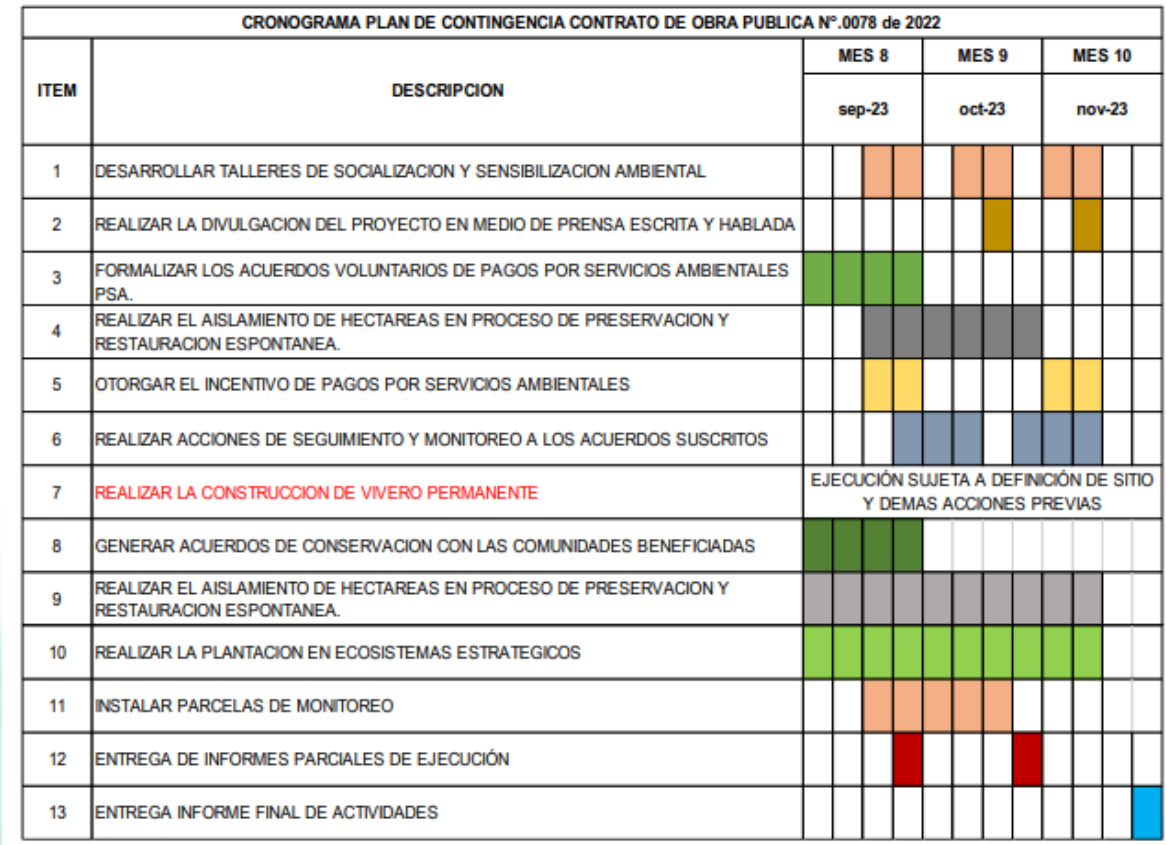

CRONOGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.0078 de 2022				
ITEM	DESCRIPCION	MES 8	MES 9	MES 10
		sep-23	oct-23	nov-23
1	DESARROLLAR TALLERES DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL			
2	REALIZAR LA DIVULGACION DEL PROYECTO EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA Y HABLADA			
3	FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA.			
4	REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTAREAS EN PROCESO DE PRESERVACION Y RESTAURACION ESPONTANEA.			
5	OTORGAR EL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES			
6	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS			
7	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIVERO PERMANENTE	EJECUCIÓN SUJETA A DEFINICIÓN DE SITIO Y DEMAS ACCIONES PREVIAS		
8	GENERAR ACUERDOS DE CONSERVACION CON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS			
9	REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTAREAS EN PROCESO DE PRESERVACION Y RESTAURACION ESPONTANEA.			
10	REALIZAR LA PLANTACION EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS			
11	INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO			
12	ENTREGA DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN			
13	ENTREGA INFORME FINAL DE ACTIVIDADES			

3.3. Obras Ejecutadas En El Período Respectivo

A la fecha el contratista PAC CESAR ha presentado a la interventoría la siguiente información:

N°.	PROPIETARIOS/ POSEEDORES	PREDIO	VEREDA	ÁREA DISPUESTA PARA R.A. (HA)	ARBOLES PROYECTADOS POR HECTAREA
1	Lacides Mejía Romero	Tierra Alta	La Junta	95,634	52.599
2	Julio Cesar Daza	Mata grande	La Junta	38,531	21.192
3	José Ángel Hinojosa	La Rochela	La Junta	4,41	2.426
4	Walter Martínez	La Chinita	La Junta	4,489	2.469
5	Ciro Luis Mendoza	Mata Del Rio	La Peña	8,687	4.778
6	Enrique Luis Ariño Cuello	La Trinidad	La Peña	60	33.000
7	Enrique Luis Mendoza	-	La Peña	24,24	13.332
8	Rafael José Fragozo Vergara	-	Guayacanal	4,752	2.614
9	Mabel Esther Vega Montaño	Los Mangos	La Sierrita	1,1	605
10	Yonis José Mejía Armenta	Las Flores	Achinticua	33,4	18.370

11	Analdo Acosta	Corea	Tocapalma	2,2	1.210
12	Amilcar José Vega	-	Piloncito	8	4.400
13	Carlos Juvencio Mendoza	-	La Peña De Los Indios	28,3	15.565
14	Nilson Oscaride Mendoza Vega	Limoncito	Piloncito	18,439	10.141
15	Víctor Loperena	Los Escondidos	La Peña De Los Indios	18,08	9.944
16	Jorge Eliecer Mendoza	La Pitilla	La Peña De Los Indios	3,6	1.980
17	Lesbia Mercedes Montaño	Pereguetano	Piloncito	1,398	769
18	Henry Brito	La Sierra	Tembladera	7,7	4.235
19	Orlando Daza	-	Tembladera	14,185	7.802
20	Alberto Fuentes Mendoza	-	La Sierrita	171,2	94.160
21	Calixto Fuentes Mendoza	-	La Sierrita	126	69.300
22	Marcelino Camargo	-	Tembladera	4,45	2.448
23	Prospero Vega	-	Tembladera	1,15	633
24	Nefer Cordoba Mejia	El Ejemplo	La Sierrita	20,54	11.297
25	Julio Bolivar Montaño	-	Loma Del Potrero	4,5	2.475
26	Abel Dario Bolaños Vega	Que Diran 2	Guayacanal	25,542	14.048
27	Alcibiades Blanchar Plata	Las Calles	Guayacanal	3,273	1.800
28	Manuel Enrique Loperena Mejia	Los Pozos	Achinticua	12,86	7.073
29	Jose Manuel Chimosquera	Oceano	La Sierrita	2,46	1.353
30	Jose Maria Martinez	Nueva Esperanza	Loma Del Potrero	2,4	1.320
31	Jorge Luis Avila Loperena	-	La Sierrita	79,84	43.912
32	Elizabeth Maria Peña Mosquera	La Planadita	Caracoli	1,17	644
33	Esneider Enrique Brito Camargo	Pastelillal		2,16	1.188
34	Javier Estailen Gonzalez Barrios	La Estrella		8,55	4.703
35	Perfecto Jose Miliam Oñate	Arroyo Leon		22,44	12.342
36	Tulio Gonzalez	Loma Verde		1,71	941
37	Ursula Atencio	-		3,72	2.046
38	Luz Deysi Mindiola Oñate	-		2,99	1.645
39	Osmar Daza Mendoza	La Esperanza 1		6,7	3.685
40	Ysela Mercedes Bolaño	Sabana El Negro	Carrizal	14,86	8.173

41	Federico Mendoza Plata	Asiento Viejo	Hatico De Los Indios	26,3	14.465
42	Fabiola Maestre Mendoza	La Esperanza 1	La Peña	22,81	12.546
43	Natalia Mendoza			19,98	10.989
44	Roberto Elias Diaz Daza			5,26	2.893
45	Ildelfonso Fuentes	Hatico De La Virgen	La Sierrita	100	55.000
46	Yimmy Mendoza	Simingaga		40,13	22.072
47	Amilkar David Bolaño	La Falda	Loma Del Potrero	0,94	517
48	Juan Segundo Vega	Los Ciruelos		5	2.750
49	Luis Alfredo Vega			2,62	1.441
50	Adalberto Daza Daza		Los Haticos	4,75	2.613
51	Hector Enrique Cujia Martinez	Villa Miriam		6,08	3.344
52	Heriberto Salinas	Villa Miriam	Los Haticos	7,83	4.307
53	Victor Jose Daza Martinez	Villa Miriam		26,06	14.333
54	Julio Andres Cujia Martinez	Villa Miriam		7,05	3.878
55	Julio Enrique Cujia Lopez	Villa Miriam		22,6	12.430
56	Diego Cujia Martinez	Villa Miriam		9,01	4.956
57	Miriam Martinez	-		21,96	12.078
58	Luis Alfonso Daza	Los Ciruelos		5	2.750
59	Luis Felipe Moguea Padilla	El Portachuel O De Las Minas	Platanal	2,62	1.441
60	Emilda Mindiola -		Tembladera	11,54	6.347
Total				1.243,79	683.767

De acuerdo a lo anterior, el contratista manifiesta haber concertado 1.243,2 hectáreas, distribuidas en 60 predios, los cuales corresponden a los puntos críticos definidos por Corpoguajira y las nuevas áreas aprobadas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos. Por su parte, se tiene una diferencia de 147,8 hectáreas de las definidas en el documento técnico para cada uno de los beneficiarios.

3.4. Obras Ejecutadas Acumuladas A Partir De La Iniciación Del Contrato

En el mes de octubre se realizaron visitas conjuntas con el consorcio, con respecto a verificación de labores de siembra y aislamiento. Los días 25 y 27 de octubre se realizó la verificación de 12 predios de restauración activa cuyas plantaciones se evidencia adaptación favorable, bajo índice

de mortandad, se evidencia además, que en algunos predios no se sujeta a las condiciones del terreno con respecto al trazado dado que en zona de pendiente han manejado trazado en cuadro y zonas planas en tres bolillo, en su momento se le manifestó al contratista hacer los correctivos en el avance de plantaciones.

Por su parte han avanzado en ahoyado, sin embargo algunas plantaciones no se le ha realizado el plateo correspondiente.

3.5. Control De Programación De Obra De Acuerdo A La ProgramaciónEntregada Por El Contratista De Obra

Como medida de seguimiento semanal al nuevo cronograma de actividades presentado en el plan de contingencia y en atención al último reporte de avance de aislamiento y siembra entregado el 30 de octubre del presente año, la interventoría en el oficio 93 emitido el 01 de noviembre del mismo año las siguientes observaciones:

ACTIVIDAD	OBRA PROYECTADA	OBRA EJECUTADA	OBSERVACIONES
4. Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontanea	44 km	7,9 km	Según las proyecciones semanales en el cronograma de actividades presentados en el plan de contingencia, en comparación con el ultimo avance de obra reporta a interventoría el 30 de octubre del 2023, se reporta un avance de 7.858 metros, correspondiente a 7,9 km; sin embargo, hasta la fecha, correspondiente a la semana 6 de las 6 proyectadas, el contratista tendría que haber adelantado 44 km, con un porcentaje de avance del 100%. No obstante, hasta la fecha se proyecta un avance del 36, 1% del total de ha contratadas. Presentando un retraso significativo del 63,9%.
6. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos	630 (ha)	**----**	Hasta la fecha no se ha reportado a esta interventoría Seguimiento y monitoreo a las hectáreas bajo el Pago por Servicios Ambientales, por lo tanto el avance de esta actividad se encuentra en 0%
8. Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	15	**----**	Esta actividad se proyecta a la generación de 66 acuerdos generados en 15 eventos con asistencia de mínimo 50 personas por evento. Sin embargo, hasta la fecha no se ha generado ningún acuerdo. Por tanto el avance se encuentra en un 0%
9. Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.	75 km	22,33 km	Según las proyecciones semanales en el cronograma de actividades presentados en el plan de contingencia, en comparación con el ultimo avance de obra reportada a interventoría el 30 de octubre del 2023, se reporta un avance de 22.325 metros equivalente a 22,33 km, sin embargo, hasta la fecha, correspondiente a la semana 8 de las 10 proyectadas, el contratista tendría que haber adelantado 60 km, con un porcentaje de avance del 60%. No obstante, hasta la fecha se proyecta un avance del 15%. Presentando un retraso significativo del 65%.

10. Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos	1.391 ha	59,63 Ha	Hasta la fecha el contratista reporta a interventoría el 30 de octubre del 2023 un avance de obra de 59,63 Ha, de las 1.391 ha, teniendo en cuenta según el cronograma correspondiente a la semana 8 de las 10 establecidas, tendrían que haber entregado a la fecha 1.112.8 Ha lo que corresponde al 80%. Sin embargo en el último avance se encuentra en un 4,2%. Presentando un retraso del 75,8%
11. Instalar parcelas de monitoreo	20	-----	En el informe presentado a la interventoría, solo manifestaron que el contratista se encuentra en la localización precisa del montaje de las parcelas de monitoreo, por tanto están realizando acercamientos directos en campo, para determinar las zonas aproximadas al área de interés en relación de las cuatro (4) parcelas PSA y tres (3) parcelas activas que se encuentran por ejecutar en Campo. Por tanto, no se determina como un avance reportado a esta interventoría que motive a una verificación en campo.

- **Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación**

El contratista reporto un avance ejecutado de 22,33 km de aislamiento en áreas de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación. Sin embargo, la interventoría PRIDA SAS solo considera como avance el aislamiento terminado, así como se menciona anteriormente, verificando 13,94 km. La diferencia es 8,39 km entre ambas mediciones esto hace referencia a trabajos parciales que no se consideran un avance significativo hasta que estén terminados.

- **Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos**

La interventoría PRIDA SAS, hace visitas de verificación donde se valida el sistema de plantación que se está llevando a cabo en las áreas de restauración, el plateo y siembra de material vegetal. Sin embargo, en la verificación se observó avance en la siembra, adaptación positiva de las especies forestales plantadas, como observación se le manifestó en su momento al contratista cumplir los metros establecidos en la densidad de siembra e implementar el tres bolillo y cuadro donde corresponda.

3.6. Informe De Inversión Del Anticipo

De acuerdo al nuevo plan de inversión del anticipo, el contratista manifiesta en el informe 9 se destinará en un 24,50% a la compra de insumos, materiales, y herramientas, 15% al pago de mano de obra calificada y no calificada, 5% transporte y un 3% al componente social. Así las cosas, los recursos girados por concepto de anticipo ascienden a la suma de $5.273.719.243, equivalente al 47,50%.

Se tiene un acumulado de giros de fiducia por un valor total de $4.448.827.097,00, equivalente al 84,36% de los recursos entregados por concepto de anticipo. Así mismo, queda un saldo de $ 824.892.146,00, correspondiente al 15,64%.

El contrato durante el periodo del presente informe realizó un avance físico y financiero del 8,29%, equivalente a $920.107.363,98 del valor contratado, representando por la ejecución de las actividades antes relacionadas.

3.7. Recursos del contratista

A la fecha no se han empleado recursos adicionales al personal

Personal

El contratista Consorcio PAC CESAR a través de su informe relaciona su equipo de trabajo profesional y técnico presentado para la ejecución del contrato de obras, está integrado por las siguientes personas:

ITEM	NOMBRE	PROFESION	DEDICACION
1	Andrés Perea Sánchez	Coordinador del proyecto	50%
2	Jaime Machado López	Residente	100%
3	Dayibeth Patricia Daza Daza	Profesional del área social	50%
4	Juan Camilo Perdomo Guerrero	Técnico operativo	100%
5	Martha Fernanda Cataño Mendoza	Técnico operativo	100%

Además de hacer referencia, a los profesionales y técnicos que integran las cuadrillas, las cuales prestan asistencia técnica complementaria a la ejecución de las actividades. A continuación, se relacionan:

N°	NOMBRE	PROFESION	TIPO DE CUADRILLA
1	Rafael Eduardo Daza Mendoza	Ingeniero Ambiental	T5
2	Francisco Javier Guevara Torres	Tecnólogo Agrícola	T5
3	Héctor Molina Duarte	Tecnólogo en producción a gropecuaria ecológica	
4	Marlín Vanegas	Tecnólogo en producción agrícola	T5
5	Luis Gabriel Murcia Molina	Ingeniero Ambiental y Sanitario	T5
6	Jorge Gámez	Técnico cultivos agrícola	T5
7	Amílcar José Vega Nieves	Ayudante Agrícola	T6
8	Cindy Villero	Ingeniera Ambiental	T4
9	Adriana López	Ingeniero Agrónomo	T5
10	Jessyka Sierra Romero	Ingeniera Geóloga-Profesional SIG	-
11	Lily Teherán	Ingeniera Industrial-apoyo administrativo y logístico	-

En atención a lo anterior, el contratista relaciona una lista de personal incompleta en la cual no mencionan al personal del plan de contingencia, teniendo en cuenta que en el informe nº 9 del contratista no relacionaron a los siguientes técnicos:

Ivan Federico Daza Perez
Luis Carlos Obregón
Benavides Borrego
Olegario Alberto Zequeda Martínez
Rafael Enrique Ramírez Contreras
Andres Rafael Meza Ballesta
Juan Carlos Pacheco Callejas
Jesus Barrera
Marcos Moreno Correa
Claudia Yelena Torres
Kevin Jose Amaris
Rosibeth Rangel
Ludis Ester Oñate
Jorge Mario Jimenez
Leonardo Fabio Nova
Ivan David Molina
Yorleidis Mercado Alfaro

Así mismo, durante las visitas de verificación de actividades por parte del personal técnico de interventoría se evidencia la presencia del siguiente personal que no relaciona el contratista. Tal es el caso de:

Yancy Mindiola
Alirio Gonzales
Angel Mendoza
Yovanny Ruiz
Oswaldo Torres
Jaider Vanegas
Eder Arocha
William Mendoza

No obstante, esta interventoría ha convocado a reunión al personal técnico del contratista en reiteradas ocasiones, sobre los cuales no se registra la presencia de la totalidad del personal. A su vez a través de los siguientes oficios se le ha solicitado al contratista que pronuncie ante la situación sin embargo no se ha tenido respuesta hasta la fecha:

OFICIO	ASUNTO	FECHA
41	Citación a reunión preoperativa	01 de agosto de 2023
43	Repuesta a reprogramación de reunión	02 Agosto de 2023
63	Reunión a personal técnico	02 Septiembre de 2023
84	Reiteración a reunión a personal técnico	06 de octubre de 2023
87	Observaciones y citación a personal	13 de octubre de 2023

Equipo

A la fecha no se ha utilizados equipos especializados para el desarrollo de las actividades

3.8. Control De Calidad

A la fecha de corte del presente informe, en el vivero ubicado en el casco urbano del municipio de San Juan del Cesar, se encuentran acopiados aproximadamente 175.000 árboles de especies nativas tales como: Cedro, Roble, Ceiba Bonga, Yaguaro, Corazón Fino y Ceiba Amarilla; Resaltando además que el material vegetal fue producido bajo técnicas adecuadas, de semillas provenientes de árboles de buena calidad, con excelente estado fitosanitario y desarrollo normal tanto en su parte aérea como raíces; el cual es suministrado por el vivero FUNDESAM con registro ICA bajo Resolución N°.00004589 del 22 de marzo del 2022, vivero El Trébol con Resolución N°.114152 del 06 de diciembre del 2021 y a la persona natural Díaz Conde Eduardo José, registrado bajo Resolución N°.00002688 del 11 de marzo del 2017.

3.9. Estado General Del Tiempo

De acuerdo al Boletín de predicción climática y recomendación sectorial emitido por el IDEAM, mediante publicación N°.344 de octubre del 2023, en el periodo reportado se esperaban lluvias por debajo de lo normal con probabilidades que oscilan entre el 40 y 45%. Sin embargo, por influencia de la tormenta tropical Tammy se presentaron lluvias de variada intensidad a partir de la tercera semana de octubre, lo cual permitió realizar el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos.

3.10. Dificultades Presentadas Durante El Desarrollo Del Contrato

Durante la ejecución de las acciones anteriormente referidas, el contratista presento las siguientes dificultades:

- Persiste la dificultad relacionada con la construcción del vivero permanente, dado que no ha sido posible ajustar el diseño estructural e hidráulico a las cantidades definidas en el presupuesto oficial, pues las especificaciones allí establecidas pertenecen a un vivero totalmente diferente al planteado, pues de acuerdo a lo analizado, los diseños iniciales entregados por Corpoguajira corresponden a una estructura para ser construida en regiones con bajas temperaturas.
- Los constantes retiros voluntarios de los propietarios y/o poseedores de los predios concertados para la ejecución de las actividades, genera retrasos en el cumplimiento de las metas definidas, teniendo en cuenta que se debe focalizar, caracterizar y concertar nuevas áreas.
- Durante la segunda y tercera semana del mes de octubre del 2023 ha disminuido el rendimiento en la ejecución de las actividades que involucra en su desarrollo mano de obra no calificada, la cual es realizada por las comunidades del área de influencia del proyecto, pues las personas que conforman las cuadrillas no asisten a laborar debido a que en las fechas citadas se llevan a cabo diferentes festividades tradicionales en las

veredas y/o corregimientos donde se ejecutan los trabajos.

- En algunos sectores a intervenir predominan los suelos con textura franco-arcillosa gravillosa y estructura granular, bajo contenido de materia orgánica, escasa profundidad radicular y con alto riesgo de erosión, lo cual ha afectado significativamente el proceso de siembra, pues para la realización del ahoyado se requiere mayor tiempo, además el déficit de humedad hace que la planta tenga que hacer un sobresfuerzo por mantener los estomas abiertos, y esto puede ocasionar que se marchite por deshidratación.

Cabe mencionar, que el contratista debe evitar en gran medida que los beneficiarios desistan, dado que en reiteradas ocasiones los beneficiarios manifiestan que los técnicos del CONSORCIO PAC CESAR tienen poca presencia en la zona, por tanto no ven seriedad y acompañamiento. Tal es el caso en la vereda tembladera y loma del potrero dicha información se encuentra soportada en las actas de visitas (*ver anexo 5*).

Por su parte esta interventoría, en atención a la situación actual que presenta el contrato sobre los retrasos significativos, ha aumentado esfuerzos en la verificación y trabajo en conjunto con el contratista, de esta manera se pretende darle celeridad a la ejecución del mismo.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato

NUMERO DE CONTRATO	**0104 DE 2022**
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032
CONTRATISTA	PRIDA SAS
NIT	900026388-1
VALOR	$ 881.742.400
ANTICIPO 50%	$ 440.871.200
PLAZO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	2 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A
PRORROGAS	03 OCTUBRE – 30 NOVIEMBRE DE 2023
ADICIONES	N/A

% OBRA PROGRAMADA	
% OBRA EJECUTADA	
% DE ATRASO	0
ACTAS PARCIALES	N/A

4.2. Actividades desarrolladas por la interventoría

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de octubre la realizó las siguientes actividades:

4.2.1 Actividades Administrativas

Se realizaron las siguientes solicitudes:

Nº OFICIO	ASUNTO	FECHA
83	Citación a Comité técnico	Octubre 4 del 2023
84	Reiteración de Reunión Personal Técnico	Octubre 6 del 2023
85	Observaciones a respuesta a oficio N°80	Octubre 12 del 2023
86	Solicitud información del profesional SIG	Octubre 12 del 2023
87	Observaciones y citación a reunión	Octubre 13 del 2023
88	Seguimientos al cronograma de actividades del plan de contingencia	Octubre 17 del 2023
89	Citación a comité técnico	Octubre 18 de 2023
90	Observaciones sobre acuerdos voluntarios con las comunidades beneficiadas	Octubre 24 del 2023
91	Solicitud corrección y actualización de información SIG	Octubre 24 del 2023
92	Requerimiento ajuste de diseño y presupuesto para la construcción de vivero	Octubre 25 del 2023

4.2.1.1. Correspondencia Enviada Y Recibida:

Se recibió la siguiente correspondencia:

- ✓ Programación actividades de campo semana 2 de octubre- 1 oct 2023
- ✓ AVANCE AISLAMIENTO VIERENES 6 DE OCTUBRE DE 2023- 6 oct 2023.
- ✓ Respuesta a oficio N°.80- 6 oct 2023
- ✓ Informe avance parcelas de monitoreo PAC CESAR- 6 oct 2023
- ✓ Programación actividades de campo semana del 9 al 14 de octubre- 8 oct. 2023
- ✓ Acuerdos de conservación PAC Cesar-5 oct. 2023
- ✓ Diseños ajustados vivero permanente 11 oct. 2023
- ✓ avance de aislamiento realizado en el contrato 078 PAC CESAR- 15 de octubre de 2023
- ✓ Programación actividades de campo semana del 16 al 21 de octubre- 15 oct. 2023
- ✓ AVANCE AISLAMIENTO AL 15/10/202- 15 oct. 2023

- ✓ SEGUNDO ENVIO ACUERDOS DE CONSERVACION PAC CESAR- 19 oct 2023
- ✓ AVANCE AISLAMIENTO Y SIEMBRA 20 DE OCTUBRE- 20 oct 2023
- ✓ Respuesta a oficio N°.86- 20 octubre
- ✓ Programación actividades de campo semana del 2 al 28 de octubre de 2023- 22 oct 2023
- ✓ Respuesta a oficio N°.92- 26 oct. 2023
- ✓ Programación actividades de campo semana del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2023- 29 oct 2023
- ✓ Informe avances de aislamiento y siembra- 29 oct. 2023
- ✓ Informe parcial de ejecución contrato de obra N°.0078 de 2022- 30 oct. 2023
- ✓ Respuesta a oficio N°.91-Información SIG actualizada- 30 oct. 2023

4.2.1.2. Actas generadas en el periodo del informe

En el mes de octubre se generaron 51 actas de visitas técnicas (*ver anexo 5*)

4.2.1.3.Actas generadas en el desarrollo del contrato

A la fecha se han generado 172 actas de visitas de técnicas.

4.2.1.4.Actas de comité técnico

En el mes de octubre se desarrollaron dos (02) comité de seguimiento técnico Nº 008 en las instalaciones de CORPOGUAJIRA territorial sur, el cual fue celebrado:

1. El 6 de octubre de 2023, en las instalaciones de la territorial sur de Corpoguajira, se celebró el comité de seguimiento técnico No. 007, cuya finalidad era atender los temas relacionados a las actividades en ejecución como plantaciones, aislamiento y vivero. Por tanto se dejaron consignado los siguientes compromisos:
   - ✓ Acta de entrega de insumos, material vegetal y herramientas – responsable pac cesar – 13 de octubre de 2023
   - ✓ Reunión con el personal técnico del contratista para capacitación- responsables contratista e interventoría- 9 de octubre de 2023
   - ✓ Entrega de los diseños del vivero – responsable contratista- 12 de octubre de 2023
   - ✓ Entrega semanal de avance de obra – pac cesar

2. El 20 de octubre en las instalaciones de la territorial sur de Corpoguajira, se celebró el comité de seguimiento de avance de obra de los contrato 078 y 080 de 2022. Donde se realizó el análisis por parte de los profesionales civiles tanto de las interventorías como del contratista, sobre la verificación de valores de las condicio0nes contractuales en la mano de obra de los presupuestos actualizado, determinando que se debe realizar un reajuste en los diseños, que no alteren las cantidades contractuales.

Como compromiso para este comité

- ✓ envío de diseños estructural ajustados – responsable pac cesar- pac ranchería – el 23 de octubre de 2023.

4.2.1.5.Sistema Integral de seguridad social

El personal de interventoría se encuentra afiliado a los sistemas de seguridadsocial.

4.2.1.6.Revisión de Vigencia de las Garantías.

Las garantías fueron aprobadas por la oficina jurídica de la corporación.

4.2.2. Actividades Técnicas.

Durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 31 de octubre la interventoría PRIDA SAS realizo visitas técnicas dirigidas a los beneficiarios de *Restauración Activa* y *PSA* del contrato de obra pública número 0078 del 2022 con el objeto de evaluar el avance de obra ejecutado hasta el momento, en las siguientes actividades:

Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación

Acorde a los avances de aislamiento presentados por el contratista de obra, el equipo técnico de la interventoría visitó las áreas de restauración activa en Achinticua, Caracolí, Carrizal, El Placer, Guayacanal, Hatico de Los Indios, La Junta, La Peña, La Sierrita, Loma del Potrero, Los Haticos, Peña de Los Indios, Piloncito y Platanal, en lo corrido del mes se visitó un total de 34 áreas de restauración activa con sus aislamientos correspondientes; tal y como se observa en la siguiente tabla:

N°	VEREDA	BENEFICIARIO	AISLAM. (Km)	AISLAM VERIF PRIDA	N° DE POSTES	AISLAM FALTANTE
1	Achinticua	Manuel Loperena	0,67	0,628	317	0,042
2	Caracolí	Elizabeth Peña Mosquera	0,13	0,124	63	0,006
3	Caracolí	Esneider Brito Camargo	0,11	0,11	63	0,000
4	Caracolí	Perfecto Miliam Oñate	1,16	0,429	207	0,731
5	Carrizal	Ysela Mercedes Bolaño	1,25	0,301	-	0,949
6	El Placer	Mabel Esther Vega Montaño	0,06	0,061	26	-0,001
7	Guayacanal	Rafael Fragozo Vergara	0,25	0,252	123	-0,002
8	Guayacanal	Abel Darío Bolaño Vega	1,32	0,945	422	0,375
9	Guayacanal	Alcibíades Blancher	0,17	0,244	118	-0,074
10	Hatico de los Indios	Federico Mendoza Plata	1,36	0,203	95	1,157
11	La Junta	Lacides Mejía	9,44	1,075	538	8,365
12	La Junta	Julio Cesar Daza	3,79	1,062	531	2,728
13	La Junta	José Ángel Hinojosa	0,276	0,234	137	0,042
14	La Junta	Walter Martínez	0,23	0,187	84	0,043
15	Los Haticos	Enrique Mendoza	1,25	0,796	398	0,454
16	La Peña	Enrique Luis Ariño	4,37	1,252	599	3,118
17	La Peña	Natalia Mendoza	1,97	0,396	167	1,574
18	La Sierrita	Idelfonso Fuentes	4	1,329	665	2,671
19	La Sierrita	Alberto Fuentes Mejía	6,83	1,080	540	5,750
20	La Sierrita	Calixto Fuentes Mejía	2,39	1,276	638	1,114

N°	VEREDA	BENEFICIARIO	AISLAM. (Km)	AISLAM VERIF PRIDA	N° DE POSTES	AISLAM FALTANTE
21	Loma del Potrero	Amilkar David Bolaño	0,05	0,057	24	-0,007
22	Loma del Potrero	Juan Segundo Vega	0,49	0,310	162	0,180
23	Loma del Potrero	Luis Alfredo Vega	0,14	0,139	70	0,001
24	Loma del Potrero	José María Martínez	0,17	0,067	30	0,103
25	Los Haticos	Víctor Daza	1,35	0,410	61	0,940
26	Los Haticos	Julio Enrique Cujia López	1,64	0,358	121	1,282
27	Peña de Los Indios	Julio Bolívar Montaño	0,44	0,389	180	0,051
28	Peña de Los Indios	Jorge Eliecer Mendoza	0,19	0,196	86	-0,006
29	Peña de Los Indios	Carlos Juvencio	2,78	1,315	643	1,465
30	Piloncito	Lesbia Montaño	0,07	0,076	39	-0,006
31	Piloncito	Amilcar José Vega	0,39	0,4037	206	-0,014
32	Piloncito	Nilson Mendoza	0,95	0,5035	200	0,446
33	Piloncito	Luis Alfonso Daza	0,26	0,097	50	0,163
34	Platanal	Luis Felipe Moguea	0,14	0,134	71	0,006
Total			**50,086**	**16,43**	**7.674**	**33,64**


Teniendo en cuenta los datos proporcionados por el contratista de obra, estas 34 áreas les corresponden un total de aislamiento de **50,086 km**, a pesar de esto, tan solo se ha ejecutado en aislamiento para restauración activa de **16,44 km,** el metraje mencionado fue medido y georreferenciado por la interventoría, viendo en campo un factor diferencial faltante de **33,64 km** para las áreas ya antes mencionadas, tal y como se puede observar en la sección de mapas generados restauración activa; el número de postes usados hasta el momento para el cercado es de **7.674** para aislamiento de restauración activa.

Parte de los aislamientos construidos presentan las siguientes situaciones:

- Se encontraron aislamientos que se está ejecutando en zonas diferentes a las ya demarcadas en los shapefiles y/o KML proporcionados por el contratista.
- Los avances que reporta el contratista son trabajos parciales del aislamiento tales como avance de ahoyado, montura de postes y montura de hilo de alambre; mas no aislamiento terminado.
- La variación en la distancia que hay entre poste y poste, sin justificación argumentada por el contratista.
- Ausencia de pie de amigo cada 30 metros como lo especifica el proyecto.
- Variación en la altura de los postes.

MAPAS GENERADOS RESTAURACION ACTIVA

1. **Achinticua:**

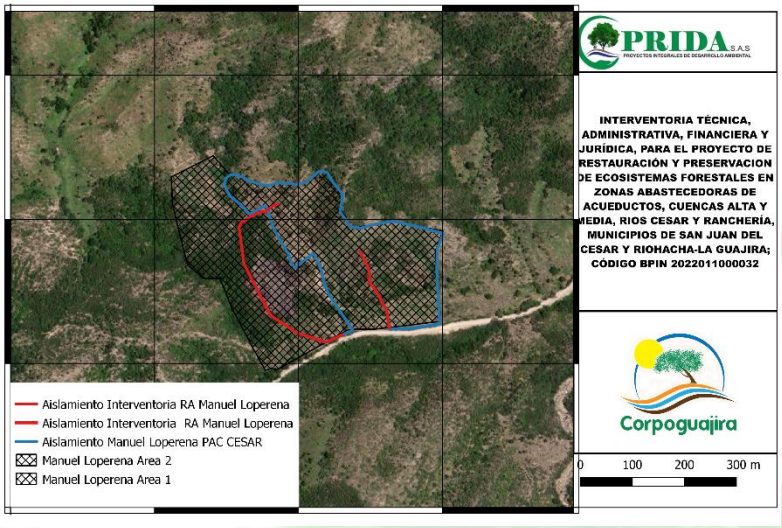


En la comunidad Achinticua se evaluó el aislamiento correspondiente al señor Manuel Loperena, el cual como se observa en el mapa, presenta discrepancia en comparación con el aislamiento proyectado por el contratista de obra PAC CESAR, el aislamiento construido por el beneficiario se encuentra dentro de ambos polígonos alterando significativamente el diseño del polígono de restauración activa y de por si la ubicación exacta del aislamiento. El metraje medido por la interventoría fue de 628 metros.


2. Caracolí

En el corregimiento de Caracolí se evaluó los aislamientos de:


- Elizabeth Peña: el aislamiento va en la zona que le fue asignada en el polígono proyectado por el contratista, faltan 6 metros de aislamiento para su terminación.

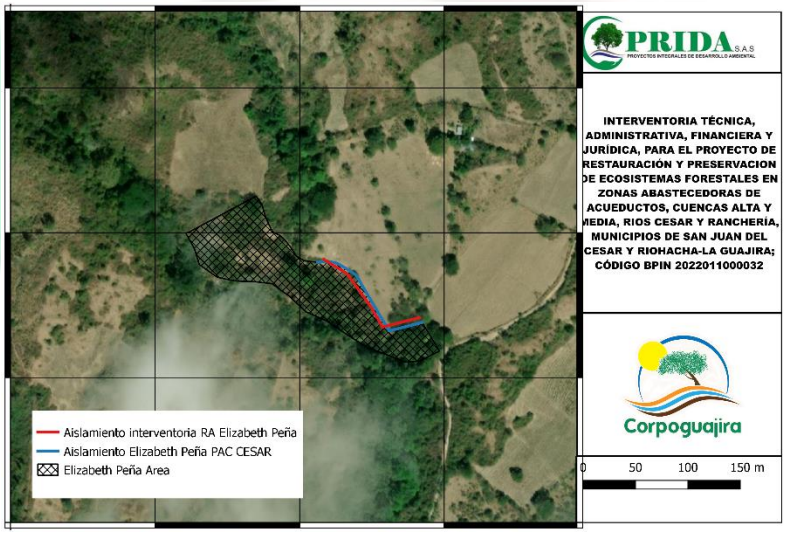


- Esneider Brito: el aislamiento no se encuentra ubicado en la zona que le fue asignada en el polígono, dicho cambio altera significativamente el polígono. El aislamiento posee un distanciado de 110 metros, aún le faltan pie de amigo.

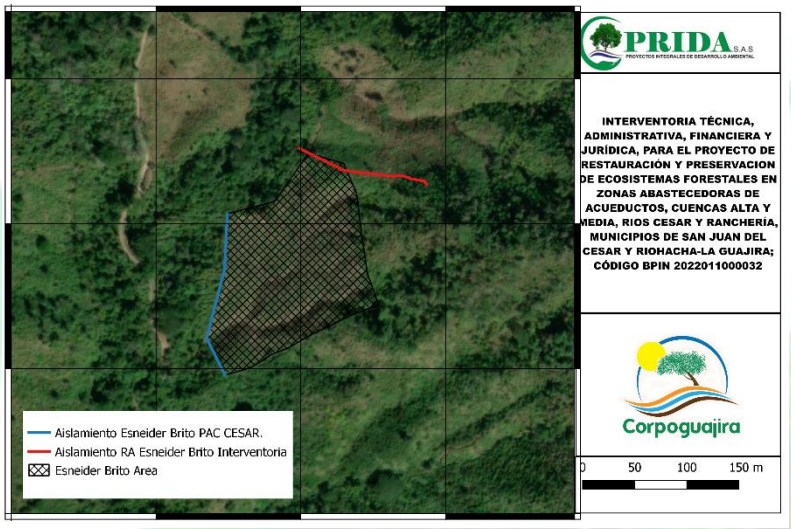


- Perfecto Millian: el aislamiento va en la zona que le fue asignada en el polígono proyectado por el contratista, hasta el momento posee un distanciado de 429 metros

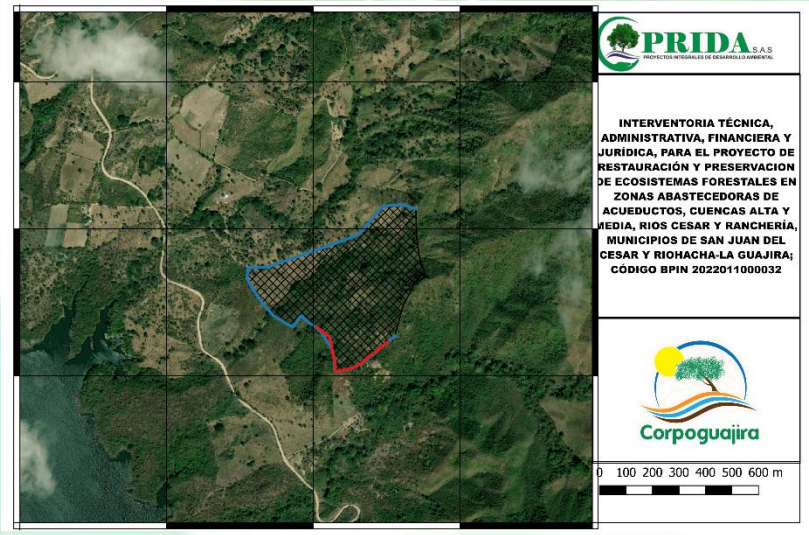

3. **Carrizal:** En la vereda Carrizal se hizo visita de verificación de aislamiento en el predio de la señora Ysela Bolaño, durante la visita se encontró un aislamiento que estaba siendo construido con madera propia del beneficiario y con madera del proyecto, con distancias entre los 0,90 – 1,20 metros, según testimonio del encargado del predio ese aislamiento es el del proyecto. La madera empleada para la instalación del cercado se encuentra en mal estado fitosanitario, parte del aislamiento esta por fuera del polígono.

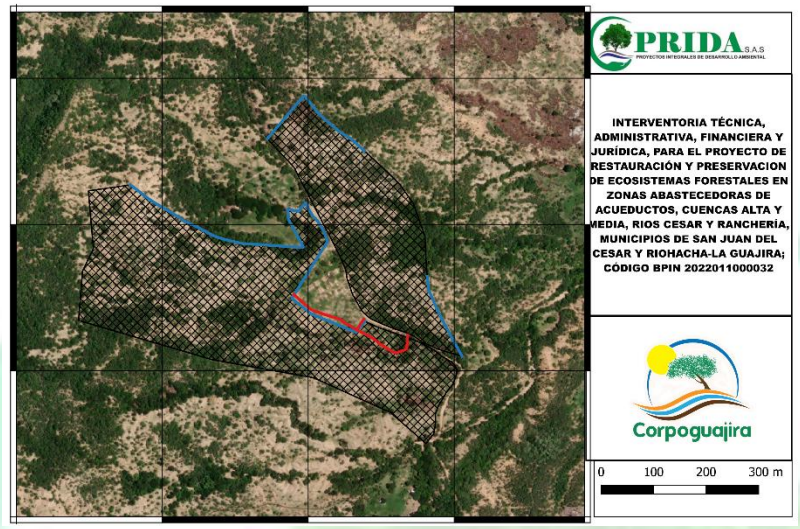


4. **El Placer:** El aislamiento perteneciente a la beneficiaria Mabel Montaño se encuentra a dos metros por encima de la zona que le corresponde, aún le faltan pie de amigo, posee un distanciado de 61 metros.

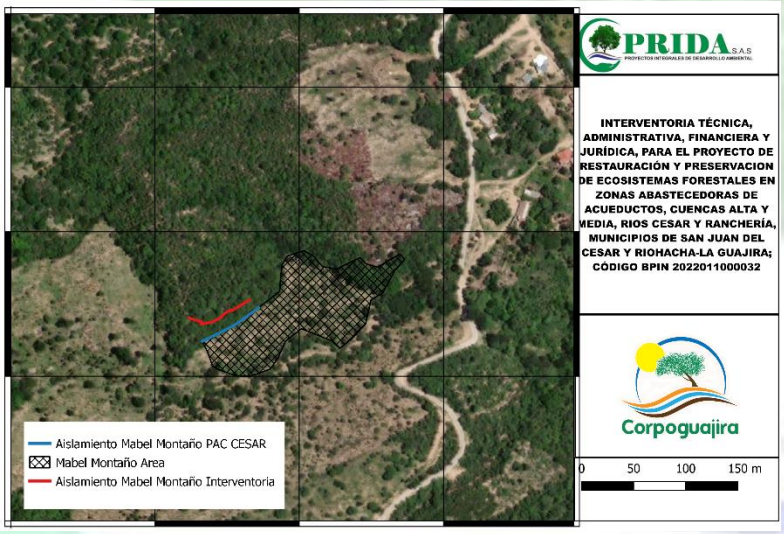


5. **Guayacanal**

- Alcibíades Blanchar: hasta el momento tiene montura de postes sin alambre de púas, falta pie amigo, el distanciado de dicha montura es de 144 metros, el aislamiento va en la zona que le fue asignada en el polígono.
- Abel Bolaño: Los aislamientos van en la zona que le fue asignada en los polígonos, ausencia de pie de amigo.


- Rafael Fragozo: Hasta el momento solo se ha ejecutado el aislamiento en el área 1, este está siendo construido en la zona que le fue asignada en el polígono, aún falta el aislamiento correspondiente al área dos, aún falta terminar el aislamiento.

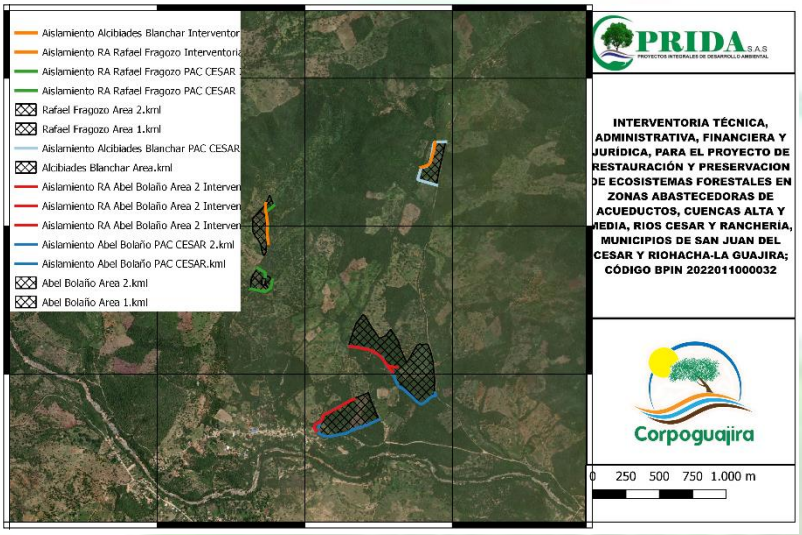


6. **Hatico de Los Indios:** el aislamiento se encuentra en la zona que le fue asignada en el polígono, presenta ausencia de pie de amigo y postes en la parte superior; hasta el momento solo se han construido 203 metros.

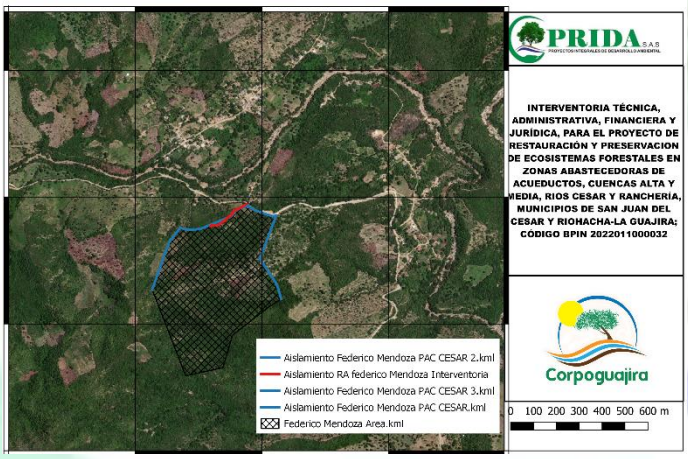


7. **La Junta:** Hasta el momento los aislamientos de los señores Lacides Mejía, Julio Daza y Ángel Hinojosa se encuentran en las zonas que les fueron asignadas en sus respectivos polígonos, falta pie de amigo y atesar postes que están flojos.

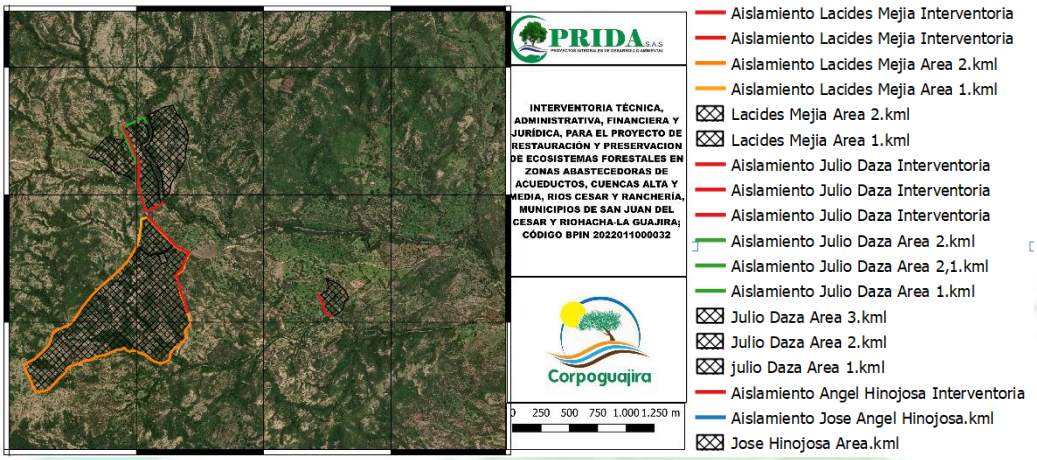


Parte del aislamiento correspondiente al señor Walter Martínez se encuentra por fuera de la zona que le fue asignada en el polígono, hasta el momento solo tiene montura de postes, no ha puesto alambre de púa porque el contratista aun no ha llevado los insumos para terminar el aislamiento.

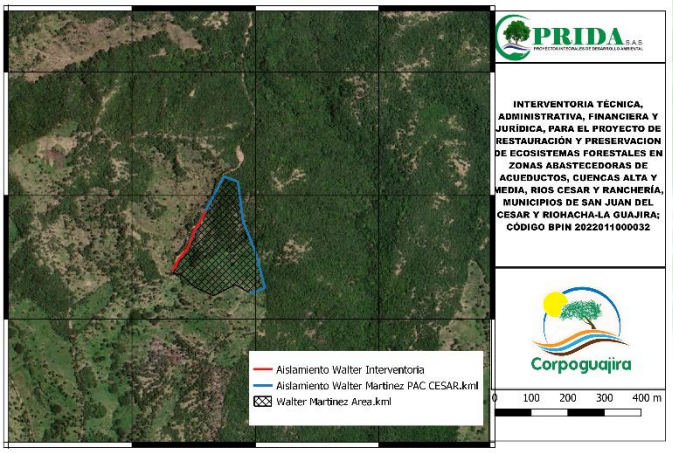

8. **La Peña:** el aislamiento correspondiente a los beneficiarios Natalia Mendoza y Enrique Ariño, se encuentran en la zona que le corresponden en el polígono, en caso del señor Enrique aún le falta colocar el alambre de púa, en cuanto al predio de la señora Natalia falta otro tramo por terminar, aun presenta postes flojos y sin alambre de púa.

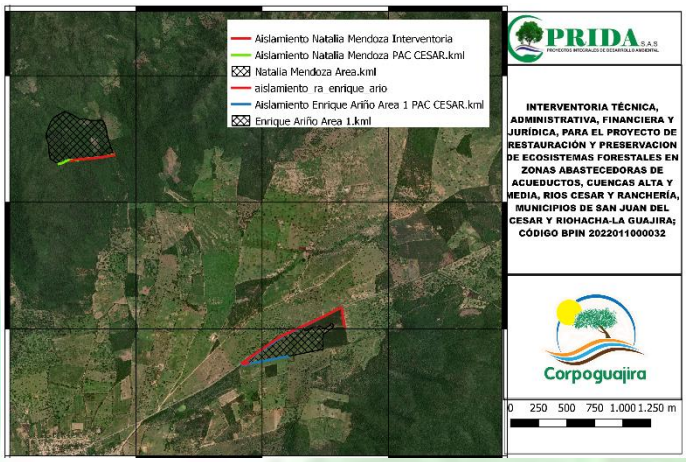


9. **La Sierrita:** las áreas de restauración activa de los hermanos Fuentes, llevan un avanzado porcentaje de aislamiento, aun así presentan modificaciones constantes en sus polígonos, se encontró postes flojos y ausencia de pie de amigo.

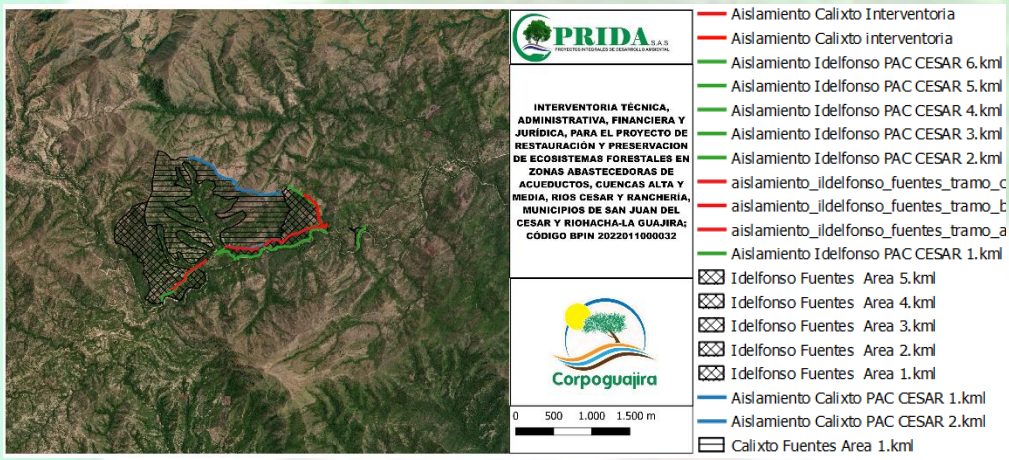


10. **Loma del Potrero:**


- José María Martínez: el aislamiento se encuentra en la zona que le fue asignada en el polígono, presenta ausencia de pie de amigo y alambre de púa.
- Juan Vega y Amilkar Bolaño: el aislamiento no se encuentra en la zona que le fue asignada en el polígono, presenta ausencia de pie de amigo y alambre de púa.
- Alfredo Vega: el aislamiento no se encuentra en la zona que le fue asignada en el polígono, falta un tramo para terminar el aislamiento.

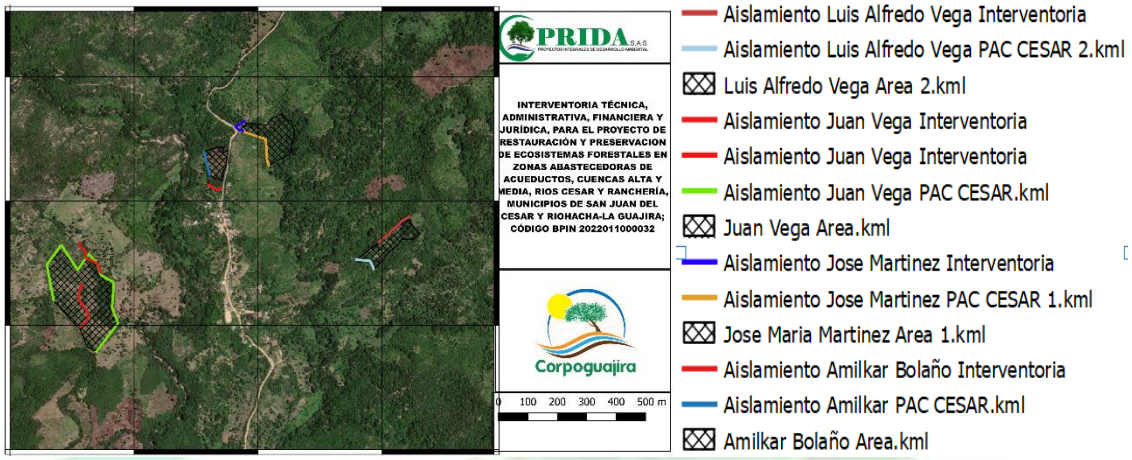


11. **Los Haticos:** El aislamiento se está construyendo en la zona que le fue asignada en los polígonos, excepto un tramo del predio del señor Víctor Daza el cual se construyó en otra posición del mismo polígono, aún falta pie de amigo y alambre.

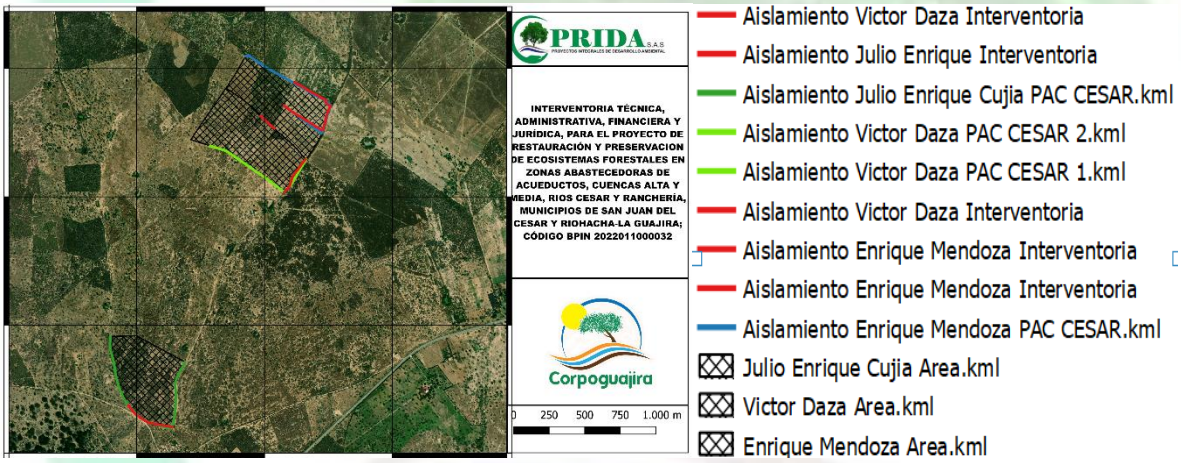


12. **Peña de Los Indios:** el aislamiento correspondiente a Carlos Juvencio se está construyendo en la zona que le fue asignada en el polígono, excepto el aislamiento de los señores Julio Montaño y Jorge Mendoza, los cuales están por fuera de la zona que le fue asignada, atraviesan o están por fuera del polígono, aún falta pie de amigo y atesar los postes flojos.

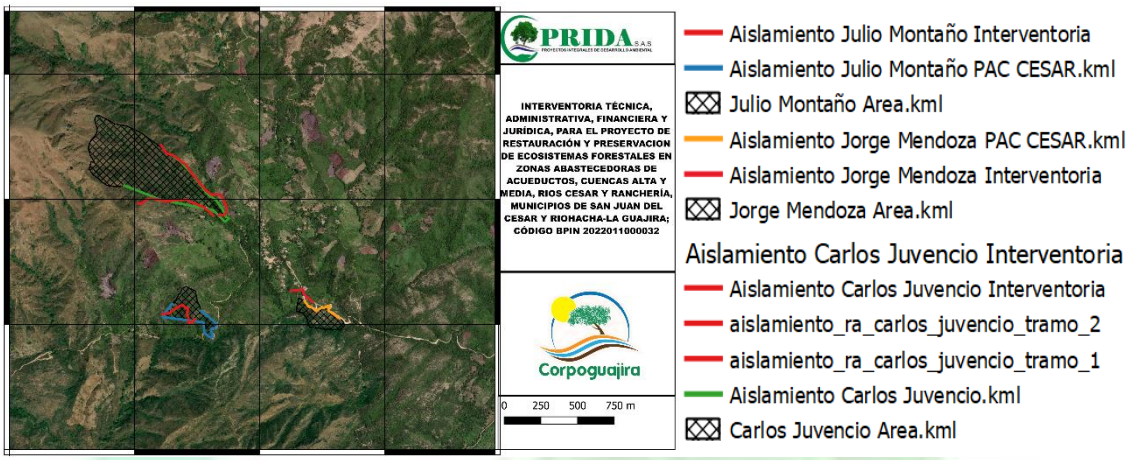


13. **Piloncito:** los aislamientos correspondientes a la señora Lesbia Montaño y Amilcar José Vega se encuentran en la zona que le fue asignada en el polígono, estos ya se encuentran terminados.

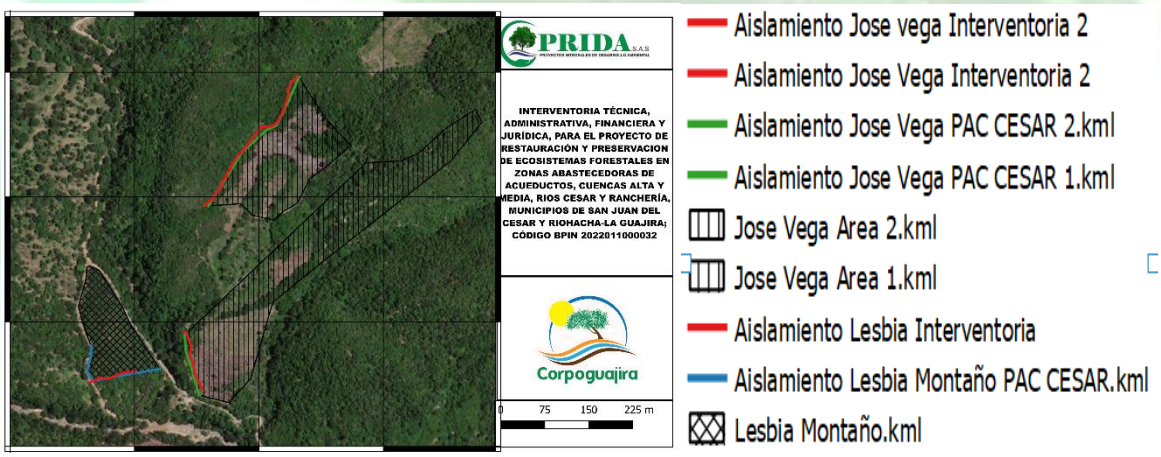


El aislamiento del señor Nilson Mendoza se encuentra en la zona que le fue asignada en el polígono, aún está en construcción.

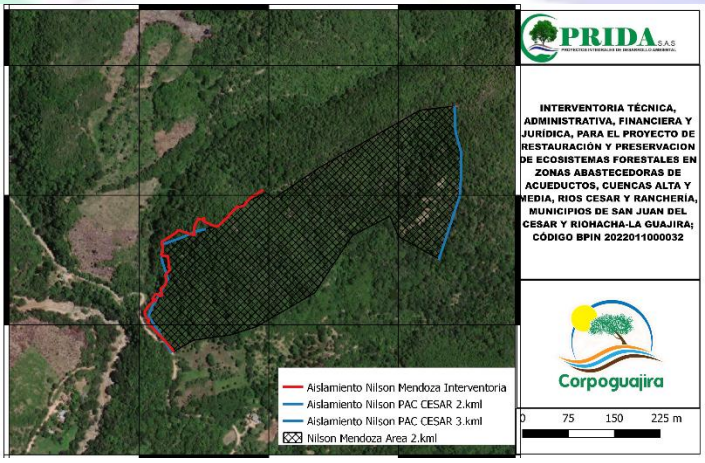

En la vereda Piloncito se encuentra el área de restauración activa del señor Luis Alfonso Daza, al cual se destinó 260 metros de aislamiento para el encerramiento de su área de plantación; durante la visita técnica a su predio el día 11 de octubre del año en curso, se encontró un encerramiento de 97,15 metros cerrando el área que destino para la actividad de R.A. mencionando que no necesitaba los metros restantes de aislamiento para su polígono, ya que la cerca que se encontraba en dicho punto es “relativamente nueva” y no va a desmontar esa cerca que se encuentra en buen estado por instalar la nueva.

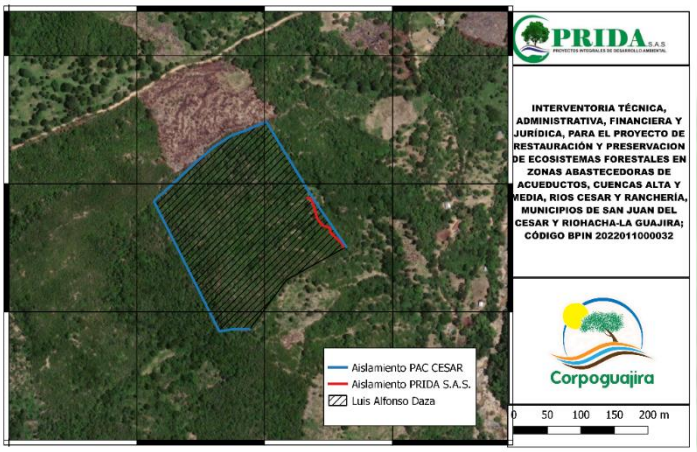

14. **Platanal:** el aislamiento correspondiente al señor Luis Moguea se encuentra por fuera de la zona que le fue asignada en el polígono, este ya se encuentra terminado.

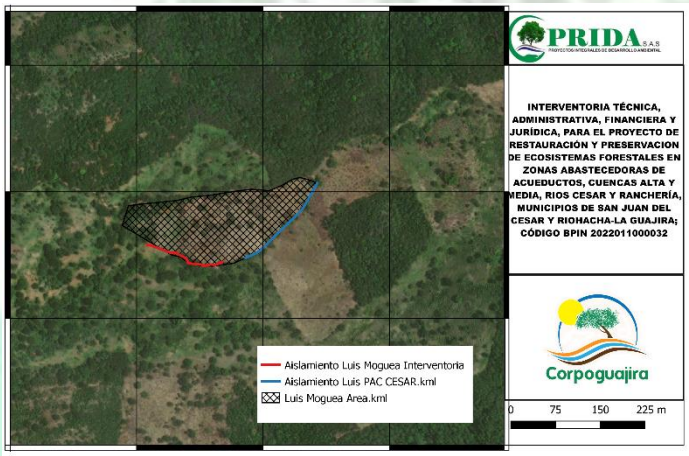

- **Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontanea**

Teniendo en cuenta los avances de aislamiento presentados por el contratista de obra, el equipo técnico de la interventoría visitó las áreas de restauración pasiva/espontanea o PSA en Caracolí, Guayacanal, La Sierrita, Tembladera y Tocapalma, en lo corrido del mes se visitó un total de siete (07) áreas PSA con sus aislamientos correspondientes; tal y como se observa en la siguiente tabla:

N°	PROPIETARIO	Vereda/Corregimiento	AREAS VERIFICADAS	AISLAM.	AISLAM VERIF PRIDA	N° DE POSTES	AISLAM FALTANTE
1	Deiner Sierra	Caracolí	35,4	2,46	0,521	241	1,939
2	Esmelin Sierra	Caracolí	10,6	0,73	0,747	304	-0,017
3	Henry Javier Nieves Guette	Guayacanal	6,6	0,454	0,438	203	0,016
4	Hilder Fuentes Mendoza	La Sierrita	110,3	8,31	1,696	848	6,614
5	Lacides Mindiola Guerra	Tembladera	53,5	3,72	1,065	533	2,655
6	Nimia Rosado	Tembladera	53,6	3,73	1,199	593	2,531
7	Emilda Mindiola	Tembladera	15,5	1,07	0,109	51	0,961
8	Analdo Acosta	Tocapalma	55,9	3,9	0,678	319	3,222
Total			**341,4**	**24,374**	**6,453**	**3092**	**17,921**

Con base en los datos proporcionados por el contratista de obra, estas 8 áreas de restauración espontanea les corresponden un total de aislamiento de **24,37 km**, a pesar de esto, tan solo se ha ejecutado en aislamiento para restauración espontanea **6,45 km**, el metraje mencionado fue medido y georreferenciado por la interventoría, viendo en campo un factor diferencial faltante de **17,92 km** para las áreas ya antes mencionadas, tal y como se puede observar en la sección de mapas generados de restauración espontanea. Hasta el momento se lleva una contabilidad de 3.092 postes.


Parte de los aislamientos construidos presentan las siguientes situaciones:

- Se encontraron aislamientos que se está ejecutando en zonas diferentes a las ya demarcadas en los shapefiles y/o KML proporcionados por el contratista.
- Los avances que reporta el contratista son trabajos parciales del aislamiento tales como avance de ahoyado, montura de postes y montura de hilo de alambre; mas no aislamiento terminado.
- La variación en la distancia que hay entre poste y poste, sin justificación argumentada por el contratista.
- Ausencia de pie de amigo cada 30 metros como lo especifica el proyecto.

MAPAS GENERADOS RESTAURACION ESPONTANEA


1. **Caracolí:**

- Deiner Sierra: el desarrollo del aislamiento va en la zona que fue delimitada en el polígono, se presenta ausencia de pie amigo, la interventoría midió 521 metros de aislamiento.
- Esmelyn Sierra: el desarrollo del aislamiento va en la zona que fue delimitada en el polígono, se presenta ausencia de pie amigo, la interventoría midió 747 metros de aislamiento, este se encuentra terminado.

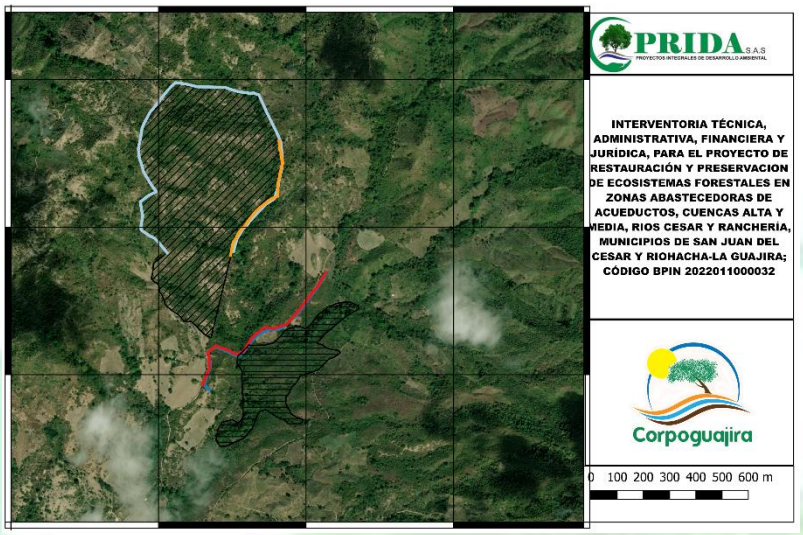


2. Guayacanal:

- Henry Nieves: el desarrollo del aislamiento va en la zona que fue delimitada en el polígono, se presenta ausencia de pie amigo, la interventoría midió 438 metros de aislamiento.

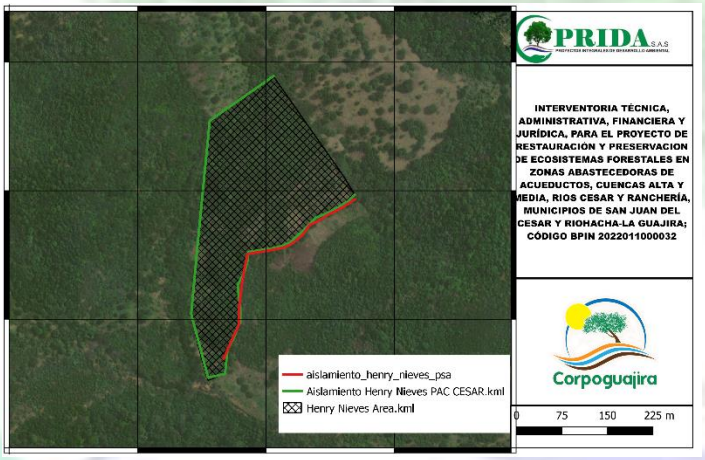


3. La Sierrita

- Hilder Fuentes: el área de restauración espontanea del señor Hilder Fuentes, lleva un avanzado porcentaje de aislamiento, aun así presentan modificaciones constantes en sus polígonos, se encontró postes flojos y ausencia de pie de amigo.

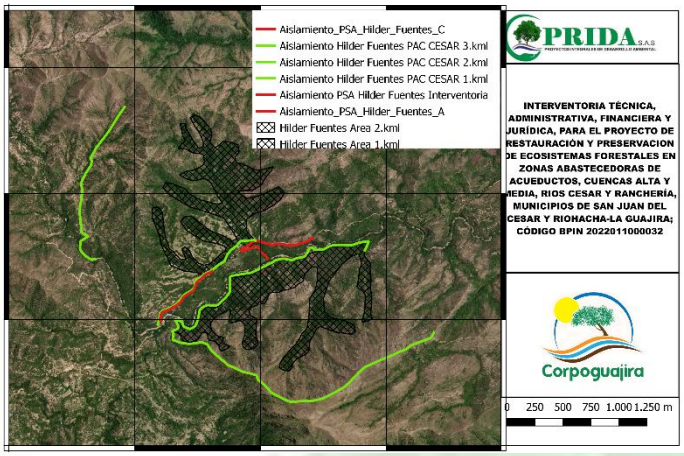


4. Tembladera


- Emilda Mindiola: el desarrollo del aislamiento va en la zona que fue delimitada en el polígono, se presenta ausencia de pie amigo, no se reporta mayor avance, ya que fue uno de los últimos en iniciar labores de cercado.
- Lacides Mindiola: el desarrollo del aislamiento va en la zona que fue delimitada en el polígono, hasta el momento se han medido 1065 metros de aislamiento.

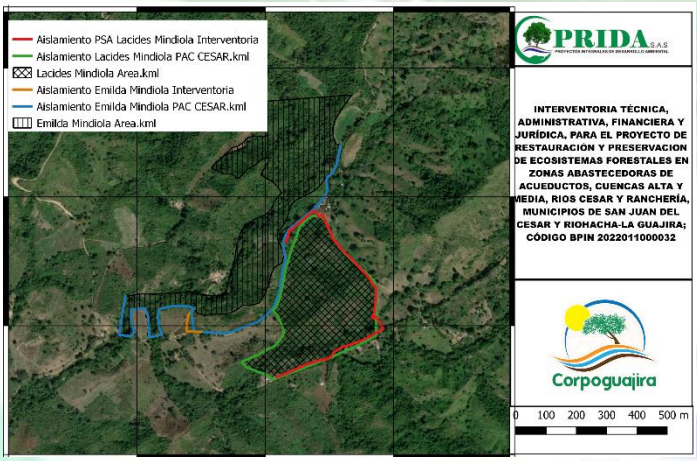

- Nimia Rosado: el desarrollo del aislamiento va en la zona que fue delimitada en el polígono, hasta el momento se han medido 1199 metros de aislamiento.

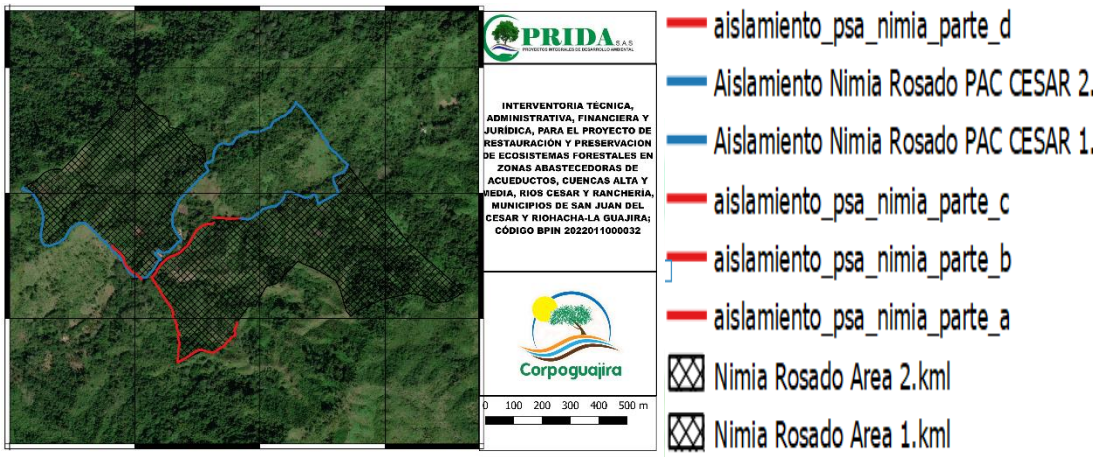

5. **Tocapalma:** parte del aislamiento construido por el beneficiario Analdo Acosta se está ejecutando en una zona por fuera del polígono, se presentó ausencia de pie de amigo, hasta el momento se ha ejecutado 678 metros.

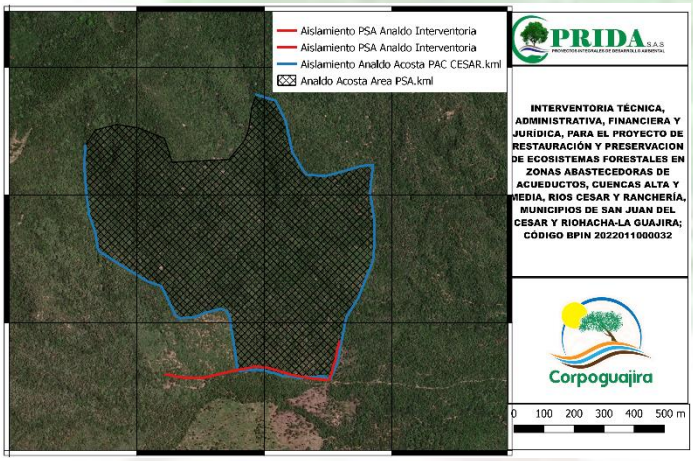

- **Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos**

Hasta el momento se ha hecho verificación del sistema de plantación, el cual debe ir acorde a la topografía de cada área de restauración activa, para dichas visitas se ha tenido en cuenta el avance de plantaciones proyectadas por el contratista. De las visitas en campo se obtuvo los siguientes datos:

N°	Zona	Beneficiario	N° Arboles PAC CESAR	Hectareaje proyectado PAC CESAR	Sistema de siembra
1	Achinticua	Yonis Mejía Móvil	200	0,364	Tres bolillos
2	Guayacanal	Rafael Fragozo	550	1	Tres bolillos
3	Hatico de Los Indios	Federico Mendoza	1500	2,727	Tres bolillos
4	La Junta	Lacides Mejía	4300	7,818	Ambos Métodos

N°	Zona	Beneficiario	N° Arboles PAC CESAR	Hectareaje proyectado PAC CESAR	Sistema de siembra
5	La Junta	Walter Martínez	1200	2,182	Tres bolillos
6	La Peña	Enrique Ariño	1300	2,364	Cuadrante 4,2 x 4,2
7	La Sierrita	Alberto Fuentes	550	1	Tres bolillos
8	La Sierrita	Calixto Fuentes	1500	2,727	Tres bolillos
9	Los Haticos	Miriam Martínez	6500	11,818	Cuadrante 4,2 x 4,2
10	Los Haticos	Víctor Daza	4000	7,273	Cuadrante 4,2 x 4,2
11	Piloncito	Amilcar José Vega	4157	7,558	Tres bolillos
12	Piloncito	Luis Alfonso Daza	825	1,5	Tres bolillos
13	Piloncito	Lesbia Montaño	769	1,398	Cuadrante 4,2 x 4,2
Total			**27351**	**49,73**	**-**

Según los datos proyectados, hasta el momento se han sembrado **27.351** plántulas de diferentes especies, tal y como se relaciona en el proyecto, con base en la relación 1:550, que por cada hectárea se deben sembrar 550 árboles, se obtiene un estimado de **49,73** has; aun así, cabe resaltar que el equipo técnico de la interventoría hasta el momento ha desarrollado visitas de verificación, estado y desarrollo de siembra, mediante recorridos en la zona sembrada descartando las no sembradas hasta el momento.

Observaciones encontradas en áreas de plantación:

- Se encontró arboles sembrados con poca lignificación y con la condición de cuello de ganso.
- A pesar que el sistema de siembra se ejecute tres bolillos o cuadrante 4,2 x 4,2, las dimensiones entre los vértices varia, y no precisamente como se dio indicado, muchas estas se da por condiciones propias del terreno.
- Debido a la temporada de lluvias en la región, ha tenido lugar un notorio aumento en la densidad de la vegetación, específicamente de rastrojos heliofitos, que ha comenzado a ocultar algunos de los árboles previamente plantados. Sin embargo, es importante destacar que existen áreas que no presentan esta misma condición, especialmente aquellas cubiertas por pastizales limpios y pastizales arbolados. Las zonas donde se ha observado un incremento en la vegetación corresponden a áreas de vegetación secundaria/transición, mosaicos de pastizales destinados a cultivos y aquellas que forman parte de los bosques de galería o ripario.
- Ante esta situación, se ha realizado una solicitud al contratista para llevar a cabo el despeje y aclarado alrededor de los árboles plantados, con el objetivo de mejorar la visibilidad de los mismos y reducir la competencia vegetal. Esto es fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de los árboles en cuestión y preservar la biodiversidad del entorno ambiental.
- Se ha encontrado ganado en las áreas de plantación.

4.2.3. Seguimiento De La Interventoría Al Establecimiento De Plantaciones Forestales En Zonas Degradadas Con Su Respectiva Georrefenciación

Que de acuerdo al Boletín de predicción climática y recomendación sectorial emitido por el IDEAM, mediante publicación N°.344 de octubre del 2023, en el periodo reportado se esperaban lluvias por debajo de lo normal con probabilidades que oscilan entre el 40 y 45%. Sin embargo, por influencia de la tormenta tropical Tammy se presentaron lluvias de variada intensidad a partir de la tercera semana de octubre, lo cual permitió realizar el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos.

En el mes de octubre se realizaron visitas conjuntas con el consorcio, con respecto a verificación de labores de siembra y aislamiento. Los días 25 y 27 de octubre se realizó la verificación de 12 predios de restauración activa cuyas plantaciones se evidencia adaptación favorable, bajo índice de mortandad, se evidencia además, que en algunos predios no se sujeta a las condiciones del terreno con respecto al trazado dado que en zona de pendiente han manejado trazado en cuadro y zonas planas en tres bolillo, en su momento se le manifestó al contratista hacer los correctivos en el avance de plantaciones.

4.2.3.3.Seguimiento de la interventoría al aislamiento con material vegetal

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por el contratista de obra, estas 34 áreas les corresponden un total de aislamiento de **50,086 km**, a pesar de esto, tan solo se ha ejecutado en aislamiento para restauración activa de **16,44 km,** el metraje mencionado fue medido y georreferenciado por la interventoría, viendo en campo un factor diferencial faltante de **33,64 km** para las áreas ya antes mencionadas, tal y como se puede observar en la sección de mapas generados restauración activa; el número de postes usados hasta el momento para el cercado es de **7.674** para aislamiento de restauración activa.

Parte de los aislamientos construidos presentan las siguientes situaciones:

- Se encontraron aislamientos que se está ejecutando en zonas diferentes a las ya demarcadas en los shapefiles y/o KML proporcionados por el contratista.
- Los avances que reporta el contratista son trabajos parciales del aislamiento tales como avance de ahoyado, montura de postes y montura de hilo de alambre; mas no aislamiento terminado.
- La variación en la distancia que hay entre poste y poste, sin justificación argumentada por el contratista.
- Ausencia de pie de amigo cada 30 metros como lo especifica el proyecto.
- Variación en la altura de los postes.

1.2.3.3. Seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto en mediosde prensa escrita y hablada

En el informe de obra Nº5 del contratista PAC CESAR, proporcionan evidencia de las Gestiones realizadas Con el fin de informar a la comunidad sobre el objetivo, metas y avances de las diferentes fases del proyecto, los cuales la realizaron a través de la divulgación en los medios de prensa escrita y hablada de la zona de influencia del proyecto. Dichas notas publicitarias fueron publicadas por:

- Diario caribe
- Estasucdiendiendo.com
- Guajira grafica
- Causa guajira
- Guajira news

Respecto a la divulgación en medios de prensa hablada, se realizó la emisión de piezas radiales en emisoras locales de acuerdo a lo siguiente:
1. Emisora Utay Stereo 106.2 FM, los días 13 y 14 de junio 2023.
2. La Voz de La Provincia de Padilla, el 13 de junio del 2023.
3. Guajira Estéreo 107.3 F.M, a partir del 15 de junio al 15 de septiembre del 2023, tres veces por semana.
4. Cardenal Stereo, programa Ecoguajira, de lunes a viernes durante 2 semanas.

Sin embargo, la interventoría en los anexos proporcionados por el contratista sobre las piezas radiales emitidas por las emisoras locales, manifiesta las siguientes observaciones:

- En el audio “AVANCE ST” nos hablan de una restauración espontanea, cuando el nombre idóneo es restauración activa esto se encuentra en el minuto 1.25 del respectivo audio, Interventoría recomienda utilizar un lenguaje sencillo, claro y conciso (sin mencionar los signos de puntuación) para llevar el mensaje a la comunidad.
  En el minuto 1.40 nos hablan de recuperar la perdida de la capacidad productiva de la tierra donde lo correcto es que estamos recuperando la cobertura vegetal, el objeto a futuro es recuperar no evaluar.

- En el audio “CORPOGUAJIRA” en el minuto 1.51 nos hablan de la producción y reforestación de unas series de plántulas donde lo que estamos buscando es la producción de plántulas y reforestación de áreas degradadas. En el minuto 2.51 nos hablan que se logre la recuperación lo que ha sido la perdida de la capacidad productiva de la tierra, donde vamos a recuperar es la cobertura.

- Respecto a la divulgación en medios de prensa hablada, interventoría recomienda colocar el respectivo nombre de cada audio ya que no tienen una identificación del medio de difusión que se empleó para difundir el

mensaje.

4.2.3.4. Seguimiento de la interventoría a las actividades de socialización y sensibilización ambiental.

Tal como se registra en el informe Nº8 correspondiente al mes de septiembre, se registra la socialización de 15 talleres ambientales, lo que da por culminado esta actividad.

4.2.3.5. Seguimiento de la interventoría al Establecimiento del Montaje deparcelas de monitoreo

Según lo reportado por el contratista en el informe Nº. 9, se realizó la instalación de 20 parcelas de monitoreo, las cuales se establecieron de acuerdo a las especificaciones definidas en el documento técnico del proyecto, y tomando como referencia los lineamientos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt establecidos para tal fin.

Por su parte, a través de las parcelas instaladas en los predios donde se establece la restauración activa y pasiva, se realiza monitoreo y seguimiento a la vegetación según los criterios e indicadores definidos en la metodología.

Cabe mencionar, que hasta la entrega del informe 9 reportan avance en la instalación de las parcelas de monitoreo, a la fecha el contratista no ha enviado informe de seguimiento y monitoreo, por lo tanto esta interventoría no ha podido realizar la verificación.

4.2.3.6. Seguimiento de la interventoría a las reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiada.

Hasta la fecha el contratista no ha presentado avance en la formalización de acuerdos voluntarios para conservación, sin embrago en reiteradas ocasiones, esta interventoría a través de oficios con consecutivos 90, ---- con respecto a la entrega del cronograma para los eventos proyectados para la generación de acuerdos, no obstante, el contratista no se ha pronunciado al respecto.

4.2.3.7. Avance físico de actividades

Según lo manifestado por el contratista, contrato durante el periodo del presente informe realizó un avance físico y financiero del 8,29%, equivalente a $920.107.363,98 del valor contratado, representando por la ejecución de las actividades antes relacionadas.

4.2.3.8. Actividades programadas y ejecutadas en el periodo

Durante el periodo prorrogado correspondiente al mes de octubre verificó el avance de plantaciones y aislamiento material vegetal y se brindó las debidas recomendaciones al contratista PAC CESAR, se continua con la de verificación de material vegetal y la recepción de poste inmunizados.

4.2.3.9.Actividades ejecutadas y aprobadas.

Se aprobaron los "***ACUERDO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO "RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RÍOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA"*** por parte de la interventoría y Corpoguajira.

4.2.3.10.Estado General del tiempo

De acuerdo al Boletín de predicción climática y recomendación sectorial emitido por el IDEAM, mediante publicación N°.344 de octubre del 2023, en el periodo reportado se esperaban lluvias por debajo de lo normal con probabilidades que oscilan entre el 40 y 45%. Sin embargo, por influencia de la tormenta tropical Tammy se presentaron lluvias de variada intensidad a partir de la tercera semana de octubre, lo cual permitió realizar el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos

4.2.3.11.Cuadros control de personal y equipo

ITEMS	CANTIDAD
Director de Interventoría	1
Profesional de apoyo. Ingeniero forestal /agrónomo	3
Profesional de apoyo. Ingeniero Civil	1
Profesional área social	1
Profesional jurídico	1
Profesional Contable	1
Técnico operativo	3
Transporte (alquilervehículo)	2


4.2.4. Actividades Financieras

De acuerdo al nuevo plan de inversión del anticipo, el contratista manifiesta en el informe 9 se destinará en un 24,50% a la compra de insumos, materiales, y herramientas, 15% al pago de mano de obra calificada y no calificada, 5% transporte y un 3% al componente social. Así las cosas, los recursos girados por concepto de anticipo ascienden a la suma de $5.273.719.243, equivalente al 47,50%.

Se tiene un acumulado de giros de fiducia por un valor total de $4.448.827.097,00, equivalente al 84,36% de los recursos entregados por concepto de anticipo. Así mismo, queda un saldo de $ 824.892.146,00, correspondiente al 15,64%.

El contrato durante el periodo del presente informe realizó un avance físico y financiero del 8,29%, equivalente a $920.107.363,98 del valor contratado, representando por la ejecución de las actividades antes relacionadas.

4.2.4.1.Ejecución financiera programada Contrato de interventoría

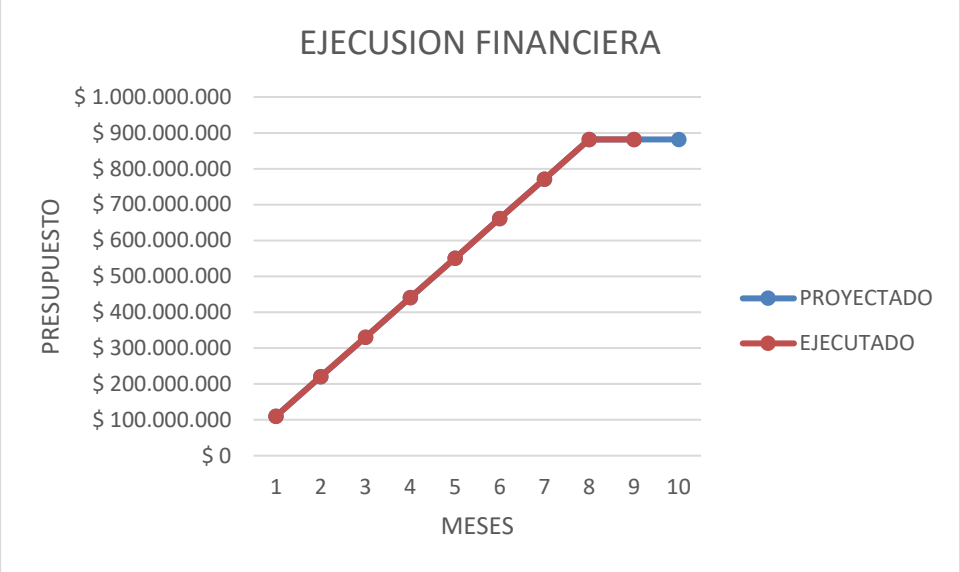

En la gráfica se observa la ejecución financiera proyectada y la ejecutada, por lo tanto la ejecución financiera está de acuerdo a lo planificado, se encuentra al 100 % , debido a que el contrato finalizo su etapa contractual inicial y en la actualidad esta en el mes 1 de la prorroga

4.2.4.2.Ejecución financiera del periodo Contrato de interventoría

El contrato financieramente se encuentra ejecutando de acuerdo a la Programación,para el mes 8, dado que este es el mes 1 de la prorroga aplica la misma ejecución financiera

PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACION TIEMPO	MES	Factor multiplicador	Salario	V. Unitario	V. total
Perfil profesional							
Director de Interventoría	1	1	8	2,2	$ 5.300.000	$ 11.660.000	$ 93.280.000
Profesional de apoyo. Ingeniero forestal / agrónomo	3	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 27.720.000	$ 221.760.000
Profesional de apoyo. Ingeniero Civil	1	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 9.240.000	$ 73.920.000

Profesional área social	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Profesional jurídico	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Profesional Contable	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Técnico operativo	3	1	8	2,2	$ 3.000.000	$ 19.800.000	$ 158.400.000
Transporte (alquiler vehículo)	2	0,7	8	1	$ 7.500.000	$ 10.500.000	$ 84.000.000
Papeleria	1	1	8	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 4.000.000
SUBTOTAL							$ 740.960.000
IVA (19%)							$ 140.782.400
TOTAL INTERVENTORIA							$ 881.742.400

En la actualidad se han adelantado actividades las cuales fueron mencionadas anteriormente.

4.2.3.4 Manejo de anticipo

ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL
SALARIOS	$ 38.650.000	$ 38.650.000	$ 38.650.000	$ 38.650.000	$ 38.650.000				
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL	$ 31.074.000	$ 31.074.000	$ 31.074.000	$ 31.074.000					
TRANSPORTE	$ 61.345.200								
GASTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 61.980.000								
Subtotal Mensual	$ 193.049.200	$ 69.724.000	$ 69.724.000	$ 69.724.000	$ 38.650.000				$ 440.871.200

4.2.3.10 Aportes parafiscales

Ver anexo 2

4.2.3.11 Información financiera contrato de interventoría

PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACION TIEMPO	MES	Factor multiplicador	Salario	V. Unitario	V. total
Perfil profesional							
Director de Interventoría	1	1	8	2,2	$ 5.300.000	$ 11.660.000	$ 93.280.000
Profesional de apoyo. Ingeniero forestal / agrónomo	3	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 27.720.000	$ 221.760.000

PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACION TIEMPO	MES	Factor multiplicador	Salario	V. Unitario	V. total
Profesional de apoyo. Ingeniero Civil	1	1	8	2,2	$ 4.200.000	$ 9.240.000	$ 73.920.000
Profesional área social	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Profesional jurídico	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Profesional Contable	1	0,5	8	2,2	$ 4.000.000	$ 4.400.000	$ 35.200.000
Técnico operativo	3	1	8	2,2	$ 3.000.000	$ 19.800.000	$ 158.400.000
Transporte (alquilervehículo)	2	0,7	8	1	$ 7.500.000	$ 10.500.000	$ 84.000.000
Papeleria	1	1	8	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 4.000.000
SUBTOTAL							$ 740.960.000
IVA (19%)							$ 140.782.400
TOTAL INTERVENTORIA							$ 881.742.400

5. INDICE DE GESTION

Actividades	Indicador de Gestión	Unidad de Medida	Meta 2023	Avance Parcial	Avance Total
Realizar Talleres de socialización y sensibilización ambiental	1100G124. Eventos De Participación Realizados	Numero	15	15	15
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos.	0900G137. Hectáreas establecidas y en proceso de restauración	Hectárea	1391	49,73	0
Realizar la protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.	0900G171. Hectáreas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección	Hectárea	1391	**18,85**	0
Realizar la construcción de vivero permanente.	1100G110. Viveros registrados	Numero	1	0	0
Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	0900G075. Parcelas de monitoreo establecidas	Numero	20	Por verificar	0
Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales	9900G037. Actas Realizadas	Numero	16	15	0
Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.	0900G171 Hectáreas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección	Hectárea	630	**6,45**	0
Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales	0900G022 Incentivos A La Conservación Del Medio Ambiente Otorgados	Numero	16	0	0
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	0900G145 Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados	Numero	15	0	0

Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada	0900G162. Elementos de difusión generados para educación ambiental	Numero	1	1	0
Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.	1000G664 Informes de seguimiento realizados	Numero	8	10	

Según el índice de gestión, se registra las siguientes observaciones.

- *Realizar Talleres de socialización y sensibilización ambiental,* se realizaron los 15 talleres ambientales
- *Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos,* hasta la fecha se verifica un avance 49,73 ha.
- *Realizar la construcción de vivero permanente,* hasta el momento la interventoría y el contratista están a la espera del comodato para la entrega oficial del terreno donde se construirá el vivero.
- *Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales*, la interventoría en el proceso de validación de los documentos para la formalización de acuerdos, tanto la interventoría como Corpoguajira dieron aprobación de los acuerdo.
- *Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea*. 6.45 ha
- *Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas,* hasta el momento no se ha generado ningún acuerdo.
- *Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada*. El contratista ha presentado en el informa de obra Nº5 las publicación en presa hablada y escrita.
- *Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.* El contratista lleva un avance del 100% de la entrega de los informes, hasta la fecha ha hecho entrega de 8 informes con retrasos en las fechas.

6.OBSERVACIONES, RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES

6.1.OBSERVACIONES

Durante dichas visitas se presentan las siguientes observaciones:

- Se encontró arboles sembrados con poca lignificación y con la condición de cuello de ganso.
- A pesar que el sistema de siembra se ejecute tres bolillos o cuadrante 4,2 x 4,2, las dimensiones entre los vértices varia, y no precisamente como se dio indicado, muchas estas se da por condiciones propias del terreno.
- Debido a la temporada de lluvias en la región, ha tenido lugar un notorio aumento en la densidad de la vegetación, específicamente de rastrojos autóctonos, que ha

comenzado a ocultar algunos de los árboles previamente plantados. Sin embargo, es importante destacar que existen áreas que no presentan esta misma condición, especialmente aquellas cubiertas por pastizales limpios y pastizales arbolados. Las zonas donde se ha observado un incremento en la vegetación corresponden a áreas de vegetación secundaria/transición, mosaicos de pastizales destinados a cultivos y aquellas que forman parte de los bosques de galería o ripario.

- Ante esta situación, se ha realizado una solicitud al contratista para llevar a cabo el despeje y aclarado alrededor de los árboles plantados, con el objetivo de mejorar la visibilidad de los mismos y reducir la competencia vegetal. Esto es fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de los árboles en cuestión y preservar la biodiversidad del entorno ambiental.
- El contratista suspendió la distribución de insumos tanto para plantación como para aislamiento situación que dificulta el avance de las obras, la interventoria solicito en varias oportunidades el cronograma de distribución de insumos pero a la fecha no se ha pronunciado al respecto

6.2.RECOMENDACIONES



1. Se le recomienda al contratista cumplir con los acuerdos pactados en el primer y segundo comité mediante acta de reunión, teniendo en cuenta el cumplimiento de las fechas para la entrega de los informes.
2. Afianzar la socialización por beneficiario sobre la finalidad del proyecto puntualizando cada ítem.
3. Tener en cuenta las observaciones señaladas por parte de la interventoría al contratista, para subsanar las inconsistencias que se han venido presentando en reiterada ocasiones.
4. Verificar las áreas definidas dado que estas presentan inconsistencias, al momento de validar la información..
5. Hacer mayor presencia y apoyo técnico por parte del contratista a los beneficiarios al momento de ejecutar el aislamiento, esto con el objeto que oriente al beneficiario los puntos ya demarcados donde se presume se encuentran los Tensionantes ambientales.
6. Atender a las observaciones alusivas al distanciamiento de los postes, alturas uniformes de los postes al realizar la cerca, postura de grapas e instalación de pie de amigo.





6.3.CONCLUSIONES



Se concluye que el contrato se desarrolla con amplios atrasos en el cronograma del plan de contingencia, lo que genera preocupación con respecto a el desarrollo de todas las actividades, teniendo en cuenta que muchos atrasos son atribuibles a la falta de presencia técnica y administrativa, a la distribución de insumos y soporte SIG en el momento de la instalación del aislamiento tanto de PSA como de restauración activa.

Por último, se recomienda al contratista apoyarse más con la labor que desempeña la interventoría para darle continuidad a las actividades establecidas en el proyecto, con el fin garantizar un buen trabajo conjunto tanto con el contratista como los beneficiarios del contrato.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

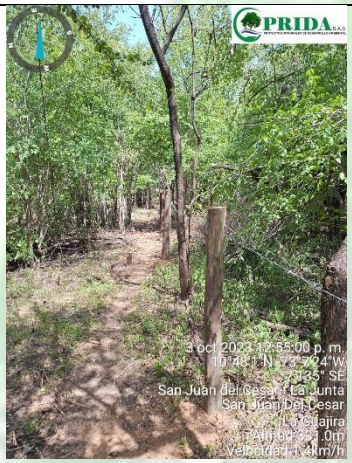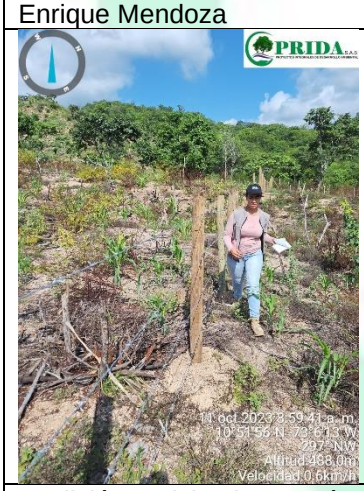		
Medición aislamiento área de Enrique Mendoza	Medición aislamiento área de Natalia Mendoza	Medición aislamiento área PAS de Lacides Mindiola
		
Medición aislamiento área de Manuel Loperena	Medición aislamiento área de Calixto Fuentes	Medición aislamiento área de Carlos Juvencio

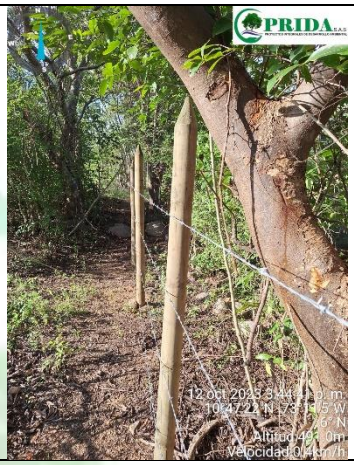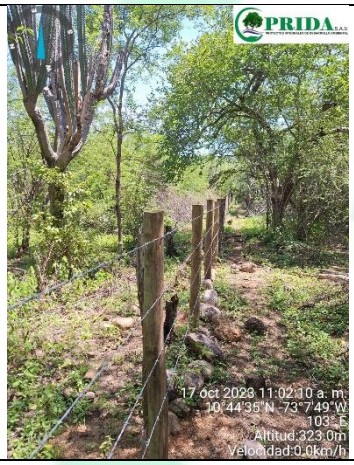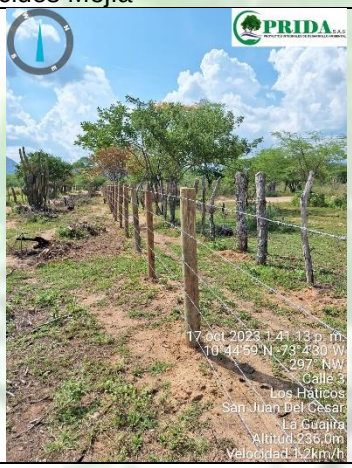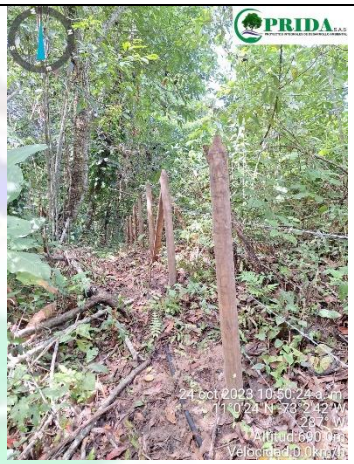		
Medición aislamiento área PSA de Hilder Fuentes	Medición aislamiento área de Lacides Mejía	Medición aislamiento área de Julio Daza
		
Medición aislamiento área PSA de Analdo Acosta.	Medición aislamiento área de Julio Enrique Cujia	Medición aislamiento área de Abel Bolaño
		
Medición aislamiento área de Alberto Fuentes	Medición aislamiento área de Idelfonso Fuentes	Medición aislamiento área PSA de Nimia Rosado

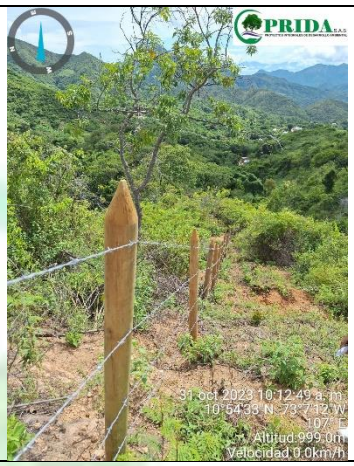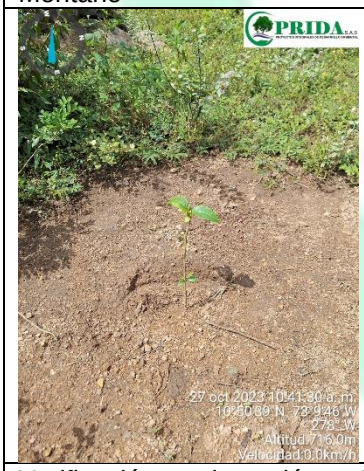		
Medición aislamiento área de Esmelyn Sierra	Medición aislamiento área de Ysela Bolaño	Medición aislamiento área de Yonis Mejía
		
Verificación plantación Lesbia Montaño	Verificación plantación Amilcar José Vega	Verificación plantación Víctor Daza
		
Verificación plantación Miriam Martínez	Verificación plantación Alberto Fuentes	Verificación plantación Calixto Fuentes

ANEXOS


ANEXO 1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 2. APORTES PARAFISCALES

ANEXO 3. EXCEL CON DATOS VERIFICADOS

ANEXOS 4. OFICIOS ENVIADOS OFICIOS RECIBIDOS

ANEXO 5. ACTAS VISITAS TECNICAS

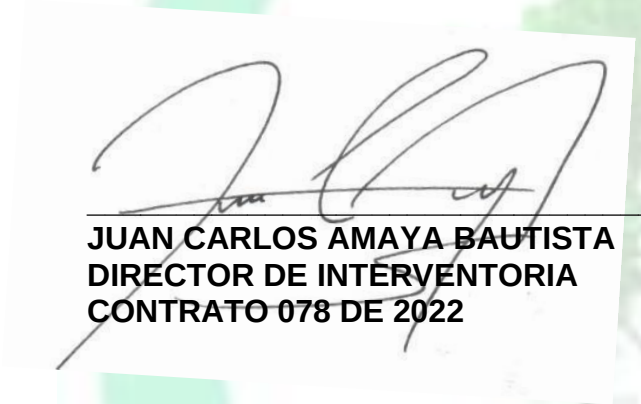

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATO 078 DE 2022

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 122	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Verificacion Aislamiento Predio del señor Analdo Acosta PSA	**Fecha:** 3/10/2023 **Lugar:** Toca Palma **Hora de Inicio:** 11:11 **Hora de Final:** 11:33

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Cabrera	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 3 de Oct del año en curso se realizo la verificacion del aislamiento en el predio del señor Analdo Acosta Ubicado en Tocapalma zona rural de sanjuan del cesar

Se midio 122,56 mt de aislamiento con 59 postes no se encontro pie amigo debido a que esta empezando el aislamiento

Observaciones

1. el aislamiento se este realizando donde lo indica los Shape Ale.
2. la distancia entre los postes Varia debido a las condiciones del terreno

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

* Arnulfo E Castro
CC: 5163011
Tel: 3217361305

FIRMA DEL RESPONSABLE

Camilo Luna

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 123.	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Enrique Mendoza Aislamiento	**Fecha:** 3/10/2023 **Lugar:** Los Hatcos **Hora de Inicio:** 8:15 **Hora de Final:** 9:38

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Francisco Guevara	T. operativo	Pnc cesar

DESARROLLO

El dia 3 de oct del año en curso se realizo la verificacion del aislamiento en el predio del señor Enrique Mendoza ubicado en los Hatcos zona rural de San Juan del cesar

Se encontro 315,19 mts de aislamiento con 140 postes.

observaciones

los postes tienen las mismas medidas en altura, y la distancia entre los primeros postes Vana de 2,40 a 1,90 mts

Se encontro que el aislamiento presenta un Quinto Pelo de alambre pero este fue instalado por el propietario

No hay presencia de Pie Amigo cada 30 mts

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenireth Gutierrez S

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Francisco Oviedo

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 124	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Técnico

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Lacides Mindiola

Fecha: 10/10/2023
Lugar: Tembladera
Hora de Inicio: 10:30 Am
Hora de Final: 1:44 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida sas
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida sas
Yenireth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida sas
Carolme Celedon	Residente	Prida sas
Eder Arocha	Tec. Operativo	Pac Cesar

DESARROLLO

El dia 10 de septiembre del año en curso se realizó visita de verificación al predio del señor Lacides Mindiola area PSA.

La visita se realizó en compañia del técnico del contratista pac Cesar Eder Alfonso Arocha.

Observaciones.

1. El aislamiento se ejecutó fuera de los poligonos PSA del señor Lacides Mindiola, registrados en los shapefiles o Kml proporcionados por el contratista.
2. se midieron 1022,57 mt de aislamiento, asi mismo se contaron 483 postes y 28 Pie de amigo.
3. solicitar al contratista capacitar a los técnicos sobre el uso de las herramientas sig y la sig hacer mayor asistencia

Powered by CamScanner

en campo.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC:
Tel:

ODEL Alocida

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 125	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Enemias Mendoz.

Fecha: 10/10/2023
Lugar: Tembladera
Hora de Inicio: 10: 50
Hora de Final: 12: 30.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Carolaine Celedon	Residente	Prida SAS
Eder Arocha	T. Operativo	Pu C Cesar.

DESARROLLO

Enemias Mendoza cuyo predio se le realizó Verificación el dia 10 de octubre, en compañía pablo luis Morales Arangon evidenciando que el predio cumple con las especificaciones contractuales para participar en el contrato 078 de 2022 como beneficiario de PSA.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

+ Pablo Luis ARAGON

Heiser López

CC:
Tel: 7714717183

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 126	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Luis Alfonso Daza Verificacion Aislamiento	**Fecha:** 11/10/2023 **Lugar:** Piloncito **Hora de Inicio:** 8:40 **Hora de Final:** 9:05

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 11 de oct del año en curso se visito el predio del señor Luis Alfonso Daza en piloncito zona rural de San juan del cesar

Se verifico el aislamiento el cual mide 97,15 mts con 50 postes y 3 pie de amigos.

El Aislamiento se desarrollo dentro de la zona que le corresponde al poligono.

Se hace la observacion que dentro de la informacion suministrada por el contratista. al beneficiario le corresponde 260 mts de aislamiento, pero en campo se identifico que realmente este corresponde al que fue modelado por la interventoria ya que en ese espacio se encuentra el tenedorante ambiental.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

Cabe resaltar que el aislamiento que rodea el Polígono se encuentra en buen estado ya que es nuevo y no amerita remplazarlo

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

*Luis DAZA
CC: 5735173
Tel: 3126967404

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yericth Gutierrez

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 127	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio de la señora Lesbia Montaño Verificacion Aislamiento	**Fecha:** 11/10/2023 **Lugar:** Piloncito **Hora de Inicio:** 9:20 **Hora de Final:** 9:57

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
camilo Cardenas	T. operativo	Prida SAS
Alirio Gonzalez	T. operativo	Par cesar

DESARROLLO

El dia 11 de oct del año en curso se realizo la Verificacion del Aislamiento al predio de la señora Lesbia Montaño ubicado en pilloncito zona rural de San Juan del cesar.

El Aislamiento mide 76,04 mts cuenta con 39 postes y 3 Pie de Amigo la distancia entre Poste y Poste Varia debido aque la zona es rocosa y eso impide cumplir las distancias indicadas. El Aislamiento esta en la zona demarcada por el shape file

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 128	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 11/20/2023
Visita al Predio del señor Anibal Jose Vega Aislamiento	**Lugar:** Piloncito
	Hora de Inicio: 10:00
	Hora de Final: 10:13

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yaneth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Alvaro Gonzales	T. operativo	Pac cesar

DESARROLLO

El dia 11 de oct del año en curso se realizo verificacion del Aislamiento del señor Anibal Jose Vega ubicado en Piloncito zona rural de San Juan del cesar

Observaciones

1. El aislamiento No se encuentre ubicado en la zona que fue delimitada en los shape file, hasta el momento se realizo el ahollado y postura de los postes, sin alambre.
2. Se solicita asistencia de caracter urgente a la profesional S.I.G para definir el trazado de los aislamientos restantes en la zona y pronta solucion de los ya ejecutados

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López.

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 129	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Al predio de la señora Lesbia Montaño PSA .	**Fecha:** 11/10/2023 **Lugar:** Piloncito **Hora de Inicio:** 10:16 **Hora de Final:** 10:20

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yericth Gonzalez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	prida SAS
camilo Lendarte	T. operativo	prida SAS
Alirio Gonzalez	T. operativo	Pac Cesar

DESARROLLO

El dia 11 de oct del año en curso se realizo Visita de Verificación al predio de la Señora Lesbia Montaño PSA ubicado en piloncito zona rural de sanjuan del cesar

El Area es Acta Para PSA.

Al momento de empezar el aislamiento, la Interventora solicita a la profesional SIG Asistencia y apoyo a los tecnicos del Consorcio para delimitar el tensionante presente en el area.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yeniceth Gutierrez J

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Julio Gozalez A.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 130	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 11/10/2023
Visita al predio del señor Juan Vega Aislamiento	**Lugar:** Loma del Potrero
	Hora de Inicio: 10:30
	Hora de Final: 11:30

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yeniceth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindark	T. operativo	Prida SAS
Alino Gonzales	T. operativo	Pac Cesar

DESARROLLO

El dia 11 de oct del año en curso se realizo la verificacion del aislamiento en el predio del señor Jua Vega ubicado en loma del potrero zona rural de San Juan del Cesar

observaciones

1. los trabajos de aislamiento no se esta ejecutando correctamente, ya que los postes puestos hasta el momento estan dentro del poligono, carece de un rumbo fijo, no cercando un poligono, si no estructurando un parcelado. por lo tanto se solicita al consorcio pac cesar de caracter urgente la asistencia de la profesional SIG para solucionar el tema del aislamiento y acompañamiento del señor Jose Vega enlace

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

Con las comunidades y de la profesional social para orientar al benchmarro Juan Vega de la Posicion exacta donde debe ir el aislamiento.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Carlos Valencia

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Adrián Rozales A

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 131	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 11 / 10 / 2023
Visita al predio del señor Carlos Juvenco Aislamiento	**Lugar:** Peña de los indios
	Hora de Inicio: 12:10
	Hora de Final: 1:32

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Londoño	T. operativo	Prida SAS
Angel Mendoza	T. operativo	Puc Cesar

DESARROLLO

El dia 11 de oct del año en curso se hizo visita de Verificacion al aislamiento del señor carlos juvenco ubicado en Peña de los indios zona rural de San juan del cesar

Observaciones

1 El aislamiento va por donde esta delimitado el Poligono del area del señor carlos juvenco

2. Atezar el cercado

3. Quedo pendiente una revision para el segundo tramo

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yesireth Gutierrez J

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S	ACTA DE VISITA 132	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion al predio del señor Jose Manuel Chismequera

Fecha: 12/10/2023
Lugar: Achintikwa
Hora de Inicio: 8:30
Hora de Final: 9:18

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yennelth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	prida SAS
Camilo Londoño	T. operativo	Prida SAS
Harlin Vanegas	T. operativo	Puc cesar.

DESARROLLO

El dia 12 de oct del año en curso se redico Visita de Verificacion al Predio del señor Jose Manuel Chismequero Ubicado en achintikwa zona rural de San Juan del Cesar

El Area Verificada por la interventoria. es Usable para restauracion activa.
Al momento de empezar los trabajos de aislamiento y Plantacion se solicita al Consorcio Puc Cesar Contratista de obra del contrato 0078 del 2022 Presencia de la profesional SIG y del Ingeniero Residente para garantizar que los trabajos se ejecuten en el area establecida

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 133	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Técnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al Predio del señor Manuel Lóperena

Fecha: 12/10/2023
Lugar: Achintikua
Hora de Inicio: 9:23 Am
Hora de Final: 10:40 Am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yeniretth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 12 de octubre del año en curso se hizo visita de verificación al aislamiento del señor Manuel Lopereña ubicado en La comunidad Achintikua zona rural del municipio de san juan del cesar.

Observaciones

1. El aislamiento ejecutado hasta el momento no cumple con los parámetros establecidos en los shapefiles proporcionados por el contratista, ya que aislan un area menor que en el que se refleja en los polígonos; se midieron dos tramos, el tramo A se midió 97,73 mt con 47 postes y 3 pie de amigo, sumado con lo medido el 27 de septiembre se tienen 450,31 mt con 244 postes y 16 pie de amigo.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

Se midió un tramo B que cuenta con 178,88mt con 91 postes y 1 Pie de amigo.
En total el aislamiento hasta el momento es de 629,19 mt.
Se solicita al consorcio Pac Cesar ejecutores del contrato 078 del 2022 que delegue a los profesionales idóneos para dar solucion a la problemática encontrada en campo, correspondiente al tema de aislamiento.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López.

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Marlin Venegas

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 134	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 12/10/2023
Visita Verificacion Aislamiento al Predio del Señor Jose Angel Hinojosa	**Lugar:** La Junta
	Hora de Inicio: 1:40
	Hora de Final: 2:20

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. Operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 12 de oct del año en cerso se realizo Visita de verificacion del aislamiento en el Predio del señor Jose Angel Hinojosa en la Junta zona rural de sanjuan del cesar

Se midio 239,13 mts de aislamiento con 137 postes y 6 Pie Amigos
hasta donde se midio el aislamiento esta dentro del Poligono enviado en los shapefile.

Observaciones
1. Hacen Falta 20,87 mts de aislamiento.
2 El contratista aun no ha definido los acuerdos de restauracion con el beneficiario, no han

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

definido el precio a sembrar por arbol
2 El señor Jose Hinojosa ya recibio todo postes Alambre Arboles y Agroinsumos

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

José Angel Hinojosa
CC:
Tel: 5762890

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenireth Gutierrez J.

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 135	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion Aislamiento Predio Lacides Mejia.

Fecha: 12/10/2023
Lugar: la Junta
Hora de Inicio: 2:36
Hora de Final: 4:25

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yeneth Cabrera	T. operativo	Prida SAS
camilo lindarte	T. operativo	Prida SAS
~~Yeneth~~ lopez	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 12 de oct del año en curso se Verifico el aislamiento del señor lacides Ubicado en la Junta zona rural de sanjuan del cesar

El aislamiento se estaba desarrollando dentro del Poligono proporcionado por el contratista. en los Shapefile

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 136	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion Aislamiento Julio Cesar Daza

Fecha: 12/10/2023
Lugar: La Junta
Hora de Inicio: 2:40
Hora de Final: 4:22

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

DESARROLLO

El dia 12 de oct del año en curso se realizo Visita de Verificacion al Predio del señor Julio Cesar Daza ubicado en la Junta Zona rural de San Juan del cesar

El aislamiento se encuentra ubicado en el permetro del poligono proporcionado por el contratista en los shape file, aun asi no es la ubicacion exacta en la que se refleja en los shape file.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **2** de **2**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 137	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion de aislamiento al predio del señor Analdo Acosta PSA	**Fecha:** 17/10/2023 **Lugar:** Toca palma **Hora de Inicio:** 11:00 **Hora de Final:** 11:35

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenneth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Pinalarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 17 de Oct del año en curso se Verifico el aislamiento del señor Analdo Acosta Ubicado en toca palma zona rural de sanjuan del Cesar

En el tramo A se midio aproximadamente 518mts Con 259 Postes Sin presencia de Pie de amigos

En el tramo B se midio 120 mts Aproximadamente Con 60 Poste sin presencia de pie de amigos se observo en algunos poste se presencia de termitas

El señor analdo beneficiario de PSA manifiesta que no ha recibido Visitas por Parte del tecnico encargado de la Zona, El se ha Puesto en contacto con el atraves de llamadas

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

Y aun asi no ha concretado visita para ver el estado de avance de obra en la zona.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Oswaldo E Acosta
CC: 5163011
Tel: 3217461305

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yericth Esteves J

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 138	Código: R PCAM-02 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica		
Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion de aislamiento al predio del señor Enrique Mendoza		Fecha: 17 /10 /2023 Lugar: los Hatico s Hora de Inicio: 12 : 30 Hora de Final: 1:00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Vencleth Gonzalez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 17 de oct del año en curso se realizo la verificacion del aislamiento del señor Enrique Mendoza ubicado en los Haticos zona rural de Sanjuan del cesar

Se midieron al redelor de. 480, 43 mts con. 227 Postes y 3 Piede amigo el aislamiento se esta realizando segun lo Indicado en los Shape File.

No se encontro al tecnico en campo.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Aeiser López

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 139	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Verificacion aislamiento al predio del señor Hugo Brochero	Fecha: 17/10/2023 Lugar: los Hatcos Hora de Inicio: 1:10 Hora de Final: 1:30

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yeniseth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Londoño	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 17 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento del señor Hugo Brochero ubicado en los Hatcos zona rural de San juan del cesar

Primer tramo

Se midieron 128 mts de aislamiento con 61 postes Ausencia de Pie de amigos

2 tramo

un aproximado de 272 mts con 136 postes. Ausencia de Pie de amigo

el aislamiento se esta desarrollando en el area demarcada en el Shape file

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 140	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion Aislamiento Julio Enrique Cujia	**Fecha:** 17/10/2023 **Lugar:** Los Haticos **Hora de Inicio:** 1:40 **Hora de Final:** 2:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yaneth Gutierrez	T. operativo	prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	prida SAS
Camilo Landarte	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 17 de oct del 2023 se verifico el aislamiento del señor Julio Enrique Cujia hubicado en los Hatico zona rutal de sanjuan del cesar

Se midieron aproximadamente 242,5 mts de aislamiento con 121 postes, dusencia de pie de amigos

el aislamiento se esta realizando segun lo indicado en los Shape file.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenneth Gutierrez J

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 141	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de verificación al aislamiento del señor Henry Nieves (PSA)

Fecha: 18/10/23
Lugar: Guayacanal
Hora de Inicio: 9:00 Am
Hora de Final: 9:20 Am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yenireth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 18 de Octubre del año en curso se hizo visita de verificación al aislamiento del señor Henry Nieves, ubicado en Guayacanal Zona rural de San Juan del Cesar.

Se midió 400 mts de aislamiento aproximadamente con 17 Pie de amigo.

El aislamiento hasta el momento va según lo indicado en los shapefiles proporcionados por el contratista.

Al aislamiento aún le falta la instalación de algunos postes y la postura de alambres y grapas.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 142	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visitar el predio del señor Alcibiades Blanchar Aislamiento	**Fecha:** 18-10-23 **Lugar:** Guayacanal **Hora de Inicio:** 9:50 Am **Hora de Final:** 10:03 Am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yeniveth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 18 de octubre del año en curso se hizo visita de verificación al predio del señor Alcibiades Blanchar ubicado en Guayacanal, zona rural de San Juan del Cesar.

Se midió 241 mts de aislamiento con 118 Postes sin presencia de pie de amigo

El aislamiento hasta el momento va segun lo indicado en los shapefiles Proporcionados por el contratista.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 143	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion Aislamiento en el predio del señor Abel Bolaño

Fecha: 18/10/2023
Lugar: Guayacanal
Hora de Inicio: 10:20
Hora de Final: 11:00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yeniseth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Hesser lopez	T. operativo	Prida SAS
camilo linduarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 18 de oct del 2023 se realizo la Verificacion al aislamiento del señor Abel Bolaño ubicado en Guayacanal zona rural de sanjuan del cesar

se midieron 423,16mts de aislamiento con 187 Postes. Sin presencia de Pie de amigos El aislamiento se esta ejecutando segun lo indicado en los shapefile

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 144	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita verificacion aislamiento al predio del señor Rafael Fragozo

Fecha: 18/10/2023
Lugar: Guayacanal
Hora de Inicio: 11:30
Hora de Final: 12:16

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 18 de oct del 2023 se realizo la verificacion del aislamiento en el predio del señor rafael fragozo Ubicado en Guayacanal zona rural de San jua del cesar

Se midio 236,17 mts de aislamiento con. 50 postes con 9 Pie de amigos

El aislamiento va segun lo indicado en los Shape file Proporcionados por el Contratista.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Rafael Jaramillo
CC: 84037285
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Jennifer Cabrera

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 145	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion aislamiento al Predio de la señora Mabel. Vega

Fecha: 18/10/2023
Lugar: El Placer
Hora de Inicio: 2:00
Hora de Final: 2:30

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	prida SAS
Camilo lindarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 18 de oct del 2023 se verifico el aislamiento de la señora Mabel ubicado en el placer Zona rural de sanjuan del cesar.

Se midieron 61,3 mts con 26 postes y 3 Pie amigo, El Poligono Presenta una Variacion de distancian con relacion al aislamiento de 14 mts, no se encuentra ubicado donde se predio debid estar segun lo indica los shape file.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

Yeniroth Gutierrez J.

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 146	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Prospero Vega.

Fecha: 10/10/2023
Lugar: predio prospero Vega
Hora de Inicio: 10:50
Hora de Final: 12:30

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Mariela Castañeda		
Pablo Luis Aragon.		
Carolaine Celedón.	Residente	Prida SAS
Heiser lopez.	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

realizando Visita tecnica en el predio Matarraton de señor prospero Vega, basados en dialogo con los trabajadores la señora Mariela Castañeda y Pablo luis Aragon manifiestan que aun no se han iniciados labores de aislamientos y hasta elmomento no se le ha entregado material Vegetal e insumos.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Marlela castañeda
CC: 26.883.714
Tel: 3233579168

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenireth Gutierrez J.

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 147	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Vista tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion aislamiento el los predios de los Hermanos fuentes	Fecha: 19/10/2023 Lugar: La sierra Hora de Inicio: 10:00 Hora de Final: 2:15

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Indarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El 19 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento realizado en el Predio Hato de la Virgen Propiedad de los hermanos Alberto, Calixto Ildefonso e Hilderfonso Fuentes Beneficiarios del proyecto de restauracion y Preservacion de ecosistemas forestales ubicado en la Sierra zona rural de sanjuan del cesar

- El area de calixto fuentes se midieron 807,33 metros
- El are de restauracion activa del señor Ildefonso se midieron 1329 metros
- El area de Hilder Fuentes area PSA se midieron 1109 metros

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

El aislamiento del señor Hilder Fuentes se desvía de la zona delimitada en los kml proporcionado por el contratista

- se encontraron postes flojos, alambres sin grapas, se encontraron tramos en los que solo hay alambre Puestos sin Postes
- se encontro desorden de postes en la via esto se presenta para daño o posible hurto

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

Carlos L. J. Jr.

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 148	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al de Verificacion Aislamiento al predio de la señora Nimia Roxado PSA

Fecha: 24/10/2023
Lugar: Temblader
Hora de Inicio: 10:19
Hora de Final: 1:00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo lindarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 24 de oct del 2023 se realizo Visita de Verificacion al aislamiento que se esta ejecutando en la Vereda Tembladera. Jurisdiccion del municipio de sonjuan del Cesar en el predio de la señora Nimia Rosado PSA

Durante la Visita se encontraron las siguientes situaciones

- La instalacion del cercado no se esta llevando a cabo en la zona en donde se especifica en los Shape files
- se midieron 4 tramos los cuales arrojan un total de 1,199 mts de aislamiento con, 59 postes y 30 Pie de amigo

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

- No se encontro presencia del equipo tecnico del contratista
- en la via se observo de manera dispersa y desordenada el material de posteras, expuestos a daños ya sea por causa naturales o antropicas y posible> hurto>

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yeniceth Cabrera J

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA SAS	ACTA DE VISITA 119	Código: FPGP04.2 Versión: 5 Fecha: 06/11/2016 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion aislamiento al predio de la Señora Emilda Mindiola.

Fecha: 24/10/2023
Lugar: Tembladera.
Hora de Inicio: 1:30
Hora de Final: 1:46

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yeniseth Gutierrez	T. operativo	Prda SAS
Camilo Indaca	T. operativo	Prda SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prda SAS

DESARROLLO

El dia 24 de oct del año en curso se realizo visita de Verificacion al aislamiento de la señora Emilda mindiola. PSA Ubicado en Tembladera. Jurisdiccion de Sanjuan del cesar.

Las instalaciones del cercado no se estan llevando a caso en la zona. donde se especifica en los shapeAle. y/o KmL

- Se midio un tramo el cual posee una distancia de 109 metros de aislamiento Con. 51 postes ausencia de pie de amigo
- No se encontro en campo presencia del equipo tecnico del contratista.
- En la Via se observa de manera dispersa y desordenada el material de postelena, esputo

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

a abonos o a posible huerto

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

Heizer López

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 150	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion Aislamiento en el predio de la Señora Elizabet pena

Fecha: 24/10/2023
Lugar: Caracoli
Hora de Inicio: 2:45
Hora de Final: 3:00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Jindarte	T. operativo	prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El dia 24 de oct del 2023 se verifico el aislamiento en el predio de la señora Elizabeth Pena ubicado en caracoli zona rural de sanjuan del sanjuan del cesar

- la instalacion de la cerca esta ubicado en lo indicado en los shape files
- se midio un tramo de 124 metros de aislamiento con 63 postes y 6 pie de amigos
- No se encontro en campo al equipo tecnico de la contratista.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC:
Tel:

Henrieth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 151	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica.

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion Aislamiento Esmelyn Sierra. PSA

Fecha: 24/10/2023
Lugar: Caracoli
Hora de Inicio: 3:05
Hora de Final: 3:35

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Cabrera	T. operativo	prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Pinzon.	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El 24 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento ubicado en Caracoli en el predio del señor Esmelin sierra beneficiario PSA.

Observaciones

1 parte del cercado no se encuentra en la zona donde se especifica en los Shape file.

2 se midio un tramo de una distancia de 747 metros con. 304 postes y 18 pie de Amigo

3 No se encontro en campo Pregencia del equipo tecnico del contratista

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenireth Cabrera

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 152	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Verificacion de postes inmunizados.

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 25/10/2023. **Lugar:** Predio luis Manuel. **Hora de Inicio:** 8:40. **Hora de Final:**

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Juan Camilo Perdomo	Resident	Consorcio Per Cesar
Cardaine Celedon	Residente	Prida Sas.
Osvaldo Torres.	Oficial	Consorcio Per Cesar.
Camilo Lindarte.	Ter. Operativo	Prida Sas.

DESARROLLO

El dia 25 de octubre de la anualidad en curso se procede a realizar la verificación de postes inmunizados, cuya recepción se especifica de la siguiente manera:

* El 14 de octubre se recepciona 1.500 unidades de bloques Brocos inmunizados con salvoconducto y certificacion de movilizacion ICA.
* El 21 de octubre se recepciona 1500 unidades de bloque Aserrado inmunizado y 74 unidades rolliza inmunizado.
* el 23 de octubre se recepciona 74 unidades de rolliza inmunizada, 1000 unidades Bloque Aserrado inmunizado y 500 unidades de bloque brusco inmunizado.

Por su parte, se verifica 713 y 880 unidades de postes de pino inmunizados cilindricos

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

sin certificado ICA presentado a la inventario con recepción del 19 de octubre 2023.

en virtud a lo anterior se procede a dar viabilidad de distribución a predios a intervenir, quedando a la espera de los certificados ICA de los posts del 19 de octubre.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Coralaine Celedón.

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 153	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 25/10/2023
Aislamiento Visita de Verificacion Henry Nieves PSA	**Lugar:** Guayacanal
	Hora de Inicio: 9:00
	Hora de Final: 10:07

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. Operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Luis Hurtia	T. operativo	Pac cesar

DESARROLLO

El dia 25 de oct del 2023 se verifico el aislamiento del señor Henry Nieves ubicado en Guayacanal zona rural de San juan del cesar

Se midieron 438,2 mts de aislamiento con 203 poste y 18 Pie de amigos

Observaciones:

- en el cercado hace falta la instalacion de 14 postes debido a que el beneficiario manifiesta que no tiene grapas
- El aislamien en una parte del trano se encuentra por fuera del area del aislamiento proporcionado por el contratista en los Shapefile.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 2'768.459
Tel: 313-5720138

FIRMA FUNCIONARIO

Yeniveth Gutierrez

Powered by CamScanner

PRIDA SAS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 154	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Acta de Visita	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita de verificación aislamiento del predio del señor Abel bolaño Que Diran 2	Fecha: 25/10/2023 Lugar: Guayacanal Hora de Inicio: 11:00 Hora de Final: 12:00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	prida SAS

DESARROLLO

El 25 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento del señor Abel bolaño en el predio Que diran 2 ubicado en Guayacanal zona rural de sanjuan del cesar

Se midieron 476,34 mts de aislamiento con 235 postes dusencia de Pic de amigos

El aislamiento va segun lo indicado en los shape file excluyendo una parte de este que esta por fuera

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 155	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica		
Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion aislamiento en el predio del señor Rafael Fragoza		Fecha: 25/10/2023 Lugar: Guayacanal Hora de Inicio: 12:30 Hora de Final: 1.16

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Jenireth Gonzalez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 25 de oct del 2023 se realizo la Verificacion del aislamiento ubicado en el predio del señor Rafael Fragoza en Guayacanal zona rural de sanjuan del cesar.

se midieron 253,17 mts de aislamiento con 123 postes y 9 Pie de amigos

El aislamiento ya segun lo indicado en los shape file proporcionado por el contratista

Observaciones

El beneficiario manifiesta que el metodo de siembra tres bolillos no lo Considera Viable Por el tipo de terreno Puesto que es un terreno semi plano

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Jorge Luis Pragozo V.
CC: 84.038.992
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 156	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion al predio del señor Jose Nieves PSA

Fecha: 25/10/2023
Lugar: Boyacanal
Hora de Inicio: 1:50
Hora de Final: 2:06

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Cabrera	T. operativo	Prida SAS
Yeiser lopez	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El 25 de oct del 2023 se visito el predio del señor jose nieves para verificar el aislamiento ubicado en Boyacanal zona rural de sanjuan del cesar.

El beneficiario Jose Nieves manifiesta que el aislamiento proporcionado por el contratista. en los shape files no lo considera como el tensionante indicado ya que este se encuentra ubicado en otra zona de su predio

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC: 84.104.609
Tel: 3135753797

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yeneth Gutierrez

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 157	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion Aislamiento en el predio del señor walter Martinez

Fecha: 26/10/2023
Lugar: la Junta
Hora de Inicio: 9:20 Am
Hora de Final: 10:00 Am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	pnda SIAS
Hersa Lopez	T. operativo	pnda SIAS
camilo linduarte	T. operativo	pnda SIAS

DESARROLLO

El dia 26 de oct del 2023 se verifico el aislamiento ubicado en la junta zona rural de sanjuan del cesar propiedad del señor walter Martinez

Observaciones

1 Se contaron 84 postes ausencia de piedra amigos con una medicion de 180 mts aproximadamente de aislamiento

2. Al beneficiario no le han realizado entrega de los alambres de pua y las grapas por causa de esto no ha terminado el aislamiento

3. El beneficiario esta avanzando en las plantaciones, ha sembrado caracaste roble ceiba y cedro

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenneth Gutierrez

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 158	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Técnica

Tema/Proyecto/Asunto:	Fecha: 26/10/2023
Visita de vefificación al aislamiento del señor Julio Cesar Daza	Lugar: La Junta
	Hora de Inicio: 10:50 Am
	Hora de Final: 11:35 Am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yenireth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

Se realizó visita de verificación al aislamiento del señor Julio Cesar Daza ubicado en la junta zona rural del municipio de San Juan del Cesar

Se midieron 903 mts de aislamiento con 83 postes sin presencia de pie de amigo.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 159	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion aislamiento en el predio de la señora Ysela Bolaño	**Fecha:** 26/10/2023 **Lugar:** Camizal **Hora de Inicio:** 12:00 **Hora de Final:** 12:50

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenirelh Gutierrez	T. operativo	Proda SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Proda SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Proda SAS

DESARROLLO

El 26 de Oct del 2023 se realizo la Verificacion del aislamiento de la señora Ysela Bolaño Ubicado en Camizal zona rural de SanJuan del Cesar.

Se midieron 275 mts de aislamiento con 282 postes y 12 Pie de amigos

Observaciones

1 El aislamiento no se esta realizando en la zona indicada por los shapefiles

2. la distancia entre los postes oscila entre 0,90mts y 1,20 mts

3. El señor Edgar Maestre Encargado del predio menciona que trajeron postes en mal estado Ritosanitario, con presencia de insectos Xilofagos que

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

llevan un alto grado de descomposicion de la madera es evidente la presencia de 2 tipos de postes inmunizados y no inmunizados con aspecto muy rudimentarios que carecen de las caracteristicas que esboza el proyecto, menciona el encargado del predio que los postes los trajo el contratista.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Edgar Maestre

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Paula Lindo

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 160	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Técnica

Tema/Proyecto/Asunto:	Fecha: 26/10/2023
Visita de verificación al aislamiento del señor Enrique Ariño	Lugar: La Peña
	Hora de Inicio: 1:50 Pm
	Hora de Final: 2:30 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yenireth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

Se realizó verificación al predio del señor Enrique Luis Ariño ubicado en la peña zona rural del municipio de san Juan del Cesar.

Se midieron 1252,3 mts de aislamiento con 599 postes, sin presencia de Pie de amigos.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 161	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica		
Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion Aislamiento en el Predio del Señor Luis felipe Hoguea		Fecha: 27/10/2023 Lugar: Platanal Hora de Inicio: 8:40 Hora de Final: 9:30

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T- operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T- operativo	prida SAS

DESARROLLO

El 27 de oct del 2023 se denfico el aislamiento del Predio del Señor Luis felipe Hoguea ubicado en Platanal zona rural de Sanjuan del cesar

Se midieron. 134 mts de aislamiento con. 71 Postes y 5 pie de amigos

El aislamiento se realizo segun lo indicado en los Shape files proporcionados por el contratista

En el predio ya se inicio el ahoyado para la plantacion.

Observaciones

1 El beneficiario manifiesta que le hace falta colocar el ultimo pelo de alambre debido a que no le an entregado las grapas que faltan.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Luis F Moquera P.
CC: 9037749
Tel: 3132492934

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yeniretth Gomez J

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 162	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita de Verificacion al predio del señor. Nilson Mendoza	**Fecha:** 27/10/2023 **Lugar:** Piloncito **Hora de Inicio:** 10:00 **Hora de Final:** 11:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. Operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Alirio Gonzales	T. operativo	Pac Cesar

DESARROLLO

El 27 de Oct del 2023 se Verifico el nodo de los aislamientos del señor Nilson Mendoza ubicado en piloncito zona rural de sanjuan del Cesar

Se midieron, 503,53 mts de aislamiento con 200 Postes y 9 PA

El aislamiento del beneficiario Se realizo segun lo indicado en los shape file enviados por el contratista

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Olivo Gozalez A.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 163	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion. al aislamiento en el predio del Señor Amilcar Jose Vega

Fecha: 27/10/2023
Lugar: Piloncito
Hora de Inicio: 11:20
Hora de Final: 1:00 Pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prida SAS
Alirio Gonzales	T. operativo	Pac Cesar

DESARROLLO

El 27 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento del señor Amilcar Jose Vega Ubicado en piloncito zona rural de sanjuan del Cesar

- Se midieron 2 tramos los cuales uno mide 289,7 mts con 152 Postes y 12 PA el Cesal se encuentra segun lo Indicado en los shape file por el contratista.
- el segundo tramo mide 114,3 mts con 59 Postes y 5 Ple de amigo el aislamiento no se encuentra en el lugar Indicado en los shape file enviado por el contratista.
- El beneficiario ya inicio el proceso de siembra

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Amilcar Vega

CC:
Tel: 8408504

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenireth Gutierrez J.

FIRMA DEL CONTRATISTA

Cel. 3108235626

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 164	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica a plantaciones.

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 25 y 27 octubre 2023.
Verificación de labores en Predios de Restauración activa	**Lugar:**
	Hora de Inicio:
	Hora de Final:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

DESARROLLO

los dias 25 y 27 de octubre del año en curso se procede a realizar Visita tecnica en los predios donde se adelantan labores de plantación. A continuación se mencionan los predios visitados.

1. Enrique Ariño: se Verifica material en proceso de adaptación, con avance de Ahoyado para avance en plantación.

2. Lacides Mejia: cuenta con avance en plantación adaptación favorable, con avance en ahoyado

3. Mirian Martinez: se observa plantaciones sin inconvenientes

4. Hugo Brochero se verifica plantación sin plateo sin embargo el contratista manifiesta que

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

adelantaran labores de limpieza en los proximos dias.
con respecto a luis alfonso Dozal se cuenta con avance de plantación, Por verificar el aislamiento que no se encuentra trazado en los poligonos presentado.
De igual manera se verifica avance sin contratiempos en los predios de Rafael fragozo, Alberto y calixto fuentes, Federico Mendoza, Amilca Vega, lesbio Montaño y Oscar de

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Carolaine Cabrales

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 165	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Verificación a predios del señor Perfecto José Milian Oñate.

Tema/Proyecto/Asunto: Verificación de poligonos de siembra y aislamiento.

Fecha: 31/10/2023.
Lugar: Coracolí
Hora de Inicio: 8:30 am.
Hora de Final:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Perfecto Milian	Beneficiario	
Carobine Celedón	Residente	Prida SAS.

DESARROLLO

el dia 31 de octubre de 2023, se procede a verificar las labores de siembra y aislamiento en el predio Arroyo de leon del señor Perfecto Milian en la zona de coracolí. Durante la visita se presentaron la siguiente situaciones donde el beneficiario manifiesta lo siguiente:

1. Hasta la fecha no se le ha entregado insumos de siembra como agroinsumos y arboles.

2. Que el dia 30 de octubre se acercó a la oficina del contratista donde le hicieron entrega de contrato para siembra y aislamiento con cambios unilaterales por parte del contratista sin ningun consentimiento del beneficiario, cuyo cambio registra que.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

en siembra serían 23,44 ha y en los combio regstra 1,054 ha. cabe destacar que el beneficiario se encuentra inconforme dado que no se estan cumpliendo los acuerdos pactados y exige respeto por su trabajo debido que los $400.000 que le consignaron no obedece al pago que se acordó en el contrato que firmó. donde además no le colocaron fecha al contrato.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

x Perfecto Jose Hilario Nate

Yenireth Gutierrez J.

CC:
Tel: 84036718
3242571967

FIRMA DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S	ACTA DE VISITA 166	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion aislamiento en el predio del señor Jorge Eliecer Mendoza

Fecha: 31/10/2023
Lugar: Peña de los indios
Hora de Inicio: 9:00
Hora de Final: 9:34

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. operativo	Prida SAS
Heiver Lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Maldonado	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El 31 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento realizado por el señor Jorge Mendoza ubicado en la peña de los indios zona rural de San Juan del Cesar

Se midieron aproximadamente. 205 mts con. 26 Postes y 8 Pie de amigos

El aislamiento no fue realizado en el lugar que se indica en los shape file enviados por el Contratista.

- el aislamiento le hace falta mas tension en los alambre

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yenireth Guerrero J

FIRMA DEL CONTRATISTA

Jorge Ivan Vega
3008878225

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 167	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Técnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 31/10/2023
Visita al aislamiento del Señor Carlos Juvencio	**Lugar:** Peña de los indios
	Hora de Inicio: 9:30 Am
	Hora de Final: 10:40 Am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yenreth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

Se realizó visita de verificación al aislamiento del señor Carlos Juvencio Mendoza ubicado en la peña de los indios zona rural de San Juan del Cesar.

Se midieron aproximadamente 775 mts con 378 Postes y 23 pie de amigo.

El aislamiento se realizó por el área delimitada en los shapefiles del contratista

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Heiser López

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Jorge Ivan Vega

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 168	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion aislamiento al predio del señor Julio Bolivar Montaño	Fecha: 31 / 10 / 2023 Lugar: Peña de los indios Hora de Inicio: 11: 35 Hora de Final: 12: 40

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	T. Operativo	Prada SAS
Helsar lopez	T. operativo	Prada SAS
Camilo Lindarte	T. operativo	Prada SAS

DESARROLLO

El 31 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento realizado en el predio del señor Julio Montaño Ubicado en Peña de los indios zona rural de sanjuan

Se midio 770 metros aproximadamente. Con 180 Postes y 9 Pie de amigo

El aislamiento se realizo en un lugar diferente al delimitado por la contratista en los shapefile

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yeniveth Gutierrez J.

FIRMA DEL CONTRATISTA

Jorge Iván Vega.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 169	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita de Verificacion aislamiento

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 31/10/2013
Verificacion de aislamiento predio Anulfo Bolaño.	**Lugar:** Loma del Patrimonio
	Hora de Inicio: 01:35 pm
	Hora de Final: 02:00 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Lindao	Tec. Operativo	PRIDA
Hassar Lopez	Tec Operativo	PRIDA
Yenneth Gutierrez	Tec Operativo	PRIDA
Jorge Ivan Urga	Tec Operativo	PAC CESAR

DESARROLLO

El dia 31 de octubre del año en curso se desarrollo visita tecnica de verificación de aislamiento en el predio del Señor Anulfo Bolaño ubicado en la vereda loma del patrimonio zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

Observaciones

En el area de restauración activa se contaron 24 postes, estos no presentan alambre de pua ni grapas, la distancia que mide los postelares instalado es de 50 metros, El aislamiento esta por forma del Poligono.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC:
Tel:

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL CONTRATISTA

Jorge Ivan Vega.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 170	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita de verificación

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 31/10/2023
Verificación Aislamiento predio Jose Maria Martinez	**Lugar:** Loma del Potrero
	Hora de Inicio: 01:40
	Hora de Final: 01:58

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Lozada	Tec Operativo	PRIDA
Hevar Lopez	Tec Operativo	PRIDA
Yeniveth Gutierrez	Tec Operativo	PRIDA
Jorge Ivan Vega	Tec Operativo	PAC CESAR

DESARROLLO

El dia 31 de octubre del año en curso se desarrollo visita tecnica de verificación de aislamiento en el predio del señor Jose Maria Martinez ubicado en la vereda Loma del Potrero zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

Observaciones

En el área de restauración activa se contaron 30 postes, estos no presentan alambres de pua, ni grapas, la distancia que rige la postelma instalada es de 60 metros, El aislamiento esta dentro del potrero.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Jorge Ivan Vega.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 171	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:	Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita Verificacion aislamiento en el Predio del Señor luis Alfredo Vega.		Fecha: 31/10/2023 Lugar: Peña de los indios Hora de Inicio: 2:15 Hora de Final: 3:06

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Cabrera	T. operativo	Prida SAS
Heiser lopez	T. operativo	Prida SAS
Camilo Cindarte	T. operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El 31 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento realizado en el Predio del Señor luis Alfredo Vega ubicado en loma del Roble zona rural de San Juan del Cesar.

Se midieron aproximadamente 130 mts con 70 Postes y 4 Pie de amigo

El aislamiento se realizo en un lugar diferente al delimitado Por la Contratista en los Shape file

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Jennelth G. Berrio J.

CC:
Tel:

FIRMA DEL CONTRATISTA

Jorge Ivan Vega

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 772	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Verificacion aislamiento al predio del señor Juan Vega	**Fecha:** 31 / 10 / 2023 **Lugar:** Loma del potrero **Hora de Inicio:** 2:10 **Hora de Final:** 2:45

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Cabrera	T. operativo	Prada SAS
Camilo Indarte	T. operativo	Prada SAS
Heiser Lopez	T. operativo	Prada SAS

DESARROLLO

El 31 de oct del 2023 se Verifico el aislamiento Realizado en el Predio del señor Juan Vega Ubicado en loma del Potrero zona rural de San Juan del Cesar

Se midieron aproximadamente 320 mts con 162 Postes y 4 Pie amigos

el aislamiento esta Por Fuera de la delimitacion propuesta Por el contratista en los shape file.

aun no se ha Puesto alambres y Pie de amigos

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

CC:
Tel:

Yeniceth Gutierrez J.

FIRMA DEL CONTRATISTA

Jorge Iván Vega.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 81

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: observaciones y rediseño de polígonos y aislamientos de áreas de R.A. y PSA solicitadas.

Cordial saludo,

La empresa PRIDA S.A.S. en su rol como interventoría, le solicita al consorcio PAC CESAR como ejecutor del contrato de obra pública número 0078 del 2022, él envió de la información SIG la cual debe contener las siguientes especificaciones:

- Los shapefiles y/o KML de los nuevos beneficiarios de R.A. (Restauración Activa).
- El rediseño de polígonos y aislamientos de áreas de R.A. y PSA solicitadas.

Observaciones:

Durante el recorrido en campo el equipo técnico de la interventoría encontró que el aislamiento de los siguientes beneficiarios está asentado en zonas diferentes a las ya demarcadas en los KML proporcionados por el contratista:

- **Medición Áreas de Restauración Activa**

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta
Alberto Fuentes	La Sierrita	1080,16	483	10	26/09/2023	118
Calixto Fuentes	La Sierrita	468,67	198	0	27/09/2023	119
Manuel Loperena	Achinticua	354,48	179	13	27/09/2023	120
Julio Cesar Daza	La Junta	262,2	120	0	27/09/2023	121

- **Medición Áreas PSA**

Beneficiario	Zona	Aislamiento medido en campo (mts)	N° de postes	N° de Pie de Amigo	Fecha	N° de acta
Hilder Fuentes	La Sierrita	587,69	266	4	26/09/2023	118

Durante dichas visitas se presentan las siguientes observaciones:

- El equipo técnico de la interventoría encontró que el aislamiento de los beneficiarios se está ejecutando en zonas diferentes a las ya demarcadas en los shapefiles y/o KML proporcionados por el contratista.

- El aislamiento dispuesto al beneficiario Hilder Fuentes esta por fuera del área destinada para PSA, como se observa en el *mapa 2*.

- El aislamiento del señor Calixto Fuentes esta por fuera de la zona que le fue asignada, dicha apreciación se puede observar en el *mapa 3*, este se encuentra atravesando área de restauración activa del nuevo beneficiario el señor Idelfonso Fuentes.


- Se encontró postes que no poseen grapa, especialmente en las áreas que corresponde a los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Daza.

- Se encontró variaciones entre las distancias de poste a poste, las cuales oscilan entre los 1,60 - 7,70 mt; aun así los tramos que presentaban dicho distanciamiento presentan el ahoyado donde va su respectivo poste. Estas observaciones se resaltaron en el aislamiento que corresponde a los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes e Hilder Fuentes.


- Gran parte de los postes presentan variaciones en cuanto a la altura a nivel del suelo, se presentaron alturas entre 1,47 – 2,10 metros. Dichas observaciones se encontraron en el aislamiento de los beneficiarios Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Cesar Daza.

- Escasa presencia de pie de amigo cada 30 metros y postes flojos o sin estabilidad, especialmente en el predio del señor Alberto Fuentes, Calixto Fuentes, Hilder Fuentes y Julio Cesar Daza.


Mapas Realizados

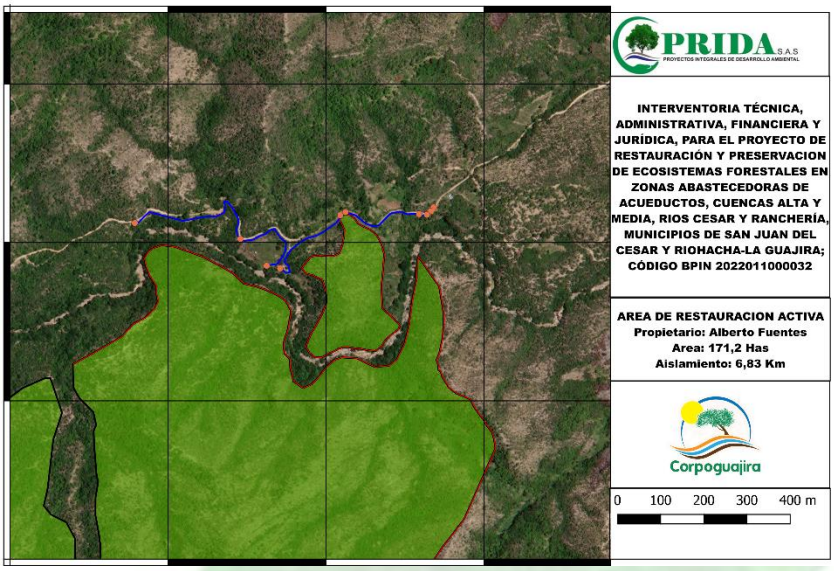


Mapa 1 Área Alberto Fuentes

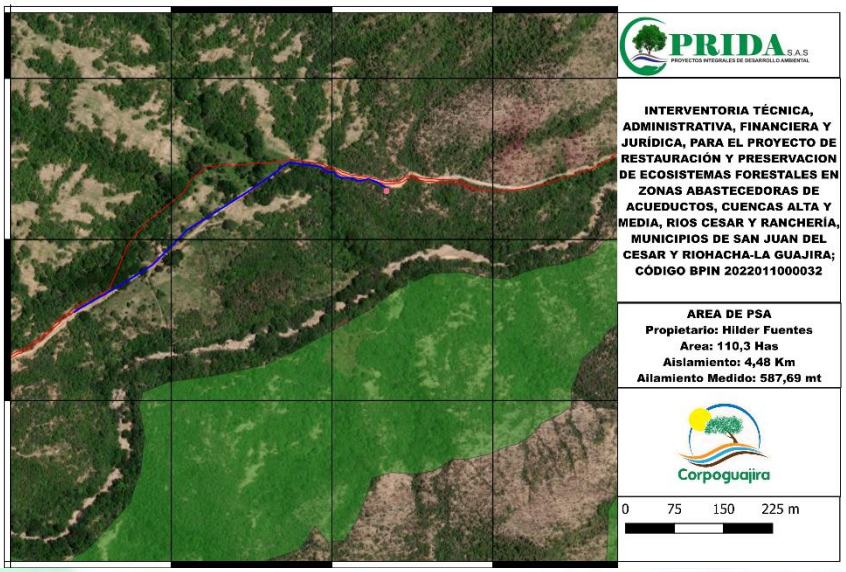


Mapa 2 Área Hilder Fuentes

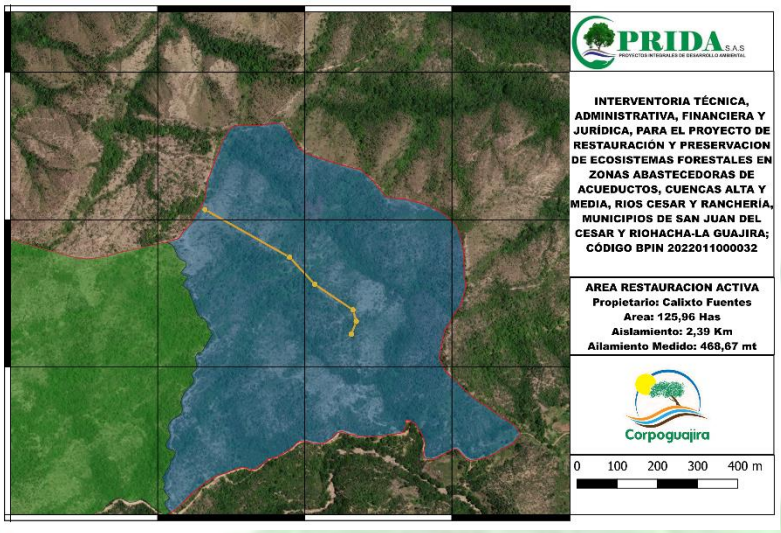

Mapa 3 Área Idelfonso Fuentes

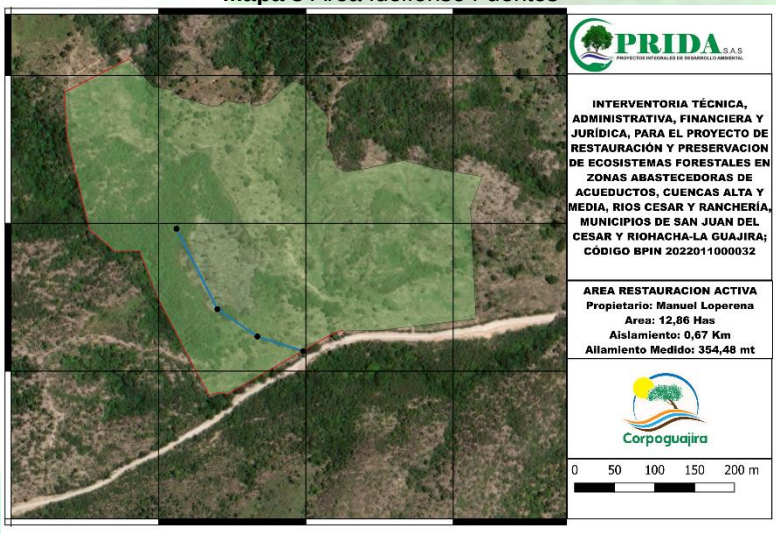

Mapa 4 Área Manuel Loperena

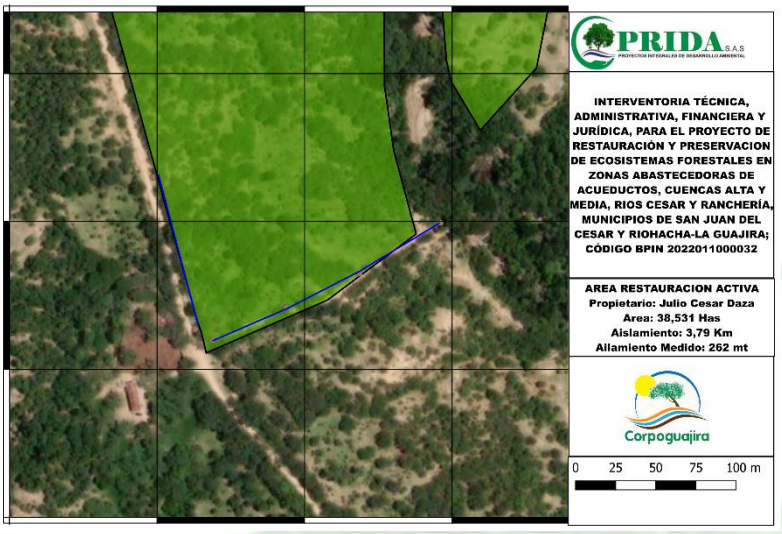

Mapa 5 Área Julio Cesar Daza

Recomendaciones

- Tomar correctivos de los polígonos en función al aislamiento ya instalado el cual no corresponde con los polígonos aprobados, teniendo en cuenta que aislamientos que no guarden concordancia con los polígonos aprobados por la interventoria no serán recibidos. .
- Hacer mayor presencia y apoyo técnico por parte del contratista a los beneficiarios al momento de ejecutar el aislamiento, esto con el objeto que oriente al beneficiario los puntos ya demarcados donde se presume se encuentran los Tensionantes ambientales.
- Atender a las observaciones alusivas al distanciamiento de los postes, alturas uniformes de los postes al realizar la cerca, postura de grapas e instalación de pie de amigo.

Cordialmente

_____

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira septiembre 28 de 2023

Oficio N° 82

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Estado solicitud de Prorroga.

Cordial saludo,

En relación a los oficios presentados los dias 25 y 29 de septiembre donde el Consorcio PAC CESAR solicita información acerca del trámite correspondiente a la prórroga del contrato 078 de 2022, me permito informarle que dicho trámite fue remitido por parte de la interventoria a supervisión el día 21 de septiembre con el respectivo concepto y según averiguaciones hechas se encuentra en la oficina asesora jurídica de la corporación, la cual está próxima a emitir concepto acerca de dicha solicitud

Cordialmente

_____

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 4 de 2023

Oficio N° 83

Señor
Andres Perea
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar.

Ref: Citación a Comité tecnico

Cordial Saludo:

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA contrato suscrito entre CORPOGUAJIRA y CONSORCIO PAC CESAR, solicitamos la asistencia del CONSORCIO PAC CESAR a comité tecnico el cual se desarrollara en las instalaciones de corpoguajira regional fonseca el día 6 de Octubre a las 9 am.

Cordialmente

_____
Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoria
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Octubre 6 de 2023

Oficio N° 84

Señor
Andrés Perea
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar.

Ref. Reiteración de Reunión Personal Técnico

Cordial Saludo:

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, se convoca nuevamente a una reunión el día lunes 9 de Octubre a las 8 a.m. en las instalaciones del INFOTEP en el municipio de San Juan Del Cesar, con el propósito de acordar las estrategias tanto de ejecución y seguimiento con miras a dar celeridad al avance del proyecto a esta reunión se requiere la participación obligatoria de la totalidad del personal técnico relacionado por el consorcio en el plan de contingencia, con el fin de acordar las estrategias tanto de ejecución el cual relacionamos a continuación, cabe mencionar que es la segunda vez que se cita a esta reunión toda vez que la anterior reunión citada para el día 4 de septiembre tuvo que ser cancelada por la inasistencia del personal del consorcio PAC CESAR.

Nombre	Cargo
Martha Fernanda Cataño Mendoza	Ingeniero Forestal
Juan Camilo Perdomo Guerrero	Ingeniero Forestal
Iván Federico Daza Pérez	Ingeniero Ambiental
Rafael Eduardo Daza	Ingeniero Ambiental
Luis Carlos Obregón	Ingeniero Ambiental
Benavides Borrego	Ingeniero Agrónomo
Olegario Alberto Zequeda	Ingeniero Agrónomo
Rafael Enrique Ramírez Contreras	Ingeniero Agrónomo

Andrés Rafael Meza Ballesta	Ingeniero Agrónomo
Juan Carlos Pacheco Callejas	Ingeniero Forestal
Alexander Velandia	Ingeniero Forestal
Jesús Barrera	Ingeniero Forestal
Marco Moreno Correa	Ingeniero agroforestal
Francisco Javier Guevara Torres	Tecnólogo Agrícola
Claudia Yelena Torres Jiménez	Tecnólogo en producción agropecuaria ecológica
Kevin José Amariz Charris	Tecnólogo en producción agrícola
Rosibeth Rangel Echavez	Técnico de cultivos agrícolas
Ludís Esther Oñate Martínez	Técnico cultivos agrícolas
Jorge Mario Jiménez Ramos	Tecnólogo en producción agrícola
Luis Gabriel Murcia Molina	Ingeniero Ambiental y Sanitario
Leonardo Fabio Nova Dávila	Tecnólogo en Gestión empresas agropecuarias
Iván David Molina Corpus	Ingeniero ambiental y sanitario
Yorleidis Mercado Alfaro	Técnico Operativo
Amílcar José Vega Nieves	Ayudante Agrícola

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 12 de 2023

Oficio N° 85

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Observaciones a respuesta a oficio N°80.

Cordial saludo,

En atención al oficio emitido por EL CONSORCIO PAC CESAR el día 05 de octubre de 2023 en respuesta al oficio con consecutivo No. 80 enviado por esta interventoría, sobre el cual se presentan las siguientes observaciones:

1. *"Por otra parte, en relación a los acuerdos voluntarios, se formalizaron 14, además, se está en el proceso de suscripción del documento con Aldo Francisco Sierra, para un total de 15 acuerdos formalizados; de ser aprobados los dos (02) predios faltantes por validar, se tendría un total de 17 acuerdos de PSA, de los cuales se contemplaron contractualmente 16, a ello obedece lo manifestado en su momento respecto a que se generaría un acuerdo voluntario adicional lo cual en efecto origina un mayor por costo para la actividad descrita, equivalente a $3.181.560"*

En virtud a lo anteriormente mencionado por el contratista, se le aclara que los presuntos sobrecostos para los pagos por servicios ambientales no tienen asidero respecto a la propuesta económica presentada por ustedes mismos en el anexo 2.2, donde los costos se encuentran discriminados por hectárea y no por número de beneficiarios, tal como se detalla a continuación:

2,2	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales	

Entidad Formuladora	
NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO: RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA
NÚMERO ACUERDOS	16
NUMERO DE HECTÁREAS	630

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD / DEDICACION	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR HECTAREA ($)	VALOR TOTAL ($)
1. EQUIPOS						
2. PERSONAL (M O calificada)					**262.155**	**165.157.545**
Profesional contable	1	Dedicación	8%	3.264.084	**262.155**	**165.157.545**
3. INCENTIVO PSA					**687.200**	**432.936.000**
Valor del incentivo PSA		UNIDAD	1	650.000	**650.000**	**409.500.000**
Poliza		UNIDAD	1	2.200	**2.200**	**1.386.000**
Gastos bancarios		UNIDAD	1	35.000	**35.000**	**22.050.000**
4. MATERIALES					**1.114**	**702.001**
Papeleria		UNIDAD	0,1%	1.800.000	**1.114**	**701.820**
5. IPC PROYECTADO		%				
TOTAL					**950.469**	**598.795.470**

ANDRES PEREA SANCHEZ
C.C No 86.062.230 de Villavicencio.
Representante
CONSORCIO PAC CESAR

Ahora bien, el valor que el contratista manifiesta con respecto $50.904.960 referente al costo en función del número de beneficiarios, no se detalla dentro de la propuesta económica general por tal razón se le solicita indicar a está interventoria donde esta discriminado este valor dentro de la propuesta económica del Consorcio PAC CESAR. Sin embrago basados en una revisión exhaustiva de los ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES donde hace referencia a la actividad "***otorgar el pago por servicios ambientales"*** en el cual mencionan textualmente lo siguiente:

"…CLÁUSULA TERCERA-VALOR Y FORMA DE PAGO DEL INCENTIVO: Se reconocerá a EL PROTECTOR AMBIENTAL a título del incentivo un monto equivalente a SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($650.000) Ha"
Lo cual está sujeto a los valores relacionados en la propuesta económica en mención.

En virtud a lo anterior, ¿bajo qué premisa se basa el contratista al manifestar que al incluir un nuevo beneficiario se generaría un sobrecosto? si bien, la propuesta es clara en cuanto al monto sujeto en hectáreas y no en número de beneficiarios.

- *A partir de lo anterior, y de acuerdo al faltante de hectáreas para PSA (49 en total), se realizó la caracterización de tres (03) nuevos predios, los cuales fueron presentados para su evaluación y viabilidad el 10 de septiembre del 2023.*

Nº	BENEFICIARIO	PREDIO	VEREDA	ÁREA DISPUESTA PARA PSA (HA)
1	ENEMIAS MINDIOLA	ARROYO LION	TEMBLADERA	9
2	LESBIA MONTAÑO	PEREGUETANO	PILONCITO	6
3	ALDO FRANCISCO SIERRA MENDOZA	LA SORPRESA	CARACOLI	34
TOTAL				**49**

En atención a lo anterior, el equipo técnico de esta interventoría procede a dar viabilidad a los dos (02) predios faltante correspondiente a Enemias Mindiola Y Lesbia Montaño, en concordancia con los polígonos suministrados por el contratista concluyendo que estos cumplen con las especificaciones contractuales que deben de tener estos predios para participar como beneficiarios de PSA. En este sentido, el contratista puede continuar con el proceso de formalización de acuerdos voluntarios para pagos de servicios ambientales a estos beneficiarios, así como también a otorgar el incentivo para PSA. Con respecto a Aldo Francisco Sierra Mendoza, este beneficiario ya había sido validado con anterioridad.

2. con respecto a la actividad ***"Generar acuerdos de conservación con las comunidades Beneficiadas***" surgen varias dudas, teniendo en cuenta lo siguiente:
   - En el oficio emitido el 26 de septiembre manifestaron "*El ítem 3.3 denominado "Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas", para lo cual se definió contractualmente un numero de 15, con los cuales se cubrirían 1.391 hectáreas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, distribuidas en 66 puntos críticos. Lo anterior indica, que se deben suscribir 66 acuerdos de conservación, a fin de respaldar la inversión que se realice en los predios concertados. Así las cosas, la cantidad contratada para la actividad en mención, se aumenta a 51 números, lo que representa un mayor valor en los costos, equivalente a $138.651.596*".

- Mientras que en el oficio respuesta al oficio con consecutivo No. 80 mencionan *"En cuanto al ítem 3.3 denominado "Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas", es claro lo que usted menciona respecto a las especificaciones técnicas definidas para la actividad en mención. Ahora bien, lo que expresamos en su momento se relaciona con la cantidad contratada, correspondiente a un numero de 15, lo cual es una cantidad menor al número de acuerdos de conservación que se deben suscribir, pues a la fecha se tienen 53 predios concertados, equivalente a 1.110,42 hectáreas, lo que indica que se generarían 38 acuerdos de más, lo que ocasiona un mayor costo para la actividad, correspondiente a $103.309.032, o en su defecto de llegarse a suscribir 66 acuerdos tal como fue definido en el documento técnico, se tendría un costo superior por valor de $138.651.596, pues se estarían generando 53 acuerdos de más respecto a la cantidad contratada".*

Si bien, no es claro lo que afirman en ambos oficios que justifique el supuesto sobre costo, entendiendo que basados en el presupuesto general, en el ítem 3.3 para la generación de acuerdos con las comunidades beneficiadas va dirigida por eventos, de los cuales el contratista debe realizar **15 eventos con un numero de 50 personas POR EVENTO**; tal y como se demuestra a continuación:

3,3	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.				
Entidad Formuladora	**CORPOGUAJIRA**				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO: RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA				
TIPO DE EVENTO II	GENERACION DE ACUERDOS DE CONSERVACION				
NÚMERO DE EVENTOS	15	**NUMERO DE DÍAS DEL EVENTO**	1	**NUMERO DE PERSONAS POR EVENTO**	50

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD / DEDICACION	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL UN EVENTO ($)	VALOR TOTAL EVENTOS ($)
1. EQUIPOS					**38.700**	**580.500**
GPS 30x (alquiler)		UNIDAD	9,00%	300.000	27.000	405.000
Clinometro (alquiler)		UNIDAD	9,00%	100.000	9.000	135.000
Calibrador o pie de rey (alquiler)		UNIDAD	9,00%	30.000	2.700	40.500
2. AUDITORIO Y/O ESCENARIOS					-	-
3. TRANSPORTE					**436.927**	**6.553.903**
Vehiculo		1	6,00%	7.282.115	436.927	6.553.903
4. ALIMENTACIÓN					-	-
					0	0
5. HOSPEDAJE					**0**	**0**
6. PERSONAL (mano de obra calificada, aplica sólo para casos especiales)					**1.544.974**	**23.174.608**
CUADRILLA COMBINADA TIPO 3	1	Dedicación	0,26	401.693	1.544.974	23.174.608
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO					**38.599**	
Papelería		Dedicación	2,50%	1.543.955	38.599	578.983
Otros insumos (pendones, cuñas radiales, entre otros)					0	0
IPC PROYECTADO		%	6%		115.727	1.735.905
OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO						0
					0	0
					0	0
TOTAL EVENTO					**2.174.927**	**32.623.905**

ANDRES PEREA SANCHEZ
C.C No 86.062.230 de Villavicencio.
Representante
CONSORCIO PAC CESAR

2174927

En este sentido, justifique con fundamento técnico y jurídico por qué no han suscrito 66 acuerdos en estos 15 eventos, si bien en cada uno deben de asistir 50 personas, cantidad suficiente para generar los acuerdos que requiere el contrato.

Cabe aclarar que a la fecha, el contratista solo ha realizado dos socializaciones correspondientes al 31 de agosto del 2023 en la peña con una asistencia de 10 beneficiarios y en la vereda el placer el día 04 de septiembre con una asistencia de 8 beneficiarios; en dichas socializaciones se presentaron falencias de carácter técnico y social, así como también en la redacción de los acuerdos, por tanto en su momento la interventoría manifestó las observaciones correctiva a través de actas (*ver anexo 2*). Y dada la complejidad de la situación se emitió el día 05 de septiembre el oficio con consecutivo No. 66 donde se plasmaron las observaciones sobre la socialización de ambos acuerdos. Solicitando además al consorcio enviar cada uno de los acuerdos para ser revisados antes de ser socializados.

Por tanto con respecto a este inciso, se le solicita al contratista enviar cronograma de los 15 eventos, teniendo en cuenta que para esta actividad pueda ser pagada deben tener como mínimo la asistencia de 50 personas por socialización y en su defecto la generación de los 66 acuerdos proyectados. No esta demás mencionar que la metodología que se estaba trabajando inicialmente debe ser replanteada, dado que no cumplía con las expectativas y por ende confundían al beneficiario.

3. El consorcio PAC CESAR manifiesta *"Por otro lado, mal hace usted en afirmar que el retiro de los propietarios de las áreas determinadas por Corpoguajira en el documento técnico, se debe a la falta de asistencia técnica del Consorcio Pac Cesar, pues es de su conocimiento que la entidad contratante definió predios en los que sus dueños desconocían su participación en el proyecto, no poseían áreas, las hectáreas establecidas para algunos son utilizadas para el desarrollo de su actividad productiva, entre otras situaciones. Además, la participación de la comunidad es voluntaria, lo que indica que, si evalúan la conveniencia de los compromisos frente a las actividades ejecutadas en sus predios, pueden decidir sobre si hacen parte o no del proceso."*

En respuesta a lo anterior, me permito informarle que toda afirmación proyectada en los oficios está soportada con pruebas. Por tanto, a continuación se relaciona cada una de las actas de visitas donde los beneficiarios manifestaron en su momento la falta de asistencia técnica por parte del CONSORCIO PAC CESAR, como por ejemplo el señor Ponciano Bolaño Oñate en el acta 14 del 28 de junio del año en curso manifiesta que desiste del proyecto debido a que el contratista no hace presencia en la zona y no ha generado acuerdos, como vemos la falta de presencia del contratista se encuentra ampliamente documentada en las actas anexas :

N°	VEREDA	PREDIO	CANTIDAD HAS A INTERVENIR	N° ACTAS FIRMADAS POR INTERVENTORIA
1	Guayacanal	Ponciano Bolaño	10	02 - 14
2	Hatico de Los Indios	Rafael Peralta Vega	8,3	11 - 29
3	Peña de Los Indios	Miguel Agustín Montaño	7	25
4	Peña de Los Indios	Aníbal Joaquín Montaño	5,2	7 - 24
5	Peña de Los Indios	Armando Montaño	3	23 - 27
6	Peña de Los Indios	Arquímedes José Nieves	5	26
7	Tembladera	Enemias Mendoza	10	40
8	El Placer	Edison Javier Vega Plata	19,77	96

Beneficiarios que desistieron, manifestando ausencia de acompañamiento:


Actas donde los beneficiarios manifiestan ausencia de acompañamiento por parte del contratista.

N°	Zona	Beneficiario	N° de Acta	Fecha de Acta
1	Peña de Los Indios	Jorge Eliecer Mendoza	6	23/06/2023
2	Peña de Los Indios	Aníbal Montaño	7	23/06/2023
3	El Placer	Mabel Vega	10	27/06/2023
4	Hatico de Los Indios	Rafael Peralta	11	27/06/2023
5	Guayacanal	Ponciano Bolaño	14	28/06/2023
6	Peña de Los Indios	Julio Montaño	21	13/07/2023
7	Peña de Los Indios	Carlos Juvencio	22	13/07/2023
8	Peña de Los Indios	Armando Montaño	23	13/07/2023
9	Peña de Los Indios	Aníbal Montaño	24	13/07/2023
10	Peña de Los Indios	Miguel Agustín Montaño	25	13/07/2023
11	Peña de Los Indios	Alquímedes Nieves	26	13/07/2023
12	Peña de Los Indios	Armando Montaño	27	13/07/2023
13	Peña de Los Indios	Víctor José Loperena	28	13/07/2023
14	Hatico de Los Indios	Rafael Peralta	29	13/07/2023
15	Tembladera	José Efrén Rodriguez	33	21/07/2023
16	Tembladera	Lacidez Mindiola	34	21/07/2023
17	Tembladera	Henry Brito	35	21/07/2023
18	Tembladera	Marcelino Camargo	36	21/07/2023
19	Tembladera	Prospero José Vega	38	24/07/2023
20	Tembladera	Orlando Daza	39	24/07/2023
21	Tembladera	Enemias Mendoza	40	24/07/2023
22	La Mina	Henry Nieves	45	25/07/2023
23	La Mina	José Nieves	46	25/07/2023
24	El Placer	Edinson Vega	96	13/09/2023

La tabla anterior se encuentra soportada en el *anexo 1* sobre las actas de visitas.

Así las cosas, esta interventoría de manera inmediata le solicita al contratista atender todas las solicitudes anteriormente manifestadas, recordándole además que estamos en una situación crítica del contrato y el no responder a todos los oficios genera dilaciones en la ejecución del mismo las cuales son imputables al consorcio PAC CESAR.

Cordialmente



Juan Carlos Amaya BautistaDirector
De Interventoría Contrato 078 de
2022

PRIDA S.A.S

ACTA DE REUNION
Nº 6

Nombre del Evento:	Visita tecnica
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Jorge Eliecer Mendoza en la vereda Peña de los indios	**Fecha:** 23/06/2023 **Lugar:** Peña de los Indios **Hora de Inicio:** 9:00 Am **Hora de Final:** 9:40 Am

Agenda:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Jorge Eliecer Mendoza	Beneficiario	
Heiser lopez	Tecnico operativo	Prida sas
Camilo lindarte	Tecnico operativo	Prida sas
Yenireth Gutierrez	Tecnico Operativo	Prida sas
Carolaine Celedon	Residente	Prida Sas

SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El dia 23 de Junio del año en curso se hace visita tecnica en el predio del señor Jorge Eliecer Mendoza ubicado en la vereda Peña de los indios zona rural del municipio de San Juan del Cesar. El beneficiario manifiesta lo siguiente:

1. No haber recibido visitas por parte de la

Powered by CamScanner

PRIDA SAS	ACTA DE REUNION Nº __

contratista Pac Cesar desde hace ya dos meses aproximadamente.
2. Manifiesta haber cedido 6 has y no 15,88 has como se refleja en los shapefiles proporcionados por la contratista.
3. El beneficiario aún no ha recibido agroinsumos ni herramientas.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Jorge Eliecer Mendoza CC 2-767971

Heiser López
CC. 1122405578

Powered by CamScanner

PRIDA	ACTA DE REUNION Nº 7

Nombre del Evento:	Visita tecnica	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Anibal Joaquin en la vereda Peña de los Indios		Fecha: 23/06/2023 Lugar: La Peña de los Indios Hora de Inicio: 9:37 Am Hora de Final: 10:07 Am
Agenda:		

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Anibal Joaquin Montaño	Beneficiario	
Yenireth Gutierrez	Tecnico operativo	Prida sas
Camilo Lindarte	Tecnico operativo	Prida Sas
Heiser Lopez	Tecnico operativo	Prida sas
Caroluine celedon.	Residente	Prida sas

SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El dia 23 de Junio del año en curso se hizo visita de Verificación en el predio denominado Mataraton Propiedad del señor Anibal Joaquin Montaño beneficiario del Proyecto reforestación de aislamiento ubicado en la Vereda Peña de los Indios zona rural del municipio Sanjuan del cesar.

Powered by CamScanner

PRIDA	ACTA DE REUNION Nº ___

El beneficiario Manifesto lo siguiente:

1. No haber recibido visitas por la contratista Rac cesur desde hace ya 1 mes aproximadamente
2. Manifesto haber cedido 2 Ha para reforestación y no 22 Ha como se relaciona en los shape files entregados por la Contratista
3. El beneficiario manifiesta no haber recibido aun agroinsumos ni herramientas

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

+Anibal Quintero 3135551603 Yeniceth Gutierrez J.
C17985018. 1122406871

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTA DE REUNION
Nº 10

Nombre del Evento:	Visita Tecnica
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio de la señora Mabel Vega en la Vereda el Placer	**Fecha:** 27/06/2023 **Lugar:** El placer **Hora de Inicio:** 10:24 **Hora de Final:** 10:54

Agenda:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Mabel Vega Montaño	Beneficiaria	
Yenireth Gutierrez	Tecnico operativo	Prida Sas
Heiser Lopez	Tecnico operativo	Prida sas
Camilo Lindarte	Tecnico operativo	Prida sas

SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El dia 27 de Junio del año en curso se hizo visita de verificacion en el predio los mangos propiedad de la señora Mabel Vega Montaño beneficiaria de proyecto de reforestacion ubicada en la Vereda el placer zona rural del municipio de San Juan del Cesar.
El beneficiario manifiesta lo siguiente

Powered by CamScanner

PRIDA SAS

ACTA DE REUNION
Nº ___

1 La beneficiaria manifiesta que no ha recibido visitas por parte de la contratista Pac Cesar desde el momento en que recibio los agro insumos, solicita mayor acompañamiento por parte de la contratista ya que desconoce los acuerdos e información respectivo a la parte economica para la siembra e instalacion de postes que le compete a el area respectiva de su predio

2. El material vegetal entregado no comple con las condiciones fitosanitarias como el cedro, yaguaro, caoba exceptuando el roble, cañagute y ceiba que estan en buenas condiciones fitosanitarias

3. la beneficiaria recibio agro insumos, aun no ha recibido herramientas para el trabajo de siembra.

4. hasta el momento la beneficiaria empezo la siembra de 160 plantulas de roble, por motivo de desconocimiento hizo la siembra 4X4

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

27.001.553

Yenireth Gutierrez

PRIDA SAS
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTA DE REUNION
Nº 11

Nombre del Evento:	Visita Tecnica
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al Predio del señor Rafael peralta. en la Vereda Hatico de los Indios	**Fecha:** 27/06/2023 **Lugar:** Hatico de los Indios **Hora de Inicio:** 11:30 AM **Hora de Final:** 11:44 Am

Agenda:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Rafael Peralta	Beneficiario	
Heiser López	Técnico Operativo	Prida SAS
Yeniseth Gutierrez	Técnico Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tecnico Operativo	Prida SAS

SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El dia 27 de junio del año en curso se hizo visita de verificación en el predio El Cerro Propiedad del Señor Rafael Bolivar Peralta ubicado en la vereda el Hatico de los indios zona rural del municipio de San Juan del Cesar. El beneficiario manifiesta lo siguiente:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTA DE REUNION
N° ___

1. El señor Rafael Bolivar Peralta por razones personales decide desistir del proyecto de reforestación activa; afirma que aún no ha firmado el acta de desestimiento porque la contratista Pac Cesar no ha hecho presencia en la zona desde hace más de dos meses.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

cc 5162320

Heiser López
cc 1.122 405 578

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 14	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Ponciano Bolaño en el corregimiento de Guayacanal	**Fecha:** 28/06/2023 **Lugar:** Guayacanal **Hora de Inicio:** 1:23 pm **Hora de Final:** 1:35 pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Ponciano Bolaño	Beneficiario	
Yenireth Gutierrez	Tecnico operativo	Prida SAS
Heiser Lopez	Tecnico operativo	Prida SAS
Camilo Linduarte	Tecnico operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 28 de Junio del año en curso se hizo visita de Verificacion en el predio la Habana Propiedad del señor Ponciano Bolaño añate ubicado en el corregimiento Guayacanal zona rural del municipio de Sanjuan del Cesar.

El beneficiario manifiesta lo siguiente

1. El señor Ponciano Bolaño añate decide desistir del Proyecto de reforestacion activa, por falta de seriedad por parte de la contratista pac cesar ya que lo mantienen desinformado, no entregan los materiales e insumos a tiempo, no han concretado ningun acuerdo con la contratista, afirma que aun no ha firmado Acta de desistimiento ya que la contratista no lo ha visitado.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Ponciano Bolaños Ante

CC: 84038033 S.J

Tel: 3206459068

FIRMA FUNCIONARIO

1.17604304

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 21	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Julio Bolivar Montaño en la Vereda Peña de los Indios	**Fecha:** 13/07/2023 **Lugar:** Peña de los Indios **Hora de Inicio:** 9:55 am **Hora de Final:** 10:05

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Julio Bolivar Montaño	Beneficiario	
Yenireth Gutierrez	Tec operativa	Prida S.A.S
Camilo Imbarte	Tecn operativo	prida S.A.S
Haser lopez	Tecn Operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 Julio del año en curso se hizo Visita tecnica de verificacion en el predio del Señor Julio Bolivar Montaño loperena beneficiario del proyecto reforestacion Activa en el predio Mango grande ubicado en la vereda Peña de los Indios zona rural del municipio de Sanjuan del cesar. Durante la visita el beneficiario manifiesta lo siguiente

1. la Contratista Pac cesar no ha hecho acompañamiento a los beneficiarios desde hace 2 o 3 meses aproximadamente.
2. No ha recibido Agroinsumos, herramientas ni material Vegetal
3. No ha recibido capacitaciones ni Charlas por parte del equipo tecnico de la Contratista

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: 8403955
Tel: 3234559131

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 22	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Carlos Juvencio Mendoza en la Vereda peña de los Indios	**Fecha:** 13/07/2029 **Lugar:** Peñade los Indio **Hora de Inicio:** 10:13 am **Hora de Final:** 10:20 am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Juvencio Mendoza	Beneficiario	
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S.
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 Julio del año en curso se hizo visita de verificacion al predio del señor Carlos Juvencio Mendoza beneficiario del programa reforestacion activa ubicado en la peña de los indios zona rural del (Corregimiento) de San juan del cesar.
El beneficiario manifiesta lo siguiente
1. la contratista pac Cesar no ha hecho acompañamiento a los beneficiarios desde hace 2 o 3 meses aproximadamente.
2. No ha recibido agro insumos, herramientas o material Vegetal.
3. No ha recibido capacitaciones ni charlas por parte del equipo tecnico de la contratista.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Carlos Juvenal Mdm

CC: 2187477
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 23	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Armando Montaño en la Vereda Peña de los Indios	**Fecha:** 13/07/2023 **Lugar:** Peña de los Indio **Hora de Inicio:** 10:27 am **Hora de Final:** 10:32 am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Armando Montaño		
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Indarte	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de Julio del año en Curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Armando montaño beneficiario del proyecto reforestacion activa ubicado en la Vereda Peña de los Indios zona rural del municipio San Juan del Cesar

Durante la visita tecnica el beneficiario no se encontraba en el predio, la visita fue atendida por la señora Bessy Maria Plata Cuñada del señor Armando montaño quien manifiesta que la contratista no ha estado haciendo visitas en el predio

Se deja evidencia en la fotografia con fecha y hora 13 Julio 2023 hora 10:30 am y coordenadas georeferenciados Nor 10° 54' 21" _ W 73° 6' 44"

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Beccy maria plata
CC:
Tel: 5607027

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	**ACTA DE VISITA** 24	**Código:** R PCP04-2 **Versión:** 5 **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento: Visita tecnica.

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Anibal Joaquin Montaño Vereda Peña de los indios	**Fecha:** 13-07-2023 **Lugar:** Peña de los Indios **Hora de Inicio:** 10:41 Am **Hora de Final:** 10:50 Am

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Santa Cecila Montaño	beneficiario (esposa)	
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Heiser Lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de julio del año en curso se hizo visita de verificación al predio del señor Anibal Joaquin Nieves beneficiario del proyecto de reforestación activa ubicado en la vereda peña de los indios zona rural del municipio de San Juan del Cesar.

Durante la visita técnica el beneficiario no se encontraba en el predio, la visita fue atendia por la señora Santa Cecilia Montaño, esposa del señor Anibal Joaquin Nieves quien manifiesta que la contratista no ha hecho visitas en el predio.

se deja evidencia en la fotografia con fecha y hora 13 de julio de 2023 y coordenadas georeferenciadas 10° 54' 25" N - 73° 6' 42" W

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Santa cecilia Montaño
CC: 27.010.273
Tel: 3106023700

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 25.	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Miguel Agustin Montaño en la vereda Peña de los Indios	**Fecha:** 13/07/2023 **Lugar:** Peña de los indio **Hora de Inicio:** 1104 **Hora de Final:** 11:14

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yulieth Nieves	beneficiario (yerna)	
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec operativo	Prida S.A.S.
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de Julio del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Miguel Agustin Montaño beneficiario del proyecto de reforestacion activa ubicado en la vereda Peña de los indio zona rural del municipio de San Juan del Cesar: Durante la visita tecnica el beneficiario no se encontraba en el predio la visita fue atendida por la señora Yulieth Paola Nieves Mojica Yerna del señor Miguel Agustin quien manifiesta que la contratistano ha hecho Visitas en el predio

Se deja evidencia en la fotografia con fecha y hora 13 Julio de 2023 11:08 y coordenadas georeferenciadas 10° 54' 31" N - 73° 6' 37" W

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

*Yulieth 184 194 134
CC:
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Camilo

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 26	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Alquimedes Jose Nieves en la vereda peña de los Indios	**Fecha:** 13/07/2023 **Lugar:** Peña de los indio **Hora de Inicio:** 11:24 **Hora de Final:** 11:40

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Alquimedes Nieves		
Yenreth Gutierrez	Tec operativa	Prida S.A.S
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Indarte.	Tec operativo	Prida S.A.S.

DESARROLLO

El dia 13 Julio del año en curso se hizo Visita tecnica de Verificacion en el Predio del señor Alquimedes Jose Nieves beneficiario del proyecto reforestacion activa en el predio loma larga. Ubigado en la Vereda peña de los Indios zona rural del municipio de Sanjuan del cesar, el beneficiario manifiesta la siguiente

1. la Contratista Ruc cesar no ha hecho Visita en el Predio del señor desde hace 3 o 4 meses aproximadamente
2. El señor Alquimedes manifiesta que no ha resivido Visita del equipo tecnico de la Contratista para la medicion del area que va a seder para la restauracion y aislamiento
3. No ha reabido Agroinsumos, herramientas ni material Vegetal.
4. los Shapefiles entregados por la contratista mencionan

Powered by CamScanner

que el area es de 3,12 Ha; pero este dato presenta inconsitencias ya que el beneficiario informa que la contratista no ha venido a delimitar el area. ni georeferenciarla.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Wolfeiminder José Viécos
CC: 71985003
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 27.	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 13/07/2023
Visita al predio del señor Armando Montaño en la Vereda peña de los Indios	**Lugar:** Peña de los Indio
	Hora de Inicio: 12:50
	Hora de Final: 1:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Armando Montaño	Beneficiario	
Yeniceth Gutierrez	Tec Operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec operativo	Prida S.A.S.
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de Julio del año en curso se hizo visita de Verificacion al señor Armando Montaño beneficiario del proyecto reforestacion activa en el predio los pereguetunos ubicado en la Vereda peña de los Indios zona rural del municipio de sanjuan del cesar. Durante la visita el beneficiario manifiesta lo siguiente

1. la contratista pac cesar no ha hecho acompañamiento a los beneficiarios desde hace 2 o 3 meses aproximadamente
2. No ha recibido Agroinsumos herramienta ni material vegetal.
3. No ha recibido capacitacion ni charlas por parte del equipo tecnico de la contratista
4. El beneficiario delego al señor Amilcar jose Vega para hacer el acompañamiento a los tecnicos de la Contratista para hacer las mediciones de

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

el area a reforestar.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Jorge Dimando Montañez
CC: 84 104371
Tel: 3126523644

FIRMA FUNCIONARIO

Camilo Ladino

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 28	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Victor Jose loperena. en la Vereda peña de los Indios	**Fecha:** 13/07/2023 **Lugar:** Peña de los Indio **Hora de Inicio:** 1:12 **Hora de Final:** 1:25.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Jhon Loperena	Beneficiario (hijo)	
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Linderte	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de julio del año en curso se hizo visita de verificacion en el predio del señor Victor Jose loperena beneficiario del proyecto de reforestacion activa en el predio los escondidos ubicado en la Vereda peña de los Indios Zona rural del municipio de sanjuan del cesar durante la visita el beneficiario no se encontraba, pero no atendio su hijo Jhon loperena quien manifiesta

1 la contratista Pac Cesar no ha hecho acompañamiento en la zona al rededor de 2 a 3 mes

2. No ha recibido Agroinsumos ni herramientas ni material vegeta

3. no ha recibido capacitaciones ni charlas por parte del equipo tecnico de la contratista

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

*JHON Jairo Lopereva
CC: 6164973
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 29	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Rafael peralta Vega en la Vereda Hatico de los Indios	**Fecha:** 13/07/2023 **Lugar:** Hatico de los Indios **Hora de Inicio:** 1:47 **Hora de Final:** 1:55

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Rafael Peralta Vega	Beneficiario	
Yenireth Cuperez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Londoño	Tec operativo	Prida S.A.S
Haiser Lopez	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El 13 de Julio del año en curso se hizo Visita tecnica de verificacion en el predio del señor Rafael Peralta Vega Beneficiario del Proyecto Reforestacion actual en el predio el cerro en la vereda el Hatico de los Indio zona rural del municipio de San Juan del Cesar
El beneficiario manifiesta que aun no ha recibido visita de parte de la contratista y continua con la idea de desistir del Proyecto

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

CC: cc 5162320.
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 33	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita Tecnica.	
Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Jose Efren Rodriguez enlel vereda Tembladera	Fecha: 21/07/2023 Lugar: Tembladera Hora de Inicio: 11:40 Hora de Final: 11:55

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Jose Daniel Torrez	Administrador	
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida SAS
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte.	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 21 de Julio del año en curso se hizo visita de Verificacion en el predio del señor Jose Efren Rodriguez en el predio el descanso en la Vereda Tembladera Jurisdiccion de Riohacha. El Beneficiario no se encontraba en el predio y la visita fue atendida por el administrador del predio el señor Jose Daniel Torrez Floriano. Quien manifesta lo siguiente.

1. la contratista Pac Cesar no ha hecho Visitas tecnicas ni de socializacion desde hace ya 3 o 4 meses (la ultimavez que vinieron fue cuando midieron el predio)
2. no han traido material Vegetal, agroinsumos ni herramientas: Postes alambres grapas
3.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Jose David Soto
CC: 1258348
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 34	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Acta de Visita

Tema/Proyecto/Asunto: Acta de Visita al predio del señor lacides Mindiola	**Fecha:** 21-07-2023 **Lugar:** Tembladera **Hora de Inicio:** 12:05 Pm **Hora de Final:** 1:00

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
lacides Mindiola	Beneficiario.	
Heiser López	Tec. Operativo	Prida SAS
Camilo Lindarte	Tec. Operativo	Prida SAS
Yeniveth Gutierrez	Tec. Operativo	Prida SAS

DESARROLLO

El dia 21 de julio del año en curso se hizo visita de verificación en el predio Mónica Esther propiedad del señor Lacides Mindiola en la vereda Tembladero Jurisdicción de Riohacha.

Durante la visita en representación de su Padre el señor Lacides manifiesta lo siguiente.

1. Lo contratista Pac Cesar no hace presencia en la zona desde hace un mes. A causa de esto se ha generado confusión con las has para la reforestación activa y las PSA. El señor desconocia que su padre tambien era beneficiario de reforestación.

Se observa en campo que dentro del area de PSA se encuentra una parcela aproximada de 2 Has que es de uso agricola; la cual debe ser excluida del polígono PSA.

Por lo tanto se recomienda (añadir) Organizar

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

1. reajustar el poligono PSA.
2. No han traido agroinsumos, ni postes, ni material vegetal.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Saida José Benedicto
CC: 84036296
Tel: 3013654133

FIRMA FUNCIONARIO

Carlos Mejía

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 35	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Acta Visita

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Henry Brito	**Fecha:** 21/07/2023 **Lugar:** Tembladera **Hora de Inicio:** 1:52 **Hora de Final:** 2:05

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Gliceno Chinchia	Administrador	
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec operativo	Prida S.A.S
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 21 de julio del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio del Señor Henry Brito, en la Vereda Tembladera Jurisdiccion de Riohacha. Al momento de la Visita, el beneficiario no se encontraba en el predio la Visita fue atendida por el administrador el señor Glicerio Chinchia Blanco. Durante la visita el encargado del predio manifesto lo siguiente:

1 la contratista Paz cesar no ha hecho Visitas tecnicas ni sociales en la zona desde hace 3 o 4 meses, la ultima Visita fue cuando midieron el predio,

2. No han traido material vegetal, agroinsumos ni herramientas

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

G Herrio

CC: 17956186
Tel: 3207814507

FIRMA FUNCIONARIO

Yeniveth Gutierrez J.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 36	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del Señor Marcelino Camargo	**Fecha:** 21/07/2023 **Lugar:** Tembladera **Hora de Inicio:** 2:38 **Hora de Final:** 3:05

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Jimenez	Administrador	
Yenireth Gutierrez	Tec Operativo	Prida S.A.S
Heiser Lopez	Tec Operativo	prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec Operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 21 de julio del año en Curso se hizo visita de verificacion al predio la Sierra Propiedad del señor Marcelino Camargo Ubicada en la Vereda Tembladera Jurisdiccion de Riohacha. Al momento de la Visita el beneficiario no se encontraba en el predio la Visita Fue atendida Por el administrador el señor Carlos Jimenez. Durante la Visita el encargado del predio manifesta lo siguiente.

1. la Contratista Pac Cesar no ha hecho Visita tecnica, ni socializacion en la zona desde hace 3 o 4 meses la ultima Visita Fue Cuando midieron el predio
2. no han traido material Vegetal, agroinsumo ni herramienta

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Carlos Jimenez
CC: 1120 744 635
Tel: 312
Encargado

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 38	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Prospero Jose Vega.

Fecha: 24/07/2023
Lugar: Tembladera
Hora de Inicio: 10:35
Hora de Final: 11:05

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Pablo luis Morales	Administrador	
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Heiser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S.
Camilo Lindarte.	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 24 de julio del año en curso se hizo Visita de VerAcacion en el Predio del señor Prospero Jose Vega Ibarra los matamatones ubicado en tembladera jurisdiccion de Riohacha. la Visita fue atendida por el Administrador del predio el señor Pablo luis Morales Aragon quien manifesta lo siguiente.

1. la contratista Pac Cesar no ha hecho Visitas tecnicas ni sociales al rededor de 3 o 4 meses en la zona.
2. no han traido Agroinsumos ni herramientas ni material Vegetal.

Cabe resaltar que el señor prospero es Beneficiario en PSA y Restauracion Activa. al momento de VerAcar el poligono PSA se encuentra que la contratista globalizo el area sin excluir

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

el espacio donde se encuentra la vivienda y el area de uso agricola que se estima aproximadamente 3 Ha

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Pablo morales

CC: 77147183
Tel: 3233579168.

FIRMA FUNCIONARIO

Yenireth Gutierrez.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 39	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Orlando Rafael Daza

Fecha: 24/07/2023
Lugar: Tembladera
Hora de Inicio: 11:45
Hora de Final: 12:15

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Mariela castañeda	Esposa Encargado	
Yenireth Gutierrez	Tec Operativo	Prida S.A.S
Camilo Linduarte	Tec Operativo	Prida S.A.S
Haser lopez	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 24 de Julio del año en curso se hizo Visita de Verificacion al Predio Mar oscuro Propiedad del señor Orlando Rafael Daza Ubicado en Tembladera Jurisdiccion Riohacha la Visita fue atendida por la esposa del encargado Mariela Castañeda quien manifesta lo siguiente

1. la contratista no ha realizado Visita de socializacion desde hace 3 o 4 mes aproximadamente.
2. no han entregado Agroinsumos herramientas ni material Vegetal
3. En el predio de restaurar se encuentra que la contratista globalizo el area. Sin excluir el area Pecuaria.
4. la zona se encuentra muy en estado de

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

conservacion que de restauracion.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Yarela I. Castañeda S.
CC: 26.883.774
Tel: 3233579168

FIRMA FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 40	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 24/07/2023
Acta de Visita al predio del señor, Enemias de Jesus Mendoza.	**Lugar:** Tembladera
	Hora de Inicio: 12:40
	Hora de Final: 1:30

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Enemias Mendoza	Beneficiario	
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Helser Lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte.	Tec operativo	Prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 24 de Julio se hizo visita de Verificacion al Predio Arrollo Elion Propiedad del Señor Enemias de Jesus Mendoza Milan Ubicado en Tembladera Jurisdiccion de Riohacha el Beneficiario manifiesta lo siguiente

1. No han venido a hacer Visitas al Predio el poligono lo tomaron sin el acompañamiento del propietario por lo tanto no excluyeron el area Pecuaria y agricola del Predio
2. El Propietario manifiesta que no quere Restauracion ya que el area no lo arrienta, que prefiere Conservacion.
3. No ha recibido ningun material ni agro insumo por parte de la contratista.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Eronia Mendoza
CC: 57655768
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Heiser López

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 45	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Herry Nieves	**Fecha:** 25/07/2023 **Lugar:** Guayacanal **Hora de Inicio:** 12:45 **Hora de Final:** 1:50

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Diomel Añez	Trabajador	
Heiser lopez	Tec operativo	Prda S.A.S
Camilo londoño	Tec operativo	prda S.A.S
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	prda S.A.S

DESARROLLO

El dia 25 de julio del año en curso se hizo Visita de Verificacion al predio del señor Herry Nieves el cercado en el corregimiento de guayacana zona rural de sanjuan del cesar guajira. El beneficiario no se encontraba en el predio y la visita fue atendida por uno de sus trabajadores Diomel Añez Maestre quien manifesto

1. la contratista Pac cesar realizo visita al rededor de 3 o 4 meses cuando tomaron los puntos para el poligono en compañia del beneficiario.
2. Al momento de Verificar el area PSA se encuentra un area de 3 ha mas o menos de uso agricola que debe ser excluida del poligono por lo que se recomienda a la contratista realizar un nuevo poligono
3. los trabajadores no tencan conocimiento de que el señor Herry Nieves es beneficiario de un

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

proyecto de conservacion por lo cual realizaron las socolas como lo hacen de costumbre

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

Diomel Añez
CC: 84037771
Tel:

FIRMA FUNCIONARIO

Carlos Lidet

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA 46	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Jose Nieves

Fecha: 25/07/2023
Lugar: Guayacanal
Hora de Inicio: 1:56
Hora de Final: 2:10

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Juan cantillo	Trabajador	
Heiver Lopez	Tec operativo	Prida S.A.S
Yeinerth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Camilo Lindarte	Tec operativo	Prida S.A.S.

DESARROLLO

El dia 25 de julio del año en curso se hizo visita de verificacion al predio el caney propiedad del señor Jose Nieves (Difunto) ubicado en Guayacanal zona rural de sanjuan.
La visita fue atendida por el señor Juan Cantillo trabajador del predio quien nos manifesto que los encargados del predio son los hijos del Difunto Jose Nieves
El area se encuentro conservada. con un bosque de Vegetacion Secundaria en transicion con mosaico de pastos arbolados.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC:
Tel:

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S	ACTA DE VISITA 96	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento: Visita tecnica

Tema/Proyecto/Asunto: Visita al predio del señor Edinson Vega	**Fecha:** 13/09/2023 **Lugar:** El placer **Hora de Inicio:** 9:46 **Hora de Final:** 9:53

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yenireth Gutierrez	Tec operativo	Prida S.A.S
Yisrlen Bagozo	Trab Social	Prida S.A.S
Camilo Jandarte	Tec operativo	prida S.A.S
Heiser lopez	Tec operativo	prida S.A.S

DESARROLLO

El dia 13 de septiembre del año en curso se hizo visita de verificacion al predio del señor Edinson Vega Nuevo beneficiario ubicado en el placer zona rural del municipio de sanjuan

El señor Edinson Vega manifiesta que no va a continuar el proyecto de restauracion activa. No obstante aun no ha firmado acta de desistimiento con la contratista

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL	ACTA DE VISITA	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 2 de 2

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA FUNCIONARIO

CC: 5166142
Tel: 3235839888

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S

ACTA DE REUNION
Nº 4

Nombre del Evento:	
Tema/Proyecto/Asunto: Socializacion de los acuerdos Voluntarios	**Fecha:** 31/08/202 **Lugar:** La peña **Hora de Inicio:** 3:30 P.M **Hora de Final:** 5:00 P.M

Agenda:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Daylibeth Daza Daza	Trabajadora Social	Daylibeth Daza
Jessyka Paula Sierra Romero	Prof. SIG	PAC CESAR
Juan Camilo Perdomo Guerrero	Prof. Ingeniero forestal	Consorcio Pac Cesar
Yisleni Fragozo Fuentes	Social - Predial	Interventoria - Prida
Coralaine Celedon	Ing Residente	Prida SAS.

SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El dia Jueves 31 de agosto del presente año se celebro la socializacion de los acuerdos Voluntarios de restauracion Activa donde se contto con la asistencia de los beneficiarios de los corregimientos La Peña y La Junta Zona rural del municipio de SanJuan del Cesar.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S	ACTA DE REUNION Nº ___

Dicha socialización fue liderada por la profesional social y el equipo de la contratista PAC cesar en compañía con la Interventoria
La profesional social de la contratista PAC cesar realizo la debida explicación de cada una de las obligaciones correspondiente a los diferentes actores, establecido en cada una de las clausulas definida en los acuerdos.
Por lo anterior se le exclarecio a cada uno de los beneficiarios las dudas e inquietudes manifestadas a la Contratista Pac Cesar.
De esta manera se Concluye de manera Satisfactoria la socialización de los acuerdos voluntarios de restauración activa.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Daylibeth Dager.
Consorcio PAC Cesar.

Yisilen Fajardo
Profesional Social
Interventoria.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

LISTA DE ASISTENCIA	
Nombre Del Proyecto	RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA- LA GUAJIRA
Departamento	LA GUAJIRA
Fecha	31/08/2023
Tema A Tratar	Socialización de los Acuerdos Voluntarios

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Walter Mendoza	17802.771		Walter Mendoza
2	Julio cesar Daza	5165825		Julio Cesar Daza
3	Natalia Mendoza Ariz	1121188719		Natalia Mendoza
4	Lucidos Mejia R	1769883		Lucidos Mejia R
5	Arnulfo E Acosta	3217361305		Arnulfo E Acosta
6	Fabiola Mendoza Castro	36475071	Esposa Beneficiario	Fabiola Mendoza
7	Enrique Luis Mendoza	84036238	B	Enrique Luis Mendoza
8	Enrique Montalvo	16470791		Enrique Montalvo
9	Linton Medina	1164022		Linton Medina
10	Anibal Cruz	84058504		Anibal Cruz
11	Jessyka Paola Sierra Romero	1120740725	Profesional PRIDA	Jessyka P Sierra
12	Juan Camilo Pedroza Guerrero	1110487040	Ing forestal	Juan Camilo
13	Yovanni Ruiz Manjarres	1126605824	Oficial Sistemas	Yovanni Ruiz
14	Dayliben Daza	56078104	T. Social	Dayliben Daza
15	Heiber López	1122405578	T. Operativo	Heiber López
16	Yeniceth Gutierrez	1122400871	T. operativo	Yeniceth G.
17	Yisilen Fragoso Fuentes	1179836243	Social Predio	Yisilen Fragoso.
18	Caroleine Celedón	1122410841	Residente	Caroleine C.

Powered by CamScanner

PRIDA SAS

ACTA DE REUNION
Nº 5

Nombre del Evento:	Socialización de Acuerdos de Restauración Activa
Tema/Proyecto/Asunto:	**Fecha:** 4/09/2023 **Lugar:** El Plan **Hora de Inicio:** 3:30 PM **Hora de Final:** 4:47 PM

Agenda:

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Daylibeth Ojeda Ojeda	Trabajo Social	PAC cesar.
Rafael E. Ojeda	Tecnico O.	PAC CESAR.
Yisselis Fragoso Fuentes	Interventoria - Social	Pride SAS

SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El dia 4 de septiembre del año en curso se recibio la socialización de los acuerdos de restauración activa a los beneficiarios de las zonas Kumules del Totumo, Plan y Platanal y la siembra del municipio de San Juan del Cesar.

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S

ACTA DE REUNION
Nº ___

La contratista Puc Cesar liderado por la Profesional Social y la compañía con la interventoría Pardo SAS. se dio el desarrollo detallado de la Socialización de los acuerdos de restauración de RVa.

Se realizo la debida explicación minuciosa a cada uno de las obligaciones correspondiente a los diferentes actores, establecidos en cada una de las cláusulas definida en el acuerdo.

Antes a esto se le Permitió el espacio a los beneficiarios en donde cada uno expuso sus dudas e inquietudes en cuanto a la formalización de los acuerdos.

Cabe anotar que cada uno de los acuerdos, entregados a los beneficiarios de la Vereda en mención presenta errores tanto en la Zona si es Vereda #/o cabezote y en el numero de hectarea.

Ante esta situación la contratista Puc Cesar queda con el compromiso de cambiar cada uno de los acuerdos que presentan errores.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Por lo tanto se concluye de manera satisfactoria la Socialización de los acuerdos de restauración activa.

Donlibeth Barzar.
T. Social. PAC Cesar.

Jesulen Rueda
Profesional Social
Interventoría

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre Del Proyecto	RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA
Departamento	LA GUAJIRA
Fecha	4/09/2023
Tema A Tratar	Socializacion Acuerdos de restauracion

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Federico Montero	12716467		
2	Manuel Fernando La Rotta	1122397444		
3	Leslien Montero La Rotta	56076807		
4	Mabel Vega Montero	27001552		
5	Rafael Segundo Montero	12723429		
6	Nefer Cordoba Mejia	84038038		
7	Anerkis Vega	84058504		
8	Alirio A. Gonzalez	84104215	oficial	
9	Angel Mendoza	5169153	Técnico	
10	Marlon Vanegas	1065808194	Tecnico	
11	Rafael G. Daza	77181692	Técnico	
12	Luis Gabriel Murcia N	1065647178	Tecnico	
13	Yisleen Fragozo Fuentes	1114983743	Social Predio	
14	Heiser López	1122405578	técnico	Heiser López
15	Yencreth Gutierrez J	1122406871	Tecnico	
	Nilson Mendoza V.	84037220		

Powered by CamScanner

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 12 de 2023

Oficio N° 86

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: solicitud información del profesional SIG.

Cordial saludo,

Con el fin de tener claridad sobre el personal relacionado en los informes parciales de actividades en donde el contratista registra su equipo de trabajo profesional y técnico presentado para la ejecución del contrato de obra, sin embargo, no se relaciona el profesional SIG designado tal y como lo determina el documento técnico del proyecto específicamente en la página 82 sobre la descripción de la actividad *Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales,* donde estipula lo siguiente: "…*se debe contar con un profesional SIG que haga la cartografía de las áreas incorporadas al programa. Con lo que se busca generar en el beneficiario una atención y acompañamiento que le genere confianza en el desarrollo del proyecto y fomente el cumplimiento del acuerdo".*

Bajo esta premisa, y en vista que en la verificación de avance de aislamiento se han venido presentando errores de ubicación del mismo, lo que demuestra la carencia de asistencia técnica en la interpretación de los polígonos, esta interventoría solicita se remita a la mayor brevedad el contrato y soportes de pago de la seguridad social del profesional SIG.

Cordialmente

_____

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 13 de 2023

Oficio N° 87

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Observaciones y citación a reunión

Cordial saludo,

En atención al oficio 84 emitido por esta interventoría el 06 de octubre del año en curso, donde se citó a reunión a todo el personal técnico relacionado en el plan de contingencia del consorcio PAC CESAR en la granja del INFOTEP del municipio de SANJUAN DEL CESAR, realizado el día 9 de octubre del 2023, por el cual se realizan las siguientes observaciones:

Nombre	Cargo
Martha Fernanda Cataño Mendoza	Ingeniero Forestal
Juan Camilo Perdomo Guerrero	Ingeniero Forestal
Iván Federico Daza Pérez	Ingeniero Ambiental
Rafael Eduardo Daza	Ingeniero Ambiental
Luis Carlos Obregón	Ingeniero Ambiental
Benavides Borrego	Ingeniero Agrónomo
Olegario Alberto Zequeda	Ingeniero Agrónomo
Rafael Enrique Ramírez Contreras	Ingeniero Agrónomo
Andrés Rafael Meza Ballesta	Ingeniero Agrónomo
Juan Carlos Pacheco Callejas	Ingeniero Forestal
Alexander Velandia	Ingeniero Forestal
Jesús Barrera	Ingeniero Forestal
Marco Moreno Correa	Ingeniero agroforestal
Francisco Javier Guevara Torres	Tecnólogo Agrícola
Claudia Yelena Torres Jiménez	Tecnólogo en producción agropecuaria ecológica
Kevin José Amariz Charris	Tecnólogo en producción agrícola
Rosibeth Rangel Echavez	Técnico de cultivos agrícolas

Ludís Esther Oñate Martínez	Técnico cultivos agrícolas
Jorge Mario Jiménez Ramos	Tecnólogo en producción agrícola
Luis Gabriel Murcia Molina	Ingeniero Ambiental y Sanitario
Leonardo Fabio Nova Dávila	Tecnólogo en Gestión empresas agropecuarias
Iván David Molina Corpus	Ingeniero ambiental y sanitario
Yorleidis Mercado Alfaro	Técnico Operativo
Amílcar José Vega Nieves	Ayudante Agrícola

1. Teniendo en cuenta el listado anterior el cual fue presentado por el contratista en el plan de contingencia, se presentó la ausencia de los siguientes profesionales:

    1. IVÁN FEDERICO DAZA PÉREZ
    2. LUIS CARLOS OBREGÓN
    3. BENAVIDES BORREGO
    4. OLEGARIO ALBERTO ZEQUEDA MARTÍNEZ
    5. RAFAEL ENRIQUE RAMÍREZ CONTRERAS
    6. ANDRÉS RAFAEL MEZA BALLESTA
    7. JUAN CARLOS PACHECO CALLEJA
    8. ALEXANDER VELANDIA
    9. JESUS BARRERA
    10. MARCO MORENO CORREA
    11. CLAUDIA YELENA TORRES JIMÉNEZ
    12. KEVIN JOSÉ AMARIZ CHARRIS
    13. ROSIBETH RANGEL ECHAVEZ
    14. LUDÍS ESTHER OÑATE MARTÍNEZ
    15. JORGE MARIO JIMÉNEZ RAMOS
    16. LEONARDO FABIO NOVA DÁVILA
    17. IVÁN DAVID MOLINA CORPUS
    18. YORLEIDIS MERCADO ALFARO

2. Por otro lado, hizo presencia un personal que no se relaciona en el plan de contingencia tal es el caso de:

    1. HECTOR MOLINA DUARTE
    2. JORGE L GAMEZ
    3. YOVANI RUIZ
    4. MARLIN VANEGAS TORRES
    5. ALIRIO GONZALES
    6. ANGEL MENDOZA
    7. EDER AROCHA
    8. YANCY MINDIOLA

En virtud a lo anterior, esta interventoría solicita al CONSORCIO PAC CESAR, la

entrega de los contratos, pago de seguridad y hoja de vida del personal mencionado en el inciso 2 del presente oficio.

Así mismo se convoca a nueva reunión el día martes 17 de octubre, con el personal que no asistió a las reuniones convocadas para los dias 4 de septiembre y 6 de octubre dicha reunión se celebrara a las 8 de la mañana en las instalaciones del INFOTEP en el municipio de San Juan Del Cesar, para dar cumplimiento a lo solicitado en los oficios 63 y 84 emitidos por esta interventoría, el personal del cual se requiere su asistencia obligatoria se encuentra relacionado en el numeral 1 del presente oficio.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 17 de 2023

Oficio N° 88

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: seguimientos al cronograma de actividades del plan de contingencia

Cordial saludo,

Como medida de seguimiento al cronograma de actividades en el plan de contingencia, esta interventoría manifiesta las siguientes observaciones en las actividades que han venido presentando atrasos significativos en su ejecución, en contraste con el último reporte de avance de actividades presentado por el contratista el día 15 de octubre de 2023.

CRONOGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.0078 de 2022				
ITEM	DESCRIPCION	MES 8	MES 9	MES 10
		sep-23	oct-23	nov-23
1	DESARROLLAR TALLERES DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL			
2	REALIZAR LA DIVULGACION DEL PROYECTO EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA Y HABLADA			
3	FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA.			
4	REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTAREAS EN PROCESO DE PRESERVACION Y RESTAURACION ESPONTANEA.			
5	OTORGAR EL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES			
6	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS			
7	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIVERO PERMANENTE	EJECUCIÓN SUJETA A DEFINICIÓN DE SITIO Y DEMAS ACCIONES PREVIAS		
8	GENERAR ACUERDOS DE CONSERVACION CON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS			
9	REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTAREAS EN PROCESO DE PRESERVACION Y RESTAURACION ESPONTANEA.			
10	REALIZAR LA PLANTACION EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS			
11	INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO			
12	ENTREGA DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN			
13	ENTREGA INFORME FINAL DE ACTIVIDADES			

ACTIVIDAD	OBRA PROYECTADA A LA FECHA	OBRA EJECUTADA A LA FECHA	OBSERVACIONES
4. Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea	44 km	4,7 km	Según las proyecciones semanales en el cronograma de actividades presentados en el plan de contingencia, en comparación con el ultimo avance de obra reportado a interventoría el 15 de octubre del 2023, se consigna un avance de 4.710 metros, sin embargo, a la fecha, correspondiente a la semana 4 de las 6 proyectada, el contratista tendría que haber adelantado 29 km, con un porcentaje de avance del 66%. No obstante, hasta la fecha se proyecta un avance del 10%. Presentando un retraso significativo del 56%.
6. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos	630 (ha)	**----**	Hasta la fecha no se ha reportado a esta interventoría Seguimiento y monitoreo a las hectáreas bajo el Pago por Servicios Ambientales, por lo tanto, el avance de esta actividad se encuentra en 0%
8. Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	15	**----**	Esta actividad se proyecta a la generación de 66 acuerdos generados en 15 eventos con asistencia de mínimo 50 personas por evento. Sin embargo, a la fecha no se no se ha generado ningún acuerdo. Por lo tanto, el avance se encuentra en un 0%
9. Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación.	75 km	13,9 km	Según las proyecciones semanales en el cronograma de actividades presentados en el plan de contingencia, en comparación con el ultimo avance de obra presentado a interventoría el 15 de octubre del 2023, se reporta un avance de 13.895 metros, sin embargo, hasta la fecha, correspondiente a la semana 6 de las 10 proyectadas, el contratista tendría que haber instalado 45 km de aislamiento, con un porcentaje de avance del 60%. No obstante, a la fecha se proyecta un avance del 13.5%. Presentando un retraso significativo del 46.5%.
10. Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos	1.391	**----**	A la fecha el contratista en el último avance de obra con fecha 15 de octubre del 2023, no reporta avance en esta actividad, presentando un retraso del 100%
11. Instalar parcelas de monitoreo	20	**-----**	En el informe presentado a la interventoría, solo manifestaron que el contratista se encuentra en la localización precisa del montaje de las parcelas de monitoreo, por lo tanto, están realizando acercamientos directos en campo, para determinar las zonas aproximadas al área de interés en relación de las cuatro (4) parcelas PSA y tres (3) parcelas activas que se encuentran por ejecutar en Campo. Por lo tanto, no se determina como un avance reportado a esta interventoría que motive a una verificación en campo. Esta actividad presentaría un retraso del 100%

En virtud a lo anterior, esta interventoría solicita que el CONSORCIO PAC CESAR de manera urgente se pronuncie en cuanto a las medidas que adoptará para dar cumplimiento al objeto contractual en el término adicionado y pactado en el plan de contingencia, puesto que de seguir con la estrategia actual no podrá dar cumplimiento a lo pactado contractualmente.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 18 de 2023

Oficio N° 89

Señor
Andres Perea
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar.

Ref: Citación a Comité tecnico

Cordial Saludo:

En desarrollo de las actividades correspondientes al contrato No 078 de 2022 el cual tiene por objeto "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA contrato suscrito entre CORPOGUAJIRA y CONSORCIO PAC CESAR, solicitamos la asistencia del CONSORCIO PAC CESAR a comité técnico el cual se desarrollará en las instalaciones de Corpoguajira regional Fonseca el día 20 de Octubre a las 8 am, se solicita la asistencia del profesional civil del consorcio con el fin de tratar el tema del vivero, así mismo se solicita la transcripción del acta del comité celebrado de manera virtual el día 4 de octubre, el cual fue grabado por el contratista Consorcio PAC CESAR y este se comprometió a transcribir dicha acta .

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoria
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 24 de 2023

Oficio N° 90

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: observaciones sobre acuerdos voluntarios con las comunidades beneficiadas

Cordial saludo,
Una vez revisados los acuerdos voluntarios enviados por EL CONSORCIO PAC CESAR, en la primera y segunda entrega que corresponden a 40 acuerdos de 66 proyectados, se presenta las siguientes correcciones sobre la zona donde se encuentran ubicados los predios de las comunidades beneficiarias dado que lo registra como vereda, por lo tanto, se señala lo siguiente:

1) Calixto fuentes Corregimiento
2) Emilda Mindiola Corregimiento
3) Federico Mendoza Comunidad indígena
4) Osmar Daza Corregimiento
5) Roberto Elías Daza Corregimiento

En el acuerdo del señor NEFER CORDOBA no se ve reflejado si el beneficiario es propietario, poseedor u ocupante.

Ahora bien, es fundamental que se envíen los acuerdos restantes para darle celeridad a la formalización de los mismos, los cuales han sido solicitados en reiteradas oportunidades. Así mismo se requiere al contratista para que envié a esta interventoría el cronograma de los eventos a realizar para la formalización de los acuerdos voluntarios de conservación, entendiendo que estamos en etapa final del contrato y dicho cronograma ha sido solicitado en varias ocasiones sin obtener respuesta por parte del Consorcio PAC CESAR.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 24 de 2023

Oficio N° 91

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Solicitud Corrección y Actualización de información SIG.

Cordial saludo,
Como es de su conocimiento esta interventoría ha observado mediante comunicados escritos sobre los errores en la construcción del aislamiento el cual presenta diferencias al proyectado en los polígonos suministrados por el contratista. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del consorcio PAC CESAR, por esta razón se le solicita de una vez más y de carácter urgente al consorcio PAC CESAR como titular del contrato de obra pública número 0078 del 2022, él envió de la información SIG la cual debe contener las siguientes especificaciones:

- Los shapefiles y/o KML de los nuevos beneficiarios de R.A. (Restauración Activa).
- Reporte detallado de novedad ya sea por cambio de área o de aislamiento con justificación


Observaciones en campo:

1. Durante el recorrido en campo el equipo técnico de la interventoría encontró que el aislamiento de los siguientes beneficiarios, está asentado en zonas diferentes a las demarcadas en los KML proporcionados por el contratista:

N°	VEREDA	BENEFICIARIO	TIPO DE BENEFICIARIO
1	Achinticua	Manuel Loperena	R.A.
2	El Placer	Mabel Esther Vega Montaño	R.A.
3	El Placer	Federico Mendoza Plata	R.A.
4	Guayacanal	Rafael Fragozo Vergara	R.A.
5	Guayacanal	Alcibíades Blancher	R.A.
6	La Junta	Lacides Mejía	R.A.
7	La Junta	Julio Cesar Daza	R.A.

N°	VEREDA	BENEFICIARIO	TIPO DE BENEFICIARIO
8	La Junta	José Ángel Hinojosa	R.A.
9	La Mina	Henry Javier Nieves Guette	P.S.A.
10	La Peña	Enrique Mendoza	R.A.
11	La Peña	Natalia Mendoza	R.A.
12	La Sierrita	Ildelfonso Fuentes	R.A.
13	La Sierrita	Alberto Fuentes Mejía	R.A.
14	La Sierrita	Calixto Fuentes Mejía	R.A.
15	La Sierrita	Hilder Fuentes Mendoza	P.S.A.
16	Loma del Potrero	Juan Segundo Vega	R.A.
17	Los Haticos	José Eduardo Brochero	R.A.
18	Piloncito	Amilcar José Vega	R.A.
19	Tembladera	Lacides Mindiola Guerra	P.S.A.

2. En la vereda Piloncito se encuentra el área de restauración activa del señor Luis Alfonso Daza, al cual se destinó 260 metros de aislamiento para el encerramiento de su área de plantación; durante la visita técnica a su predio el día 11 de octubre del año en curso, se encontró un encerramiento de 97,15 metros cerrando el área que destino para la actividad de R.A. mencionando que no necesitaba los metros restantes de aislamiento para su polígono, ya que la cerca que se encontraba en dicho punto es “relativamente nueva” y no va a desmontar esa cerca que se encuentra en buen estado por instalar la nueva, esto quedo registrado en el acta de visita de interventoría número 126. En vista de lo anterior el área de R.A. se reduce significativamente como se observa en la imagen número 1.

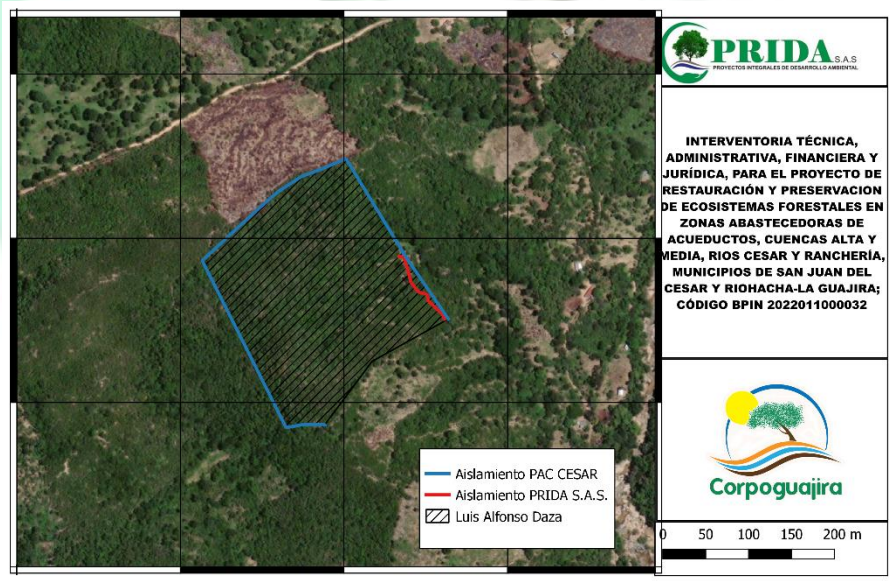

Con base en esta muestra tomada en campo, se puede concluir que los aislamientos en su mayoría presentan esta condición; por tal motivo se solicita al

contratista de obra implementar los correctivos pertinentes para que el aislamiento ejecutado tenga concordancia con el aislamiento proyectado en los polígonos inicialmente presentados y que fueron avalados por interventoria o presente las aclaraciones a que haya lugar soportadas técnicamente.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira octubre 25 de 2023

Oficio N° 92

Señor.
Andrés Perea Sánchez
Representante Legal Consorcio PAC CESAR
San Juan Del Cesar

REF: Requerimiento ajuste de diseño y presupuesto para la construcción de vivero

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento se le ha venido solicitando al CONSORCIO PAC CESAR ajustar el diseño del vivero, teniendo como parámetros de ajuste el espacio disponible así como el presupuesto del contrato para esta actividad que no es objeto de adición y teniendo como antecedente que el consorcio PAC CESAR envió un ajuste, el cual no correspondía con lo solicitado, y de que en virtud de lo anterior se citó a comité técnico el día 20 de octubre en el cual el delegado del consorcio ingeniero Carlos Flórez se comprometió a revisar el diseño para realizar un ajuste y que se pronunciaría sobre dicho ajuste el día lunes 23 de octubre, tal y como se encuentra consignado en el acta de dicho comité, y siendo 25 de octubre el consorcio guarda silencio y a la fecha no se ha pronunciado sobre el particular, solicitamos que consorcio se pronuncie y aclare la razón por las cuales se vienen presentando estas las dilaciones en el ajuste solicitado o que persigue el consorcio PAC CESAR dilatando la entrega del ajuste al diseño, por medio de la presente se requiere al consorcio PAC CESAR para que remita a esta interventoria el ajuste al diseño del vivero en las condiciones anteriormente descritas en un término perentorio de máximo 24 horas

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Contrato 078 de 2022
