21 de Marzo del 2023, Martes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente, 1 SISO, 1 Inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 cheque, 8 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades.

1. Construcion de espacio público costado Derecho PRO+060 al PRO+113.
2. Correcciones de detalles PRO+044 al PRO+113 Izquierdo Solicitados por la Firma interventora.
3. Se evidencia obreros sin dotación en obra, Se Solicita retiro hasta no tener Completa dotación del personal.
4. Se evidencia excavación abierta desde el PRO+354 al PRO+381, Sin rejón, Inundada por fuertes lluvias en Fin de Semana.
5. Se indica por parte de la interventoría que los daños que reciba la Subrasante Seran asumidos por ellos.
6. Se Solicita retiro de escombros ubicados en plaza sobre calle 35 Sur retiro de Material vegetal en Calle 5 Sur retiro de escombros casa abandonada costado Derecho entre calles 2 y 3 Sur.
7. Se solicita reparación anden PRO+060 Izquierdo, Instalación tubería de 4" para Salida de agua de vivienda alaria, toda vez que se instaló anden y no se adecuo la tubería, afectando esta al anden Construido.

22 de Marzo del 2023, Miercoles

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente 1 Siso, 1 Inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro 1 oficial, 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo 1 cadero, 3 operadores de equipos.

Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 minicargador 1 vibrocompactador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades.

1. Instalación de Geotextil del PROT347 al PROT370.
2. Instalación de Pajón del PROT347 al PROT370.
3. Se realiza tala de Arboles entre calles 5 y 6 Ser.
4. Resto de Actividades paralizadas.
5. Se le indica a la firma contratista que deben finalizar actividades de espacio público de los tramos Construidos desde el PROT446 al PROT799. y que a la Fecha queda menos de Mes y Medio para finalizar el contrato.

23 de Marzo del 2023, Jueves

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente 1 Siso, 1 Inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro 1 oficial, 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo 1 Cadenero, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Retrollanta, 1 minicargador, 1 vibrocargador, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades

1. Equipo para dos parrilleados (Retroexcavador)
2. Continua la instalación de bordillos en el costado de la Calle 3.
3. Tala de arboles en abs PRO+250
4. Se funde rampa peatonal en calle 3 abs PRO+120 lateral Izquierdo.
5. Se arman parrillas de Acero de 1/2" para refuerzo de losas
6. Se realiza manjol en PRO+125.
7. Inicia extension de Subbase en PRO+350 al PRO+380.
8. Se Solicita a la firma Contratista Asignar recursos de Equipos y personal para finalizar la obra en el tiempo Contractual del proyecto.

24 de Marzo del 2023, Viernes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente 1 SISO, 1 inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial 2 oficios Varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 minicargador, 1 Vibro Compactador, Herramientas Menores
Clima: Soleado

Actividades

1. Continua la extension de Material granular desde el PRO+350 al PRO+380

2. Instalación de Guías y Visual en cunetas Sobre la calle 3 PRO+117 - pro+125 Lateral Izquierdo.

3. Se realiza demolición de Terrazas desde el PRO+119 al PRO+125 lateral Derecho.
4. Se realiza Sello de juntas entre bordillos y anden abs PRO+044 al PRO+125.
5. Continua El equipo Retrocargador (Pajarita) paralizado.

25 de Marzo del 2023. Sabado.

Personal en obra: 1 director de Obra, 1 auxiliar residente 1 SISO, 1 Inspector de obra, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes oficios Varios 5 Ayudantes 1 topografo, 1 Cadenero 3 operadores de equipo
Equipos en obra: 1 Retro de llantas, 1 vibrocompactador 1 mini cargador, Herramientas menores
Clima: Soleado

Actividades

1. Se realiza Extensión y compactación desde PRO+250 a/a PRO+300.
2. Extensión de Material de rajón del PRO+370 al PRO+380.
3. Extensión e instalación de Geotextil del PRO+370 al PRO+380
4. Tala de Arboles desde el PRO+180 al PRO+300.
5. Aun se encuentra paralizada El retrocargador de llantas
6. Las Actividades de Excavación están realizadas y el Suministro de rajón es deficiente.
7. Se Solicita al Contratista Asignar recursos para finalizar en el tiempo Contractual.

27 de Marzo del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente
1 SSO, 1 inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro
2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero
3 operadores de equipos
Equipos de obra, 1 Vibrocompactador, 1 minicargador 1
1 Retro de llanta, Herramientas menores
Clima: Soleado

Actividades

1. Se realiza extension de rajón desde el prot350 al prot402.

2. Se finaliza cerco desde el prot250 al prot292.
3. Se instala formaletas para Concretos desde el prot250 al prot292 costado Derecho
4. Actividades de excavación paralizadas.

EPP

28 de Marzo del 2023, Martes

Personal en obra: 1 director, 1 auxiliar Residente, 1 SSO,
1 Inspector, 1 social, 1 almacenista, 1 maestro, 2 oficios varios
6 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores de equipo
Equipos en obra: 1 minicargador, 1 Retro de llanta, 1 Vibrocompactador
Herramientas menores
Clima: Soleado

Actividades

1. Instalación de subbase desde el prot292 al prot370.
y Su Compactación.
2. Se evidencia Residuos de tala de arboles
en la zona de trabajo; Se solicita su retiro y disposición
de Manera inmediata.

3. Las actividades de excavación se encuentran paralizadas.
4. Se realiza chequeo de formuletas y Espesores de pavimentos, se solicita por parte de la firma interventora: Corregir puntos solicitados para espesores.
5. Nuevamente se solicita a la firma contratista Asignar recursos para finalizar la obra en el tiempo Contractual.

29 de Marzo del 2023, Miercoles.

Personal en obra: 1 directora, 1 auxiliar residente, 1 SISO 1 Inspector, 1 almacenista, 1 maestro, 1 oficial, 2 oficios varios, 5 oyudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 vibrocompactador, 1 minicargador 1 Retro de llanta ---- Clima: Soleado

Actividades

1. Se reinician actividades de excavación desde el PRO+402 al PRO+422

2. Se instala Subbase desde el PRO+300 al PRO+370.

3. Se instala Concreto desde el PRO+250 al PRO+292 Costado Derecho.

4. Se realiza tala de arboles e instalación de bordillos. del PRO+193 al PRO+250.

5. Llegan nuevas formaletas para Concreto a la obra

30 de Marzo del 2023, Jueves.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente, 1 SISO, 1 almacenista, 1 inspector, 1 social, 1 maestro, 1 oficial, 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo 1 cadenero, 3 operadores de equipo

Equipos en obra: 1 minicargador, 1 operador de Retrollanta 1 Vibrocompactador

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Se realiza Excavación del PRO+422 al PRO+436.

2. Se realiza instalación de Geotextil y extension de Rajon. del PRO+402 al PRO+436.

3. Se Finalizan Actividades de excavación para el total de la via a Construir.

4- Se realiza excavación para anden en calle 2 PRO+036

5. Se instala concreto MR 38 desde el PRO+292 al PRO+307 Costado Derecho.

6 Se instala bordillos desde el PRO+190 al PRO+294.

31 de Marzo del 2023, Viernes.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar de Residente 1 SISO, 1 almacenista, 1 inspector 1 social, 1 maestro, 1 oficial 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero. 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Retro de llanta, 1 vibrocompactador, 1 mini-Cargador, Herramientas menores

Clima. Soleado

Actividades.

1. Se instala Concreto desde el PROT250 al PROT347 Costado Izquierdo

2. Se presentan lloviznas leves, Se Solicita al Contratista tapar con plasticos las losas.

3. Se realiza extension de subbase desde el PROT350 a PROT436.

4. Se realiza excavacion por presentarse humedad en subbase, Se evidencia Union del Tubo de 4" de Agua a presion desajustado, Se arregla daño y Se vuelve a subir estructura.
Largo = 4m, Ancho = 3,10m; Profundidad = 0,75m.

EdR

01 de abril del 2023, Sabado

personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente 1 SISO, 1 almacenista, 1 social, 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial 2 ayudantes oficios varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero 3 operadores de equipo
Equipos en obra: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1 Retro de llanta, - - - Clima: Soleado.

Actividades

1. Se realiza extension de Subbase prot 347 al PROT435.
2. Continua la instalacion de bordillos en fundida de Rampas PROT190 a PROT250.

3. Se Solicita a la firma contratista iniciar las actividades faltantes como son la Compensacion forestal y parte electrica del proyecto

EdR

03 de Abril del 2023, lunes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente, 1 SISO, 1 social, 1 almacenista, 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial, 2 oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores de equipos.

Equipos en obra: 1 Retro de llantas, 1 Vibro Compactador, 1 Vibrocompactador, Herramientas menores

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Instalación y compactación de Subbase desde el PR0+347 al PR0+435.

2. Instalación de Formaletas del PR0+347 al PR0+389. costado Derecho

3. Se realiza instalación de bordillos desde el PR0+280 al PR0+340. Derecho.

4. Se Solicita a la firma contratista, practicar ensayos de los Concretos fundidos en sitios entre las abscisas PR0+120 a PR0+280.

5. Se Solicita a la Firma Contratista Subsanar detalles Solicitados por la interventoría, mediante oficios desde el PR0+436 al PR0+799.

6. Se solicita ala firma Contratista asignar recursos para Finalizar en el tiempo Contractual el proyecto.

04 de Abril del 2023, Martes

Personal en obra: 1 director de obra, 1 auxiliar residente, 1 SISO, 1 almacenista, 1 inspector, 1 maestro, 1 social, 1 oficial, 2 Oficios varios, 5 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores de equipos

Equipos en obra: 1 Rebo de llanta, 1 rodillo compactador, Herramientas menores, 1 minicargador.

CLIMA: SOLEADO

Actividades

1. Demolición de Anden PROT036 al PROT044 costado Derecho

2 Instalación de Bordillos PROT036 al PROT044.

3 Instalación de Espacio público sobre calle 3 Sur Con Cra 8E Sur

4. Demolición anden PROT113 al PROT120 costado Derecho, Instalación de Bordillo

5. Demolición anden PROT125 al PROT132 costado Derecho e instalación de bordillos.

6. Instalación de Acero para placa sobre Manjol PROT348, calle 6.

7 Instalación Soldura granular PROT347 - PROT356.

05 de Abril del 2023, Miercoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Aux residente, 1 SISO, 1 Almacenista, 1 Inspector, 1 Maestro 1 Social, 1 Oficial, 2 Oficios Varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores Equipos

Equipo en obra: 1 Excavadora, 1 Minicargadora, 1 Motoniveladora, 1 Rodillo.
Clima: Soleado.
Actividades
1. Instalación de anden PRO+036 al PRO+044.
Costado Derecho Calle 2 Sur
2. Remoción de escombros plaza Calle 3 Sur con Cra 8E Sur
3. Instalación Subbase granular PRO+347 al PRO+436.
4. Continua Instalación de bordillos del PRO+190 al PRO+340.
5. Se Solicita a la Firma Contratista dejar señalizada la obra toda vez que se viene un parón por Semana Santa desde el jueves 6 de abril al 09 de Abril

10 de Abril, del 2023, lunes.
Personal en obra: 1 director de obra, 1 aux residente 1 SISO 1 almacenista, 1 social, 1 Inspector, 1 maestro, 1 Oficial. 2 Oficios Varios, 5 Ayudantes, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 operadores de Equipo.
Equipos: 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Retrollanta, H menores.
Actividades.
1. Se evidencia falta de personal obrero en Campo.
2. Actividades totalmente paralizadas a pesar de faltar 29 días para finalizar el contrato de obra
3. A la fecha se tiene ejecutado:
* Pavimento desde PRO+000 al PRO+347.
* Pavimento desde PRO+436 al PRO+690
* Pavimento desde el PRO+700 al PRO+799.

* Espacio público desde PRO+000 al PRO+477.
- Faltando Espacio público en la Calle 3 Sur.
- Faltando Remoción de Escombros,
- Faltando Reparación de andenes Solicitados
- Faltando Sello de juntas entre losetas)

* Instalación bordillas PRO+000 al PRO+340.
- Falta todo Anden a Realizar y Demoliciones, Cortes de Lozas y Reubicaciones de Redes de Gas y Acueducto.

* ~~Pendiente~~ de Realizar Correcciones en los andenes desde el PRO+436 al PRO+690 y desde el PRO+~~700~~ al PRO+797.

* A la Fecha No se tiene Lugar o sitio de disposición para Compensación Forestal.

* A la Fecha No se ha iniciado Actividades de Red electrica.

* Según plan de Contingencia A la Fecha Tendriamos
- Finalización Pavimento PRO+347 al PRO+436. — No Comple
- El dia 11 de Abril, Martes Finaliza la instalación Red Electrica, A la Fecha No se ha Realizado Ninguna Actividad prevista - No Comple..
- ~~D~~esde el PRO+274 al PRO+347 Se estaria Finalizando la Actividad de andenes, A la Fecha Solo Se ha instalado bordillos, No Comple
- Desde el PRO+190 al PRO+274 es tramo deberia haber estado Finalizado, A la Fecha Solo Se tiene bordillos Instalados - No Comple.

4. Se Solicita a la Firma Contratista Asignar Recursos Para Finalizar dentro del Plazo Contractual, toda Vez Que el Contrato Vence en Fecha 04 de Mayo del 2023.

Atentamente,

11 de Abril del 2023, Martes

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, 4 Maestro andenes y sus 4 Ayudantes, 1 operador de minicargador, 1 Celador.
Equipo en obra: 1 Minicargador

Cima: Nivelado

Actividades

1. Instalación de Concreto PRO+347 al PRO+389 costado Derecho.

2. Instalación de Material Granular sobre andenes desde PRO+280 al PRO+347 costado Izquierdo.

3. Instalación de Material Granular para andenes costado Derecho PRO+190 al PRO+270.

4. Armado e Instalación de formaletas en terreno del PRO+389 al PRO+436 costado Derecho.

5. Se evidencia personal escaso en obra para la Construcción de andenes, No se ve arranque con cuadrilla de 4 trabajadores, se necesita se asigne mas personal en obra.

12 de Abril del 2023, Miercoles.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro andenes, 4 Ayudantes andenes, 2 oficios Varios, 1 Celador, 1 operador de Mini

Equipo en obras 1 Minicargador, H. Menores

Clima: Soleado en Mañana, lluvias desde Medio día hasta las 2 pm, Resto tarde Soleado.

Actividades.

1. Instalación Concreto PRO+389 al PRO+436 Costado Derecho.
2. Instalación de Material Granular PRO+190 al PRO+290 costado Izquierdo y Derecho Andenes
3. Cerco de terreno e instalación de formaleta para Concreto desde PRO+347 al PRO+383 costado Izquierdo

13 abril del 2023 Jueves

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Maestro andenes, 4 Ayudantes andenes, 1 oficios Varios, 1 celador, 1 operador Minicargador

Equipo en obra: 1 Minicargador, H. Menores.

Clima: Soleado

Actividades

1. Fundida de Concreto PRO+347 al PRO+383 Costado Derecho
2. Cerco de terreno PRO+383 al PRO+436. costado Izquierdo
3. Resane de Cajas domiciliarias PRO+190 al PRO+300

14 Abril del 2023, Viernes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro Andenes, 4 Ayudantes andenes, 1 oficios varios, 1 Celador, 1 operador Minicargador

Equipo en obra: 1 Minicargador. 4 Mezcladoras

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Fundida de Concreto PR0+383 al PR0+436 costado Izquierdo

2. Instalación de espacio público, PR0+270 al PR0+290 Costado Izquierdo

3. Continúa el Relleno con Material granular para andenes desde el PR0+410 al PR0+347

4. Finaliza instalación de pavimento longitudinalmente faltaría por Realizar bocacalle de la Calle 5 Sur

5. Se debe Realizar incremento de cuadrillas para intervención de Espacio público para poder finalizar dentro del tiempo Contractual

6. A la fecha No se han Iniciado actividades para la Red Electrica.

15 de Abril del 2023, Sábado

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 S&SO, 1 Social, 1 Almacenista, 1 Maestro, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 1 Maestro Soldeuro, 2 Ayudantes soldeuro, 1 Oficios Varios, 1 Celador, 1 Operador de Minicargadora.

Equipo en obra: 1 Minicargador, H. Menores.

Clima: Soleado.

Actividades:

1. Se instala ~~Espacio~~ público sobre calle 3 y calle 4, PRO+180.

2. Se instala Material Granular entre abscisas PRO+340 al PRO+436.

3. Se propone terreno entre PRO+190 al PRO+270 costado Derecho para instalación de Espacio Público.

4. Afectación No se cuenta Tuvieron Actividades con la Red Eléctrica.

16 Abril del 2023, Lunes

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector S&SO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 oficiales, 7 Ayudantes, 1 Celador, 1 Oficios Varios, 1 Operador de Minicargador.

Equipo en obra: ~~Soldeuro~~ Minicargador, H. Menores

Clima: Soleado.

Actividades.

1. Se inicia con recorrido para la parte eléctrica del Contratista de obra
2. Se revisan nuevamente los postes a cambiar e instalados del nuevo, en total son 16 postes
3. Se inicia la construcción de espacio público desde el PRO + 190 al PRO + 270 costado Derecho.

4. Se instala Concreto PRO + 270 sobre la Calle 5 Sur con Cra 8E Sur, bocacalles.

5. Se Solicita al Contratista perfilar vía en Calle 3 Sur toda vez que el Agua proveniente del Cerro vertida a la calle por los habitantes de lugar van a ir al pavimento y se quedan estancadas sobre la bocacalle de la calle 3 Sur

6. Se realiza Demolición de placas e instalación de Concreto en ellas en Calle 3 Sur, PRO + 180 Lado Izq y PRO + 280 Lateral Izq.

18 de Abril del 2023, Martes.
Personal en obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestro, 2 Oficial, 4 Ayudantes, 1 celador, 1 Oficios Varios, 1 operador de Mini cargador
Equipo en obra: Minicargador, H. Menores
Clima: Soleado

Actividades.

1. Fundida Concreto para espacio público PRO + 240 PRO + 270 Costado Derecho.

2. Instalación espacio público del PK0+100 y PK0+125 Esquinas Con bocacalle.

3. Se inician actividades de excavaciones para Instalación de postes de Concreto para redes eléctricas.

4. Se instala Bordillos desde el PK0+384 al PK0+436 costado Derecho e Izquierdo.

5. Se Solicita ala firma Contratista asignar mayor personal en obra para finalizar espacio público dentro del tiempo Contractual.

6. Se Solicita ala firma contratista realizar las Correcciones Solicitadas mediante oficio ESASIM-III-2022 de Fecha 12 abril del 2023

19 abril del 2023, Miercoles.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 BIISO, 1 Social
1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 7 Ayudantes,
1 Celador, 1 Oficios Varios, 1 operador de Minicargadores.
Equipo en obra: H. Menores, Minicargador
Clima: Soleado

Actividades

1. Fundida de rampa peatonal en PK0+200 carril derecho
2. Se Solicita ala firma contratista con mayor bordillos carril derecho PK0+290, Se instalan
3. Se instala relleno con material Seleccionado para anden PK0+360 al PK0+350

4. Se instala bordillos PRO+370 al PRO+436 por carril Izquierdo

5. Instalación de Espacios públicos PRO+200 al PRO+240 Lado Izquierdo.

6. Se debe incluir mas cuadrillas para Mejoras rendimiento de Construcción de Espacio público.

ap

20 de Abril del 2023, Jueves

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 social, 1 Almacenista, 2 Maestros 4 oficiales, 7 Ayudantes, 1 Celador,

Equipos: H. Menores.

Obra: Soldado

Actividades.

1. Hincado de postes de baja tensión en todo el proyecto. desde PRO+044 al PRO+799. y fundida de Concreto en base de poste.

2. Construcción de Concreto de cuneta PRO+192 al PRO+237 Lado Derecho

3. Sellado entre Pavimento y bordillo PRO+350 al PRO+436 Carril Izquierdo

4. Fundida de rampa peatonal PRO+130
Lado Izquierdo

5. Fundida de rampa en concreto vehicular PRO+137
Lado Derecho.

6. Instalación de Guia del PRO+312 al PRO+330
Izquierdo

7. Fundida de rampa peatonal PRO+120
Costado Derecho.

8. Toma de Muestras de cilindros de Concretos
para concreto andenes.

21 de Abril del 2023, Viernes
Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector,
1 SISO, 1 Social, 1 almacenista, 2 Maestros,
4 oficiales, 7 Ayudantes, 1 celador.
Equipos: H. Menores.
Clima: Soleado.

Actividades.

1. Fundida de Concreto para andenes
PRO+300 al PRO+330 Carril Izquierdo.

2. Instalación Espacio público del PRO+190 Lado
Derecho e Izquierdo al PRO+270

3. Fundida rampa peatonal PRO+180 lado Derecho.

4. Fundida concreto de andenes Bodalles PRO+189

5. Salida rampa personal PK0+130 Canal Izquierdo.

6. Se Soldara viga y Sumo contratista Colocar rejillas en Gradas PK0+600 y Señalizar Escalera.

EJR

22 de Abril del 2023, Sábado.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Celador.

Equipos: 4 Mezcladoras

Clima: Nublado en la Tarde.

Actividades:

1. Se finalizo Viga en Concreto PK0+130 Canal Izquierdo PK0+130.

2. Instalacion de Sello de juntas PK0+274 al PK0+536

3. Construccion espacio público del PK0+190 al PK0+270 Lateral Derecho.

EJR

23 abril del 2023, Domingo.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SISO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Celador

Equipo: H. Mayores

Obra: Sótano

Actividades

1. Sello de juntas restante al paramento Contiguo.

2. Sello entre bandillas y colocación malla al Acero Costado Derecho.

3. Se deben corregir Sellos todo en 3 que el mortero colocado quede con mal acabado y se desprende con respecto al Viejo Colocado.

24 de Abril del 2023, Lunes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Celador.

Equipo: H. Mayores

Obra: Sótano

Actividades:

1. Demolición y corte de piso en Pto 480
2. Se retiran Cortadores de Gas.
3. Instalación de Cubas y Manual desde el Pto 360 al Pto 375 Costado Izquierdo
4. Instalación de Aparato público Provisional al Pto 290 Costado Derecho.
5. Fundida de aceras Pto 370 al Pto 375 Costados Izquierdo y Derecho.

6. Se Solicita a la Firma Contratista hacer los Comentarios Solicitados en oficio nº I-SAS/DI-III-7022 enviado a la Firma Contratista.

7. Se debe ingresar recursos de personal para finalizar en el tiempo contractual.

8. Se debe mejorar Señalización de obra en los diferentes puntos de Intervención.

9. Se Realiza recorrido en Compañía de la Supervisión de Secretaría de Infraestructura

26 de Abril del 2023, Martes.

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 SSO, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales 8 Ayudantes, 1 Celador

Equipo en obra: H. Menores.

Clima: Soleado.

Actividades

1. Se le Solicita a la Firma Contratista presentar afiliaciones del personal nuevo, asimismo se Solicita contar con la dotación del personal toda vez que se evidencia Falta de esta. Se debe Suspender el personal hasta contar con la dotación adecuada.

Se le aclara a la Firma Contratista que ellos deben implementar el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo.

Es responsabilidad del Contratista la implementación de este, de no aplicarlo pueden acarrear multas y sanciones a que ello diere lugar.

2. Se Solicita presentar la Inducción, Capacitación, examen de Ingreso del personal.

3. Se deben señalizar los puntos a intervenir

4. Fundida de Concreto del PK0+200 al PK0+304 andenes

5. Se funde rampa peatonal PK0+130 Costado Izquierdo, y rampa PK0+270 Costado Izquierdo; Rampa Vehicular PK0+250.

6. Fundida de Concreto para andenes del PK0+200 al PK0+230 Costado Izquierdo.

26 de Abril del 2023 Miercoles

Personal en obra: 1 Director, 1 Inspector, 1 Social, 1 Almacenista, 2 Maestros, 4 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Celador.

Equipo en obra: 4 Mixers

Clima: Soleado

Actividades.

1. Se Solicita a la Firma Contratista Señalización en obra en los diferentes puntos Intervenidos.

2. Se debe Colocar Señalización en Cuestas las cuales Fatta parilla, PK0+600, de Manera Urgente.

3. Se inicia Excavación y Fundida de Pantallas o pantallas en Calle 2, calle 3, Calle 4.

4. Continuan trabajos eléctricos en red de baja tensión

5. Se continua con el corte y Demolición de terrazas entre el PK0+347 al PK0+436.

6. Construcción de Espacios públicos en bocacalle PK0+274 Sobre calle 5.

7. Fundida de cuñas en bocacalles PK0+347 calle 6.

27 de Abril del 2023, Jueves
Personal en obra:

Equipo en obra: H. Menores.
Clima: Lluvias a 3:30 pm hasta 6:00 pm

Actividades.

1. Continuan trabajos Electricos en la Zona del proyecto.

2. Fundida anden PK0+334 Costado Derecho

3. Fundida Rampa Vehicular PK0+320 Costado Derecho.

4. Excavación para dentellón PK0+274, PK0+347, PK0+436 ~~PK0+044~~.

5. Corte y Demolición de Terrazas para andenes desde el PK0+280 al PK0+320 carril Izquierdo.

28 de Abril del 2023, Viernes.
Personal en obra:

Equipo en obra: H. Menores
Clima: Soleado, lluvias en la tarde, 1:46 pm hasta 4pm
Actividades

1. Fundida Concreto anden PROT382 al PROT405

2. Vaceo rampa peatonal PROT350 costado Derecho

3. Vaceo rampa peatonal PROT340. costado Izq.

4 Vaceo anden bocacalle PROT347 costado Izq.

5. Vaceo de Sardineles PROT274, PROT347, PROT190.

29 de Abril del 2023, Sabado.
Personal en obra:

Equipo en obra:
Clima: Soleado
Actividades

1. Sellado entre peatonal y Sardinel desde PROT700 al PROT799.

2. Jornada de limpieza en obra al finalizar el dia.

4. Instalación de bolardos en Rampa Peatonal pk5 0+340

5. Instalación de Tableta Guía y Vial en pk0+420.

5. Toma de Medidas de agua, PK 0+390 Lado Izquierdo.

6. Fundido de Postes en Concreto de Red Eléctrica baja tensión.

7. Fundición de Rampa Peatonal en PK 0+435. Costado derecho

8. Realce de Registros desconocidos.

9. Fundición de Concreto para cunetas PK 0+460 a la pk 0+420 Costado Izquierdo.

30 de Abril del 2023, Domingo.
Personal en obra:

Equipo en obra
Clima: Lluvias desde la 9 AM, todo el día

Actividades:

1. Instalación Concreto cuneta bocacalle PK 0+270, I y D.

2. Sellado entre pavimento y Cordón PK 0+210 a PK 0+300

3. Lluvias desde 9:00 AM toda el resto día

4. Suspendidas labores por lluvias

01 de Mayo, Lunes
Personal en obra 0

equipo en obra 1
clima: Soleado

Actividades
1. Instalación Concreto rampa Vehicular PK0+419 Derecho
2 Instalación Concreto Rampa Vehicular PK0+418 Izq.

02 de Mayo del 2023, Martes

clima: Soleado

Actividades
1. Instalación Rampa ~~peatonal~~ eu PK0+436 Izq y PK0+416 costado Izquierdo.
2. Conexiones de Detalles desde PK0+194 al PK0+300
3 Conexiones de Detalles desde PK0+600 ala PK0+650

4 Jornadas de Inspección para Manejo PROT 532.

5 Jornadas de Inspección para Manejo PROT 470.

03 de Mayo de 2023, Miercoles

Clima: Soleado

Actividades

1.) Se realiza reparo Conel desde la Pr + 300 al Pr + 600.

2) Se realiza limpieza General.

04 de Mayo de 2023, Jueves

Clima: Soleado

Actividades

1) Se realiza limpieza General.

2) Se terminan la toma de Detalles.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN

CONTRATO No:	LP – SPM – 008-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA, representado por JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR:	($2.680.932.314).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
FECHA DEL ACTA:	08 DE AGOSTO DE 2022

En el sitio donde se van a realizar las obras del objeto en mención, a los ocho (08) días del mes de agosto del año 2022, se reunieron funcionarios de la secretaría de infraestructura, el contratista de obra, el contratista de interventoría y la comunidad del área a intervenir con el fin de dar a conocer el alcance, el presupuesto y las especificaciones técnicas del proyecto.

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de las firmas Contratista e interventoría
2. Presentación del proyecto
3. Peticiones y Varios.
4. Registro fotográfico.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

1. Presentación de las firmas Contratista e interventoría

Contratista de obra:

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

Contratista de interventoría:

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Representante Legal

2. Presentación del proyecto

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Valor Total: $ 2,680.932.314
Plazo: CUATRO (04) MESES


EL PROYECTO CONTEMPLA:

- 798,18 ml de PAVIMENTO RIGIDO
- CUNETAS TRANSVERSALES.
- BORDILLOS
- ANDENES
- RAMPAS PARA DISCAPACITADOS




LA CALZADA CONSTA DE DOS TRAMOS DIVIDIDOS ASI:


TRAMO 1:

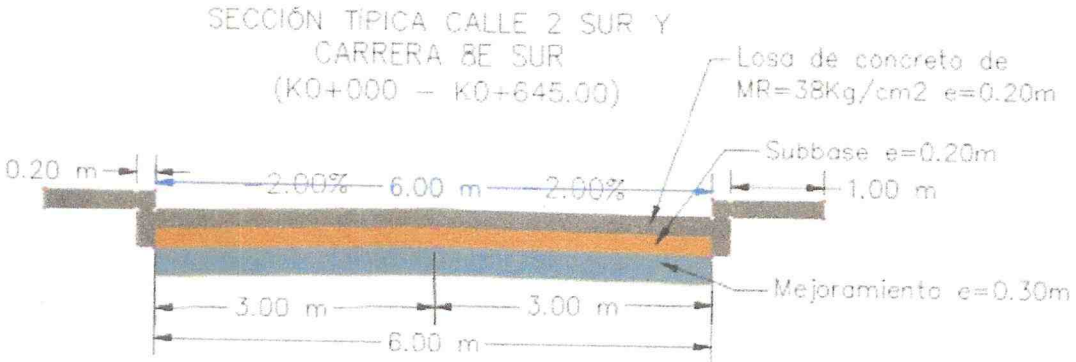



TRAMO 2:

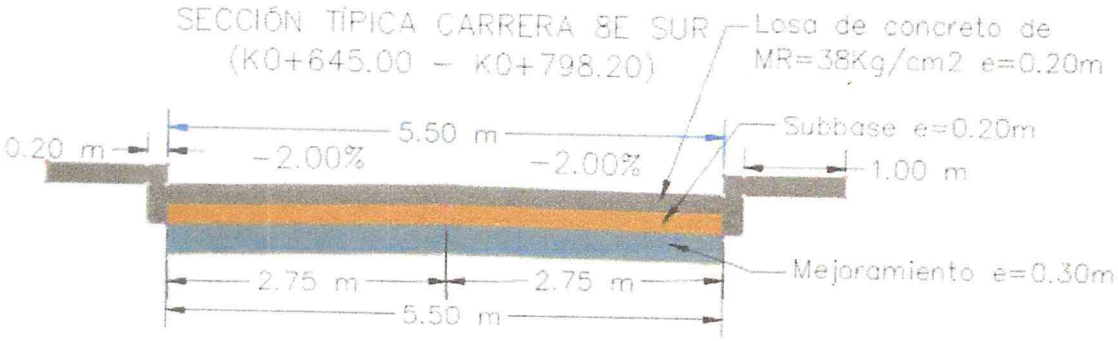

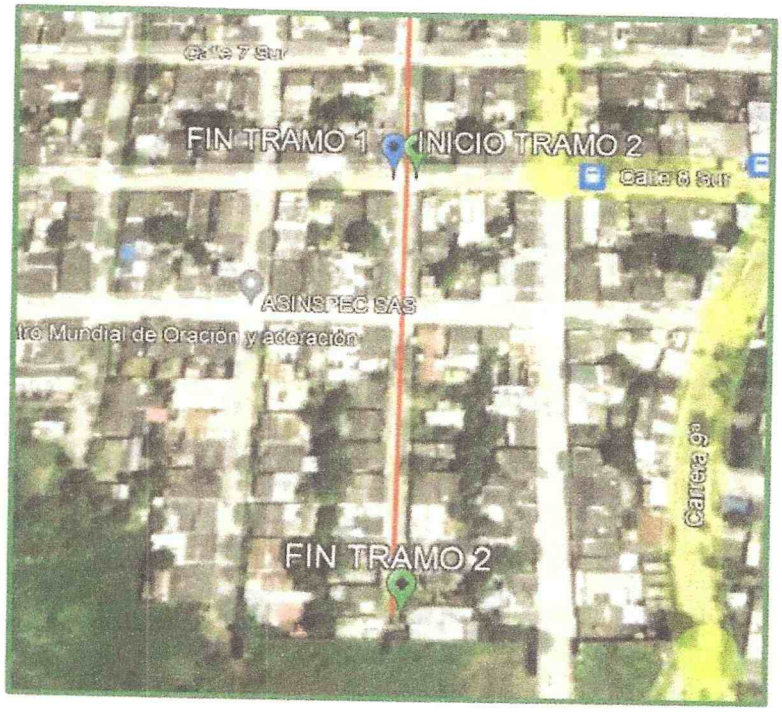

3. Peticiones y Varios

Siendo las 9:15 am de la mañana del dia 8 de agosto, se da Inicio a la Reunion de Socalizaciòn, en el Colegio La Luz del Saber, del contrato de obra LP: SPM – 20081-2022 Consorcio Pavimento Montena.
El Ingiero Jorge Carrascal Director de obra fue el encargado de Dar Apertura la reunion de Socializacion, Realizando la Presentacion del Proyecto, a las personas que se encontraban en el recinto, la Reunion tuvo acompañamiento del Contratista e interventoria y con la asistencia y participacion de la Secretaria de Infraestructura.

La finalidad de la Reunion es parte a conocer a la comunidad el mejoramiento de las Vias En los Barrios Alfonso Lopez y Araujo en el municipio de Montena.
Por medio de Diapositivas se dieron a Conocer los tramos a intervenir en lo que abarca, Pavimento Rigido Cunetas Bardillas, Andenes, Rampa. Para discapacitado.

Una Vez culminada la Presentacion Se Tomaron las Peticiones acerca de la obra.

1. Tener en cuenta el personal para trabajar, que sea del mismo sector a intervenir la obra.
2. Que las cunetas tengan Suficiente espacio para que pueda drenar el agua lluvia.
3. Que se le de el mejor manejo Posible al drenaje de las aguas lluvias.
4. La comunda manifiesta agradecimiento por la Pavimentacion.

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE SOCIALIZACIÓN
Contrato N°: LP-SPM-008-2022
Fecha: 07-JULIO-2022

MONTERÍA

Listado de Veedores

* Gregorio Segundo Sepulveda Diaz
Cedula: 6.870246
Celular: 3126340769 Alfonso Lopez


* Hernando Pereira Hernandez
Cedula: 78709760
Celular: 3136027120 Alfonso Lopez

* Henry Luna Tordecilla.
Cedula: 78748901
celular: 3103677528 Barrio Arauyo

* Astrid Acosta Oviedo
Cedula: 34991039
Celular: 3137667686 Barrio Arauyo

4. Registro Fotográfico



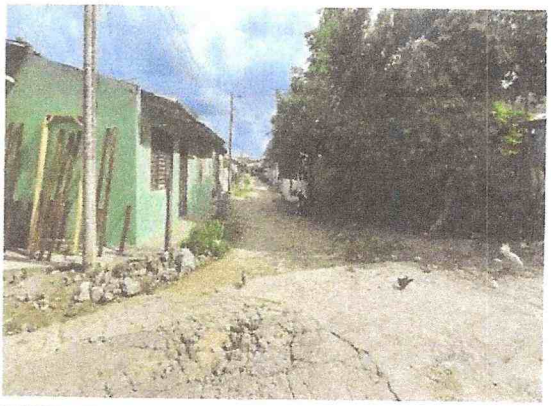

Calle 2 Sur Entre Cra 8e Sur Y Cra 8f Sur










Cra 8e Sur Entre Calle 2 Sur Y Calle 3 Sur



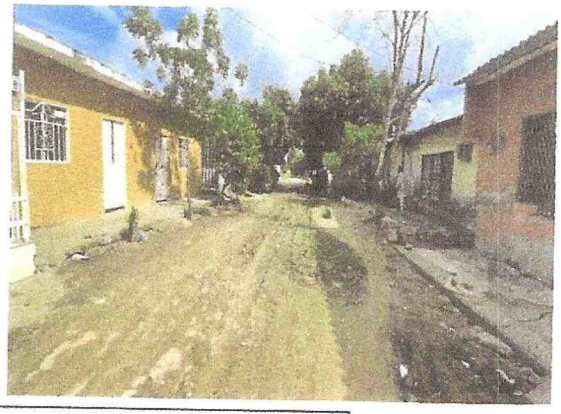

Cra 8e Sur Entre Calle 2 Sur Y Cra 9









Cra 8e Sur Entre Calle 2 Sur Y Cra 9






Cra 8e Sur Entre Calle 2 Sur Y Cra 9





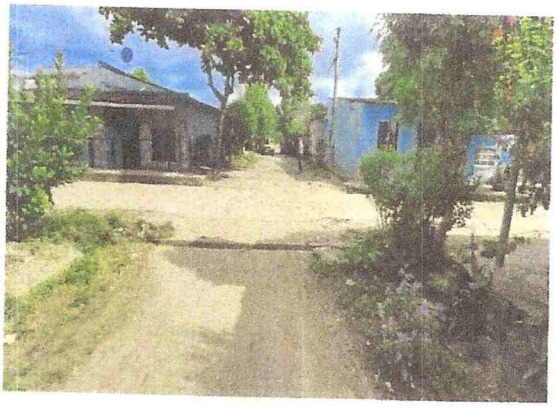




Cra 8e Sur Entre Calle 2 Sur Y Cra 9





Cra 8e Sur Entre Calle 2 Sur Y Cra 9



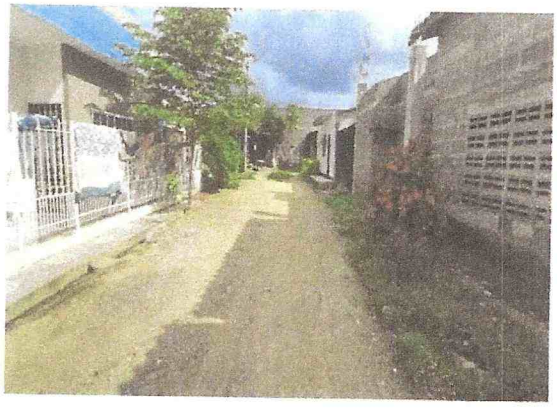

Cra 8e Sur Entre Calle 8 Sur - Cra 9 – Fin Cra 8e Sur

LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRE	CELULAR	DIRECCION	FIRMA
Miladis Oscalina	3206799865	cra 8e.	Miladis oscalina
María Galarcio	3225933631	C. 8E. 451	María Galarcio
Magdalena Bolaños	3144515924	Cr 8E#6-61	Magdalena B. Bo
LOSEMA. Arteaga M	5097542 2	6 8E-938	LOSEMA

Jorge Camargo 3002737057 Contratista

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE SOCIALIZACIÓN
Contrato N°: LP-SPM-008-2022
Fecha: 07-JULIO-2022

MONTERÍA

NOMBRE	CELULAR	DIRECCION	FIRMA
Carmen Arenals J.	3007271431	Cll 5 Kra 8 #D 15	Carmen Arenals
JHON JAIRO LÓPEZ	3217027871	CR 8E Nº 3-71	
GREGORIO SEPULVEDA	3126340769	CARRERA 8-E #4-43	
Henry Lunat	3103677528	CL 4A #8A-56	
Rosalba Contreras	25845295	CRA 8E #6C30	A/F Lopez
EDGAR BERTELE	78.695455	Kra 8E #6C9	A/F Lopez
Sumilda Orozco	3280176351	K 8D 16	Sumilda O
Delystadeil Mendoza	3017997807	CR 8C # 4A-24	Delystadeil M.
Luis Davis Reyes	4380377 1	CR 8E 6C H59	
Consuelo Ordoñez	3014510787	Cll 4A #8B 56	Consuelo O.
Marcial LOPEZ M	1806344	KBE 461	
Jhonatan Contreras	10 966 232	Kra 4-81	
Angie Tao R.	3016735574	Arauja Viejo	Angie Tao.
Judith Lorduy	3142472787	Carrera 8-E	Judith LORDUY
Miguel ARROYO	3145914989	Alfonso	LOPEZ
RAFAEL PAZA	3126896507	calle 6 E # 24	Arauja R.
BERLIDEZ JULIO	3174132953	AV 18 E 6C H 54	ARAUJO
Laudy Baldovino	3116762655	CR 8E #502.	Laudy Baldovino
Alberto Romero	3126636524	Cra 8 E # 72 C	
Osiris Barrera M	3015504023	CR. 8E #6E06	
Mario A Tamara P	91PP367030	SIM Interventoria	
Elkin Rojas Araujo	3126671610		

Gobierno de la GENTE

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE SOCIALIZACIÓN
Contrato N°: LP-SPM-008-2022
Fecha: 07-JULIO-2022

MONTERÍA

NOMBRE	CELULAR	DIRECCION	FIRMA
Abiuth Martinez	3128601370	los Arroyos	
Mary Tapia Cetel	3152769282	Alfredo López	
Alvaro Diaz	7835932	Alfredo López	
Emilda R. Polanco	3205483324	Km 8E # 6-10	
Teolinda G.D. Ortega	3135930373	KRE. # 424.	
Orlinda ortega	3208210508	KRE # 424	
Betty Bayuelo Tejeda	3235932980	3499267	
maria Velasquez	3144804141	CR 8 EN 688	
Elizabeth Sancha O.	320-404-07-41	cr 8e #5-27	
gloria Escobar		Cr 8 #6-15	
maria del carmen jimenez		Cr 6 #	
Edith Martinez Vargas	320-5[illegible]-20	cr 8 # 6-50	NO firma
Jorge R Vargas Mon	315-6541088	KRE 310	8.660.286
Eliana Tabala	3052123438	Kra 8E #6-53	
Yuranys Ensuncho C.	3123812879	KRE #319	
Esmeralda Silva A.	3012583623	KRE # 2-67	
Sonia Gonzalez	3107364310	KRE # 9-63	
Jorge Vergara	3105857053	KRE # 320.	
Mario Vasquez	3107352000	CRC # 635	
Astrid Aguas Davila	3137667686	calle 9 # 8B-07	
HAROL Mendoza	3128639911	CALLE 7 CR 8 6659	

Gobierno de la GENTE

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, identificado con el NIT 901254479, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la regional SENA donde está ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-09-13

Generado por : MAYRA ALEJANDRA VILLAMIZAR ORTIZ

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 220171430 - Número de Certificado: 222644

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

LA DIRECTORA TERRITORIAL DE CORDOBA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, una vez verificado el sistema de Información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativo-Laborales y sanciones de la Dirección Territorial Córdoba sede Montería respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud: 05EE2023742300100002401 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S
Identificación: 9 0 1 2 5 4 4 7 9-2

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVO-LABORALES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Córdoba y Arboletes Antioquia. Si se requiere información sobre otra jurisdicción deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipal según sea el caso.

Para tal efecto se toma como período de certificación el último año a la fecha de la solicitud:

Investigaciones y/o reclamaciones: del 30 de agosto del 2022, al 30 de agosto del 2023
Sanciones: del 30 de agosto del 2022, al 30 de agosto del 2023

Dado en la Ciudad de Montería, a los (31) días del Mes de Agosto del 2023

SANDRA MARCELA MENDOZA ARGEL
Directora Territorial Córdoba

43500

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO FINANCIERO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CORDOBA

CERTIFICA QUE:

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERÍA S.A.S identificado con el número de NIT **901.254.479,** no se encuentra registrado en nuestra base de datos como aportante.

Este documento no tiene validez para fines tributarios, ni para ser presentado en procesos de selección del Estado.

Dado en Montería a los cuatro (4) días del mes de septiembre del 2023.

JOSE LUIS DORIA ARGUMEDO
Coordinador Grupo Financiero
ICBF Regional Córdoba

	Nombre - Cargo	Firma	Fecha
Revisó:	Robert Antonio Martinez Angulo - Grupo Financiero - Responsable Oficina Recaudo		04/09/2023
Elaboró:	Ena Margarita Espitia Villegas - Técnico Administrativo - Grupo Financiero - Recaudo		04/09/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

43500

Al contestar cite este número

Radicado No:
202343500000067511

Monteria, 2023-09-04

Señora
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Representante Legal Elsa Maria Rueda Landinez Ingeniería S.A.S
emruedalandinez@gmail.com
Transversal 154 No. 17-20 Casa 10 C.R. Club House Gold – Floridablanca (SS)
Bucaramanga - Santander

Asunto: Respuesta solicitud relación de pago

Cordial saludo;

En respuesta a la comunicación radicada con el N° 202343400000048672 de fecha 31 de agosto del 2023, nos permitimos informarle que revisado nuestro Sistema de Información, se pudo constatar que la empresa que usted representa, no se encuentra registrada, es decir; no ha efectuado pagos por concepto de aportes parafiscales en la regional Córdoba (NIT inexistente).

Es importante manifestarle que el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, el cual adicionó el artículo 114-1 al Estatuto Tributario, frente a la exoneración de aportes, indicó: "Articulo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA, el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.

Estaremos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente;

JOSE LUIS DORIA ARGUMEDO
Coordinador Grupo Financiero
ICBF Regional Córdoba

	Nombre - Cargo	Firma	Fecha
Revisó:	Robert Antonio Martinez Angulo - Grupo Financiero - Responsable Oficina Recaudo		04/09/2023
Elaboró:	Ena Margarita Espitia Villegas - Técnico Administrativo - Grupo Financiero - Recaudo		04/09/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

Anexos: Un (1) folio

Comfenalco
SANTANDER
Se preocupa por ti.

Bucaramanga, 01 de septiembre de 2023

Señor(es)
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
RUEDA LANDINEZ ELSA MARIA
REPRESENTANTE LEGAL
Nit 901.254.479
Email: emruedalandinez@gmail.com

En respuesta a su solicitud relacionada con la expedición del certificado de paz y salvo de aportes, debemos informar que, una vez verificado el sistema de información de Afiliación y Subsidio de COMFENALCO SANTANDER, se pudo constatar que, con corte a julio de 2023, el empleador ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS. con Nit 901.254.479 no presenta aportes pendientes por cancelar por los trabajadores afiliados a la Caja De Compensación Familiar Comfenalco Santander.

DOCUMENTO NO VALIDO PARA TRASLADO ENTRE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

Esta certificación se expide sin perjuicio de las acciones y competencias de determinación y cobro de aportes por parte de las administradoras del Sistema de la Protección Social y/o de la UGPP.

Cordialmente,

ALEXANDER GARZON VALDERRAMA
Jefe Departamento de Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co

Avenida González
Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX: 607 6577000
Opción 1

Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680003

VIGILADO SuperSubsidio

comfacor

LA GERENTE DE SUBSIDIO FAMILIAR DE
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CORDOBA "COMFACOR"
NIT 891.080.005-1

CERTIFICA:

Que la empresa **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENERIA S.A.S** con Nit **901.254.479-2**, representado legalmente por **Elsa María Ruedas Landinez**, realizó Aportes Parafiscales del 4%, por los períodos que se detallan a continuación:

Periodo Pago	Fecha Pago	Aportes	Valor Mora	Total, Aportes	Nro. Planilla
202208	19/09/2022	369.100	0	369.100	61520932
202209	01/11/2022	439.000	5.100	444.100	62930679
202210	24/01/2023	20.000	1.400	21.400	25401101
202210	01/11/2022	328.000	0	328.000	62935184
202211	06/12/2022	328.000	0	328.000	63795780
202212	11/01/2023	250.800	0	250.800	64728006
202301	02/03/2023	250.400	3.900	254.300	66000634
202302	13/03/2023	205.600	0	205.600	66294606
202302	14/03/2023	46.400	0	46.400	66299751
202302	29/03/2023	156.000	2.300	158.300	66604901
202303	25/04/2023	452.800	2.300	455.100	67280955
202303	25/04/2023	46.400	300	46.700	67304170
202304	23/05/2023	499.200	3.000	502.200	67902960
202305	23/05/2023	418.800	0	418.800	67903108
Totales=======>>>>>		3.810.500	18.300	3.828.800	

Se le aclara al peticionario que, los datos aquí suministrados, **pertenecen a la vigencia requerida por el peticionario (202208 hasta 202305)**, donde la relación de los aportes recibidos, son los que el aportante ha declarado por ellos mismos en el pago de los aportes pilas recibidos; valores sobre los cuales podría surgir cualquier inconsistencia, una vez la Caja aplique su función de verificación en el pago de los aportes del 4%, por medio del cual se hace el control de las contribuciones parafiscales de la protección social; en esta función de verificación se pueden encontrar inconsistencias en sus aportes por algún trabajador, generándose entonces una Inexactitud u Omisión; lo cual traería como consecuencia el cobro de esa cartera por inexactitud u omisión. Esto según Decreto 3033 de 2013, y resolución 1702 de 2021

Este certificado se expide para fines netamente fiscales, en el cual se hace constar que el empleador pagó determinado monto de aportes en los periodos que aquí se especifican, sin que por eso se convierta en paz y salvo para efectos de afiliarse a otras Cajas de Compensación. Se expide sin perjuicio de las acciones y competencias de determinación y cobro de aportes por parte de las administradoras y la UGPP. Este certificado no es válido para efecto de afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

La anterior constancia se expide a solicitud del señor, **Elsa María Ruedas Landinez**, en su calidad de representante legal de **"ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENERIA S.A.S"** con Nit, **901.254.479-2**, a los 22 días del mes de septiembre de 2023, teniendo en cuenta lo requerido en la **PQR ID: 174048**.

MARISOL MORENO MUÑOZ

Proyecto: Kelly barba

Revisó: Laura Mestra

Aprobó: Madyn Morales
Líder de Aportes

VIGILADO SuperSubsidio

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: GUSTAVO DAVID POLO SOTO C.C 10.778.969 CARGO: CONDUCTOR DE INTERVENTORÍA

En fecha 15 del mes de septiembre del año 2022, finaliza el contrato laboral celebrado con **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **GUSTAVO DAVID POLO SOTO** identificado con la cédula de ciudadanía **10.778.969.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

Gustavo David Polo Soto
TRABAJADOR
NOMBRE: Gustavo David Polo Soto
C.C: 10778969

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
NIT: 901.254.479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: AHIMELEC DANIEL GONZALEZ SANCHEZ C.C1.042.350.367 CARGO: TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA

En fecha 30 del mes de septiembre del año 2022, finaliza el contrato laboral celebrado con ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, con NIT 901.254.479-2 y AHIMELEC DANIEL GONZALEZ SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía 1.042.350.367.

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

x

TRABAJADOR
NOMBRE: Ahimelec
C.C: 1042350367

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
NIT: 901.254.479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: MARCOS DAVID RICARDO CASTRILLON C.C 1.233.346.220 CARGO: CADENERO DE INTERVENTORIA

En fecha 28 del mes de febrero del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado con **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **MARCOS DAVID RICARDO CASTRILLON** identificado con la cédula de ciudadanía **1.233.346.220.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

Marcos Ricardo Castrillon
TRABAJADOR
NOMBRE: Marcos Ricardo Castrillón
C.C: 1233346220

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
NIT: CC37734541
NIT 901254479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: DIANA MILENA SANCHEZ ORTEGA C.C 49.664.633 CARGO: INSPECTORA INTERVENTORIA

En fecha 28 del mes de febrero del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **DIANA MILENA SANCHEZ ORTEGA** identificada con la cédula de ciudadanía **49.664.633.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Diana Milena Sanchez
C.C: 49.664.633

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
NIT: 37.939.591
NIT 901 254479-2.

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ C.C 37.934.541 CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y COORDINADOR SG-SST

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ** identificada con la cédula de ciudadanía **37.934.541.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
C.C: 37934541

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L
NIT CC 37934541
NIT 901.254.479-2.

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: VÍCTOR DANIEL CASTRO SALAZAR C.C 10.524.225 CARGO: ESPECIALISTA EN VÍAS

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **VÍCTOR DANIEL CASTRO SALAZAR** identificado con la cédula de ciudadanía **10.524.225.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Victor Daniel Castro
C.C: 10.254.225

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L
NIT: 901.254.479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: ELKIN ROJAS ANAYA C.C 11.039.041 CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **ELKIN ROJAS ANAYA** identificado con la cédula de ciudadanía **11.039.041.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Elkin Rojas A.
C.C: 11039041

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda
NIT: 901.254.479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: SANDRA MILENA GARNICA CÁRDENAS C.C 63.501.152 CARGO: CONTADORA

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **SANDRA MILENA GARNICA CÁRDENAS** identificada con la cédula de ciudadanía **63.501.152.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Sandra Milena Garnica
C.C: 63501152

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
NIT: 901254479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: YANETH PATRICIA RUEDA LANDINEZ C.C 51.935.750 CARGO: ABOGADA

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **YANETH PATRICIA RUEDA LANDINEZ** identificada con la cédula de ciudadanía **51.935.750.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Yaneth Patricia Rueda L.
C.C: 51.935.750

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
NIT: 901.254.479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: FARYTH STEVAN ALVAREZ RUIZ C.C 1.101.692.175 CARGO: TOPÓGRAFO

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con NIT **901.254.479-2** y **FARYTH STEVAN ALVAREZ RUIZ** identificado con la cédula de ciudadanía **1.101.692.175.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

Faryth Stevan Alvarez Ruiz

TRABAJADOR

NOMBRE: Faryth Stevan Alvarez R

C.C: 1101692175

EMPLEADOR

NOMBRE: Elsa Maria Rueda L

NIT: 901254479-2.

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: JANITH SULAY JAIMES PABON C.C 1.102.359.339 CARGO: SECRETARIA

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **JANITH SULAY JAIMES PABON** identificada con la cédula de ciudadanía **1.102.359.339.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Janith Sulay Jaimes P.
C.C: 1102359339

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L
NIT: 901254479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: JUAN CARLOS CORTES PRADILLA C.C 91.205.817 CARGO: CONDUCTOR

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **JUAN CARLOS CORTES PRADILLA** identificado con la cédula de ciudadanía **91.205.817.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Juan Carlos Cortés
C.C: 91.205.817

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L.
NIT: CC 37934541
NIT 901.254.479-2

INFORMACION TRABAJADOR

TRABAJADOR: OLGA LUCIA RUEDA LANDINEZ C.C 37.934.481 CARGO: CADENERA

En fecha 04 del mes de mayo del año 2023, finaliza el contrato laboral celebrado entre **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** con **NIT 901.254.479-2** y **OLGA LUCIA RUEDA LANDINEZ** identificada con la cédula de ciudadanía **37.934.481.**

Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

CONCEPTO
SALARIO
CESANTIAS:
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES (BONO ALIMENTOS)

El trabajador firma el presente documento como señal de asentimiento y prueba de que ha recibido a satisfacción cada uno de los conceptos señalados.

TRABAJADOR
NOMBRE: Olga Lucia R
C.C: 37934981

EMPLEADOR
NOMBRE: Elsa Maria Rueda L
NIT: 901254979-2.
