**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.**
**ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE OBRA**

| Código: SPD-S-01 | Versión: 01 | Fecha emisión: 13-12-2023 | Página: 1 de 1 | DOCUMENTO CONTROLADO |
|---|---|---|---|---|

| ACTA DE PAGO: N1 | PARCIAL: N1 | FINAL: | SUPERVISIÓN: JHON HERWIS HERRERA | INTERVENTORIA: MARCO JULIO SUESCUN |
|---|---|---|---|---|

| INFORMACION DEL CONTRATO | PÓLIZAS Y GARANTÍAS | | | PLAZOS | ACTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO : REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 | NOMBRE: | COSTO: | VIGENCIA: | Fecha de Iniciación: 21/09/2023<br>Plazo Inicial: CIENTO(3) MESES | Numero: 3<br>Valor Acta: $ 842.611.447 |
| CDP : 230006 | CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | $ 162.790.032,39 | 21/09/2023 AL 22/10/2024 | Fecha de Suspension : | Periodo del contrato: 21/09/2023 A 12/12/2023 |
| RP : 230006 | BUEN MANEJO ANTICIPO | $ 813.950.161,56 | 21/09/2023 AL 22/10/2024 | Fecha de Reinicio : | Fecha del acta: 15-ene-24 |
| Contrato No. : 004 DE 2023 | PAGO SALARIOS PRESTACIONES | $ 81.395.016,15 | 21/09/2023 AL 22/09/2027 | Dias de suspension : | CONTRATO |
| Contratista: AUGUSTO TELLEZ AYALA | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 488.370.096,90 | 21/09/2023 AL 22/09/2027 | Dias de Ampliacion : | Valor Inicial: $ 1.627.900.322,17 |
| Contratante: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P | | | | Fecha de Terminación Inicial : 20/01/2024 | Valor Adicional: N/A |
| Supervisora: JHON HERWIS HERRERA | OTRAS: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 162.790.032,30 | POR 5 AÑOS APARTIR DEL ACTA FINAL | Fecha de Terminación Final : | Valor Total: $ 1.627.900.322,17 |
| | | | | Plazo Final: CIENTO(3) MESES | Valor Anticipo: 50% $ 813.950.161,09 |

| | Descripción | CONS. INICIALES CONTRACTUALES | | | | MODIFICATORIA | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION Y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cantidad | Valor Parcial | Cantidad | Valor Parcial |
| 1,00 | CAPITULO: PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN | | | | $ 4.403.083,18 | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | Ml | 86,14 | $ 10.125,00 | $ 872.167,50 | 0,42 | $ 4.252,50 | 86,56 | $ 876.420,00 | 86,56 | $ 876.420,00 | 0,42 | $ 4.252,50 |
| 1,2 | Señalizacion preventiva con tela PP | Ml | 168,28 | $ 13.236,00 | $ 2.492.074,08 | 0,84 | $ 11.118,24 | 169,12 | $ 2.503.192,32 | 169,12 | $ 2.503.192,32 | 0,84 | $ 11.118,24 |
| 1,3 | Corte de anden y pavimento | Ml | 16,00 | $ 11.771,00 | $ 188.336,00 | -16,00 | $ 188.336,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 16,00 | $ 188.336,00 |
| 1,4 | Demolición de pavimento a mano | M2 | 4,80 | $ 49.472,00 | $ 237.465,60 | -4,80 | $ 237.465,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -4,80 | $ 237.465,60 |
| 1,5 | Demolición de anden a mano hasta 10 cm de espesor | M2 | 40,00 | $ 15.501,00 | $ 620.040,00 | -40,00 | $ 620.040,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -40,00 | $ 620.040,00 |
| 1,6 | Manejo de agua | M | 0,00 | $ 10.288,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,00 | CAPITULO: MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | $ 7.183.965,58 | | | | | | | | |
| 2,1 | Excavación a Mano entre 0-2m de Profundidad | M3 | 219,21 | $ 24.827,00 | $ 5.464.247,67 | -73,14 | $ 1.823.180,78 | 146,07 | $ 3.641.066,89 | 146,07 | $ 3.641.066,89 | -73,14 | $ 1.823.180,78 |
| 2,2 | Lleno compactado con material del sitio | M3 | 15,03 | $ 18.441,00 | $ 277.168,23 | -15,03 | $ 277.168,23 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -15,03 | $ 277.168,23 |
| 2,3 | Lleno compactado con material de prestamo | M3 | 18,28 | $ 77.820,00 | $ 1.422.549,60 | 18,28 | $ 1.422.549,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 18,28 | $ 1.422.549,60 |
| 3,00 | CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO | | | | $ 31.815.168,50 | | | | | | | | |
| 3,1 | Suministro e instalacion de Tuberia perfilada de PVC D=6 | Ml | 6,00 | $ 60.395,00 | $ 362.370,00 | -6,00 | $ 362.370,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -6,00 | $ 362.370,00 |
| 3,2 | Suministro e instalacion de Tuberia perfilada PVC D=12" | Ml | 18,00 | $ 158.807,00 | $ 2.858.526,00 | -18,00 | $ 2.858.526,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -18,00 | $ 2.858.526,00 |
| 3,3 | Suministro e instalacion de Silla Yee 12 x 6" | Un | 1,00 | $ 331.909,00 | $ 331.909,00 | -1,00 | $ 331.909,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -1,00 | $ 331.909,00 |
| 3,4 | Cámara + Cuerpo + Cono + Pesta?as D=1,2 m | Ml | 0,00 | $ 1.057.918,00 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,5 | Placa tapa camara en manhole polimerica | Un | 2,00 | $ 1.777.390,00 | $ 3.554.780,00 | -2,00 | $ 3.554.780,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -2,00 | $ 3.554.780,00 |
| 3,6 | Base y Cañuela | Un | 2,00 | $ 575.762,00 | $ 1.151.524,00 | -2,00 | $ 1.151.524,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -2,00 | $ 1.151.524,00 |
| | Sumidero transversal aguas lluvias en concreto | ml | 18,00 | $ 1.589.131,00 | $ 28.604.358,00 | -18,00 | $ 28.604.358,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -18,00 | $ 28.604.358,00 |
| 3,7 | Caja de inspección 80x80x80 | Un | 1,00 | $ 753.558,00 | $ 753.558,00 | -1,00 | $ 753.558,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -1,00 | $ 753.558,00 |
| 3,8 | Anden concreto simple E=0,07 | m2 | 144,85 | $ 98.710,00 | $ 14.298.143,50 | -144,85 | $ 14.298.143,50 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -144,85 | $ 14.298.143,50 |
| 4,00 | CAPITULO: PAVIMENTOS Y REPOSICIONES | | | | $ 185.495.977,66 | | | | | | | | |
| 4,1 | Pavimento rigido premezclado MR 42 Kg/cm2 e=200 mm | M2 | 450,32 | $ 194.000,00 | $ 87.362.080,00 | -450,32 | $ 87.362.080,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -450,32 | $ 87.362.080,00 |
| 4,2 | Sub base granular compactada e=20 cm | M3 | 90,06 | $ 200.625,00 | $ 18.066.299,50 | -90,06 | $ 18.066.299,50 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -90,06 | $ 18.066.299,50 |
| 4,3 | Sellado de junta de dilatación pavimento rígido incluye cordo | ML | 191,90 | $ 27.040,00 | $ 5.189.576,00 | -191,90 | $ 5.189.576,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -191,90 | $ 5.189.576,00 |
| 4,4 | Sardinel en concreto 3000 PSI 15* 15cm | Ml | 172,28 | $ 70.973,00 | $ 12.227.228,44 | -172,28 | $ 12.227.228,44 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -172,28 | $ 12.227.228,44 |
| 4,5 | Acero de refuerzo | Kg | 2224,04 | $ 9.553,00 | $ 21.246.254,12 | -2224,04 | $ 21.246.254,12 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -2224,04 | $ 21.246.254,12 |
| | Viga de transicion | ml | 22,00 | $ 180.000,00 | $ 3.960.000,00 | -22,00 | $ 3.960.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -22,00 | $ 3.960.000,00 |
| 4,6 | Encamado triturado 3/4 | M3 | 5,31 | $ 174.810,00 | $ 927.179,10 | -5,31 | $ 927.179,10 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -5,31 | $ 927.179,10 |
| 3,9 | Suministro e instalacion de boota tacit alerta /o Guia de 40x40 (incluye soldo en concreto de 21 kips para soporte de boota) | Ml | 168,70 | $ 83.309,00 | $ 14.152.810,30 | -168,70 | $ 14.152.810,30 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -168,70 | $ 14.152.810,30 |
| | Excavacion en arena | M | 137,95 | $ 17.000,00 | $ 2.345.150,00 | -137,95 | $ 2.345.150,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -137,95 | $ 2.345.150,00 |
| 5,00 | CAPITULO: OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS | | | | $ 122.823.192,71 | | | | | | | | |
| 5,1 | Pilote sin cunorete D=0,5 m | Ml | 168,00 | $ 171.000,00 | $ 28.728.000,00 | 0,00 | $ - | 168,00 | $ 28.728.000,00 | 168,00 | $ 28.728.000,00 | 0,00 | $ - |
| 5,2 | Acero de refuerzo pilotes | Kg | 2.706,07 | $ 9.553,00 | $ 25.870.162,71 | -6,01 | $ 57.413,53 | 2.702,08 | $ 25.812.779,18 | 2702,06 | $ 25.812.779,18 | -6,01 | $ 57.413,53 |
| | Viga de 0,50x0,50 m | ml | 31,75 | $ 650.000,00 | $ 17.462.500,00 | -5,00 | $ 2.750.000,00 | 26,75 | $ 14.712.500,00 | 26,75 | $ 14.712.500,00 | -5,00 | $ 2.750.000,00 |
| 5,3 | Perforacion pilotes | ml | 168,00 | $ 150.000,00 | $ 25.200.000,00 | 0,00 | $ - | 168,00 | $ 25.200.000,00 | 168,00 | $ 25.200.000,00 | 0,00 | $ - |
| 5,4 | Anden en voleadizo h=0,15 m L=0,78 m | M | 31,75 | $ 280.000,00 | $ 8.890.000,00 | -31,75 | $ 8.890.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -31,75 | $ 8.890.000,00 |
| | Suministro e instalacion de pasamos 16x16 cm x 1/2 (incluye perno* tuercas) | und | 19,00 | $ 115.000,00 | $ 2.185.000,00 | -19,00 | $ 2.185.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -19,00 | $ 2.185.000,00 |
| 5,5 | Baranda metalica | M | 31,75 | $ 450.000,00 | $ 14.287.500,00 | -31,75 | $ 14.287.500,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -31,75 | $ 14.287.500,00 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | CAPITULO: OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | | | | $ 14.224.350,00 | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Cargue y Retiro de Sobrantes (incluye permiso escombrera) | M3 | 787,33 | $ 50.367,00 | $ 14.224.350,00 | -92,44 | -$ 4.657.361,70 | 192,89 | $ 9.567.088,36 | 100,89 | $ 9.567.088,36 | -92,44 | -$ 4.657.361,70 | | |
| | OBRAS NO CONTRATADAS EJECUTADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTO DIRECTO TRAMO 1 | | | | $ 383.834.737,41 | | -$ 204.783.870,60 | | $ 111.041.606,75 | | $ 111.041.606,75 | | -$ 204.783.870,60 | | |
| Item | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUTO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-0 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cantidad | Valor Parcial | Cantidad | Valor Parcial | | |
| 1.00 | CAPITULO: PRELIMINARES Y SEÑALIZACION | | | | $ 37.318.478,94 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localizacion y replanteo | M | 97,79 | $ 10.125,00 | $ 935.448,75 | -0,89 | -$ 9.011,25 | 91,50 | $ 926.437,50 | 91,50 | $ 926.437,50 | -0,89 | -$ 9.011,25 | | |
| 1.2 | Señalizacion preventiva con tela PP | M | 202,78 | $ 13.236,00 | $ 2.683.996,08 | -1,78 | -$ 50.832,08 | 199,00 | $ 2.633.164,00 | 199,00 | $ 2.633.164,00 | -1,78 | -$ 50.832,08 | | |
| 1.3 | Corte de asfalto y pavimento | M | 18,00 | $ 11.271,00 | $ 202.878,00 | -18,00 | -$ 202.878,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -18,00 | -$ 202.878,00 | | |
| 1.4 | Demolición de pavimento a mano | M2 | 832,10 | $ 49.472,00 | $ 41.271.251,20 | 34,86 | $ 1.721.825,66 | 666,96 | $ 32.992.876,80 | 666,96 | $ 32.992.876,80 | 34,86 | $ 1.721.825,66 | | |
| 1.5 | Demolición de andén a mano hasta 10 cm de espesor | M2 | 94,69 | $ 15.601,00 | $ 1.466.394,69 | -94,69 | -$ 1.466.394,69 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -94,69 | -$ 1.466.394,69 | | |
| 1.6 | Manejo de aguas | M | 92,39 | $ 10.299,00 | $ 950.508,33 | -0,89 | -$ 9.156,33 | 91,50 | $ 941.352,00 | 91,50 | $ 941.352,00 | -0,89 | -$ 9.156,33 | | |
| 2.00 | CAPITULO: MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | $ 38.845.162,15 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion a Mano entre 0-2m de Profundidad | M3 | 460,36 | $ 24.927,00 | $ 11.699.736,72 | -21,62 | -$ 538.921,74 | 447,74 | $ 11.160.814,98 | 447,74 | $ 11.160.814,98 | -21,62 | -$ 538.921,74 | | |
| 2.2 | Llena compactado con material del sitio | M3 | 136,53 | $ 18.441,00 | $ 2.517.749,73 | -31,61 | -$ 571.855,41 | 105,52 | $ 1.945.894,32 | 105,52 | $ 1.945.894,32 | -31,61 | -$ 571.855,41 | | |
| 2.3 | Llena compactado con material de prestamo | M3 | 209,41 | $ 77.820,00 | $ 16.062.826,20 | -34,99 | -$ 2.722.921,86 | 171,42 | $ 13.339.904,40 | 171,42 | $ 13.339.904,40 | -34,99 | -$ 2.722.921,86 | | |
| 2.4 | Entibado en madera | M2 | 196,78 | $ 43.525,00 | $ 8.564.849,50 | -16,78 | -$ 730.349,50 | 180,00 | $ 7.834.500,00 | 180,00 | $ 7.834.500,00 | -16,78 | -$ 730.349,50 | | |
| 3.00 | CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO | | | | $ 81.629.448,63 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalacion de Tuberia perfilada de PVC D=6" | M | 60,00 | $ 60.395,00 | $ 3.968.070,00 | 7,00 | $ 422.765,00 | 73,00 | $ 4.408.835,00 | 73,00 | $ 4.408.835,00 | 7,00 | $ 422.765,00 | | |
| 3.2 | Suministro e instalacion de Tuberia perfilada PVC D=12" | M | 98,39 | $ 158.807,00 | $ 15.625.020,73 | -0,89 | $ 141.338,23 | 97,50 | $ 15.483.682,50 | 97,50 | $ 15.483.682,50 | -0,89 | $ 141.338,23 | | |
| 3.3 | Suministro e instalacion de Silla Yee 12" x 6 | Un | 11,00 | $ 331.909,00 | $ 3.650.999,00 | 2,00 | $ 663.818,00 | 13,00 | $ 4.314.817,00 | 13,00 | $ 4.314.817,00 | 2,00 | $ 663.818,00 | | |
| 3.4 | Cámara + Cuerpo + Cono + Pretalud D=1,2 m | M | 3,70 | $ 1.057.918,00 | $ 3.914.296,60 | 3,70 | -$ 3.914.296,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 3,70 | -$ 3.914.296,60 | | |
| 3.5 | Placa tapa cámara en manhole polimerico | Un | 2,00 | $ 1.777.390,00 | $ 3.554.780,00 | -2,00 | -$ 3.554.780,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -2,00 | -$ 3.554.780,00 | | |
| 3.6 | Base y Cañuela | Un | 2,00 | $ 575.762,00 | $ 1.151.524,00 | -2,00 | -$ 1.151.524,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -2,00 | -$ 1.151.524,00 | | |
| 3.7 | Caja de inspección Ref.Ø60 | Un | 11,00 | $ 753.558,00 | $ 8.289.138,00 | 11,00 | -$ 8.289.138,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -11,00 | -$ 8.289.138,00 | | |
| 3.8 | Andén concreto simple f'c=0,07 | m2 | 215,00 | $ 98.710,00 | $ 21.222.650,00 | -215,00 | -$ 21.222.650,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -215,00 | -$ 21.222.650,00 | | |
| 3.9 | Suministro e instalacion de boela tactil alerta Yo Guia de 40x40 | M | 86,00 | $ 83.399,00 | $ 7.172.314,00 | -86,00 | -$ 7.172.314,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -86,00 | -$ 7.172.314,00 | | |
| 3.10 | Locamiento en obra | M | 86,00 | $ 17.200,00 | $ 1.482.000,00 | -86,00 | -$ 1.482.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -86,00 | -$ 1.482.800,00 | | |
| 3.11 | Suministro transversal tipico Andén en concreto | m | 7,3 | $ 1.589.131,00 | $ 11.600.656,30 | -1,00 | -$ 1.589.131,00 | 6,30 | $ 10.011.525,30 | 6,30 | $ 10.011.525,30 | -1,00 | -$ 1.589.131,00 | | |
| 4.00 | CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION ACUEDUCTO | | | | $ 11.403.835,00 | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Tubería PVC PresiÓn D=8" E.L. RDE 21 | M | 96,00 | $ 61.997,00 | $ 5.331.312,00 | 4,00 | $ 247.988,00 | 90,00 | $ 5.579.300,00 | 90,00 | $ 5.579.300,00 | 4,00 | $ 247.988,00 | | |
| 4.2 | Acometida Domiciliaria PVC Previn 3"x12" | M | 33,00 | $ 90.701,00 | $ 2.993.133,00 | 0,00 | $ - | 33,00 | $ 2.993.133,00 | 33,00 | $ 2.993.133,00 | 0,00 | $ - | | |
| 4.3 | Valvula compuerta cierre 3" | Und | 1,00 | $ 905.317,00 | $ 905.317,00 | 1,00 | -$ 905.317,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -1,00 | -$ 905.317,00 | | |
| 4.4 | Caja para valvulas h.a.r con tapa en manhole polimerico | Und | 1,00 | $ 2.174.093,00 | $ 2.174.093,00 | -1,00 | -$ 2.174.093,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -1,00 | -$ 2.174.093,00 | | |
| 5.00 | CAPITULO: PAVIMENTOS Y REPOSICIONES | | | | $ 169.473.836,33 | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pavimento rígido premezclado MR 42 Kg/cm2 e=20(3 min | M2 | 511,70 | $ 194.000,00 | $ 99.269.800,00 | -241,70 | -$ 46.889.800,00 | 270,00 | $ 52.380.000,00 | 270,00 | $ 52.380.000,00 | -241,70 | -$ 46.889.800,00 | | |
| 5.2 | Sub base granular compactada e=20 cm | M3 | 107,34 | $ 205.875,00 | $ 22.552.425,50 | 5,66 | $ 1.165.669,50 | 108,00 | $ 21.669.100,00 | 108,00 | $ 21.669.100,00 | 5,66 | $ 1.165.669,50 | | |
| 5.3 | Sellado de junta de dilatación pavimento rígido incluye corte | ML | 280,50 | $ 27.040,00 | $ 7.855.120,00 | -290,50 | -$ 7.855.120,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -290,50 | -$ 7.855.120,00 | | |
| 5.4 | Sardinel en concreto 3000 PSI 15" 15 cm | M | 172,00 | $ 70.873,00 | $ 12.207.356,00 | -172,00 | -$ 12.207.356,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -172,00 | -$ 12.207.356,00 | | |
| 5.5 | Acero de refuerzo | Kg | 2.200,31 | $ 8.553,00 | $ 21.019.561,43 | -1218,18 | -$ 11.618.167,54 | 984,13 | $ 9.401.393,89 | 984,13 | $ 9.401.393,89 | -1218,18 | -$ 11.618.167,54 | | |
| 5.6 | Encamisado Intumido 3/4 | M3 | 34,44 | $ 174.810,00 | $ 6.021.968,40 | -1,54 | -$ 268.899,40 | 32,90 | $ 5.744.669,00 | 32,90 | $ 5.744.669,00 | -1,54 | -$ 268.899,40 | | |
| 5.7 | Viga de transicion | ml | 14,20 | $ 180.000,00 | $ 2.556.000,00 | -14,20 | -$ 2.556.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -14,20 | -$ 2.556.000,00 | | |
| 6.00 | CAPITULO: OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | | | | $ 32.046.478,74 | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Cargue y Retiro de Sobrantes (incluye permiso escombrera) | M3 | 836,07 | $ 50.382,00 | $ 32.046.478,74 | 32,71 | $ 1.647.995,22 | 868,78 | $ 33.694.473,96 | 868,78 | $ 33.694.473,96 | 32,71 | $ 1.647.995,22 | | |
| | OBRAS NO CONTRATADAS EJECUTADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTO DIRECTO TRAMO 2 | | | | $ 370.909.257,80 | | -$ 133.432.604,15 | | $ 237.476.653,65 | | $ 237.476.653,65 | | -$ 133.432.604,15 | | |
| Item | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-0 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cantidad | Valor Parcial | Cantidad | Valor Parcial | | |
| 1.00 | CAPITULO: PRELIMINARES Y SEÑALIZACION | | | | $ 40.234.537,30 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo | M | 92,34 | $ 10.125,00 | $ 934.942,50 | -0,54 | -$ 5.467,50 | 91,80 | $ 929.475,00 | 91,80 | $ 929.475,00 | -0,54 | -$ 5.467,50 | | |
| 1.2 | Señalización preventiva con tela PP | M | 202,68 | $ 13.236,00 | $ 2.682.672,48 | -1,08 | -$ 14.294,88 | 201,60 | $ 2.668.377,60 | 201,60 | $ 2.668.377,60 | -1,08 | -$ 14.294,88 | | |
| 1.3 | Corte de asfalto y pavimento | M | 18,00 | $ 11.271,00 | $ 202.878,00 | -18,00 | -$ 202.878,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -18,00 | -$ 202.878,00 | | |
| 1.4 | Demolición de pavimento a mano | M2 | 842,40 | $ 49.472,00 | $ 41.680.812,80 | 18,56 | $ 918.200,32 | 660,96 | $ 32.699.013,12 | 660,96 | $ 32.699.013,12 | 18,56 | $ 918.200,32 | | |
| 1.5 | Demolición de andén a mano hasta 10 cm de espesor | M2 | 237,80 | $ 15.501,00 | $ 3.687.037,80 | -154,98 | -$ 2.402.344,98 | 82,82 | $ 1.280.692,82 | 82,82 | $ 1.280.692,82 | -154,98 | -$ 2.402.344,98 | | |
| 1.6 | Manejo de aguas | M | 92,34 | $ 10.299,00 | $ 949.903,92 | -0,54 | -$ 5.555,52 | 91,80 | $ 944.438,40 | 91,80 | $ 944.438,40 | -0,54 | -$ 5.555,52 | | |
| 2.00 | CAPITULO: MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | $ 33.348.124,35 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavación a Mano entre 0-2m de Profundidad | M3 | 399,08 | $ 24.927,00 | $ 9.947.867,16 | -5,94 | -$ 148.066,38 | 393,14 | $ 9.799.800,78 | 393,14 | $ 9.799.800,78 | -5,94 | -$ 148.066,38 | | |
| 2.2 | Llena compactado con material del sitio | M3 | 105,39 | $ 18.441,00 | $ 1.961.937,99 | -22,41 | -$ 413.262,81 | 83,98 | $ 1.548.675,18 | 83,98 | $ 1.548.675,18 | -22,41 | -$ 413.262,81 | | |
| 2.3 | Llena compactado con material de prestamo | M3 | 184,21 | $ 77.820,00 | $ 12.778.822,20 | -39,28 | -$ 3.056.799,60 | 124,93 | $ 9.722.052,60 | 124,93 | $ 9.722.052,60 | -39,28 | -$ 3.056.799,60 | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Enrollado en madera | M2 | 196,08 | $ 42.525,00 | $ 8.360.497,00 | -31,44 | -$ 1.368.426,09 | 165,24 | $ 7.193.071,00 | 165,24 | $ 7.192.871,09 | -31,44 | $ (1.368.426,09) | | |
| 3,00 | CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO | | | | $ 383.183.678,65 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalacion de Tuberia perforada de PVC D=6 | Mt | 84,00 | $ 60.395,00 | $ 3.996.678,00 | 16,00 | $ 1.067.116,00 | 84,00 | $ 5.073.180,00 | 84,00 | $ 5.073.180,00 | 16,00 | $ 1.067.116,00 | | |
| 3.2 | Suministro e instalacion de Tuberia perforada PVC D=12" | Mt | 6,00 | $ 158.807,00 | $ 952.842,00 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 952.842,00 | 6,00 | $ 952.842,00 | 0,00 | $ - | | |
| | Suministro e instalacion de Tuberia perforada PVC D=18" | Mt | 90,34 | $ 278.167,00 | $ 25.135.730,68 | -0,54 | $ (150.216,19) | 91,80 | $ 25.535.730,68 | 91,80 | $ 25.535.730,68 | -0,54 | $ (150.216,19) | | |
| 3.3 | Suministro e instalacion de Silla Yee 36" x 6" | Un | 11,00 | $ 401.343,00 | $ 4.414.751,00 | 3,00 | $ 1.204.029,00 | 14,00 | $ 5.618.774,00 | 14,00 | $ 5.618.774,00 | 3,00 | $ 1.204.023,00 | | |
| 3.4 | Cámara + Cuerpo + Cono + Peldaños D= 1,2 m | Mt | 3,80 | $ 1.057.918,00 | $ 4.020.088,40 | -3,80 | $ (4.020.088,40) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -3,80 | $ (4.020.088,40) | | |
| 3.5 | Placa tapa cámara en marcheta prefabricada | Un | 2,00 | $ 1.777.396,00 | $ 3.554.792,00 | -2,00 | $ (3.554.792,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -2,00 | $ (3.554.792,00) | | |
| 3.6 | Sumi y Cañuela | Un | 2,00 | $ 575.762,00 | $ 1.151.524,00 | -2,00 | $ (1.151.524,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -2,00 | $ (1.151.524,00) | | |
| 3.7 | Caja de inspección (Sin Bordillo) | Un | 11,00 | $ 753.558,00 | $ 8.289.138,00 | -3,00 | $ (2.260.674,00) | 8,00 | $ 6.028.464,00 | 8,00 | $ 6.028.464,00 | -3,00 | $ (2.260.674,00) | | |
| 3.8 | Anden concreto simple E=0,07 | m2 | 226,95 | $ 98.710,00 | $ 22.313.395,50 | -226,95 | $ (22.313.395,50) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -226,95 | $ (22.313.395,50) | | |
| 3.9 | Suministro e instalacion de rejilla tactil alerta ylo guia de | Mt | 176,00 | $ 83.399,00 | $ 14.678.224,00 | -176,00 | $ (14.678.224,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -176,00 | $ (14.678.224,00) | | |
| 3.1 | Encamado en arena | M3 | 176,00 | $ 17.000,00 | $ 2.992.000,00 | -176,00 | $ (2.992.000,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -176,00 | $ (2.992.000,00) | | |
| 3.11 | Sumidero transversal aguas lluvias en concreto | ml | 7,00 | $ 1.589.131,00 | $ 11.123.917,00 | 0,20 | $ 317.826,20 | 7,20 | $ 11.441.743,20 | 7,20 | $ 11.441.743,20 | 0,20 | $ 317.826,20 | | |
| 4,00 | CAPITULO: PAVIMENTOS Y REPOSICIONES | | | | $ 305.079.879,44 | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pavimento rigido premezclado MR 42 kg/cm2 e= 200 mm | M2 | 842,40 | $ 184.500,00 | $ 124.829.868,00 | -311,97 | $ (60.512.480,00) | 330,48 | $ 64.113.170,00 | 330,48 | $ 64.113.170,00 | -311,97 | $ (60.512.480,00) | | |
| 4.2 | Sub base granular compactado e=20 cm | M3 | 139,48 | $ 200.823,00 | $ 25.801.996,00 | 3,72 | $ 747.069,00 | 132,20 | $ 26.549.065,00 | 132,20 | $ 26.549.065,00 | 3,72 | $ 747.069,00 | | |
| 4.3 | Sellado de junta de dilatacion pavimento rigido vertaje asfalto | ML | 289,80 | $ 27.040,00 | $ 7.836.192,00 | -289,80 | $ (7.836.192,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -289,80 | $ (7.836.192,00) | | |
| 4.4 | Sardinel en concreto 3000 PSI 15* 15 cm | M | 176,00 | $ 70.971,00 | $ 12.491.248,00 | -176,00 | $ (12.491.248,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -176,00 | $ (12.491.248,00) | | |
| 4.5 | Acero de refuerzo | Kg | 2618,09 | $ 9.553,00 | $ 25.774.758,24 | -1551,48 | $ (14.821.288,44) | 3146,60 | $ 30.953.469,80 | 3146,60 | $ 30.953.469,80 | 1551,48 | $ (14.821.288,44) | | |
| 4.6 | Encofrado incluido 3/4 | M2 | 34,42 | $ 174.810,00 | $ 6.010.675,20 | 0,98 | $ 171.117,80 | 35,40 | $ 6.181.794,00 | 35,40 | $ 6.181.794,00 | 0,98 | $ 171.117,80 | | |
| | Viga de transicion | ml | 14,00 | $ 180.000,00 | $ 2.520.000,00 | -14,00 | $ (2.520.000,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | -14,00 | $ (2.520.000,00) | | |
| 6,00 | CAPITULO: OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | | | | $ 32.149.761,84 | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Cargue y Retiro de Sobrantes (incluye permiso sitio botra) | M3 | 638,12 | $ 50.382,00 | $ 32.149.761,84 | -21,36 | $ 1.076.361,05 | 616,76 | $ 31.073.400,79 | 616,76 | $ 31.073.400,79 | -21,36 | $ (1.076.361,05) | | |
| | OBRAS NO CONTRATADAS EJECUTADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTO DIRECTO TRAMO 3 | | | | $ 413.859.784,61 | | -$ 153.500.184,92 | | $ 286.305.579,69 | | $ 286.305.579,69 | | -$ 153.500.184,92 | | |
| | TOTAL COSTO DIRECTOS | | | | 1.150.589.795,82 | | -341.706.459,73 | | 808.823.300,09 | | 808.823.300,09 | | -341.706.459,73 | | |
| | ADMINISTRACION | | | 18,40% | $ 306.767.461,79 | | $ -152.881.674,56 | | $ 172.905.817,23 | | $ 172.905.817,23 | | $ -153.861.674,56 | | |
| | IMPREVISTOS | | | 1% | $ 11.505.897,60 | | $ 5.417.664,60 | | $ 6.088.233,00 | | $ 6.088.233,00 | | $ -5.417.664,60 | | |
| | UTILIDAD | | | 5% | $ 103.553.078,38 | | $ -48.758.981,38 | | $ 54.794.097,01 | | $ 54.794.097,01 | | $ -48.758.981,38 | | |
| | IVA | | | | $ 15.917.001,91 | | | | | | - | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | $ 17.540.602,77 | | | | | | - | | | | |
| | PGIO | | | | $ 4.026.803,00 | | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | COSTO TOTAL | | | | $ 1.627.900.322,17 | | -749.804.788,26 | | $ 842.611.447,33 | | $ 842.611.447,33 | | -785.280.874,84 | | |

Observaciones

| | |
|---|---|
| Valor Total Presente Acta: | $ 842.611.447,33 |
| [-] Amortización Anticipo(50%): | $ 813.950.161,09 $ 421.305.723,67 |
| VALOR NETO A PAGAR: | $ 421.305.723,67 |

| BALANCE CONTRATO | | | BALANCE ANTICIPO | | | BALANCE OBRA (S) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato: | $ 1.627.900.322,17 | | Valor Inicial Anticipo: | $ 813.950.161,09 | | % OBRAS CONTRACTUALES | $ 1.627.900.322 | 100% |
| Anticipo de 50% | | $ 813.950.161,09 | | | | | | |
| Valor Actas Anteriores: | | $ - | Amortizacion Acumulada: | | | % OBRA EJECUTADA | 51,76% | |
| Presente acta : | | $ 421.305.723,67 | Amortizacion Esta Acta: | | $ 421.305.723,67 | % OBRAS POR EJECUTAR | 48,24% | |
| Saldo del Contrato: | | $ 392.644.437,42 | Saldo del Anticipo: | | $ 392.644.437,42 | SUMAS IGUALES | 100,00% | 100% |
| Sumas Iguales: | $ 1.627.900.322,17 | $ 1.627.900.322,17 | Sumas Iguales | $ 813.950.161,09 | $ 813.950.161,09 | FECHA DE BALANCE | 15/12/2023 | |

CONTRATISTA: ALVARO TELLEZ AYALA
Obra: II Etapa/Pantoria __

SUPERVISOR: JESUS HERWIS HERRERA Cargo: Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios
EPQ S.A E.S.P.

INTERVENTOR: MARCO JULIO SUEZCUN
Contrato No.004 - 2023







Powered by CamScanner

# AUGUSTO TELLEZ AYALA

**AUGUSTO TELLEZ AYALA NIT 7553741**
**No somos Gran Contribuyente**
**No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA**
**No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios**

## Factura Electrónica de Venta AUT - 69

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053299502 de 08/08/2023 - 08/02/2024 autoriza AUT-58 a AUT-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 15/12/2023 17:33 |
| Fecha de Vencimiento | 15/12/2023 17:33 |
| Fecha de Validación | 15/12/2023 17:33 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | AUGUSTO TELLEZ AYALA |
| CC | 7553741 |
| Obligación | IVA |
| Email | atain1012@yahoo.com |
| Teléfono | 3157805442 |
| Dirección | BRR VILLA JIMENA MZ 1 CA 9 ET 2 |
| Ciudad, Depart. | ARMENIA, QUINDIO (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | EMPRESA PUBLICAS DEL QUINDIO |
| NIT | 800063823 |
| Obligación | IVA |
| Email | opertiva@esaquin.gov.co |
| Teléfono | 7441774 |
| Dirección | CR 14 22 30 |
| Ciudad, Depart. | ARMENIA, QUINDIO (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | contrato de obra No 004 de 2023 acta No 1 costo Directo | 1.0 | EA | $608,823,300.09 | | $608,823,300.09 | $608,823,300.09 |
| 2 | 141 | Administracion28.40% | 1.0 | EA | $172,905,817.23 | | $172,905,817.23 | $172,905,817.23 |
| 3 | 142 | Imprevistos1% | 1.0 | EA | $6,088,233.00 | | $6,088,233.00 | $6,088,233.00 |
| 4 | 143 | Utilidad 9% | 1.0 | EA | $54,794,097.01 | | $54,794,097.01 | $54,794,097.01 |

4

| | |
|---|---|
| Subtotal | $842,611,447.33 |
| Total a Pagar | $842,611,447.33 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b52efb269f240957d4b4c0a84bf7f0162bb20df2b816c8114a61cfbef7100db22dbdfcd9092aab8ddd2cf030f447c2f8
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Powered by CamScanner


## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

### PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 1,1 | Localización y replanteo | | | | | | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CALLE 9 ENTRE CRA 6 Y 7 | | | 86,56 | | 86,56 | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| | | | | | | | 86,56 | | |
| TOTAL | | | | | | | **86,56** | | |



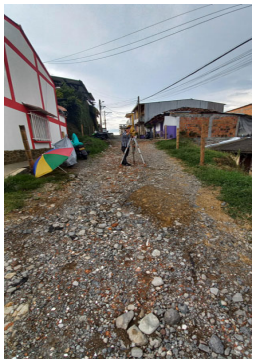

EL CONTRATISTA: 0,00 V°B° INTERVENTOR:

Firma:

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | 21/09/2023 | **A** | 15/12/2023 |
| **OBRA** | **REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003** | | | | |
| **CONTRATISTA** | **AUGUSTO TELLEZ AYALA** | | | | |

| **ITEM** | **1,2** | **Señalizacion preventiva con tela PP** | | | | | | | **UNIDAD** | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **EJE** | **DIMENSIONES** | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL ACUMULADO** | **OBSERVACION** | **ESQUEMA** | |
| | | **h** | **Ancho** | **long** | **Unidades** | | | | | |
| | CALLE 9 ENTRE CRA 6 Y 7 LONGITUDINAL | | | 86,56 | 2,00 | 173,12 | 173,12 | | | |
| | CALLE 9 ENTRE CRA 6 Y 7 TRASVERSAL | | | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| | | | | | | | 189,12 | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **189,12** | | | |



**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023623730003 | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 2,1 | Excavación a mano entre 0-2 mts de profundidad | | | | | | | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | | |
| | BRECHA SUMIDERO | 1,80 | 0,95 | 18,00 | | | 0,00 | | | |
| | DOMICILIARIA | 1,00 | 0,70 | 4,20 | 1,00 | | 0,00 | | | |
| | CAJEO DE VIA CALLE 9 | 0,20 | 5,30 | 86,560 | | 91,75 | 91,75 | | | |
| | PERFILADA TALUD | 1,50 | 1,00 | 31,750 | | 47,63 | 139,38 | | | |
| | VIGA CABEZAL | 0,50 | 0,50 | 26,75 | | 6,69 | 146,07 | | | |
| | VIGA TRANSICIÓN CRA 6 | 0,40 | 0,40 | 5,20 | | | 146,07 | | | |
| | VIGA TRANSICIÓN CRA 7 | 0,40 | 0,40 | 5,20 | | | 146,07 | | | |
| | MEJORAMIENTO RASANTE | 0,15 | 5,00 | 45,07 | | | 146,07 | | | |
| | CAJA INSPECCIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| | | | | | | | 146,07 | | | |
| TOTAL | | | | | | | **146,07** | | | |



**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |

| | |
|---|---|
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,1 | Pilote en concreto D=0,5 m | | | | | | | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | | |
| | CALLE 9 PILOTES | | | 8,00 | 21,000 | 168,00 | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | **168,00** | | | |







EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO**

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,2 | Acero de refuerzo pilotes | | | | | | | UNIDAD | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | kg/m | long | Unidades | | ACUMULADO | | | |
| | ACERO LONGITUDINAL (1/2") PILOTES | | 0,994 | 9,00 | 210,000 | 1878,66 | 1878,66 | | | |
| | ACERO ESPIRAL (@0.075) | 0,075 | 0,994 | 0,30 | 588,00 | 175,34 | 2054,00 | | | |
| | ACERO ESPIRAL (@0.225) | 0,0225 | 0,560 | 0,30 | 597,000 | 100,30 | 2154,30 | | | |
| | ACERO LONGITUDINAL (1/2") VIGA | | 0,994 | 31,000 | 8,000 | 246,51 | 2400,81 | | | |
| | ACERO TRASVERSAL VIGA (3/8") | | 0,560 | 1,850 | 277,000 | 286,97 | 2687,78 | | | |
| | TRASLAPOS ACERO LONGITUDINAL | | 0,560 | 0,500 | 51,000 | 14,28 | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | | | | | | | 2702,06 | | | |
| | TOTAL | | | | | | **2702,06** | | | |







**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,2,1 | Viga de 0,50x0,50 m | | | | | | | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | ACUMULADO | | | |
| | VIGA CABEZAL | | | 26,75 | | 26,75 | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| | | | | | | | 26,75 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 26,75 | | | |







EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,3 | Perforacion pilotes | | | | | | | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | ACUMULADO | | | |
| | CALLE 9 PILOTES | | | 8,00 | 21,000 | 168,00 | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| | | | | | | | 168,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | **168,00** | | | |



**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**


**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCION y MANEJO DE AGUA LLUVIAS CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA Q.UINDIO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 6,1 | Cargue y Retiro de Sobrantes (incluye permiso escombrera) | | | | | | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | DEMOLOCIÓN PAVIMENTO A MANO | 0,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | DEMOLICIÓN DE ANDEN A MANP | 0,15 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | CAJEO DE VIA CALLE 9 | 0,20 | 5,30 | 86,560 | | 91,75 | 91,75 | | |
| | PERFILADA TALUD | 1,50 | 1,00 | 31,750 | | 47,63 | 139,38 | | |
| | VIGA CABEZAL | 0,50 | 0,50 | 26,75 | | 6,69 | 146,07 | | |
| | VIGA TRANSICIÓN CRA 6 | 0,40 | 0,40 | 5,20 | | | 146,07 | | |
| | VIGA TRANSICIÓN CRA 7 | 0,40 | 0,40 | 5,20 | | | 146,07 | | |
| | MEJORAMIENTO RASANTE | 0,15 | 5,00 | 45,07 | | | 146,07 | | |
| | CAJA INSPECCIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 146,07 | | |
| | EXCVACIÓN MATERIAL DE SITIO | | | 0,00 | | | 146,07 | | |
| | BRECHA SUMIDERO | 1,80 | 0,95 | 18,00 | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| | | | | | | | 146,07 | | |
| TOTAL | | | | | | | 189,89 | | |







EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO**

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 1,1 | Localizacion y replanteo | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CARRERA 9 | | | 91,50 | | 91,50 | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| TOTAL | | | | | | | **91,50** | | |





0,00

**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

### PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 1,2 | Señalizacion preventiva con tela PP | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | CARRERA 9 | | | 91,50 | 2,00 | 183,00 | 183,00 | |
| | FRENTE CRA 9 | | | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| | | | | | | | 199,00 | |
| TOTAL | | | | | | | **199,00** | |

ESQUEMA










EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |

| | |
|---|---|
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 1,4 | DemoliciOn de pavimento a mano | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CARRERA 9 | | 7,41 | 90,00 | | 666,90 | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| | | | | | | | 666,90 | | |
| TOTAL | | | | | | | **666,90** | | |



EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO**

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 1,6 | Manejo de aguas | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CARRERA 9 | | | 91,50 | | 91,50 | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| | | | | | | | 91,50 | | |
| TOTAL | | | | | | | **91,50** | | |



**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO


| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 2,1 | Excavacion a Mano entre 0-2m de Profundidad | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES h | Ancho | long | Unidades | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARRERA 9 CAJEO DE VIA | 0,20 | 7,41 | 90,00 | | 133,38 | 133,38 | |
| | AICANTARILLADO ENTRE C23 Y C7 | 2,01 | 1,00 | 90,00 | | 180,90 | 314,28 | |
| | REPOSICIÓN ACUADUCTO | 0,80 | 0,70 | 90,000 | | 50,40 | 364,68 | |
| | ACOMETIDAS ALCANTARILLADO | 1,40 | 0,70 | 6,000 | 13,00 | 76,44 | 441,12 | |
| | CAJAS DE INSPECCIÓN | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 13,00 | | 441,12 | |
| | SUMIDERO | 1,50 | 0,70 | 6,30 | | 6,62 | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | | | | | | | 447,74 | |
| | TOTAL | | | | | | **447,74** | |

ESQUEMA


EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:



**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO**

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 2.2 | Lleno compactado con material del sitlo | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Area | long | Ancho | | | | |
| | ALCANTARILLADO ENTRE C23 Y C7 | 0,65 | 0,0710 | 90,00 | 1,00 | 52,11 | 52,11 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA |    |
| | REPOSICIÓN ACUADUCTO | 0,40 | 0,0046 | 90,00 | 0,70 | 24,79 | 76,90 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA | |
| | ACOMETIDAS ALCANTARILLADO | 0,55 | 0,018 | 6,000 | 0,70 | 28,63 | 105,52 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA AL RESULTADO SE MULTIPLICA POR 13 ACOMETIDAS | |
| | | | | | | | 105,52 | | |
| | | | | | | | 105,52 | | |
| | | | | | | | 105,52 |

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 2.3 | Lleno compactado con material de prestamo | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Area | long | Ancho | | | |
| | ALCANTARILLADO ENTRE C23 Y C7 | 1,20 | | 90,00 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA |
| | REPOSICIÓN ACUADUCTO | 0,40 | | 90,00 | 0,70 | 25,20 | 133,20 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA |
| | ACOMETIDAS ALCANTARILLADO | 0,70 | | 6,000 | 0,70 | 38,22 | 171,42 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA AL RESULTADO SE MULTIPLICA POR 13 ACOMETIDAS |
| | | | | | | | 171,42 | |
| | | | | | | | 171,42 | |
| | | | | | | | 171,42 |

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 2.4 | Entibado en madera | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | ENTRE C23 Y C7 | 2,00 | | 90,00 | | 180,00 | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| | | | | | | | 180,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | **180,00** | | |




EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 3,1 | Suministro e instalacion de Tuberla perfilada de PVC 0=6" | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CASA 1 | | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | |
| | CASA 2 | | | 6,00 | | 6,00 | 12,00 | | |
| | CASA 3 | | | 6,00 | | 6,00 | 18,00 | | |
| | CASA 4 | | | 6,00 | | 6,00 | 24,00 | | |
| | CASA 5 | | | 6,00 | | 6,00 | 30,00 | | |
| | CASA 6 | | | 6,00 | | 6,00 | 36,00 | | |
| | CASA 7 | | | 6,00 | | 6,00 | 42,00 | | |
| | CASA 8 | | | 6,00 | | 6,00 | 48,00 | | |
| | CASA 9 | | | 6,00 | | 6,00 | 54,00 | | |
| | CASA 10 | | | 6,00 | | 6,00 | 60,00 | | |
| | CASA 11 | | | 6,00 | | 6,00 | 66,00 | | |
| | CASA 12 | | | 3,50 | | 3,50 | 69,50 | | |
| | CASA 12''' | | | 3,50 | | 3,50 | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| | | | | | | | 73,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | **73,00** | | |





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 3.2 | Suministro e instalacion de Tuberia perfilada PVC D=12" | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | C23 Y C7 | | | 91,50 | | 91,50 | 91,50 | |
| | SUMIDERO | | | 6,00 | | 6,00 | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| | | | | | | | 97,50 | |
| TOTAL | | | | | | | **97,50** | |

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 3.3 | Suministro e instalacion de Silla Vee 12' x 6' | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CASA 1 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | CASA 2 | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | CASA 3 | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| | CASA 4 | | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | |
| | CASA 5 | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | |
| | CASA 6 | | | | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| | CASA 7 | | | | 1,00 | 1,00 | 7,00 | | |
| | CASA 8 | | | | 1,00 | 1,00 | 8,00 | | |
| | CASA 9 | | | | 1,00 | 1,00 | 9,00 | | |
| | CASA 10 | | | | 1,00 | 1,00 | 10,00 | | |
| | CASA 11 | | | | 1,00 | 1,00 | 11,00 | | |
| | CASA 12 | | | | 2,00 | 2,00 | 13,00 | | |
| | | | | | | | 13,00 | | |
| | | | | | | | 13,00 | | |
| | | | | | | | 13,00 | | |
| | TOTAL | | | | | | **13,00** | | |





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 3,11 | Sumidero transversal aguas liuvias en concreto | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | SUMIDERO CRA 9 | | | 6,30 | | 6,30 | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| | | | | | | | 6,30 | |
| TOTAL | | | | | | | 6,30 | |

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 4,1 | Tuberia PVC PresiOn D=3" E.L. RDE 21 | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | TUBERIA 3" | | | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | 90,00 | |
| TOTAL | | | | | | | **90,00** | |





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 4,2 | Acometida Domiciliaria PVC Presión 3"xl/2" | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CASA 1 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | CASA 2 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | | |
| | CASA 3 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 9,00 | | |
| | CASA 4 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 12,00 | | |
| | CASA 5 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | | |
| | CASA 6 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 18,00 | | |
| | CASA 7 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 21,00 | | |
| | CASA 8 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 24,00 | | |
| | CASA 9 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 27,00 | | |
| | CASA 10 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 30,00 | | |
| | CASA 11 | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 33,00 | | |
| | | | | | | | 33,00 | | |
| | | | | | | | 33,00 | | |
| | | | | | | | 33,00 | | |
| | | | | | | | 33,00 | | |
| | | | | | | | 33,00 | | |
| | | | | | | | 33,00 | | |
| | | | | | | | 33,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 33,00 | | |






EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,1 | Pavimento rigido premezclado MR 42 Kg/cm2 e=200 mm | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | CARRERA 9 | | 3,00 | 90,00 | | 270,00 | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| | | | | | | | 270,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 270,00 | |

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|


| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,2 | Sub base granular compactada e=20 cm | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | CARRERA 9 | 0,20 | 6,00 | 90,00 | | 108,00 | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| | | | | | | | 108,00 | |
| TOTAL | | | | | | | **108,00** | |

ESQUEMA



EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,5 | Acero de refuerzo | UNIDAD | KG |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | kg/m | long | Unidades | | | |
| | ACERO CAMARAS C23 | | | | | | | |
| | Barras #5 Longotudinal | 1,40 | 0,000 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Barras #3 Trasversal | 1,40 | 0,000 | 6,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ACERO CAMARAS C7 | | | | | | 0,00 | |
| | Barras #5 Longotudinal | 2,72 | 0,000 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Barras #3 Trasversal | 2,72 | 0,000 | 6,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ACERO SUMIDERO | | | | | | 0,00 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 2,65 | 0,969 | 6,30 | 8,00 | 129,47 | 129,47 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 2,10 | 0,994 | 6,30 | 2,00 | 26,30 | 155,77 | |
| | Barras #3 Trasversal | 2,43 | 0,560 | 6,30 | 8,00 | 68,58 | 224,36 | |
| | ACERO SARDINEL | | | | | | 224,36 | |
| | Barras #3 Longotudinal | 6,20 | 0,000 | | 36,00 | 0,00 | 224,36 | |
| | Barras #3 Trasversal | 0,50 | 0,000 | | 593,00 | 0,00 | 224,36 | |
| | VIGA DE TRANSICIÓN | | | | | | 224,36 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 1,00 | 0,994 | 3,00 | 4,00 | 23,86 | 248,21 | CANTIDAD SE X2 POR SER DOS VIGAS |
| | Barras #3 Trasversal | 1,20 | 0,560 | 3,00 | 5,00 | 20,16 | 268,37 | CANTIDAD SE X2 POR SER DOS VIGAS |
| | ACERO LOSA TAPA | | | | | | 268,37 | |
| | Barras #5 Longotudinal | 1,50 | 0,000 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 268,37 | DOBLE PARRILLA |
| | Barras #5 Trasversal | 1,30 | 0,000 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 268,37 | DOBLE PARRILLA |
| | ACERO REFUERZO LOSAS | | | | | | 268,37 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 2,00 | 0,994 | 3,40 | 15,00 | 101,39 | 369,76 | |
| | Barras #4 Trasversal | 2,00 | 0,994 | 2,80 | 18,00 | 100,20 | 469,96 | |
| | ACERO EJE TRASVERSAL | | | | | | 469,96 | |
| | Barras #4 Longotudinal | | 0,994 | 0,90 | 75,00 | 67,10 | 537,05 | |
| | PASADORES DE CARGA ENTRE (1"@0.3) | 25,00 | 3,978 | 0,35 | 10,00 | 348,08 | 885,13 | |
| | CANASTILLAS DOVELAS (GRAFIL 5MM) | | 0,22 | 75,00 | 6,00 | 99,00 | 984,13 | |
| | | | | | | | 984,13 | |
| | | | | | | | 984,13 | |
| | | | | | | | 984,13 | |
| | | | | | | | 984,13 | |
| TOTAL | | | | | | | 984,13 | |

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,6 | Encamado triturado 3/4 | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | C23 Y C7 | 0,2516 | 1,00 | 90,00 | | 22,64 | 22,64 | |
| | ACOMTIDAS ALCANTARILLADO | 0,2008 | 0,70 | 73,00 | | 10,26 | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| | | | | | | | 32,90 | |
| TOTAL | | | | | | | **32,90** | |

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO


| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|


| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 6,1 | Cargue y Retiro de Sobrantes (incluye permiso escombrera) | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Area | long | Unidades | | | |
| | EXCAVACION 0-2 CAJEO Y SUMIDERO | | | | | 140,00 | 140,00 | |
| | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO | 0,20 | 666,90 | | | 133,38 | 273,38 | |
| | DEMOLICIÓN DE ANDEN | 0,10 | 0,00 | | | 0,00 | 273,38 | |
| | TRITURADO | | | | | 32,90 | 306,28 | |
| | LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | | | | | 171,42 | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| | | | | | | | 477,70 | |
| TOTAL | | | | | | | 668,78 | |

ESQUEMA

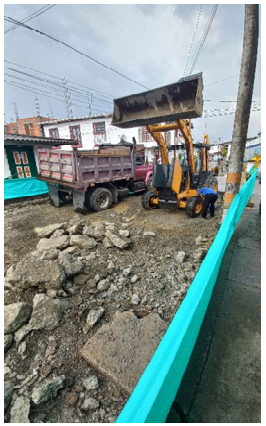

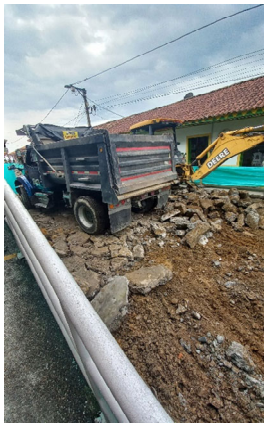

EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO**

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 1,1 | Localización y replanteo | | | | | | | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | ACUMULADO | | | |
| | CRA 8 | | | 91,80 | | 91,80 | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| TOTAL | | | | | | | **91,80** | | | |





**EL CONTRATISTA:** 0,00 **V°B° INTERVENTOR:**

**Firma:**

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | 21/09/2023 | **A** | 15/12/2023 |
| **OBRA** | **PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO** | | | | |
| **CONTRATISTA** | **AUGUSTO TELLEZ AYALA** | | | | |

| **ITEM** | **1,2** | **Señalizacion preventiva con tela PP** | | | | | | | **UNIDAD** | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **EJE** | **DIMENSIONES** | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **OBSERVACION** | **ESQUEMA** | |
| | | **h** | **Ancho** | **long** | **Unidades** | | **ACUMULADO** | | | |
| | CRA 8 LONGITUDINAL | | | 91,80 | 2,00 | 183,60 | 183,60 | | | |
| | CRA 8 TRASVERSAL | | | 9,00 | 2,00 | 18,00 | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| | | | | | | | 201,60 | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **201,60** | | | |



**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**


**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |

| | |
|---|---|
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |
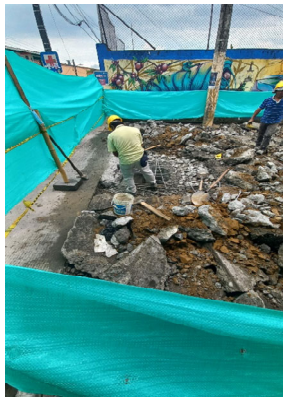
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | 1,4 | Demolición de pavimento a mano | | | | | | | UNIDAD | M2 |
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | | |
| | CRA 8 | | 7,200 | 91,80 | | 660,96 | 660,96 | |  |  |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | | | | | | 660,96 | | | |
| | | TOTAL | | | | | **660,96** | | | |

EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO |
|---|---|
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 1.5 | Demoliciàn de andén a mano hasta 10 cm de espesor | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CRA 8 MD | | 0,90 | 91,80 | | 82,62 | 82,62 | | |
| | CRA 8 MI | | 1,25 | 91,80 | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| | | | | | | | 82,62 | | |
| TOTAL | | | | | | | **82,62** | | |





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 1,6 | Manejo de aguas | | | | | | | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | ACUMULADO | | | |
| | CRA 8 | | | 91,80 | | 91,80 | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| | | | | | | | 91,80 | | | |
| TOTAL | | | | | | | **91,80** | | | |





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 2,1 | Excavaciôn a Mano entre 0-2m de Profundidad | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CARRERA 9 CAJEO DE VIA | 0,20 | 7,20 | 91,80 | | 132,19 | 132,19 | | |
| | ENTRE C1 Y C8 | 1,80 | 1,00 | 91,80 | | 165,24 | 297,43 | | |
| | ACOMETIDAS ALCANTARILLADO | 1,40 | 0,70 | 6,000 | 14,00 | 82,32 | 379,75 | | |
| | CAJAS DE INSPECCIÓN | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 8,00 | 5,83 | 385,58 | | |
| | SUMIDERO | 1,50 | 0,70 | 7,20 | | 7,56 | 393,14 | | |
| | | | | | | | 393,14 | | |
| | | | | | | | 393,14 | | |
| | | | | | |

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 2.2 | Lleno compactado con material del sitio | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Area | long | Ancho | | | | |
| | ENTRE C7 Y C8 | 0,65 | 0,0710 | 91,80 | 1,00 | 53,15 | 53,15 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA | |
| | ACOMETIDAS ALCANTARILLADO | 0,55 | 0,018 | 6,000 | 0,70 | 30,83 | 83,98 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA AL RESULTADO SE MULTIPLICA POR 14 ACOMETIDAS | |
| | | | | | | | 83,98 | | |
| | | | | | | | 83,98 | | |
| | | | | | | | 83,98 |

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 2.3 | Lleno compactado con material de prestamo | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Area | long | Ancho | | | |
| | ENTRE C7 Y C8 | 1,00 | 0,0710 | 91,80 | 1,00 | 85,28 | 85,28 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA |
| | ACOMETIDAS ALCANTARILLADO | 0,70 | 0,018 | 6,000 | 0,70 | 39,65 | 124,93 | VOLUMEN TOTAL - VOLUMEN DE AREA DE TUBERIA AL RESULTADO SE MULTIPLICA POR 14 ACOMETIDAS |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| | | | | | | | 124,93 | |
| TOTAL | | | | | | | **124,93** | |

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 2.4 | Entibado en madera | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CRA 8 | 1,80 | | 91,80 | | 165,24 | 165,24 | |  |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| | | | | | | | 165,24 | | |
| TOTAL | | | | | | | **165,24** | | |

EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 3,1 | Suministro e instalacion de Tuberla perfilada de PVC D=6 | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 6,00 | | 6,00 | 12,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 6,00 | | 6,00 | 18,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 6,00 | | 6,00 | 24,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 6,00 | | 6,00 | 30,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 6,00 | | 6,00 | 36,00 | |
| | CASA 1 | | | 6,00 | | 6,00 | 42,00 | |
| | CASA 2 | | | 6,00 | | 6,00 | 48,00 | |
| | CASA 3 | | | 6,00 | | 6,00 | 54,00 | |
| | CASA 4 | | | 6,00 | | 6,00 | 60,00 | |
| | CASA 5 | | | 6,00 | | 6,00 | 66,00 | |
| | CASA 6 | | | 6,00 | | 6,00 | 72,00 | |
| | CASA 7 | | | 6,00 | | 6,00 | 78,00 | |
| | CASA 8 | | | 6,00 | | 6,00 | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| | | | | | | | 84,00 | |
| TOTAL | | | | | | | **84,00** | |

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 3.2 | Suministro e instalacion de Tuberia perfilada PVC D=12' | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | SUMIDERO | | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 6,00 | |

ESQUEMA



EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | 21/09/2023 | **A** | 15/12/2023 |
| **OBRA** | **PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO** | | | | |
| **CONTRATISTA** | **AUGUSTO TELLEZ AYALA** | | | | |

| **ITEM** | **3.2.1** | **Suministro e instalacion de Tuberia perfilada PVC D=16"** | **UNIDAD** | ML |
|---|---|---|---|---|

| | **EJE** | **DIMENSIONES** | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL ACUMULADO** | **OBSERVACION** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **h** | **Ancho** | **long** | **Unidades** | | | |
| | CRA 8 EJE PRINCIPAL | | | 91,80 | | 91,80 | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| | | | | | | | 91,80 | |
| **TOTAL** | | | | | | | **91,80** | |

**ESQUEMA**



**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

**PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 3.3 | Suministro e instalacion de Silla Yee 16' x 6" | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 5,00 | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 6,00 | |
| | CASA 1 | | | 1,00 | | 1,00 | 7,00 | |
| | CASA 2 | | | 1,00 | | 1,00 | 8,00 | |
| | CASA 3 | | | 1,00 | | 1,00 | 9,00 | |
| | CASA 4 | | | 1,00 | | 1,00 | 10,00 | |
| | CASA 5 | | | 1,00 | | 1,00 | 11,00 | |
| | CASA 6 | | | 1,00 | | 1,00 | 12,00 | |
| | CASA 7 | | | 1,00 | | 1,00 | 13,00 | |
| | CASA 8 | | | 1,00 | | 1,00 | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| | | | | | | | 14,00 | |
| TOTAL | | | | | | | **14,00** | |

ESQUEMA





**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 3,7 | Caja de inspecciOn 80x80x80 | | | | | | | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACION | ESQUEMA | |
| | | h | Ancho | long | Unidades | | ACUMULADO | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 5,00 | | | |
| | HOSPITAL MENTAL | | | 1,00 | | 1,00 | 6,00 | | | |
| | CASA 1 | | | 1,00 | | 1,00 | 7,00 | | | |
| | CASA 2 | | | 1,00 | | 1,00 | 8,00 | | | |
| | CASA 3 | | | 1,00 | | | 8,00 | | | |
| | CASA 4 | | | 1,00 | | | 8,00 | | | |
| | CASA 5 | | | 1,00 | | | 8,00 | | | |
| | CASA 6 | | | 1,00 | | | 8,00 | | | |
| | CASA 7 | | | 1,00 | | | 8,00 | | | |
| | CASA 8 | | | 1,00 | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | **8,00** | | | |





**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 3,11 | Sumidero transversal aguas lluvias en concreto | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | SUMIDERO | | | 7,20 | | 7,20 | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| | | | | | | | 7,20 | | |
| TOTAL | | | | | | | 7,20 | | |





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 4,1 | Pavimento rIgido premezclado MR 42 Kg/cm2 e=200 mm | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | CRA 8 | | 3,60 | 91,80 | | 330,48 | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| | | | | | | | 330,48 | |
| TOTAL | | | | | | | 330,48 | |





EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 4,2 | Sub base granular compactada e=20 cm | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | | |
| | CRA 8 | 0,20 | 7,20 | 91,80 | | 132,19 | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| | | | | | | | 132,19 | | |
| TOTAL | | | | | | | **132,20** | | |



EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

**PAVIMENTACION V OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO V ACUEDUTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DEFILANDIA Q.UINDiO**

| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003 |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA |

| ITEM | 5,5 | Acero de refuerzo | UNIDAD | KG |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES h | kg/m | long | Unidades | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACERO CAMARAS C23 | | | | | | | |
| | Barras #5 Longotudinal | 1,90 | 0,000 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Barras #3 Trasversal | 1,90 | 0,000 | 6,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ACERO CAMARAS C7 | | | | | | 0,00 | |
| | Barras #5 Longotudinal | 1,90 | 0,000 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Barras #3 Trasversal | 1,90 | 0,000 | 6,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ACERO SUMIDERO | | | | | | 0,00 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 2,65 | 0,994 | 7,20 | 8,00 | 151,72 | 151,72 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 2,10 | 0,994 | 7,20 | 2,00 | 30,06 | 181,78 | |
| | Barras #3 Trasversal | 2,43 | 0,560 | 7,20 | 8,00 | 78,38 | 260,16 | |
| | ACERO SARDINEL | | | | | | 260,16 | |
| | Barras #3 Longotudinal | 6,20 | 0,000 | | 36,00 | 0,00 | 260,16 | |
| | Barras #3 Trasversal | 0,50 | 0,000 | | 593,00 | 0,00 | 260,16 | |
| | VIGA DE TRANSICIÓN | | | | | | 260,16 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 1,00 | 0,994 | 3,60 | 4,00 | 28,63 | 288,79 | CANTIDAD SE X2 POR SER DOS VIGAS |
| | Barras #3 Trasversal | 1,20 | 0,560 | 3,60 | 5,00 | 24,19 | 312,98 | CANTIDAD SE X2 POR SER DOS VIGAS |
| | ACERO LOSA TAPA | | | | | | 312,98 | |
| | Barras #5 Longotudinal | 1,50 | 0,000 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 312,98 | DOBLE PARRILLA |
| | Barras #5 Trasversal | 1,30 | 0,000 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 312,98 | DOBLE PARRILLA |
| | ACERO REFUERZO LOSAS | | | | | | 312,98 | |
| | Barras #4 Longotudinal | 2,00 | 0,994 | 3,40 | 20,00 | 135,18 | 448,17 | |
| | Barras #4 Trasversal | 2,00 | 0,994 | 3,80 | 18,00 | 135,98 | 584,15 | |
| | ACERO DE AMARRE EJE LONGITUDINAL (1/2"@1.2) | | 0,994 | 0,90 | 77,00 | 68,88 | 653,03 | |
| | PASADORES DE CARGA ENTRE (1"@0.3) | 23,00 | 3,978 | 0,35 | 12,00 | 384,27 | 1037,31 | |
| | CANASTILLAS DOVELAS (GRAFIL 5MM) | | 0,22 | 82,80 | 6,00 | 109,30 | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| | | | | | | | 1146,60 | |
| TOTAL | | | | | | | 1146,60 | |

ESQUEMA





**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**V°B° INTERVENTOR:**

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | | |

| ITEM | 4,6 | Encamado triturado 3/4 | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | C1 Y C2 | 0,2855 | 1,00 | 91,50 | | 26,12 | 26,12 | |
| | ACOMTIDAS ALCANTARILLADO | 0,2008 | 0,70 | 66,00 | | 9,28 | 35,40 | |
| | | | | | | | 35,40 | |
| | | | | | | | 35,40 | |
| | | | | | |

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 21/09/2023 | A | 15/12/2023 |
| OBRA | PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 7-8 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO | | | | |
| CONTRATISTA | AUGUSTO TELLEZ AYALA | | | | |

| ITEM | 6,1 | Cargue y Retiro de Sobrantes (incluye permiso escombrera) | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| | EJE | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | Ancho | long | Unidades | | | |
| | EXCAVACION 0-2 CAJEO Y SUMIDERO | | | | | 139,75 | 139,75 | |
| | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO | 0,20 | 660,96 | | | 132,19 | 271,94 | |
| | DEMOLICIÓN DE ANDEN | 0,10 | 82,62 | | | 8,26 | 280,21 | |
| | TRITURADO | | | | | 35,40 | 315,61 | |
| | LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | | | | | 124,93 | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| | | | | | | | 440,54 | |
| TOTAL | | | | | | | 616,76 | |

ESQUEMA




EL CONTRATISTA:

Firma:

V°B° INTERVENTOR:

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | villa jimena mzn 1 # 9 | ARMENIA-QUINDIO | 7406527 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 300432752 | 9459486937 | I | 2023/12/12 | 2023/11/27 | BANCOOMEVA S.A. | 0 | $496,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 7553741 | TELLEZ AYALA AUGUSTO | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS037 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,400,000** | **$224,000** | | | **$1,400,000** | **$175,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,400,000** | **$97,500** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$496,500** | **$0** | **$0** | **$496,500** |



2023/12/01 06:40 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | villa jimena mzn 1 # 9 | ARMENIA-QUINDIO | 7406527 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 195780506 | 9457228209 | I | 2023/10/10 | 2023/10/03 | BANCOOMEVA S.A. | 0 | $496,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 7553741 | TELLEZ AYALA AUGUSTO | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS037 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $97,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$496,500** | **$0** | **$0** | **$496,500** |



2023/10/03 03:11 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | villa jimena mzn 1 # 9 | ARMENIA-QUINDIO | 7406527 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-10 | 243860553 | 9458193613 | I | 2023/11/10 | 2023/10/30 | BANCOOMEVA S.A. | 0 | $496,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 7553741 | TELLEZ AYALA AUGUSTO | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS037 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,400,000** | **$224,000** | | | **$1,400,000** | **$175,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,400,000** | **$97,500** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$496,500** | **$0** | **$0** | **$496,500** |



2023/10/30 11:04 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | A - 200 O MAS COTIZANTES | OBRAS VARIAS | CALLE 22 N 13 54 | ARMENIA-QUINDIO | 7359106 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 60782281 | 9457611246 | Y | 2023/10/10 | 2023/10/18 | BANCO DE OCCIDENTE | 8 | $136,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 9730055 | EGUIS VIVAS ANDRES FELIPE | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1084251912 | ESTRADA BECERRA CARLOS ANDRES | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 0 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 24995870 | HERRERA LOPEZ CARMEN LORENA | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 0 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 7542170 | QUINTERO ARENAS CESAR AUGUSTO | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 0 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7541784 | SANCHEZ GALVEZ JUAN CARLOS | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 5)** | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,933,335 | $135,000 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $135,000 | $1,200 | $0 | $136,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $135,000 | $1,200 | $0 | $136,200 |
| **TOTAL** | | | | **5** | **$135,000** | **$1,200** | **$0** | **$136,200** |



2023/12/15 05:12 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | A - 200 O MAS COTIZANTES | OBRAS VARIAS | CALLE 22 N 13 54 | ARMENIA-QUINDIO | 7359106 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-10 | 67979638 | 9458759408 | Y | 2023/11/10 | 2023/11/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $404,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 9730055 | EGUIS VIVAS ANDRES FELIPE | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1084251912 | ESTRADA BECERRA CARLOS ANDRES | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 24995870 | HERRERA LOPEZ CARMEN LORENA | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 7542170 | QUINTERO ARENAS CESAR AUGUSTO | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7541784 | SANCHEZ GALVEZ JUAN CARLOS | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $5,800,000 | $404,000 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $404,000 | $0 | $0 | $404,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $404,000 | $0 | $0 | $404,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $404,000 | $0 | $0 | $404,000 |



2023/12/15 05:13 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | A - 200 O MAS COTIZANTES | OBRAS VARIAS | CALLE 22 N 13 54 | ARMENIA-QUINDIO | 7359106 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 43857613 | 9460283488 | Y | 2023/12/12 | 2023/12/14 | BANCO DE OCCIDENTE | 2 | $404,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 9730055 | EGUIS VIVAS ANDRES FELIPE | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1084251912 | ESTRADA BECERRA CARLOS ANDRES | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 24995870 | HERRERA LOPEZ CARMEN LORENA | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 7542170 | QUINTERO ARENAS CESAR AUGUSTO | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7541784 | SANCHEZ GALVEZ JUAN CARLOS | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $5,800,000 | $404,000 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $404,000 | $800 | $0 | $404,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $404,000 | $800 | $0 | $404,800 |
| TOTAL | | | | 5 | $404,000 | $800 | $0 | $404,800 |



2023/12/15 05:14 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | A - 200 O MAS COTIZANTES | OBRAS VARIAS | CALLE 22 N 13 54 | ARMENIA-QUINDIO | 7359106 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 58859894 | 9457543492 | E | 2023/10/10 | 2023/10/11 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | $313,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 16718999 | COLLAZOS VIVAS MARINO | 230201 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS037 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF43 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1098313210 | LOAIZA ROJAS CAMILA | 230301 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS037 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF43 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 16455263 | MAFLA SALAZAR JHON JAIRO | 231001 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS010 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF43 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 4564908 | ORTIZ MONROY JOSE IVAN | 230301 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS037 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF43 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 18497545 | PEREZ YUCUMA ALDEMAR | 230201 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS005 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF43 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 7549933 | SILVA PEÑA MAURICIO | 25-14 | 4 | $154,667 | $24,800 | ESSC62 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF43 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1096032852 | TORRES LOAIZA JAIDER | 230301 | 4 | $154,667 | $24,800 | ESSC62 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF43 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 7)** | | | | | $1,005,335 | $161,200 | | | $1,005,335 | $40,400 | | | $1,005,335 | $40,400 | | | $1,005,335 | $70,200 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $161,200 | $400 | $0 | $161,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $18,600 | $100 | $0 | $18,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $24,800 | $100 | $0 | $24,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $74,400 | $100 | $0 | $74,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $43,400 | $100 | $0 | $43,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $70,200 | $100 | $0 | $70,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $70,200 | $100 | $0 | $70,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $40,400 | $100 | $0 | $40,500 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 7 | $40,400 | $100 | $0 | $40,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $40,400 | $400 | $0 | $40,800 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $12,400 | $100 | $0 | $12,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $4,700 | $100 | $0 | $4,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $17,100 | $100 | $0 | $17,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $6,200 | $100 | $0 | $6,300 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$312,200** | **$1,000** | **$0** | **$313,200** |



2023/12/15 05:16 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | A - 200 O MAS COTIZANTES | OBRAS VARIAS | CALLE 22 N 13 54 | ARMENIA-QUINDIO | 7359106 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-11 | 67998734 | 9458760822 | E | 2023/11/10 | 2023/11/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $4,238,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 91478230 | ABAUNZA ARDILA JORGE ENRIQUE | 230201 | 18 | $696,000 | $111,400 | EPS002 | 18 | $696,000 | $27,900 | CCF43 | 18 | $696,000 | $27,900 | 14-11 | 18 | $696,000 | $48,500 | 18 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1098306276 | AGUIRRE MARTINEZ JUAN DAVID | 230201 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | EPS018 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF43 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | 14-11 | 27 | $1,044,000 | $72,700 | 27 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1007269396 | BENITEZ BENITEZ JUAN CAMILO | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS041 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 4423904 | CARDONA VANEGAS CARLOS ARTURO | 230201 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS037 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF43 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1072963523 | CASTRO HERRERA JOHAN SANTIAGO | 230201 | 12 | $464,000 | $74,300 | EPS005 | 12 | $464,000 | $18,600 | CCF43 | 12 | $464,000 | $18,600 | 14-11 | 12 | $464,000 | $32,300 | 12 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 16718999 | COLLAZOS VIVAS MARINO | 230201 | 10 | $386,667 | $61,900 | EPS041 | 10 | $386,667 | $15,500 | CCF43 | 10 | $386,667 | $15,500 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 10 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 15911653 | LADINO LARGO ANGELMIRO | | 0 | $0 | $0 | ESSC62 | 18 | $696,000 | $27,900 | CCF43 | 18 | $696,000 | $27,900 | 14-11 | 18 | $696,000 | $48,500 | 18 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1098313210 | LOAIZA ROJAS CAMILA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 4407276 | LOPEZ CASTAÑO ARLEY | 25-14 | 16 | $618,667 | $99,000 | ESSC62 | 16 | $618,667 | $24,800 | CCF43 | 16 | $618,667 | $24,800 | 14-11 | 16 | $618,667 | $43,100 | 16 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 17654478 | LOZADA GIRALDO ANGEL MARIA | 231001 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS041 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 16455263 | MAFLA SALAZAR JHON JAIRO | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 94462217 | MORA RODRIGUEZ JOSE ELIECER | 230301 | 12 | $464,000 | $74,300 | EPS041 | 12 | $464,000 | $18,600 | CCF43 | 12 | $464,000 | $18,600 | 14-11 | 12 | $464,000 | $32,300 | 12 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1005255384 | MORALES LOAIZA CARLOS MARIO | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS041 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF43 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1116443710 | OCORO VILLEGAS CRISTHIAN DAVID | 230301 | 18 | $696,000 | $111,400 | EPS037 | 18 | $696,000 | $27,900 | CCF43 | 18 | $696,000 | $27,900 | 14-11 | 18 | $696,000 | $48,500 | 18 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1005206955 | OLARTE TORRES CRISTIAN ADRIAN | 230201 | 6 | $232,000 | $37,200 | EPS041 | 6 | $232,000 | $9,300 | CCF43 | 6 | $232,000 | $9,300 | 14-11 | 6 | $232,000 | $16,200 | 6 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 4422666 | OROZCO LOPEZ JUAN BAUTISTA | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS010 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF43 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1143372303 | ORTEGA REYES JESUS DAVID | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS017 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 4564908 | ORTIZ MONROY JOSE IVAN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 18497545 | PEREZ YUCUMA ALDEMAR | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 9790053 | QUINTERO MUÑOZ JAVIER DE JESUS | 230301 | 21 | $812,000 | $130,000 | ESSC62 | 21 | $812,000 | $32,500 | CCF43 | 21 | $812,000 | $32,500 | 14-11 | 21 | $812,000 | $56,600 | 21 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 18469924 | RAMIREZ CEBALLOS ALVARO | 230201 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS037 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 18470766 | RESTREPO PALACIO JOSE GREGORIO | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS037 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1096645831 | RODRIGUEZ MURIEL JHON EDUAR | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS037 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 13466996 | SILVA MENDOZA LUIS ERNESTO | 230301 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS041 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF43 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-11 | 5 | $193,334 | $13,500 | 5 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 7549933 | SILVA PEÑA MAURICIO | 25-14 | 10 | $386,667 | $61,900 | ESSC62 | 10 | $386,667 | $15,500 | CCF43 | 10 | $386,667 | $15,500 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 10 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1095268099 | TANGARIFE CARDONA JHOJAN STEVEEN | 230301 | 6 | $232,000 | $37,200 | EPS018 | 6 | $232,000 | $9,300 | CCF43 | 6 | $232,000 | $9,300 | 14-11 | 6 | $232,000 | $16,200 | 6 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1096032852 | TORRES LOAIZA JAIDER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC62 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 1098312535 | YEPES ROJAS JUAN JOSE | 230301 | 21 | $812,000 | $130,000 | EPS005 | 21 | $812,000 | $32,500 | CCF43 | 21 | $812,000 | $32,500 | 14-11 | 21 | $812,000 | $56,600 | 21 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 28)** | | | **$13,340,005** | **$2,135,300** | | | **$14,036,005** | **$562,400** | | | **$14,036,005** | **$562,400** | | | **$14,036,005** | **$978,100** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 27 | $2,135,300 | $0 | $0 | $2,135,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $191,800 | $0 | $0 | $191,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $160,900 | $0 | $0 | $160,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 14 | $1,107,900 | $0 | $0 | $1,107,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $674,700 | $0 | $0 | $674,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 28 | $978,100 | $0 | $0 | $978,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 28 | $978,100 | $0 | $0 | $978,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 28 | $562,400 | $0 | $0 | $562,400 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 28 | $562,400 | $0 | $0 | $562,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 28 | $562,400 | $0 | $0 | $562,400 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | $147,100 | $0 | $0 | $147,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $49,500 | $0 | $0 | $49,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $1,600 | $0 | $0 | $1,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $130,200 | $0 | $0 | $130,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 7 | $57,500 | $0 | $0 | $57,500 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 2 | $51,100 | $0 | $0 | $51,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $27,900 | $0 | $0 | $27,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| **TOTAL** | | | | **28** | **$4,238,200** | **$0** | **$0** | **$4,238,200** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7553741 | | TELLEZ AYALA AUGUSTO | A - 200 O MAS COTIZANTES | OBRAS VARIAS | CALLE 22 N 13 54 | ARMENIA-QUINDIO | 7359106 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-12 | 43858137 | 9460282957 | E | 2023/12/12 | 2023/12/14 | BANCO DE OCCIDENTE | 2 | $6,206,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 91478230 | ABAUNZA ARDILA JORGE ENRIQUE | 230201 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS002 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF43 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-11 | 5 | $193,334 | $13,500 | 5 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1098306276 | AGUIRRE MARTINEZ JUAN DAVID | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS018 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1096646081 | BENITEZ CASTAÑO JUAN CARLOS | 230201 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS010 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF43 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 9790049 | BUITRAGO CESAR AUGUSTO | 25-14 | 9 | $348,000 | $55,700 | EPS010 | 9 | $348,000 | $14,000 | CCF43 | 9 | $348,000 | $14,000 | 14-11 | 9 | $348,000 | $24,300 | 9 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1096646642 | CARDONA ARIAS CRISTIAN | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | ESSC62 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1072963523 | CASTRO HERRERA JOHAN SANTIAGO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 11620584 | CUESTA URRUTIA HENRY | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS037 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 15908059 | DIAZ OROZCO JUAN GUILLERMO | 230201 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS005 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF43 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-11 | 15 | $580,000 | $40,400 | 15 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 5912672 | GONZALEZ ECHEVERRY GILDARDO ANTONIO | 230301 | 12 | $464,000 | $74,300 | EPS037 | 12 | $464,000 | $18,600 | CCF43 | 12 | $464,000 | $18,600 | 14-11 | 12 | $464,000 | $32,300 | 12 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 4376571 | GRANADOS TOVAR JOSE GREGORIO | 230301 | 23 | $889,334 | $142,300 | EPS037 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF43 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-11 | 23 | $889,334 | $61,900 | 23 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 15911653 | LADINO LARGO ANGELMIRO | | 0 | $0 | $0 | ESSC62 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF43 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1098313210 | LOAIZA ROJAS CAMILA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 4423856 | LOAIZA NIETO RUBEN DARIO | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS041 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 16455263 | MAFLA SALAZAR JHON JAIRO | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1097039534 | MARIN GUZMAN JUAN ESTEBAN | 230301 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS041 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF43 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1096645881 | MEDINA FRANCO MIGUEL ANGEL | 230301 | 22 | $850,667 | $136,200 | EPS041 | 22 | $850,667 | $34,100 | CCF43 | 22 | $850,667 | $34,100 | 14-11 | 22 | $850,667 | $59,300 | 22 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 94462217 | MORA RODRIGUEZ JOSE ELIECER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS041 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1097035884 | OBANDO BOLAÑOS JESUS | 230201 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS005 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF43 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1005091514 | OCHOA ARBELAEZ JUAN DAVID | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS010 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF43 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1116443710 | OCORO VILLEGAS CRISTHIAN DAVID | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS037 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF43 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1005206955 | OLARTE TORRES CRISTIAN ADRIAN | 230201 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS041 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF43 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-11 | 5 | $193,334 | $13,500 | 5 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 4564908 | ORTIZ MONROY JOSE IVAN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 18497545 | PEREZ YUCUMA ALDEMAR | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1088246648 | PRADO RIOS ANDRES FELIPE | 230201 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS041 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 9790053 | QUINTERO MUÑOZ JAVIER DE JESUS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC62 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 4422583 | QUINTERO MUÑOZ JOSE LEONIDAS | 231001 | 9 | $348,000 | $55,700 | EPS005 | 9 | $348,000 | $14,000 | CCF43 | 9 | $348,000 | $14,000 | 14-11 | 9 | $348,000 | $24,300 | 9 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1096644768 | RAMIREZ LOPEZ HUGO HERNAN | 230301 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | ESSC62 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | CCF43 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | 14-11 | 28 | $1,082,667 | $75,400 | 28 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 1097396318 | RAMIREZ IBAGON JUAN CARLOS | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS005 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF43 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 18470766 | RESTREPO PALACIO JOSE GREGORIO | 230301 | 15 | $580,000 | $92,800 | EPS037 | 15 | $580,000 | $23,200 | CCF43 | 15 | $580,000 | $23,200 | 14-11 | 15 | $580,000 | $40,400 | 15 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 18415385 | RIVILLA VILLAMIL MANUEL | 230201 | 10 | $386,667 | $61,900 | EPS041 | 10 | $386,667 | $15,500 | CCF43 | 10 | $386,667 | $15,500 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 10 | $0 | $0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CC | 1004916555 | RUIZ GARCIA LUIS FERNANDO | 230301 | 8 | $309,334 | $49,500 | EPS041 | 8 | $309,334 | $12,400 | CCF43 | 8 | $309,334 | $12,400 | 14-11 | 8 | $309,334 | $21,600 | 8 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 1095268099 | TANGARIFE CARDONA JHOJAN STEVEEN | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS018 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1096032852 | TORRES LOAIZA JAIDER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC62 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1094954844 | VALENCIA OROZCO JORGE IVAN | 230301 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS037 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF43 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1096644088 | VALENCIA AGUIRRE YEISON ESTIVEN | 230301 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS010 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF43 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1098312535 | YEPES ROJAS JUAN JOSE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF43 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 36)** | | | | | **$19,952,007** | **$3,193,100** | | | **$20,029,341** | **$802,300** | | | **$20,029,341** | **$802,300** | | | **$20,029,341** | **$1,395,600** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 35 | $3,193,100 | $6,400 | $0 | $3,199,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $241,300 | $500 | $0 | $241,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $55,700 | $200 | $0 | $55,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 22 | $2,079,200 | $4,100 | $0 | $2,083,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 10 | $816,900 | $1,600 | $0 | $818,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $1,395,600 | $2,800 | $0 | $1,398,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 36 | $1,395,600 | $2,800 | $0 | $1,398,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $802,300 | $1,600 | $0 | $803,900 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 36 | $802,300 | $1,600 | $0 | $803,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 36 | $802,300 | $1,900 | $0 | $804,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | $140,900 | $300 | $0 | $141,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $74,400 | $200 | $0 | $74,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 8 | $179,600 | $400 | $0 | $180,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 8 | $124,100 | $300 | $0 | $124,400 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 2 | $92,800 | $200 | $0 | $93,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $7,800 | $100 | $0 | $7,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | $182,700 | $400 | $0 | $183,100 |
| **TOTAL** | | | | **36** | **$6,193,300** | **$12,700** | **$0** | **$6,206,000** |
