IDEBOY Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	
	PROCESO: APOYO JURIDICO	CÓDIGO: R-AJ-24	VERSIÓN: 4
		FECHA: 10-11-2020	PÁGINA:1 DE 1

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17	08	2023
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	16	11	2023
PERIODO PARA PAGAR	**DEL 17 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023**		

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA A CRUZ SAS R/L ALFREDO ALFONSO CRUZ MACIAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR: GRLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS

A LOS (0 8 SEP 2023), EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA O QUIEN HAGA SUS VECES CERTIFICA QUE LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION REPOSAN EN LA CARPETA DEL **CONTRATO DE OBRA NO. 049** DE **2023**, DANDO PLENO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 019 DE 2012 LEY ANTITRAMITES.

Marcar	**DOCUMENTO**
N/A	1. Solicitud del C.D.P.
X	2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. No. CDP. **2023 -87**
N/A	3. Solicitud a Talento Humano, Registro R-TH-01 "Necesidades de Personal"
N/A	4. Certificación Talento Humano expedida por el IDEBOY (necesidad del servicio)
N/A	5. Acto administrativo de justificación de la modalidad de contratación
N/A	6. Estudios Previos / Análisis del Sector / Matriz de Riesgos
N/A	7. Invitación Publica, pliegos y/o prepliegos
N/A	8. Oferta y documentos soporte del Contratista que acrediten su idoneidad y experiencia, así como no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
NA	9. Informes de evaluación
NA	10. Certificación de Idoneidad
NA	11. Acto administrativo de adjudicación
X	12. Contrato Original No. 049 DE 2023
X	13. Certificado Registro presupuestal CRP**. No. 2023 -95**
N/A	14. Garantías exigidas en el contrato
NA	15. Certificado y/o Acta de aprobación de garantías exigidas en el contrato
N/A	16. Acuerdo de Confidencialidad
N/A	17. Certificación Capacitación Riesgo Operacional
N/A	18. Acta de recibido a satisfacción
X	19. Factura y/o cuenta de cobro
X	20. Informe de Actividades contratista
X	21. Informe del supervisor Registro R-AJ-25 y/o R-AJ-26
X	22. Comprobante de pago de la Seguridad Social y Riesgos Laborales sobre el 40% del valor del pago mensual y Parafiscales cuando corresponda
N/A	23. Paz y salvo institucional
x	24. Acta de terminación y/o liquidación

Observaciones: De conformidad con lo establecido en los Decretos Legislativos Nos 491 del 28 de marzo, 537 del 14 de abril y 1287 del 24 de septiembre de 2020, los documentos relacionados a continuación se encuentran suscritos mediante firma digitalizada:

Firma: Cristóbal Barón
Nombre: CRISTÓBAL BARÓN
Jefe Oficina (Jurídica)

COPIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001

IDEBOY — Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá

CONSTRUCTORA A CRUZ SAS — Nit: 800.002.820 - 4

FECHA ELABORACIÓN: AGOSTO 31 DE 2023

PERIODO DE PAGO: ENTRE EL 17 DE AGOSTO DE 2023 Y EL 31 DE AGOSTO D

MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO No.:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION:
MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY	49 DE 2023	AGOSTO 17 DE 2023	NOVIEMBRE 16 DE 2023

CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA A CRUZ SAS NIT 800.002.820-4**	**INTERVENTOR:**	**N/A**
CLIENTE:	**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA NIT 891.800.462-5**	**SUPERVISOR:**	**GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS**

DATOS ESPECIFICOS DE LA PRESENTE ACTA

En la ciudad de Paipa (Boyaca). a los Treinta y Un (31) dias del mes de Agosto del año 2023 se reunieron el arq. JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ en su calidad de DIRECTOR DE PROYECTO de CONSTRUCTORA A CRUZ SAS actuando como CONTRATISTA, por una parte, y por la otra, la arq. YOHANNA PEREZ BURGOS en su calidad de PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION de IDEBOY Y GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS, actuando como SUPERVISORA, para suscribir la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

CONDICIONES ACTUALIZADA VALOR ETAPA DE OBRA							ACUMULADA ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		TOTAL ACUMULADO	
ITEM		RESUMEN	UD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
1.		**PRELIMINARES**										
1.1	1.01.17	DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO).	M2	24,39	$ 3.279,00	$ 79.974,81	-	$ 0,00	25,11	$ 82.335,69	25,11	$ 82.335,69
1.2	1.01.21	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO <=10CMS	M2	30,00	$ 34.432,00	$ 1.032.960,00	-	$ 0,00	59,88	$ 2.061.788,16	59,88	$ 2.061.788,16
1.3	1.01.24	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	96,92	$ 9.839,00	$ 953.595,88	-	$ 0,00	96,85	$ 952.907,15	96,85	$ 952.907,15
1.4	1.01.26	DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	55,07	$ 2.520,00	$ 138.776,40	-	$ 0,00	71,81	$ 180.961,20	71,81	$ 180.961,20
1.5	1.01.33	DEMOLICION MUROS LADRILLO E=015 MTS	M2	11,21	$ 14.229,00	$ 159.507,09	-	$ 0,00	28,28	$ 402.396,12	28,28	$ 402.396,12
1.6	1.01.36	DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO	M2	214,49	$ 3.290,00	$ 705.672,10	-	$ 0,00	255,17	$ 839.509,30	255,17	$ 839.509,30
1.7	1.01.49	DESMONTE CANALES-BAJANTES	ML	16,93	$ 5.985,00	$ 101.326,05	-	$ 0,00	24,70	$ 147.829,50	24,70	$ 147.829,50
1.8	1.01.54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	209,31	$ 12.239,00	$ 2.561.745,09	-	$ 0,00	109,06	$ 1.334.785,34	109,06	$ 1.334.785,34
1.9	1.01.55	DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA	M2	18,34	$ 9.169,00	$ 168.159,46	-	$ 0,00	18,45	$ 169.168,05	18,45	$ 169.168,05
1.10	1.01.61	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	KG	49,41	$ 4.299,00	$ 212.413,59	-	$ 0,00	98,10	$ 421.731,90	98,10	$ 421.731,90
1.11	1.01.63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	60,83	$ 14.047,00	$ 854.479,01	-	$ 0,00	64,79	$ 910.105,13	64,79	$ 910.105,13
1.12	1.01.65	DESMONTE VIDRIO	M2	41,40	$ 3.125,00	$ 129.375,00	-	$ 0,00	43,50	$ 135.937,50	43,50	$ 135.937,50
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 7.097.984,48**		**$ 0,00**		**$ 7.639.455,04**		**$ 7.639.455,04**
2.		**CIMENTACION Y DESAGUES**										
2.1	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	4,20	$ 52.830,00	$ 221.886,00	-	$ 0,00	3,84	$ 202.867,20	3,84	$ 202.867,20
2.2	1.02.30	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KG	64,15	$ 6.877,00	$ 441.159,55	-	$ 0,00	138,54	$ 952.739,58	138,54	$ 952.739,58
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 663.045,55**		**$ 0,00**		**$ 1.155.606,78**		**$ 1.155.606,78**
3.		**MAMPOSTERIA**										
3.1	1.04.15	MURO EN BLOQUE No 5 E=0,12 MTS	M2	13,04	$ 53.150,00	$ 693.076,00	-	$ 0,00	9,47	$ 503.330,50	9,47	$ 503.330,50
3.2	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS	M2	9,14	$ 84.460,00	$ 771.964,40	-	$ 0,00	3,14	$ 265.204,40	3,14	$ 265.204,40
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 1.465.040,40**		**$ 0,00**		**$ 768.534,90**		**$ 768.534,90**
4.		**PAÑETES**										
4.1	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	138,62	$ 10.125,00	$ 1.403.527,50	-	$ 0,00	156,16	$ 1.581.120,00	156,16	$ 1.581.120,00
4.2	1.05.03	GOTERAS	M2	60,99	$ 17.105,00	$ 1.043.233,95	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
4.3	1.05.09	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	M2	15,76	$ 34.675,00	$ 546.478,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
4.4	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	169,06	$ 24.397,00	$ 4.124.556,82	-	$ 0,00	213,08	$ 5.198.512,76	213,08	$ 5.198.512,76
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 7.117.796,27**		**$ 0,00**		**$ 6.779.632,76**		**$ 6.779.632,76**
5.		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
5.1	1.06.14	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	14,00	$ 107.564,00	$ 1.505.896,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.2	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1/2" RDE 9	ML	26,00	$ 12.370,00	$ 321.620,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.3	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 3/4" RDE 11	ML	10,00	$ 16.570,00	$ 165.700,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.4	1.06.28	SALIDA SANITARIA PVC 3"	UND	17,00	$ 157.370,00	$ 2.675.290,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.5	1.06.35	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS INCL ACCESORIOS	UND	1,00	$ 599.915,00	$ 599.915,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.6	1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	UND	3,00	$ 54.170,00	$ 162.510,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001

FECHA ELABORACIÓN: AGOSTO 31 DE 2023

PERIODO DE PAGO: ENTRE EL 17 DE AGOSTO DE 2023 Y EL 31 DE AGOSTO D

MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO No.:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION:
MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY	49 DE 2023	AGOSTO 17 DE 2023	NOVIEMBRE 16 DE 2023

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA A CRUZ SAS NIT 800.002.820-4	INTERVENTOR:	N/A
CLIENTE:	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA NIT 891.800.462-5	SUPERVISOR:	GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS

DATOS ESPECIFICOS DE LA PRESENTE ACTA

En la ciudad de Paipa (Boyaca). a los Treinta y Un (31) dias del mes de Agosto del año 2023 se reunieron el arq. JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ en su calidad de DIRECTOR DE PROYECTO de CONSTRUCTORA A CRUZ SAS actuando como CONTRATISTA, por una parte, y por la otra, la arq. YOHANNA PEREZ BURGOS en su calidad de PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION de IDEBOY Y GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS, actuando como SUPERVISORA, para suscribir la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

CONDICIONES ACTUALIZADA VALOR ETAPA DE OBRA							ACUMULADA ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM		RESUMEN	UD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
5.7	1.06.11	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUYE VALVULA Y REGISTRO	UND	1,00	$ 458.020,00	$ 458.020,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.8	1.06.13	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO	UND	4,00	$ 156.364,00	$ 625.456,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5.9	1.06.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	ML	6,86	$ 19.361,00	$ 132.816,46	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 6.647.223,46**		**$ 0,00**	-	**$ 0,00**		**$ 0,00**
6.		**INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS- LAMPARAS**							-			
6.1		Restauracion General de la instalacion electrica interna y puesta en funcionamiento	GL	1,00	$ 13.060.000,00	$ 13.060.000,00	-	$ 0,00	0,40	$ 5.224.000,00	0,40	$ 5.224.000,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 13.060.000,00**		**$ 0,00**		**$ 5.224.000,00**		**$ 5.224.000,00**
7.		**PINTURA**										
7.1	1.09.12	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	M2	15,76	$ 26.038,00	$ 410.358,88	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00
7.2	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	190,71	$ 17.131,00	$ 3.267.053,01	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
7.3	1.09.19	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	136,08	$ 5.426,00	$ 738.370,08	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
7.4	1.09.22	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	203,31	$ 17.585,00	$ 3.575.206,35	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 7.990.988,32**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
8.		**ENCHAPES**										
8.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	112,06	$ 73.613,00	$ 8.249.072,78	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
8.2	1.10.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3	UND	4,00	$ 24.988,00	$ 99.952,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 8.349.024,78**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
9.		**PISOS- BASES- ACABADOS**										
9.1	1.11.04	ALISTADO PISO E=4CM -1:5	M2	272,08	$ 31.308,00	$ 8.518.280,64	-	$ 0,00	155,35	$ 4.863.697,80	155,35	$ 4.863.697,80
9.2	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	7,09	$ 76.395,00	$ 541.640,55	-	$ 0,00	6,91	$ 527.889,45	6,91	$ 527.889,45
9.3	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI	M2	48,60	$ 76.015,00	$ 3.694.329,00	-	$ 0,00	104,96	$ 7.978.534,40	104,96	$ 7.978.534,40
9.4	1.11.15	PISO CERAMICA 25*25 CM	M2	22,21	$ 64.860,00	$ 1.440.540,60	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
9.5	1.11.44	PISO CERÁMICA 51*51 CM	M2	221,58	$ 92.777,00	$ 20.557.527,66	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
9.7	1.11.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM	ML	76,05	$ 20.098,00	$ 1.528.452,90	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 36.280.771,35**		**$ 0,00**		**$ 13.370.121,65**		**$ 13.370.121,65**
10.		**CUBIERTAS**										
10.1	1.12.01	AFINADO CUBIERTAS PLANAS E=6 CM	M2	14,14	$ 59.885,00	$ 846.773,90	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
10.2	1.12.42	SUMINISTRO E INSTALACION MANTO FIBERGLAS	M2	14,14	$ 70.758,00	$ 1.000.518,12	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
10.3		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DECORATIVA	M2	203,31	$ 100.711,00	$ 20.475.553,41	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
10.4	1.12.31	SUMINITRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	26,83	$ 125.944,00	$ 3.379.077,52	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
10.5	1.12.43	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	112,66	$ 17.962,00	$ 2.023.598,92	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
10.6	1.12.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PLASTICA ALL X 3M	ML	9,00	$ 69.575,00	$ 626.175,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
10.7	1.12.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M	ML	24,40	$ 81.375,00	$ 1.985.550,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001

FECHA ELABORACIÓN: AGOSTO 31 DE 2023

PERIODO DE PAGO: ENTRE EL 17 DE AGOSTO DE 2023 Y EL 31 DE AGOSTO D

MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO No.:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION:
MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY	49 DE 2023	AGOSTO 17 DE 2023	NOVIEMBRE 16 DE 2023

CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA A CRUZ SAS NIT 800.002.820-4**	**INTERVENTOR:**	**N/A**
CLIENTE:	**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA NIT 891.800.462-5**	**SUPERVISOR:**	**GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS**

DATOS ESPECIFICOS DE LA PRESENTE ACTA

En la ciudad de Paipa (Boyaca). a los Treinta y Un (31) dias del mes de Agosto del año 2023 se reunieron el arq. JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ en su calidad de DIRECTOR DE PROYECTO de CONSTRUCTORA A CRUZ SAS actuando como CONTRATISTA, por una parte, y por la otra, la arq. YOHANNA PEREZ BURGOS en su calidad de PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION de IDEBOY Y GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS, actuando como SUPERVISORA, para suscribir la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

CONDICIONES ACTUALIZADA VALOR ETAPA DE OBRA							ACUMULADA ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		TOTAL ACUMULADO	
ITEM		RESUMEN	UD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
10.8	1.12.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	ML	24,40	$ 77.862,00	$ 1.899.832,80	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 32.237.079,67**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
11.		**CIELO RASOS**										
11.1	1.13.17	LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM)	M2	56,88	$ 42.120,00	$ 2.395.785,60	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 2.395.785,60**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
12.		**CARPINTERIA EN MADERA**										
12.1	1.14.31	PUERTA MARCO MADERA ABARCO ENTABL. TRIPEX 4MM ECONOMICA 70-90 *200 CM	UND	2,00	$ 405.438,00	$ 810.876,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 810.876,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
13.		**CARPINTERIA METALICA**										
13.1	1.15.06	PUERTA ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	22,31	$ 332.580,00	$ 7.419.859,80	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
13.2	1.15.16	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE	M2	33,60	$ 227.280,00	$ 7.636.608,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
13.3	1.15.17	DIVISION PARA BATERA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	M2	7,49	$ 713.650,00	$ 5.345.238,50	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 20.401.706,30**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
14.		**APARATOS SANITARIOS**										
14.1	1.16.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	4,00	$ 296.999,00	$ 1.187.996,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
14.2	1.16.01	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	3,00	$ 818.661,00	$ 2.455.983,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 3.643.979,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15.		**VIDRIOS Y CERRADURAS**										
15.1	1.17.01	CERRADURA ALCOBA	UND	1,00	$ 59.263,00	$ 59.263,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
15.2	1.17.02	CERRADURA BAÑO	UND	1,00	$ 61.263,00	$ 61.263,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
15.3	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	7,00	$ 137.525,00	$ 962.675,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
15.4	1.17.04	ESPEJO 4MM SIN BISEL	M2	2,79	$ 94.758,00	$ 264.374,82	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
15.5	1.17.06	VIDRIO 5MM	M2	33,60	$ 66.015,00	$ 2.218.104,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 3.565.679,82**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.		**OBRAS EXTERIORES**										
16.1	1.18.08	FACHADA EN GRANIPLAS	M2	108,67	$ 35.458,00	$ 3.853.220,86	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
16.2	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	1,53	$ 136.350,00	$ 208.615,50	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 4.061.836,36**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
17.		**OTROS**										
17.1	1.20.02	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 CM	ML	3,36	$ 428.450,00	$ 1.439.592,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 1.439.592,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
18.		**VARIOS**										
18.1	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	112,66	$ 3.492,00	$ 393.408,72	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL CAPITULO				**$ 393.408,72**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO ETAPA DE OBRA				**$ 157.621.818,08**		**$ -**		**$ 34.937.351,13**		**$ 34.937.351,13**
		ADMINISTRACION	%	25,93%		$ 40.871.337,43		$ -		$ 9.059.255,15		$ 9.059.255,15
		IMPREVISTOS	%	0,50%		$ 788.109,09		$ -		$ 174.686,76		$ 174.686,76
		UTILIDAD	%	3,00%		$ 4.728.654,54		$ -		$ 1.048.120,53		$ 1.048.120,53

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001

FECHA ELABORACIÓN: AGOSTO 31 DE 2023

PERIODO DE PAGO: ENTRE EL 17 DE AGOSTO DE 2023 Y EL 31 DE AGOSTO D

MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO No.:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION:
MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY	49 DE 2023	AGOSTO 17 DE 2023	NOVIEMBRE 16 DE 2023

CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA A CRUZ SAS NIT 800.002.820-4**	**INTERVENTOR:**	**N/A**
CLIENTE:	**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA NIT 891.800.462-5**	**SUPERVISOR:**	**GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS**

DATOS ESPECIFICOS DE LA PRESENTE ACTA

En la ciudad de Paipa (Boyaca). a los Treinta y Un (31) dias del mes de Agosto del año 2023 se reunieron el arq. JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ en su calidad de DIRECTOR DE PROYECTO de CONSTRUCTORA A CRUZ SAS actuando como CONTRATISTA, por una parte, y por la otra, la arq. YOHANNA PEREZ BURGOS en su calidad de PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION de IDEBOY Y GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS, actuando como SUPERVISORA, para suscribir la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

CONDICIONES ACTUALIZADA VALOR ETAPA DE OBRA							ACUMULADA ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM		RESUMEN	UD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
		IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		$ 898.444,36		$ -		$ 199.142,90		$ 199.142,90
		TOTAL OBRAS CIVILES				**$ 204.908.363,50**		**$ -**	**$**	**45.418.556,47**		**$ 45.418.556,47**

VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001 **$ 45.418.556,47**

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 47/100 MONEDA LEGAL

Se firma la presente a los Treinta y Un (31) dias del mes de Agosto de 2023, ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001 por los que en ella intervienen:

ARQ JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE PROYECTO
CONSTRUCTORA A CRUZ SAS

V0.B
GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS
SUPERVISION
IDEBOY

Nota: La mayores cantidades se encuentran justificadas tecnicamernte en Bitacora de Obra.


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.1 (1.01.17)- DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
COCINA	6,05	4,15		1	M2	25,11
						25,11

ESQUEMA

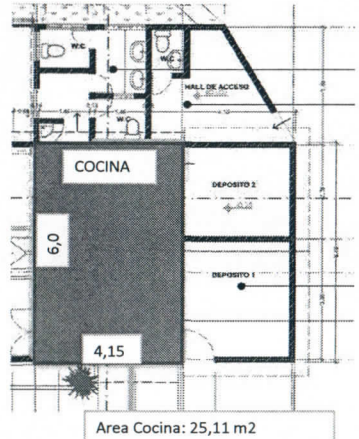

Area Cocina: 25,11 m2

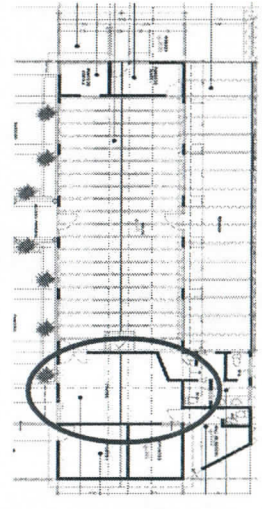



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.2 (1.01.21)- DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO <=10CMS — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
TERRAZA 1	5,00	6,50		1,00	M2	32,50
TERRAZA 2	16,20	0,90		1,00	M2	14,58
PUNTO DE VENTA 1 PLACA TANQUE	1,20	0,90		1,00	M2	1,08
TERRAZA 2	2,30	2,40		1,00	M2	5,52
MESON EN CONCRETO PUNTO DE VENTA 1	1,95	0,60		1,00	M2	1,17
MESON EN CONCRETO PUNTO DE VENTA 1	0,60	0,60		1,00	M2	0,36
MESON EN CONCRETO PUNTO DE VENTA 1	0,80	0,60		1,00	M2	0,48
PLACA EN CONCRETO PUNTO DE VENTA 1 TANQUE	1,20	0,90		1,00	M2	1,08
MESON EN CONCRETO BAÑOS	1,90	0,60		1,00	M2	1,14
MESON EN CONCRETO PUNTO DE VENTA 2	3,40	0,40		1,00	M2	1,36
PLACA EN CONCRETO NICHO GAS	0,55	1,10		1,00		0,61
						59,88

ESQUEMA

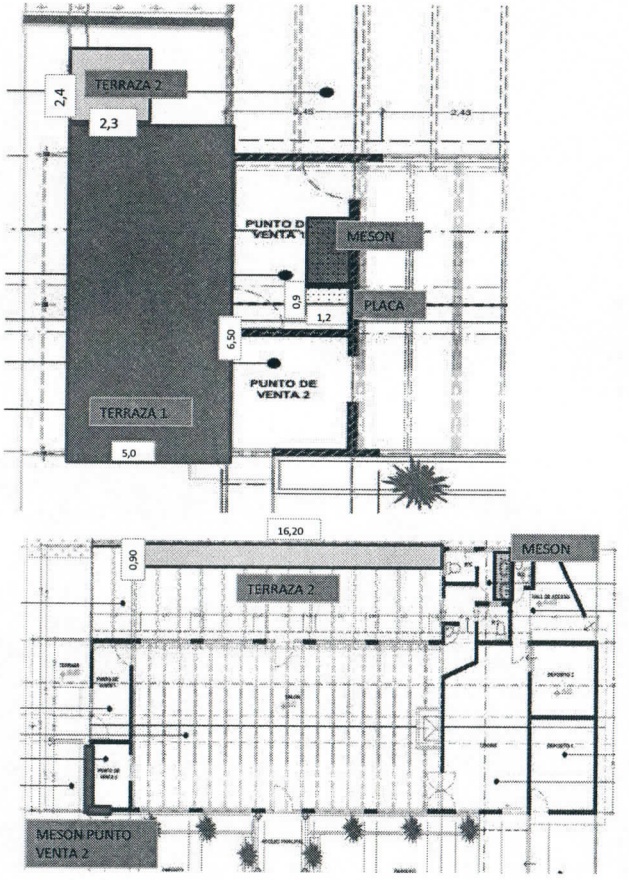

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó


JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.2 (1.01.21)- DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO <=10CMS	UNIDAD	M2





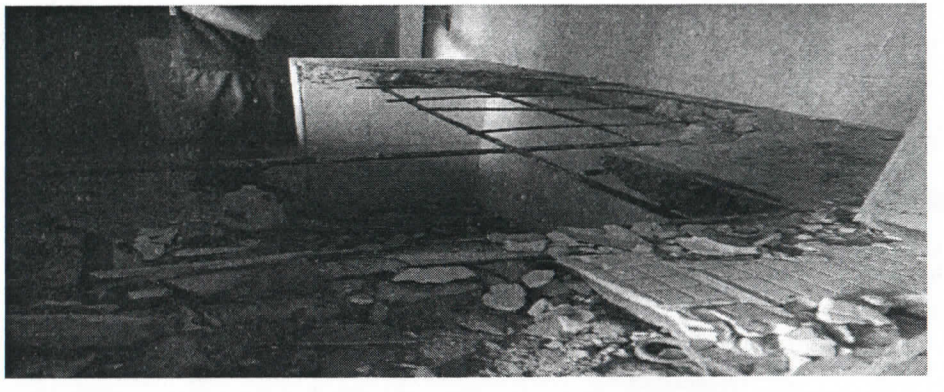

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

YOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.3 (1.01.24)-DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
COCINA (1)	2,86		1,60		M2	4,58
COCINA (2)	3,46		1,60		M2	5,54
COCINA (3)	1,75		1,60		M2	2,80
COCINA (4)	0,70		1,60		M2	1,12
COCINA (5)	1,64		1,60		M2	2,62
COCINA (6)	5,10		1,60		M2	8,16
BAÑO SALON (7)	0,70		1,60	2	M2	2,24
BAÑO SALON (8)	1,18		1,60		M2	1,89
BAÑO SALON (9)	1,35		1,60		M2	2,16
BAÑO SALON (10)	1,50		1,60		M2	2,40
BAÑO SALON (11)	0,70		1,60		M2	1,12
BAÑO SALON (12)	1,25		1,60		M2	2,00
BAÑO SALON (13)	1,50		1,60	2	M2	4,80
BAÑO SALON (14)	1,90		1,60		M2	3,04
BAÑO SALON (15)	3,20		1,60		M2	5,12
BAÑO SALON (16)	1,10		1,60		M2	1,76
BAÑO SALON (17)	1,50		1,60		M2	2,40
BAÑO SALON (18)	0,50		1,60	2	M2	1,60
PUNTO DE VENTA 1 (19)	2,45		2,20		M2	5,39
PUNTO DE VENTA 1 (20)	2,40		1,10		M2	2,64
PUNTO DE VENTA 1 (21)	1,00		2,20		M2	2,20
PUNTO DE VENTA 1 (22)	1,40		2,20		M2	3,08
PUNTO DE VENTA 1 (23)	2,40		2,20		M2	5,28
PUNTO DE VENTA 2 (24)	0,60		2,20		M2	1,32
PUNTO DE VENTA 2 (25)	1,73		2,20		M2	3,81
PUNTO DE VENTA 2 (26)	2,45		2,20		M2	5,39
PUNTO DE VENTA 2 (27)	1,73		2,20		M2	3,81
PUNTO DE VENTA 2 (28)	1,10		2,20		M2	2,42
BAÑO EXTERIOR (29)	1,80		2,20	2	M2	3,96
BAÑO EXTERIOR (30)	0,80		2,20	1	M2	1,76
BAÑO EXTERIOR (31)	0,20		2,20	1	M2	0,44
TOTAL						96,85

ESQUEMA

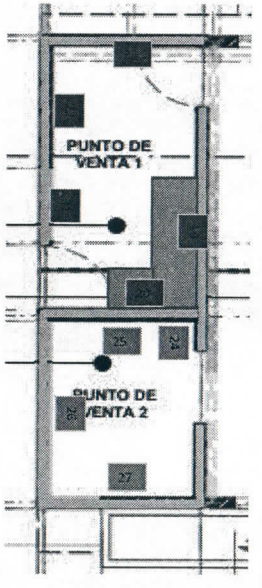

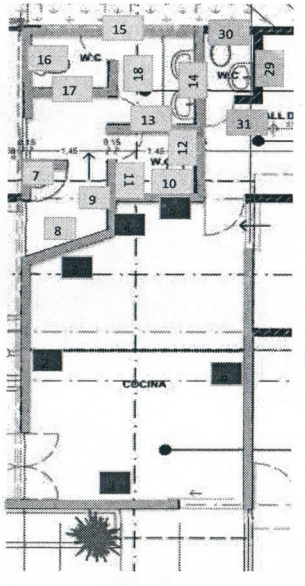



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó


YOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.3 (1.01.24)-DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	UNIDAD	M2



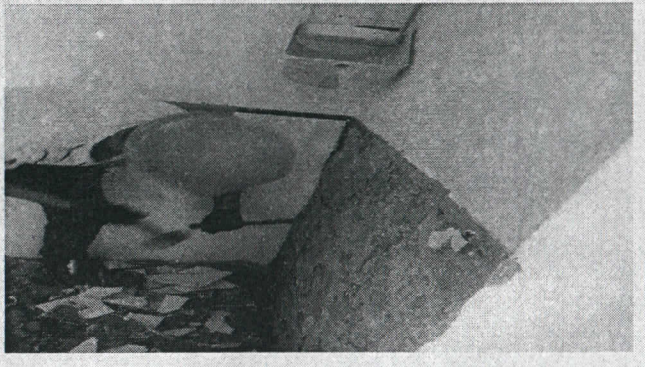





Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.4 (1.01.26)-DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)
UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
SALON (1)	7,22			2	ML	14,44
SALON (2)	3,85			1	ML	3,85
SALON (3)	1,2			1	ML	1,2
SALON (4)	6,8			2	ML	13,6
SALON (5)	1			1	ML	1
SALON (6)	1			2	ML	2
SALON (7)	1,4			1	ML	1,4
SALON (8)	1,5			1	ML	1,5
PUNTO DE VENTA 1 (9)	2,45			1	ML	2,45
PUNTO DE VENTA 1 (10)	2,4			1	ML	2,4
PUNTO DE VENTA 1 (11)	2,45			1	ML	2,45
PUNTO DE VENTA 1 (12)	2,4			1	ML	2,4
PUNTO DE VENTA 2 (13)	0,6			1	ML	0,6
PUNTO DE VENTA 2 (14)	1,73			1	ML	1,73
PUNTO DE VENTA 2 (15)	2,45			1	ML	2,45
PUNTO DE VENTA 2 (16)	1,73			1	ML	1,73
PUNTO DE VENTA 2 (17)	1,1			1	ML	1,1
COCINA (18)	2,86			1	ML	2,86
COCINA (19)	3,46			1	ML	3,46
COCINA (20)	1,75			1	ML	1,75
COCINA (21)	0,7			1	ML	0,7
COCINA (22)	1,64			1	ML	1,64
COCINA (23)	5,1			1	ML	5,1
TOTAL						71,81

ESQUEMA

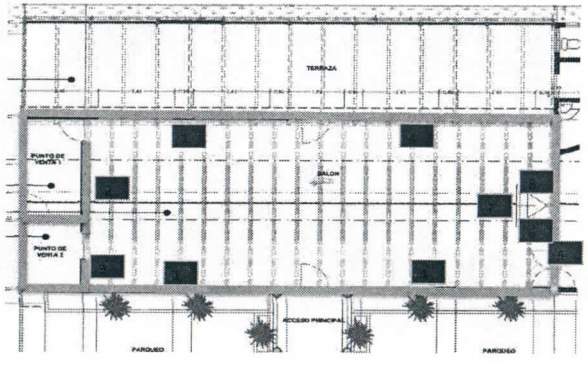



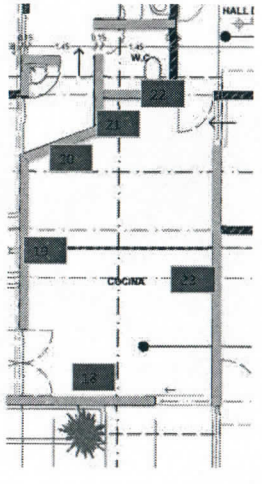

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA


Aprobó


JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.4 (1.01.26)-DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD	ML

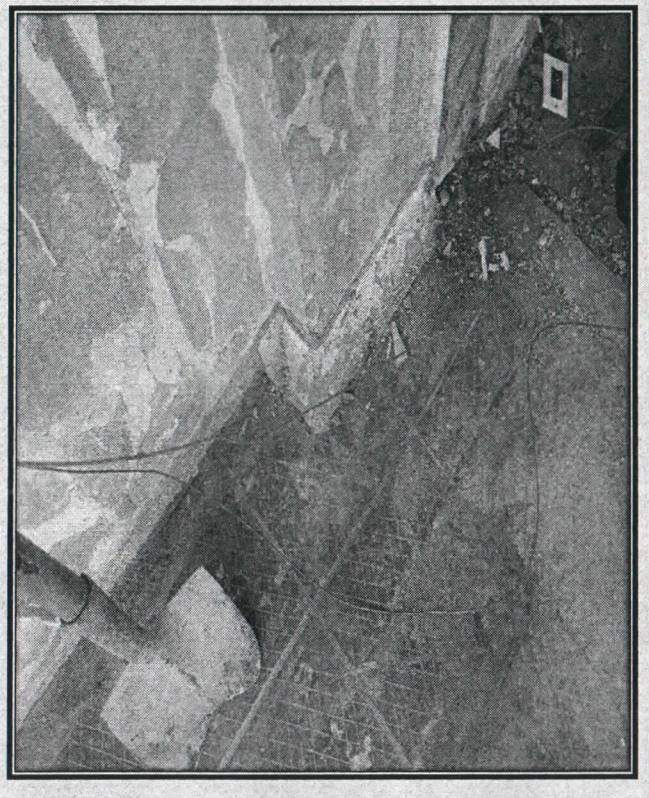

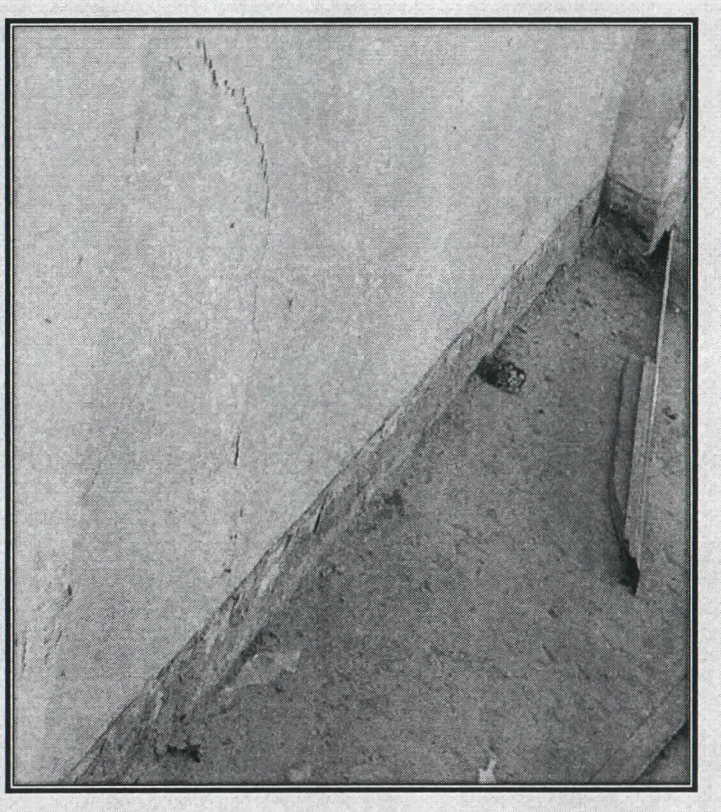

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

IOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.5 (1.01.33)-DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E=0,15 MTS) — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
BAÑOS SALON (1)	1,70		2,30	1,00	M2	3,91
BAÑOS SALON (2)	0,70		2,30	1,00	M2	1,61
BAÑOS SALON (3)	0,62		2,30	1,00	M2	1,43
BAÑOS SALON (4)	1,65		2,30	1,00	M2	3,80
BAÑO EXTEROR (5)	2,20		2,00	1,00	M2	4,40
POCETA (6)	2,40		1,00	1,00	M2	2,40
MOCHETA TERRAZA (7)	1,80		0,60	1,00	M2	1,08
MURO SALON BARRA (8)	3,20		1,00	1,00	M2	3,20
NICHO FACHADA CONTADOR ENERGIA (9)	0,40		0,60	1,00	M2	0,24
DEMOLICION MURO DEPOSITO (10)	1,50		2,35	1,00	M2	3,53
DEMOLICION MOCHETA PUNTO VENTA 2	0,60		1,90	1,00	M2	1,14
DEMOLICION NICHO GAS	0,50		1,55	2,00	M2	1,55
TOTAL						28,28

ESQUEMA

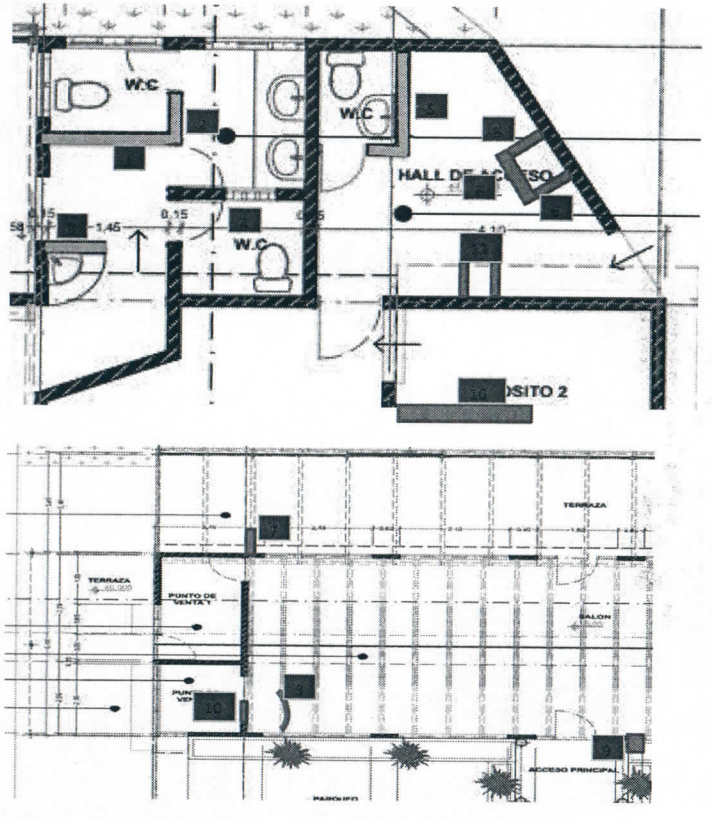

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA


Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.5 (1.01.33)-DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E=0,15 MTS)	UNIDAD	M2

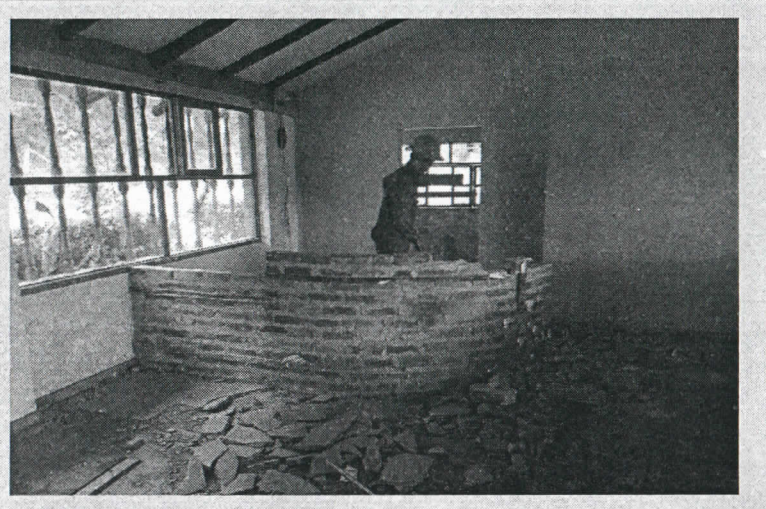





Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA


Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.6 (1.01.36)-DEMOLICION PISO EN BALDOSA +MORTERO	UNIDAD	M2

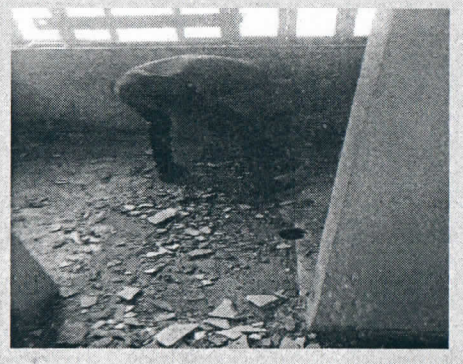







Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.6 (1.01.36)-DEMOLICION PISO EN BALDOSA +MORTERO
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
BAÑOS	3,3	4,2		1,00	M2	13,86
COCINA	5,25	4,15		1,00	M2	21,79
COCINA	2,7	1		1,00	M2	2,70
DEPOSITO 2	3,1	3,35		1,00	M2	10,39
SALON	15,1	6,1		1,00	M2	92,11
PUNTO VENTA 1	2,4	3,4		1,00	M2	8,16
PUNTO DE VENTA 2	1,75	2,5		1,00	M2	4,38
TERRAZA 1	16,2	3,4		1,00	M2	55,08
TERRAZA 1	2,3	2,4		1,00	M2	5,52
TERRAZA 1	2,5	2,9		1,00	M2	7,25
TERRAZA 2	5	6,5		1,00	M2	32,50
BAÑO EXTERIOR	1,8	0,8		1,00	M2	1,44
TOTAL						255,17

ESQUEMA

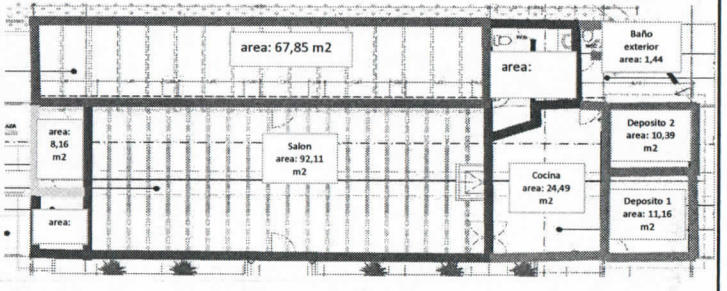

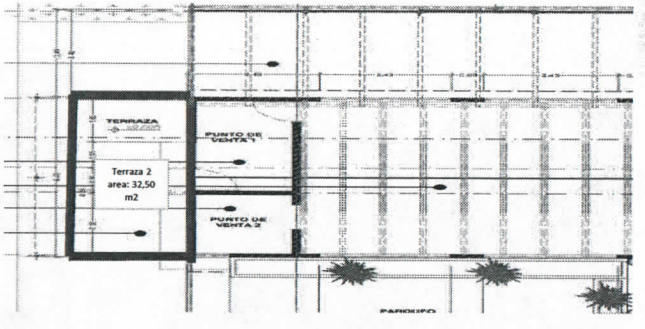

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.7 (1.01.49)-DESMONTE CANALES- BAJANTES
UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
CANAL AGUAS LLUVIAS	8,40			1,00	ML	8,40
CANAL AGUAS LLUVIAS	16,30			1,00	ML	16,30


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.8 (1.01.54)-DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
DEPOSITOS	3,6	8,52		1	M2	30,67
COCINA	22	8,52		1	M2	187,44
						0
						0
						0
						0
						0
SE RECONOCE EL 50% DE LA ACTIVIDAD						
TOTAL						109,06

ESQUEMA

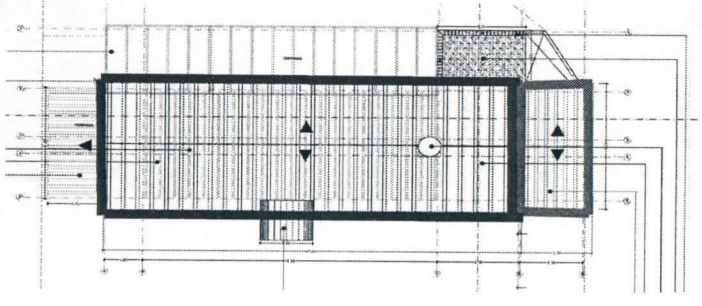



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.8 (1.01.54)-DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	UNIDAD	M2







Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.9 (1.01.55)-DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
TERRAZA 2	6,15	3		1	M2	18,45
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL						18,45

ESQUEMA

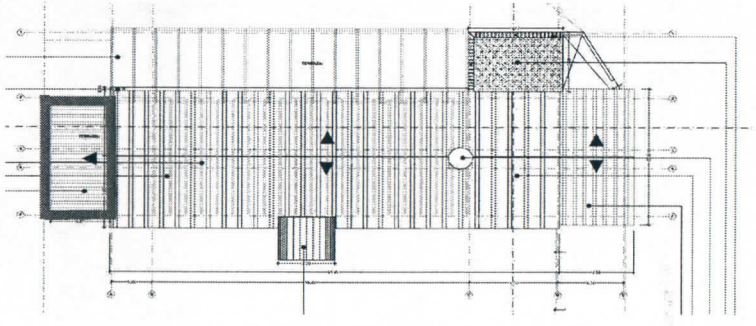

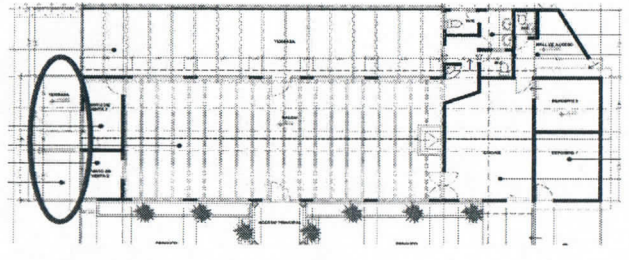

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA


Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.9 (1.01.55)-DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA	UNIDAD	M2

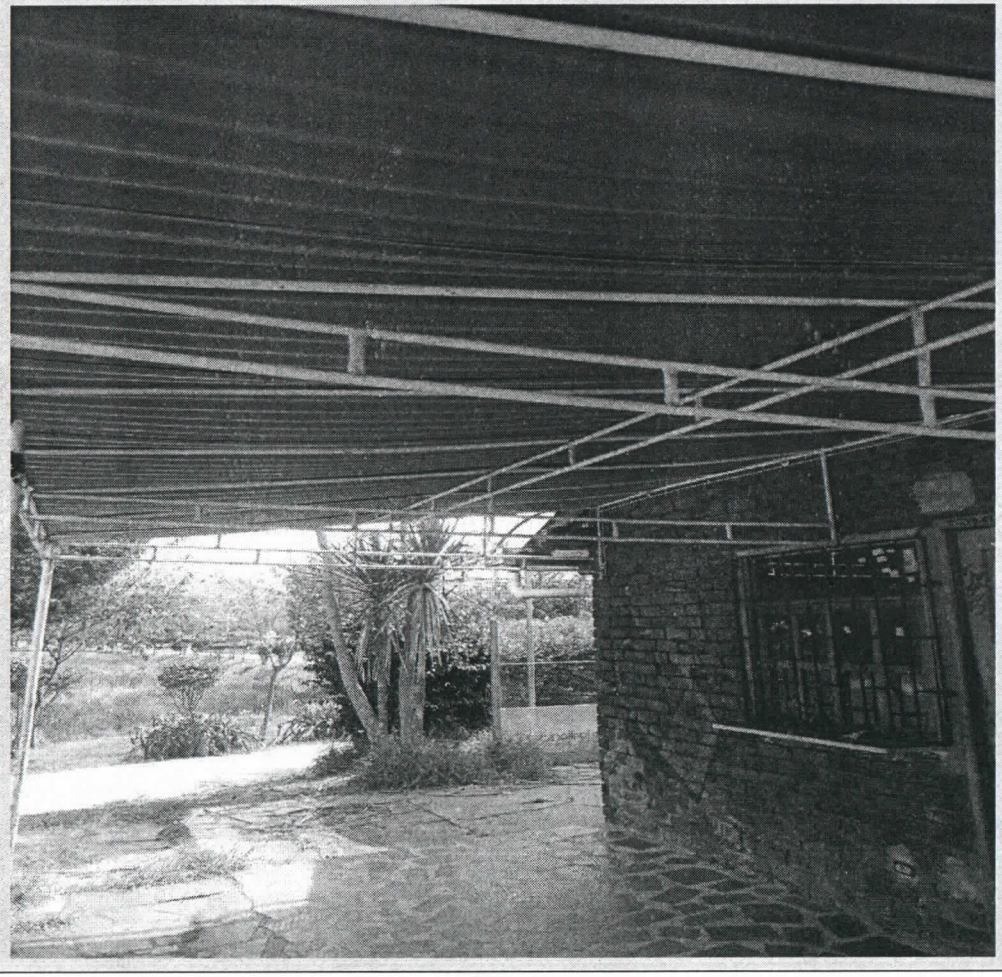

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.10 (1.01.61)-DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS
UNIDAD	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	PESO			
TERRAZA 2	6,00		0,91	5,00	KG	27,30
TERRAZA 2	3,00		0,91	18,00	KG	49,14
TERRAZA 2	0,60		0,91	4,00	KG	2,18
TERRAZA 2	0,30		0,91	4,00	KG	1,09
TERRAZA 2	2,00		0,91	3,00	KG	5,46
DEPOSITO	3,55		0,91	4,00	KG	12,92
TOTAL						98,10

ESQUEMA

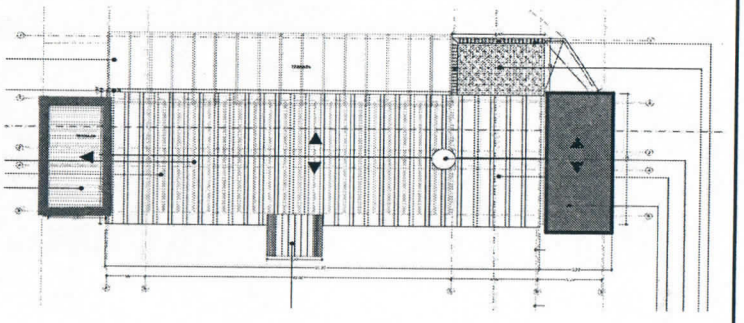

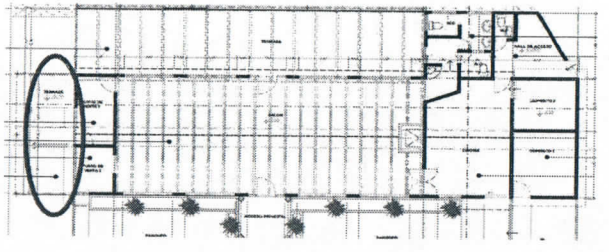

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA


Aprobó


JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.10 (1.01.61)-DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	UNIDAD	KG

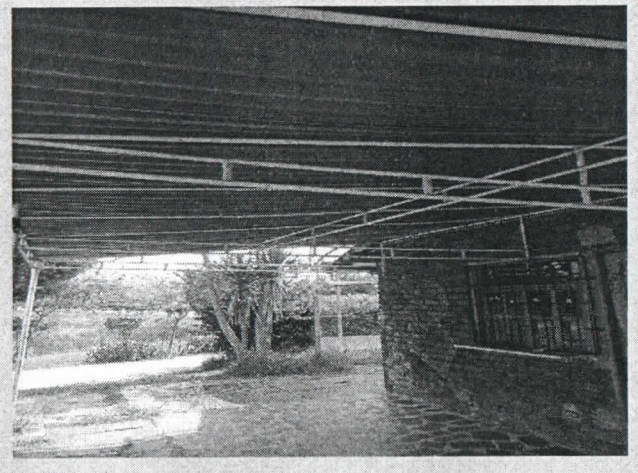

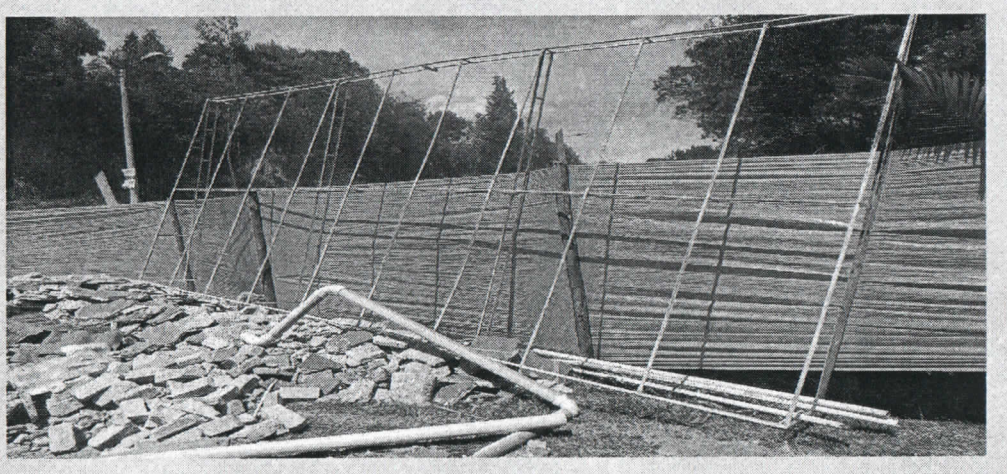

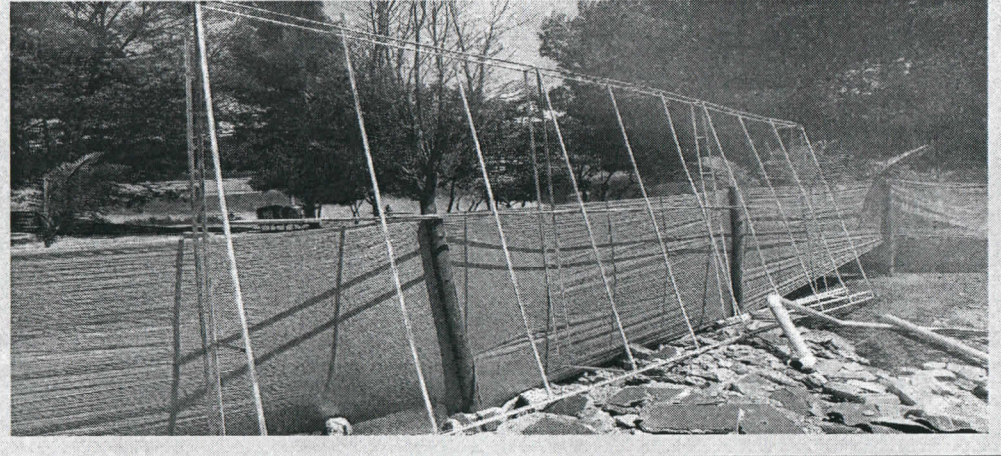

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.11 (1.01.63)-DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto			
P1	1,00		2,10			2,10
P2	1,30		2,16			2,81
P3	1,80		2,10			3,78
P4	0,90		2,00			1,80
P5	1,80		2,10			3,78
P6	0,90		2,10			1,89
P7	1,50		2,00			3,00
P8	0,80		2,10			1,68
P9	0,66		2,10			1,39
P10	0,60		2,10			1,26
P11	0,60		1,95			1,17
P12	0,60		2,10			1,26
P13	0,90		2,00			1,80
P14	1,00		1,50			1,50
V1	1,19		1,30			1,55
V2	2,43		1,34			3,26
V3	2,43		1,34			3,26
V4	2,43		1,34			3,26
V5	2,43		1,34			3,26
V6	2,55		1,00			2,55
V7	1,05		1,00			1,05
V8	2,43		1,34			3,26
V9	2,43		1,34			3,26
V10	2,43		1,34			3,26
V11	2,43		1,34			3,26
V12	1,20		0,97			1,16
V13	1,20		0,95			1,14
V14	0,61		0,84			0,51
V15	0,90		0,28			0,25
V16	0,90		1,00			0,90
V17	0,57		0,67			0,38
TOTAL						64,79

ESQUEMA

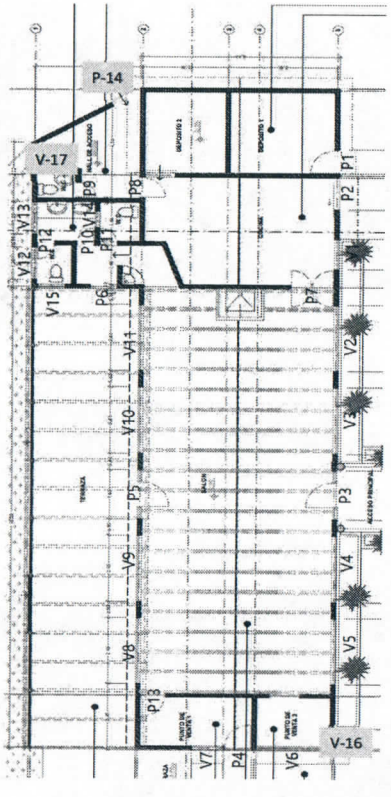

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA





Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES

IDEBOY

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.11 (1.01.63)-DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS
UNIDAD	M2

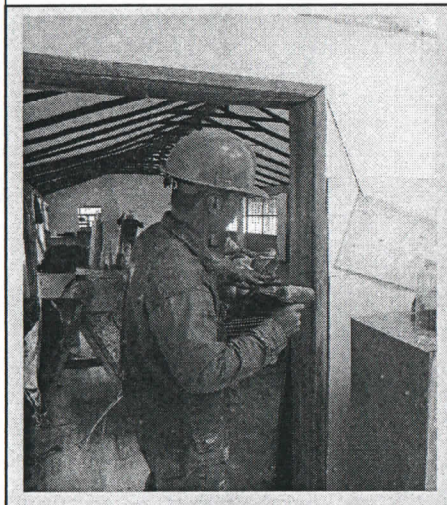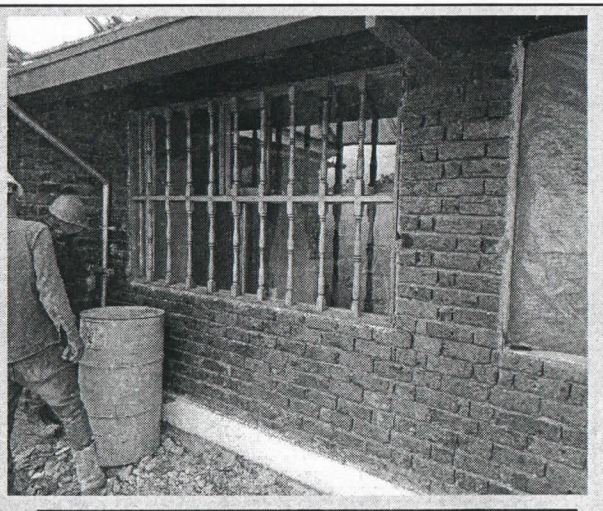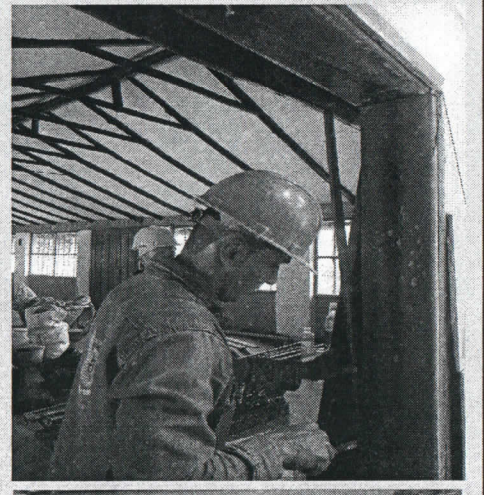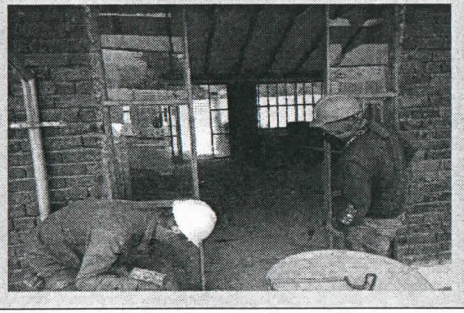

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES

IDEBOY
Boyacá Crece

OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL SECTOR DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	3,2 (1.04.30)- MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS	UNIDAD	M2



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	3,2 (1.04.30)- MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	ancho	alto			
HALL DE ACCESO	3,92		0,80		M2	3,14
						3,14

ESQUEMA

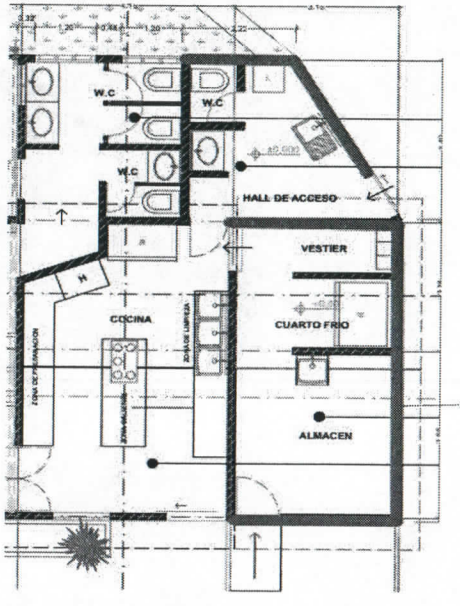

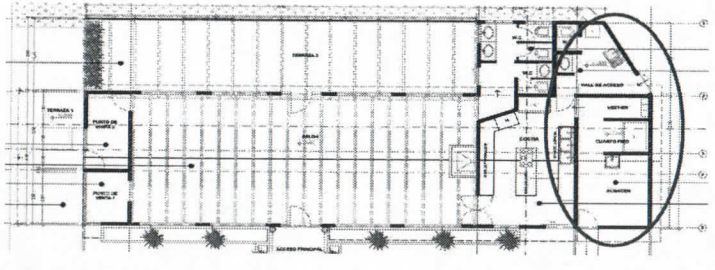

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA


Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	3,1 (1.04.15)- MURO EN BLOQUE No 5E=0,12 MTS	UNIDAD	M2

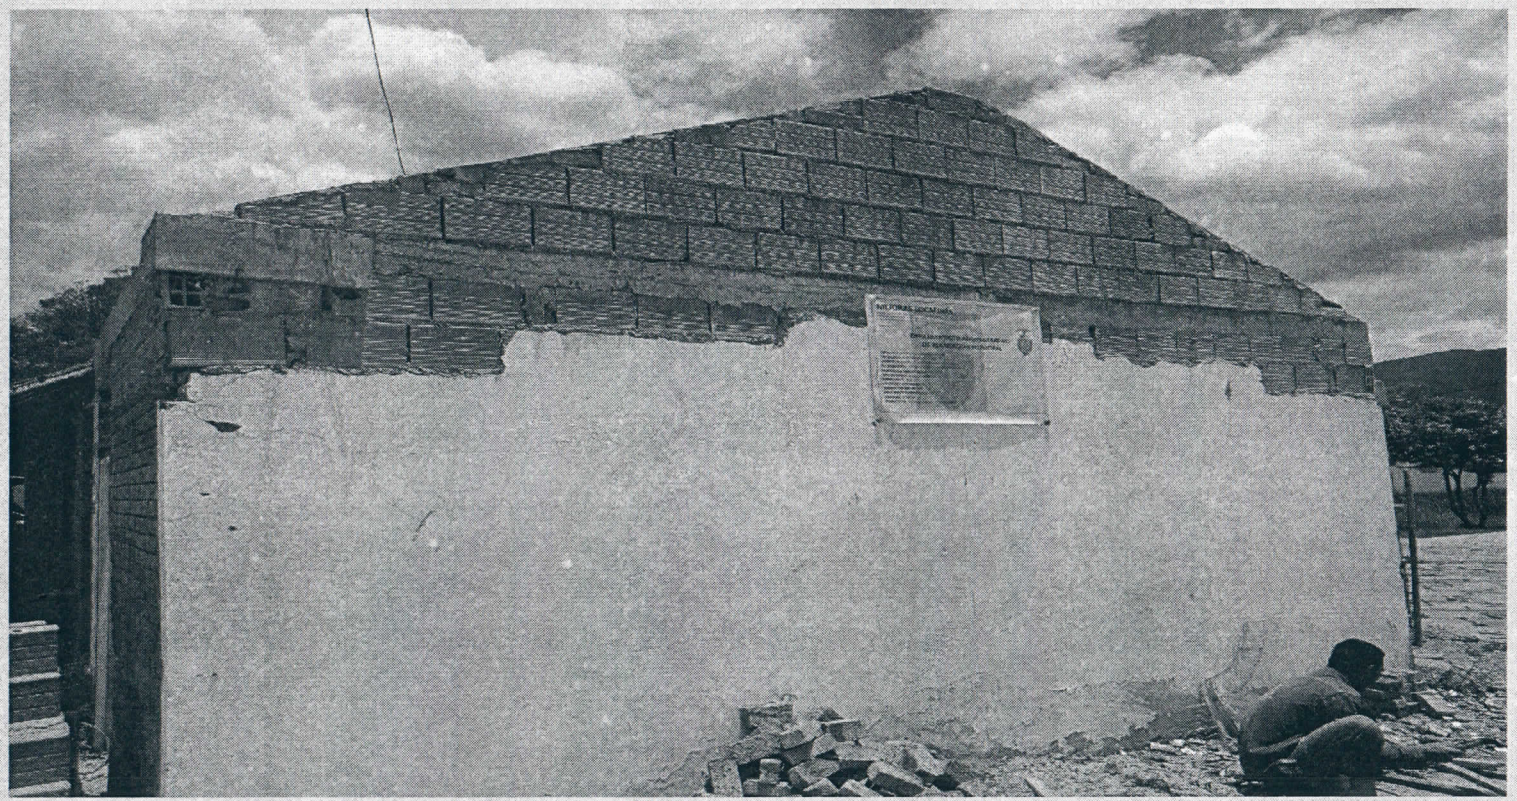

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	3,1 (1.04.15)- MURO EN BLOQUE No 5E=0,12 MTS — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	ancho	alto			
DEPOSITOS	12,95		0,40		M2	5,18
CUCHILLA DEPOSITOS	6,35		1,35		M2	4,29
						9,47

ESQUEMA

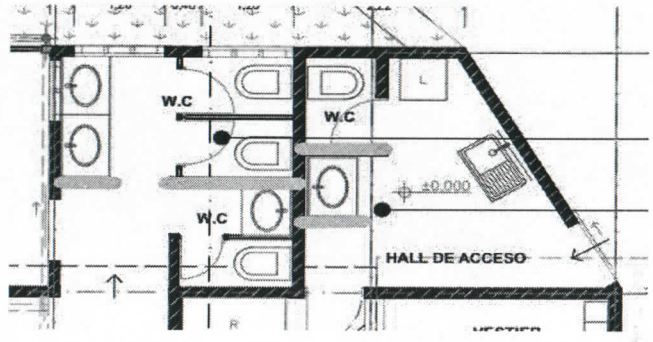

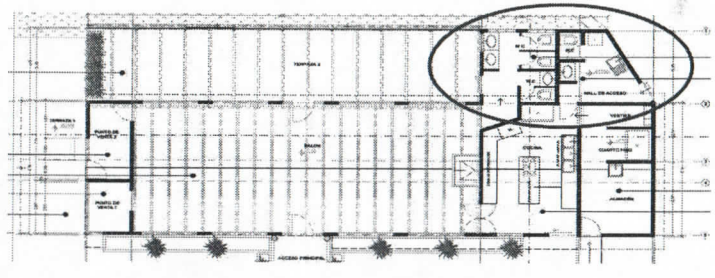

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó


JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES

IDEBOY
Boyacá Crece

OBJETO	MEJORAMIENTO LOCATIVO PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	2.2 (1.02.30)- SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84	UNIDAD	KG



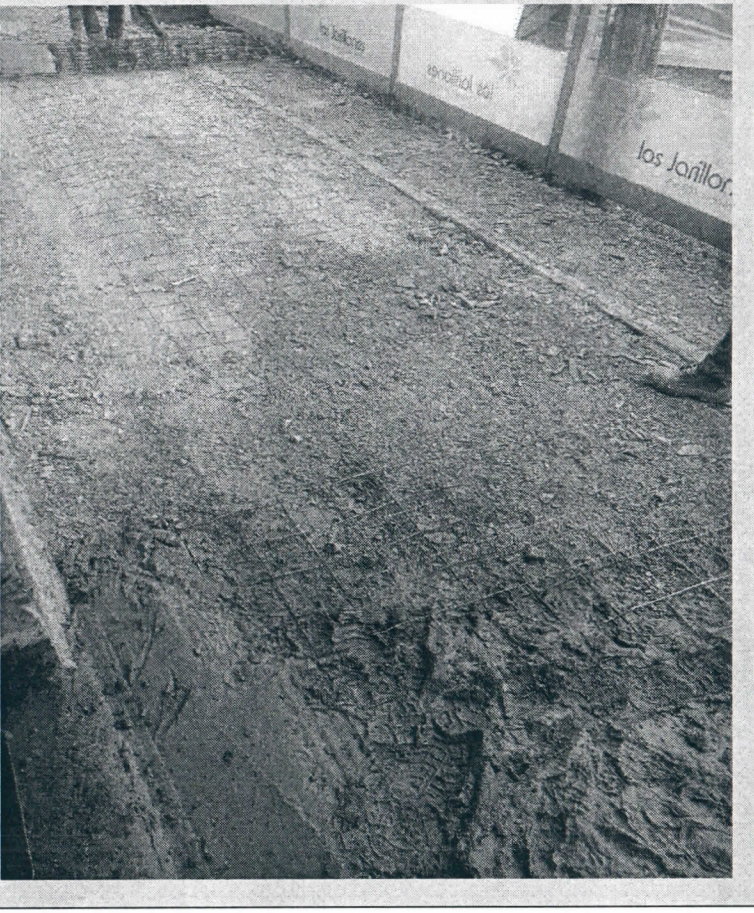

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	2.2 (1.02.30)- SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84
UNIDAD	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Area	kg			
TERRAZA		56,70	1,32		KG	74,84
DEPOSITO		20,96	1,32		KG	27,66
TERRAZA		7,80	1,32		KG	10,30
TERRAZA 2		19,50	1,32		KG	25,74
						138,54

ESQUEMA

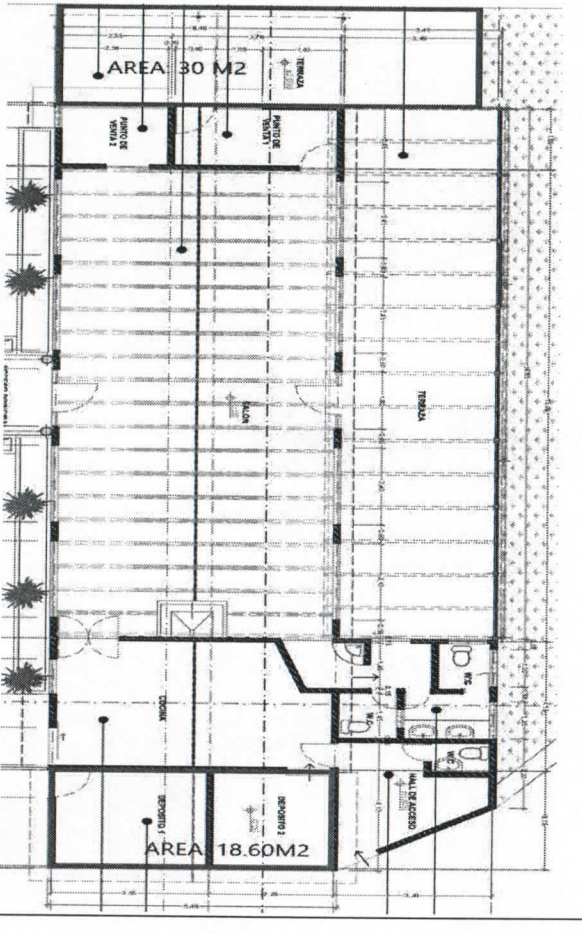

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	2.1 (1.02.17)- EXCAVACION MANUAL	UNIDAD	M3



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	2.1 (1.02.17)- EXCAVACION MANUAL — UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Area	Prof			
TERRAZA 1 DESAGUE CANAL SU[redacted]		2,72	0,40	1,09	M3	1,09
TERRAZA 1 [redacted]		27,50	0,10	2,75	M3	2,75

Nota: La profundidad se toma de 0,14cm ya que 10 cm hace parte de la demolicion de placa es decir profundidad total es 0,24 cm

						3,84

ESQUEMA

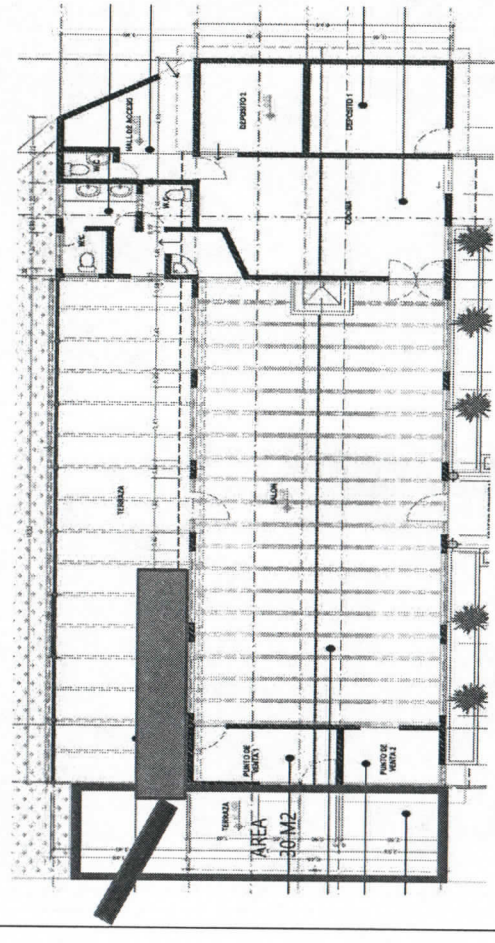

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY

Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS A PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	1.11 (1.01.63)-DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS
UNIDAD	M2



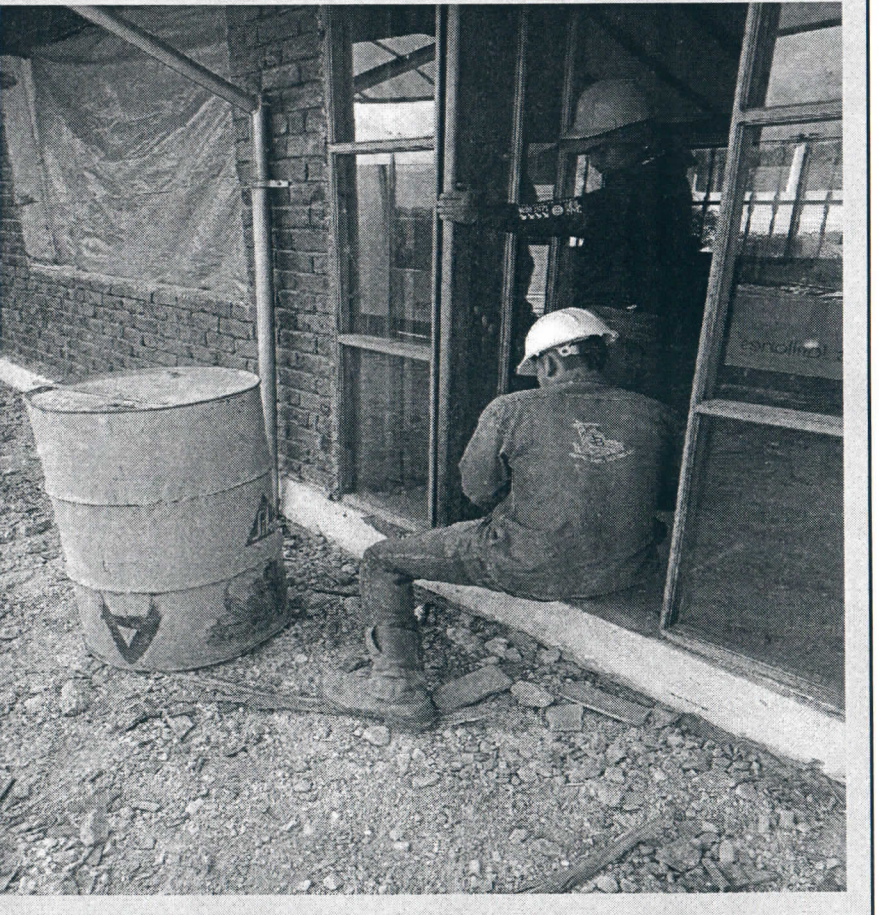

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó


JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	1.11 (1.01.65)-DESMONTE VIDRIO	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			ACUMULADO
P3	1,80		2,10			3,78
P5	1,80		2,10			3,78
P6	0,90		0,26			0,23
P10	0,60		0,10			0,06
P12	0,60		0,13			0,08
V1	1,19		1,30			1,55
V2	2,43		1,34			3,26
V3	2,43		1,34			3,26
V4	2,43		1,34			3,26
V5	2,43		1,34			3,26
V6	2,55		1,00			2,55
V7	1,05		1,00			1,05
V8	2,43		1,34			3,26
V9	2,43		1,34			3,26
V10	2,43		1,34			3,26
V11	2,43		1,34			3,26
V12	1,20		0,97			1,16
V13	1,20		0,95			1,14
V14	0,61		0,84			0,51
V15	0,90		0,28			0,25
V16	0,90		1,00			0,90
V17	0,57		0,67			0,38
TOTAL						43,50

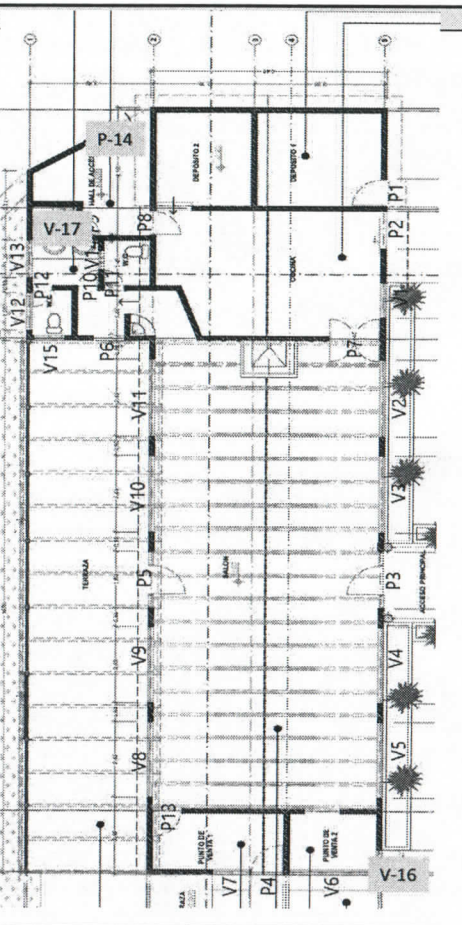

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	4,1 (1.05.02)- FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES — UNIDAD: ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	ancho	alto			ACUMULADO
P1	1,00			2,00		2,00
P1			2,10	3,00		6,30
P2	1,30		2,16	2,00		6,92
P2			2,16	3,00		6,48
P5			2,10	2,00		4,20
P6	0,90			1,00		0,90
P6			2,10	4,00		8,40
P7	1,50			2,00		3,00
P7			2,00	2,00		4,00
P8	0,80			2,00		1,60
P8			2,10	4,00		8,40
P13	0,90			2,00		1,80
P13			2,00	2,00		4,00
P14	1,00			2,00		2,00
P14			2,00	2,00		4,00
V1	1,19			4,00		4,76
V1			1,30	4,00		5,20
V2	2,43			2,00		4,86
V2			1,34	2,00		2,68
V3	2,43			2,00		4,86
V3			1,34	2,00		2,68
V4	2,43			2,00		4,86
V4			1,34	2,00		2,68
V5	2,43			2,00		4,86
V5			1,34	2,00		2,68
V6	2,55			4,00		10,20
V6			1,00	3,00		3,00
V8	2,43			2,00		4,86
V8			1,34	2,00		2,68
V9	2,43			2,00		4,86
V9			1,34	2,00		2,68
V10	2,43			2,00		4,86
V10			1,34	2,00		2,68
V11	2,43			2,00		4,86
V11			1,34	2,00		2,68
V12	1,20			4,00		4,80
V12			0,97	4,00		3,88
						156,16

ESQUEMA

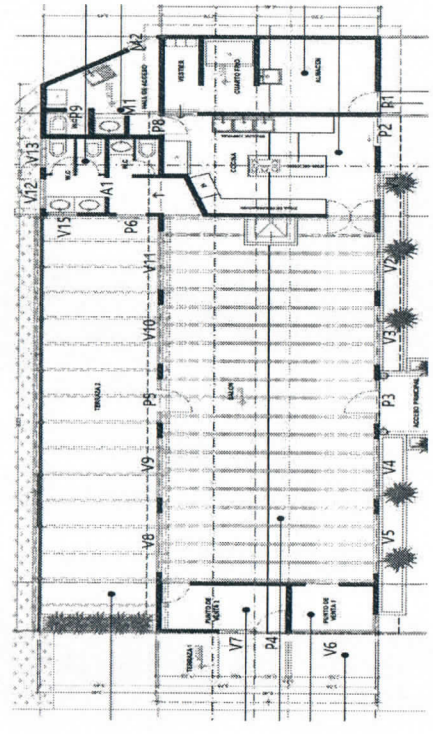

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIA DE CANTIDADES

IDEBOY
Boyacá Crece

OBJETO	MEJORAS A LA VIA DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	4,1 (1.05.02)- FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	UNIDAD	ML



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	4,4 (1.05.13)-PAÑETE LISO MUROS 1:4 — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	ancho	alto			
COCINA (1)	2,86		2,35	1,00	M2	6,72
COCINA (2)	3,46		2,35	1,00	M2	8,13
COCINA (3)	1,75		2,35	1,00	M2	4,11
COCINA (4)	0,70		2,35	1,00	M2	1,65
COCINA (5)	1,64		2,35	1,00	M2	3,85
COCINA (6)	5,10		2,35	1,00	M2	11,99
PUNTO DE VENTA 1 (19)	2,45		2,35	1,00	M2	5,76
PUNTO DE VENTA 1 (20)	2,40		1,10	1,00	M2	2,64
PUNTO DE VENTA 1 (21)	1,00		2,35	1,00	M2	2,35
PUNTO DE VENTA 1 (22)	1,40		2,35	1,00	M2	3,29
PUNTO DE VENTA 1 (23)	2,40		2,35	1,00	M2	5,64
PUNTO DE VENTA 2 (24)	0,60		2,35	1,00	M2	1,41
PUNTO DE VENTA 2 (25)	1,73		2,35	1,00	M2	4,07
PUNTO DE VENTA 2 (26)	2,45		2,35	1,00	M2	5,76
PUNTO DE VENTA 2 (27)	1,73		2,35	1,00	M2	4,07
PUNTO DE VENTA 2 (28)	1,10		2,35	1,00	M2	2,59
DEPOSITO	3,50		2,35	2,00	M2	16,45
DEPOSITO	2,15		2,35	1,00	M2	5,05
DEPOSITO	1,60		2,35	1,00	M2	3,76
FACHADA DEPOSITO	3,30		2,50	1,00	M2	8,25
FACHADA DEPOSITO	6,35		2,50	1,00	M2	15,88
FACHADA HALL ACCESO	3,80		2,50	1,00	M2	9,50
FACHADA CUCHILLA DEPOSITO	6,35		1,35	1,00	M2	4,29
HALL ACCESO CONTRA DEPOSITO	3,30		2,50	1,00	M2	4,13
HALL ACCESO INTERNO	4,60		2,50	1,00	M2	11,50
FACHADA TERRA	16,90		2,30	2,00	M2	77,74
VENTANAS	2,40		1,35	-8,00	M2	-25,92
PUERTAS	1,70		2,10	-2,00	M2	-7,14
FACHADA TERRAZA 2	6,30		2,00	1,00	M2	12,60
CUCHILLA TERRAZA 2	6,30		1,80	1,00	M2	5,67
VENTANAS PUNTO VENTA 2	2,55		1,00	-1,00	M2	-1,28
VENTANAS PUNTO VENTA 1	1,05		1,00	-1,00	M2	-0,53
PUERTA PUNTO VENTA 1	0,90		2,00	-1,00	M2	-0,90
						213,08

ESQUEMA

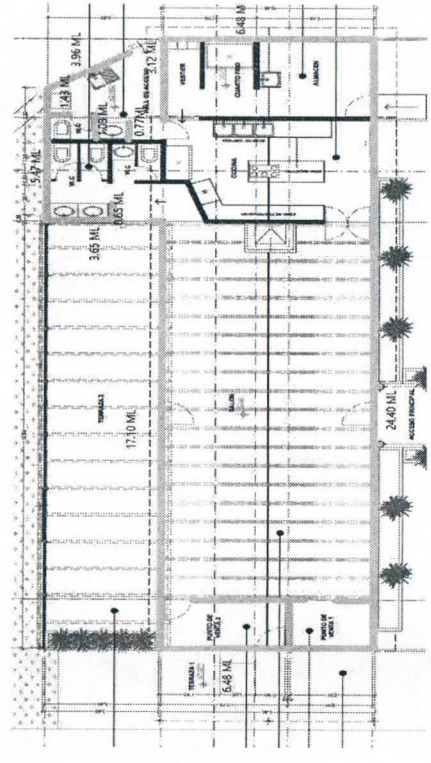

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA


Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	4,4 (1.05.13)-PAÑETE LISO MUROS 1:4	UNIDAD	M2

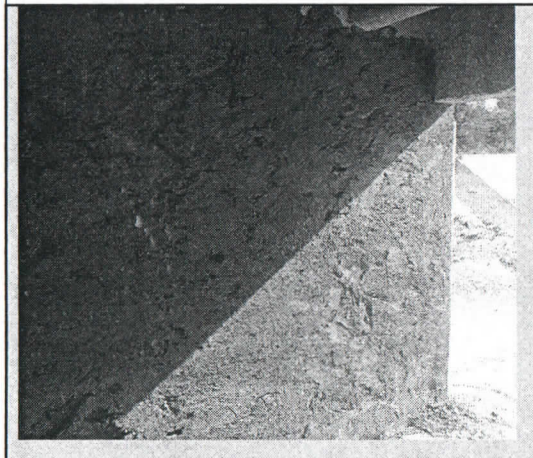





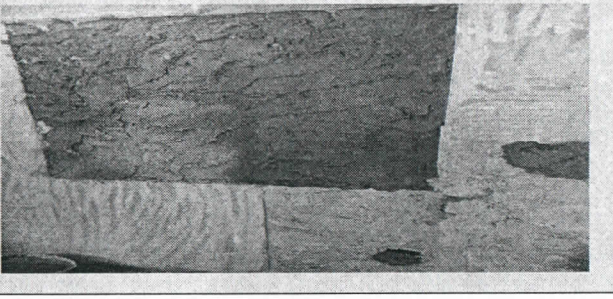

Elaborò

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobò

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY
ITEM	6,1-Restauracion General de la instalacion electrica interna y puesta en funcionamiento
UNIDAD	GL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	ancho	alto			
eneral de la instalacion electrica interna y puesta en f				0,40	GL	0,40
						0,40

ESQUEMA

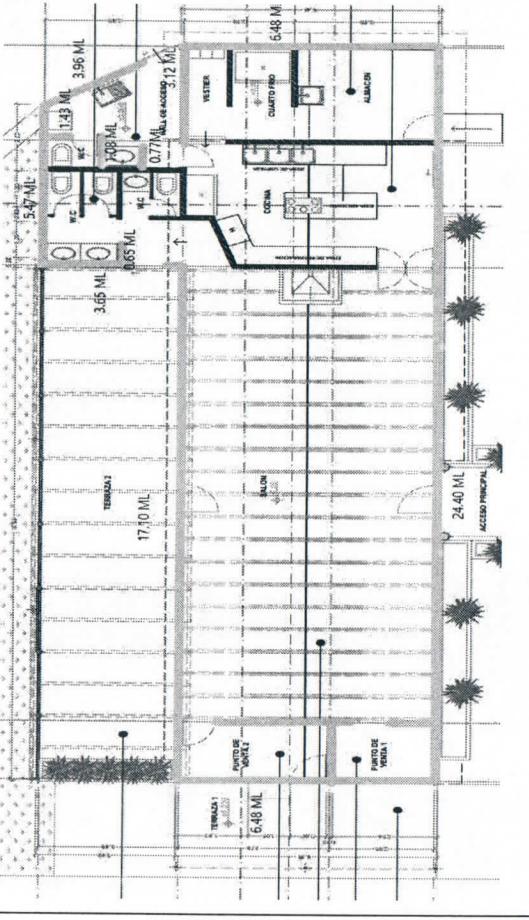

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó


JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	6,1-Restauracion General de la instalacion electrica interna y puesta en funcionamiento	UNIDAD	GL



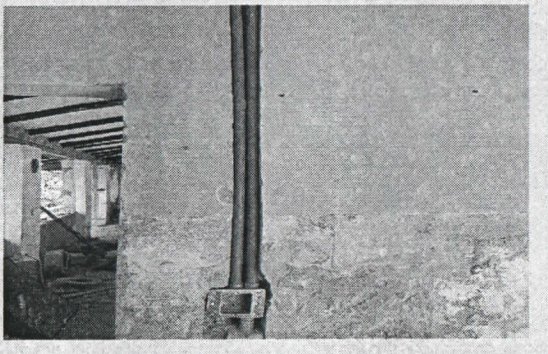

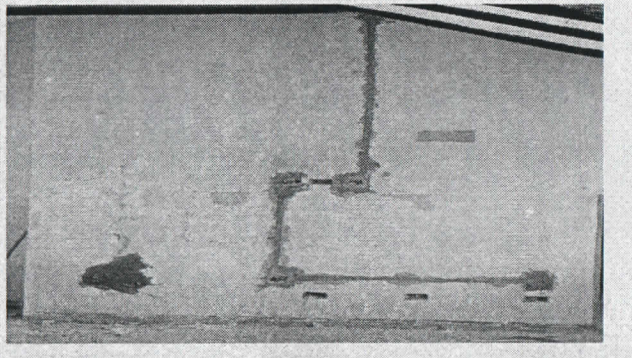



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	9,1 (1.11.04)- ALISTADO DE PISO E=4CM -1:5	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	ancho	AREA			
SALON	15,1	6,1		1,00	M2	92,11
PUNTO VENTA 1	2,4	3,4		1,00	M2	8,16
TERRAZA 1	16,2	3,4		1,00	M2	55,08
						155,35

ESQUEMA

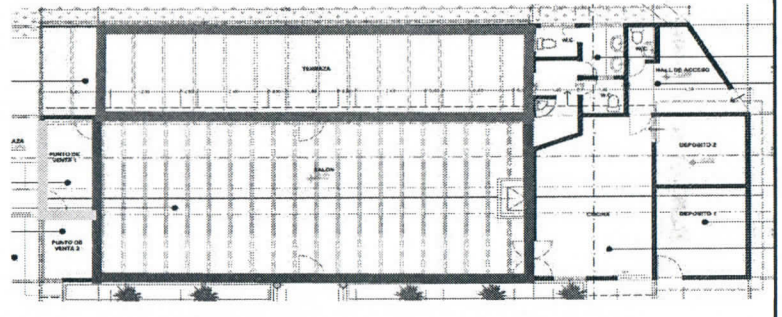

Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	9,2 (1.11.06)- BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	area	ancho	alto			
TERRAZA 1 (ESPESOR= 0 ,10 CM AFIRMADO, 0,10 DE PLACA)	14,58		0,10		M3	1,46
DEPOSITO	20,96		0,22		M3	4,61
HALL ACCESO	8,41		0,10		M3	0,84
						6,91

ESQUEMA

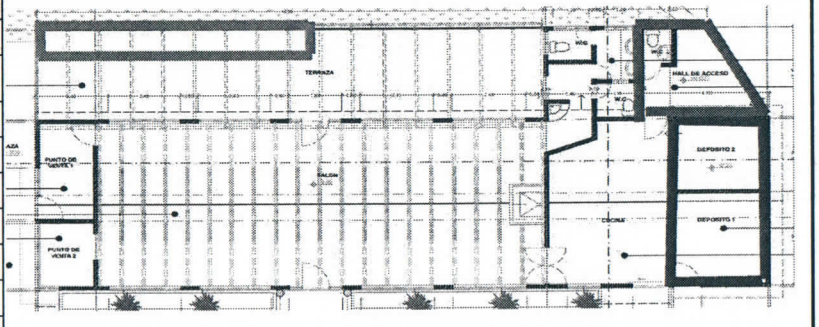



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S.

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION


IDEBOY
Boyacá Crece

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO	MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY		
ITEM	9,3 (1.11.26)- PLACA BASE EN CONCRETO E=10 COM 2500 PSI	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	area	ancho	alto			ACUMULADO
TERRAZA 1 (ESPESOR= 0 ,10 CM AFIRMADO, 0,10 DE PLACA)	56,7				M2	56,70
DEPOSITOS (ESPESOR= 0 ,20 CM AFIRMADO, 0,10 DE PLACA)	20,955				M2	20,96
TERRAZA 1 (ESPESOR= 0 ,10 CM AFIRMADO, 0,10 DE PLACA)	7,8				M2	7,80
TERRAZA 2	19,5				M2	19,50
						104,96

ESQUEMA

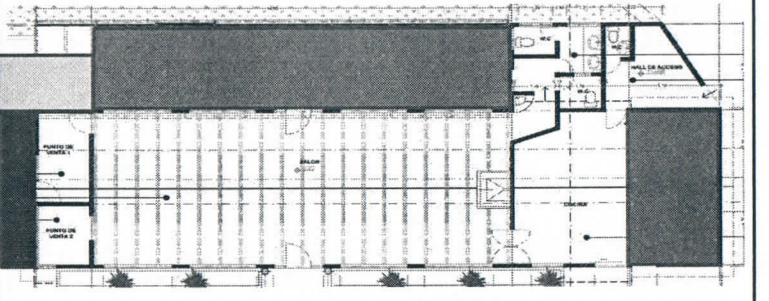



Elaboró

Cristhian Felipe Rodriguez S

CRISTHIAN FELIPE RODRIGUEZ SALAS
RESIDENTE DE OBRA

Aprobó

JOHANNA PEREZ BURGOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

IDEBOY
Boyacá Crece

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	1			FECHA:	31	de	AGOSTO	de	2023		
PERIODO:	DEL	17	de	AGOSTO	de	2023	AL	31	de	AGOSTO	de	2023
CONTRATO No:	49	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	N/A						

OBJETO:

Mejoras Locativas predio denominado Jarillones de propiedad del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyaca- IDEBOY

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Paipa-area Rural

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Dinamizacion Financiera para el Desarrollo Social y Economico del Departamento

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
N/A	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
COSNTRUCTORA A CRUZ SAS	GLADIS Z. CABALLERO CASTELLANOS

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	No se ha realizado ningun adicional y prorroga		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		-	-

VALOR INICIAL:	$ 204.908.363,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 204.908.363,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL					16	de	NOVIEMBRE	de	2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)						de		de			

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	0,0%	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	16,7%	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	100,0%



PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	11-44-101205047		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
cumlimiento del contrato	26	7	2023	26	4	2024	$ 40.981.672,60
Estabilidad y calidad de la obra							$ 40.981.672,60
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indeminizaciones laborales	26	7	2023	26	10	2026	$ 10.245.418,15

IDEBOY
Boyacá Crece

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA						
No PÓLIZA	11-40101054234		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
predios labores y operaciones	26	7	2023	26	10	2024	100% valor del predio

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
no se han generado actas			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO).	25,11 M2
DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO <=10CMS	59,88 M2
DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	96,85 M2
DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	71,81 ML
DEMOLICION MUROS LADRILLO E=015 MTS	28,28 M2
DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO	255,17 M2
DESMONTE CANALES-BAJANTES	24,7 ML
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	109,06 M2
DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA	18,45 M2
DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	98,1 KG
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	64,79 M2
DESMONTE VIDRIO	43,5 M2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	3,84 M3
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84	138,54 KG
MURO EN BLOQUE No 5 E=0,12 MTS	9,47 M2
MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS	3,14 M2
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	156,16 ML
PAÑETE LISO MUROS 1:4	213,08 M2
Restauracion General de la instalacion electrica interna y puesta en funcionamiento	0,4 GL
ALISTADO PISO E=4CM -1:5	155,35 M2
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	6,91 M3
PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI	104,96 M2

IDEBOY
Boyacá Crece

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Herramienta menor	Demoliciones e Intalaciones	100%	
andamios	demoliciones	50%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
NO SE HAN REALIZADO PAGOS		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA											
					PERIODO						
					DESDE			HASTA			
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
CRISTHIAN FELIPE RODRIGEZ SALAS	1032464040	X	X	X	17	8	2023	31	8	2023
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79387420	X	X	X	17	8	2023	31	8	2023

IDEBOY
Boyacá Crece

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	CRISTHIAN FELIPE RODRIGEZ SALAS	1032464040
RESIDENTE DE OBRA	JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79387420

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
todos los trabajadores cuentan con seguridad social en Obra cuentan con casco y botas	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N/A				


RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

OBSERVACIONES

Se anexa informe de ejecucion , las mayores cantidadese items nuevos se justifican tecnicamente en Bitacora de Obra

FIRMA:



Supervisor

NOMBRE:	GLADYS Z.CABALLERO CASTELLANOS

CONSTRUCTORA A CRUZ SAS
Nit: 800.002.820 - 4

CONTRATO No. 049/2023

OBJETO:
MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY.


SUPERVISOR:
GLADYS Z. CABALLERO CASTELLANOS

CONTRATANTE:
ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	JULIO 14 DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 17 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$204.908.363,00

INFORME DE AVANCE
SOPORTE DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1


AGOSTO 31 DE 2023

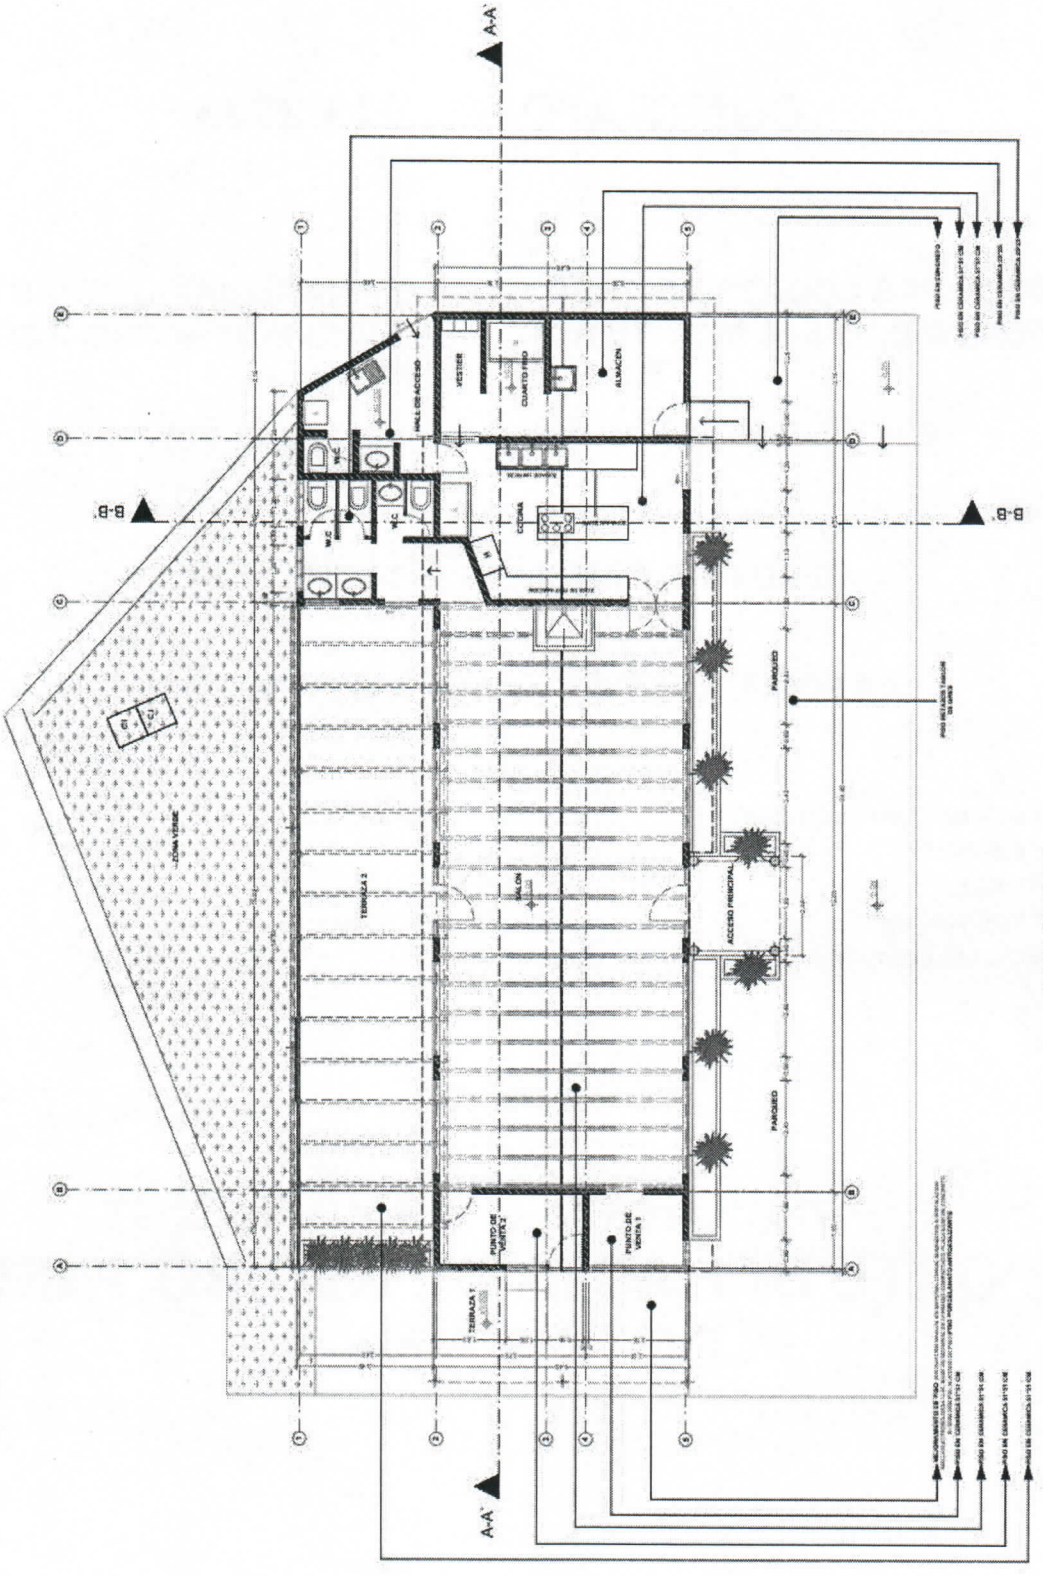


PLANTA GENERAL

PLANO DE AVANCE DE OBRA:


1.1 DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO):

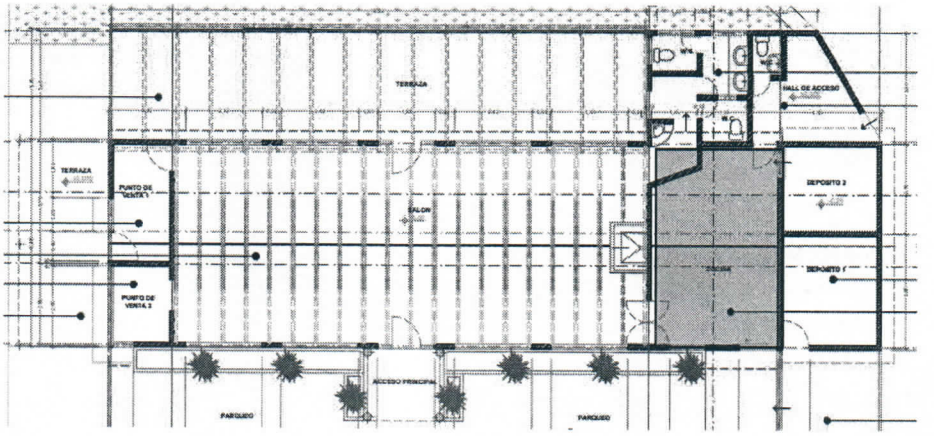


1.2 DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO <=10CMS:

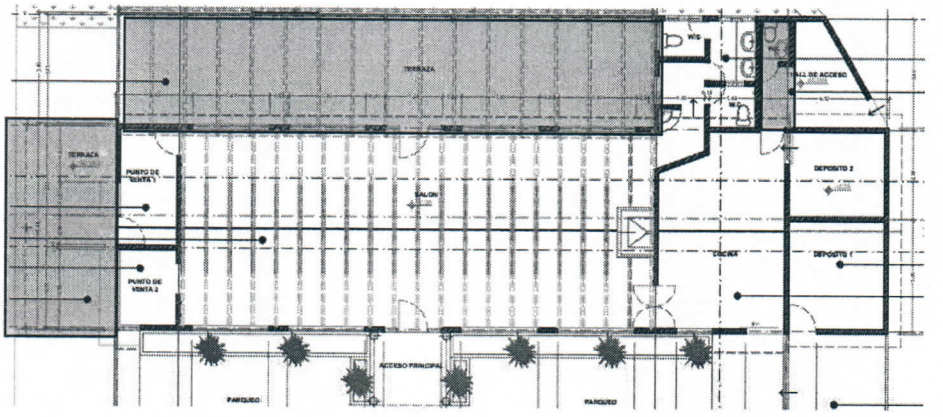


1.3 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO:

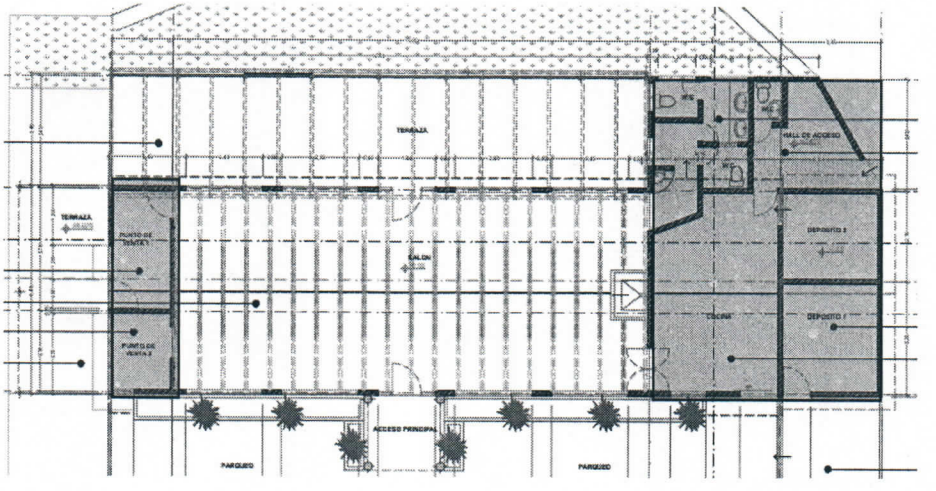


1.4 DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO):

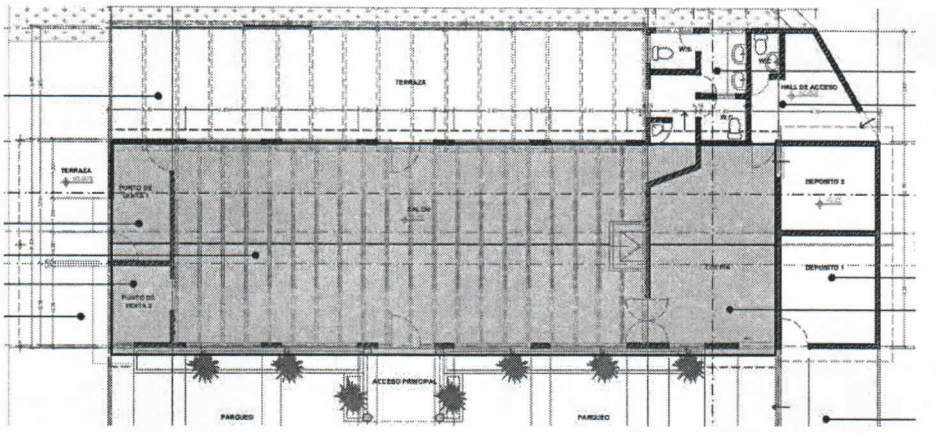


1.5 DEMOLICION MUROS LADRILLO E=015 MTS:

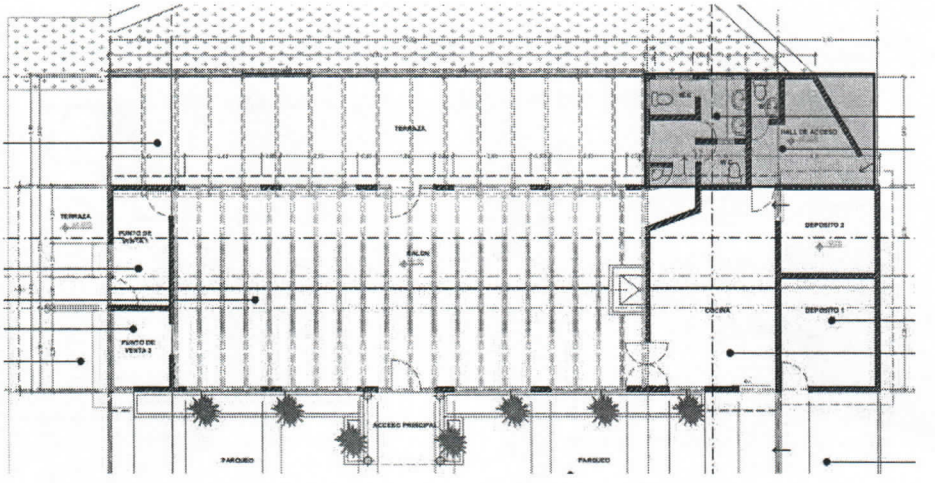


1.6 DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO:

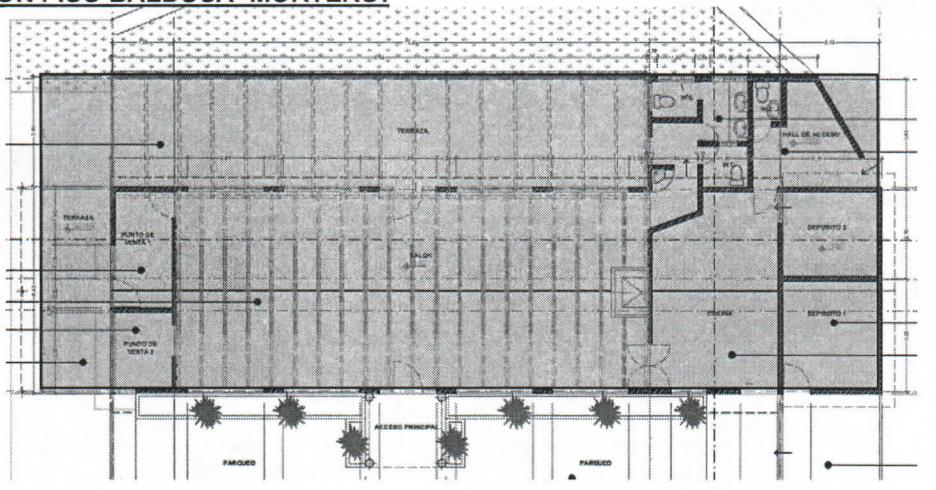


1.7 DESMONTE CANALES-BAJANTES:

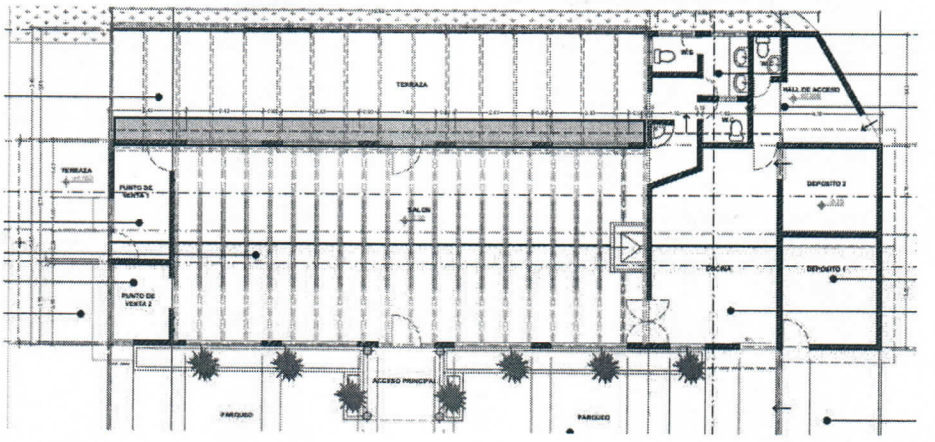


1.8 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO:

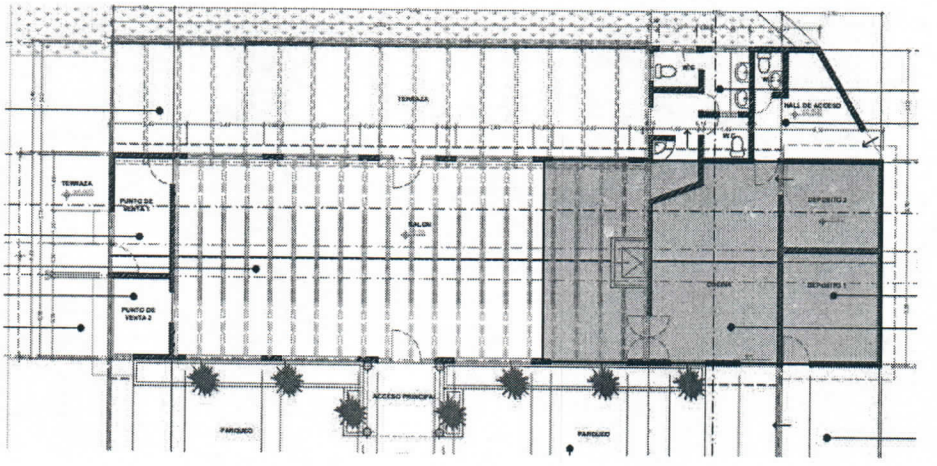


1.9 DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA:

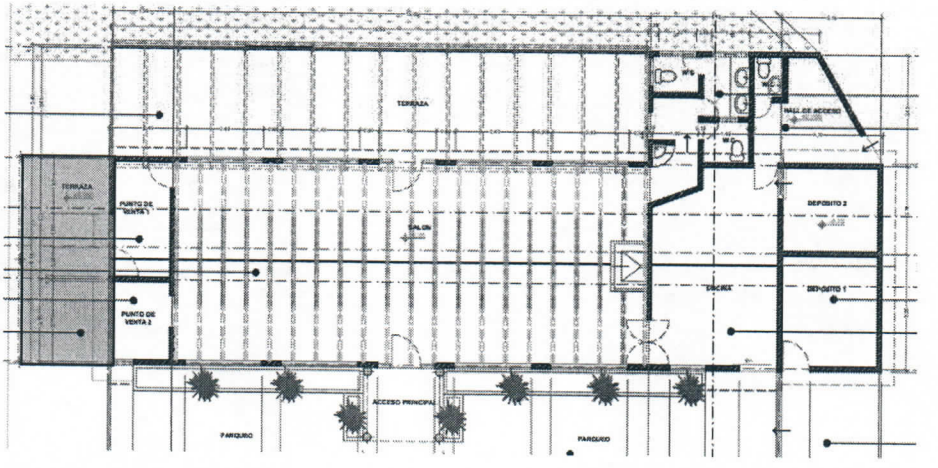


1.10 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS:

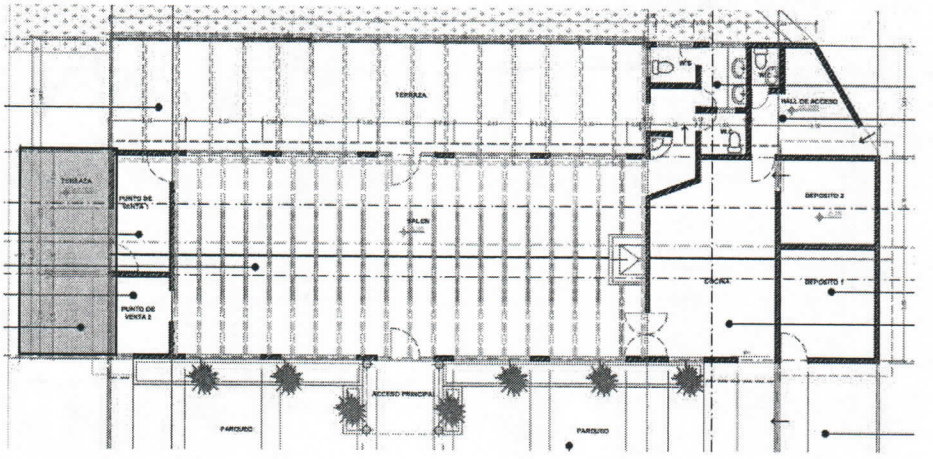


1.11 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS:

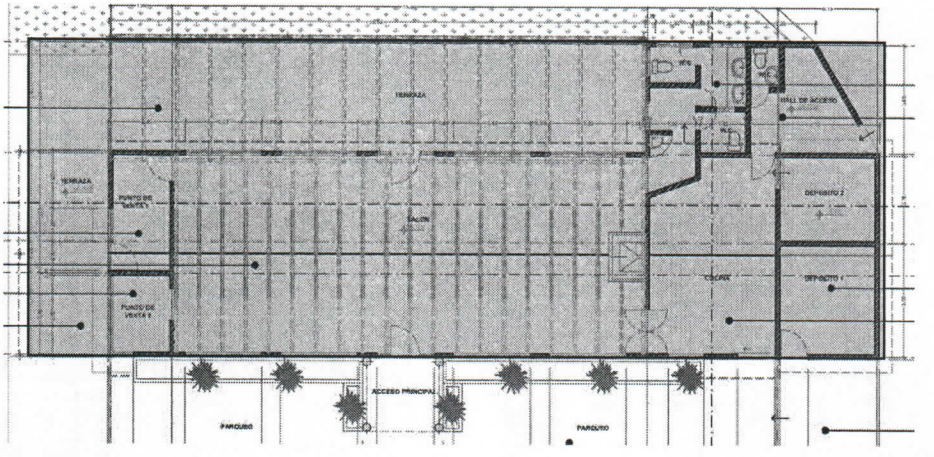


1.12 DESMONTE VIDRIO:

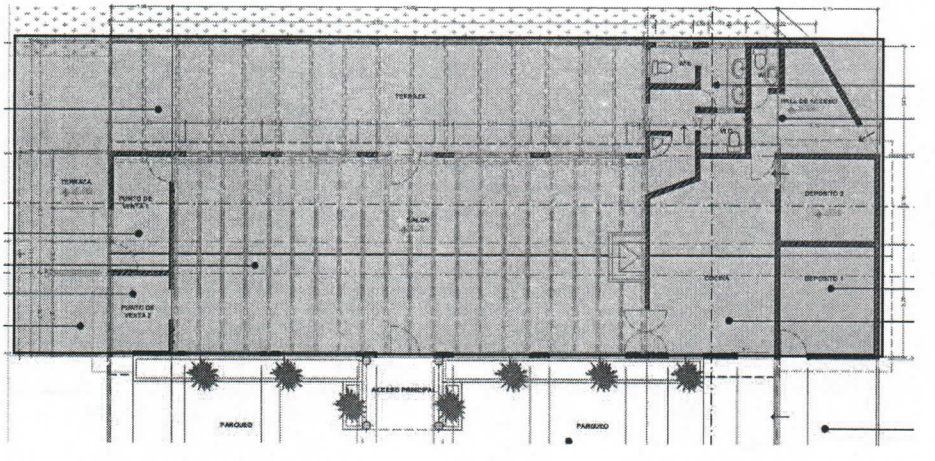


2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO):

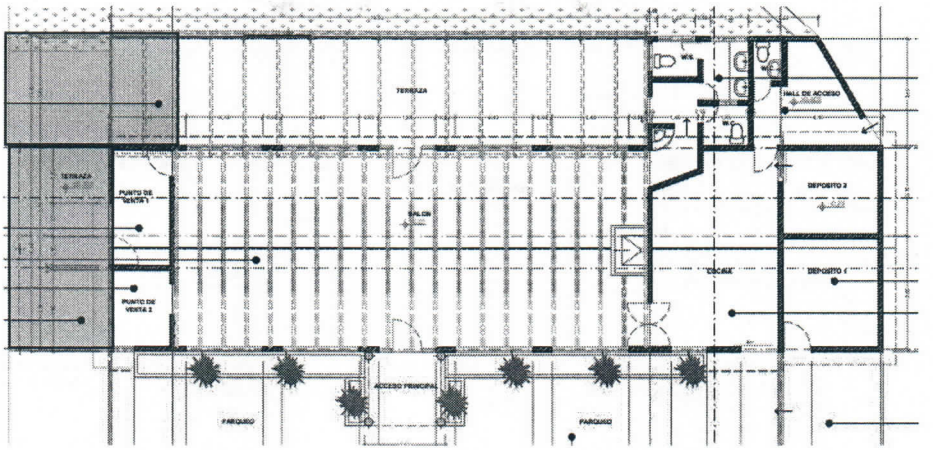


2.2 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84:

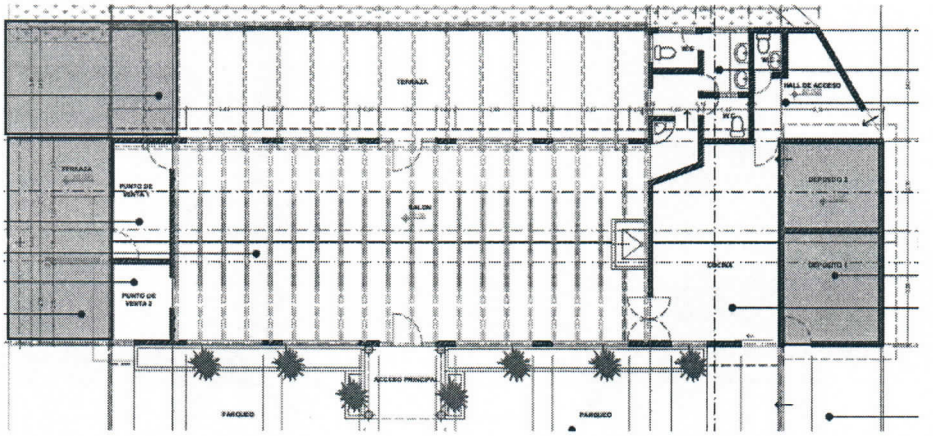


3.1 MURO EN BLOQUE No 5 E=0,12 MTS:

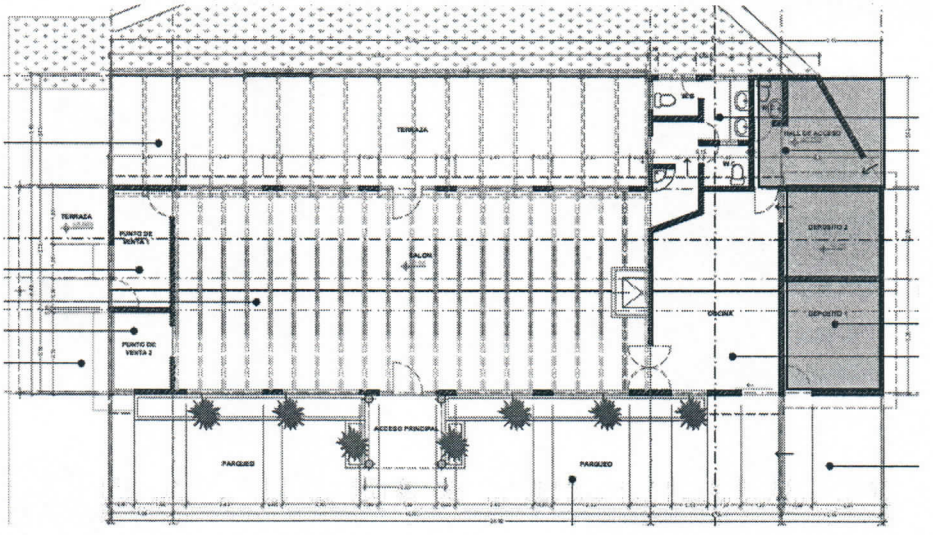


3-2 MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS:

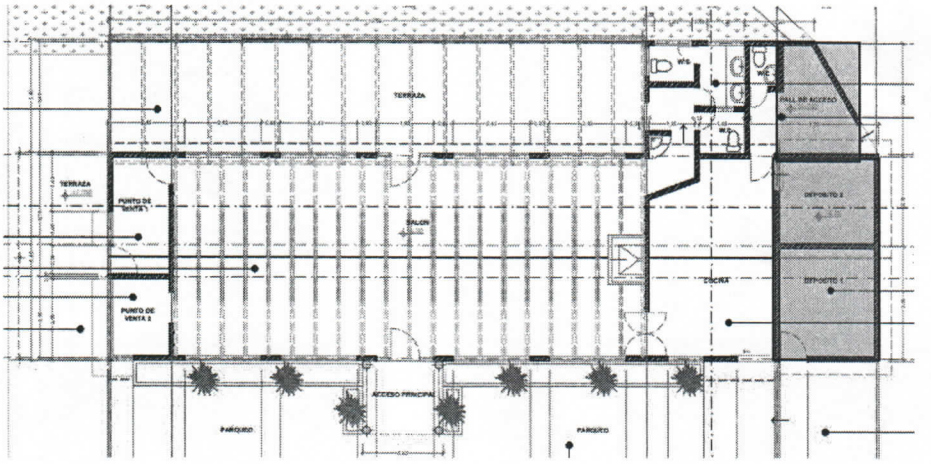


4.1 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES:

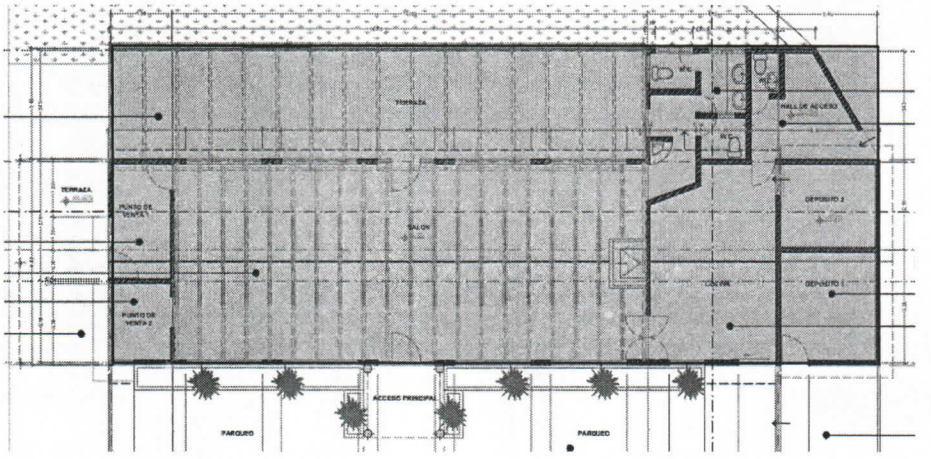


4.4 PAÑETE LISO MUROS 1:4:

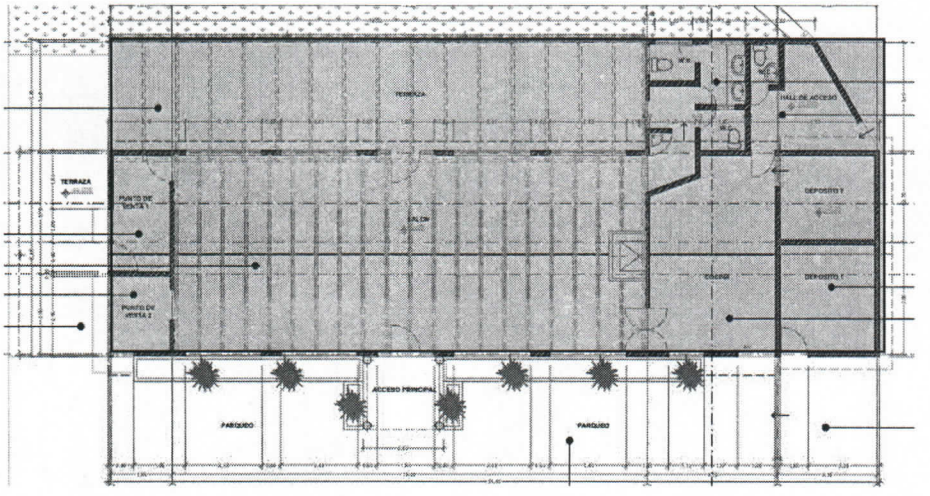


6.1 Restauración General de la instalación eléctrica interna y puesta en funcionamiento:

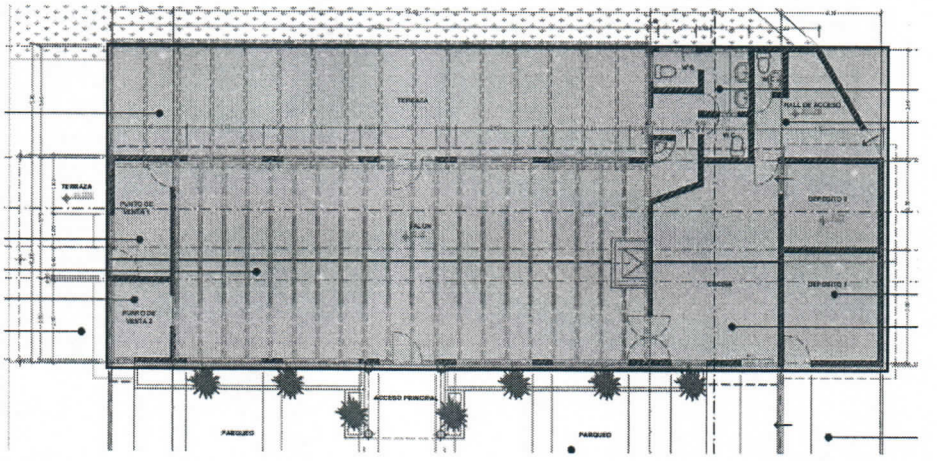


9.1 ALISTADO PISO E=4CM -1:5:

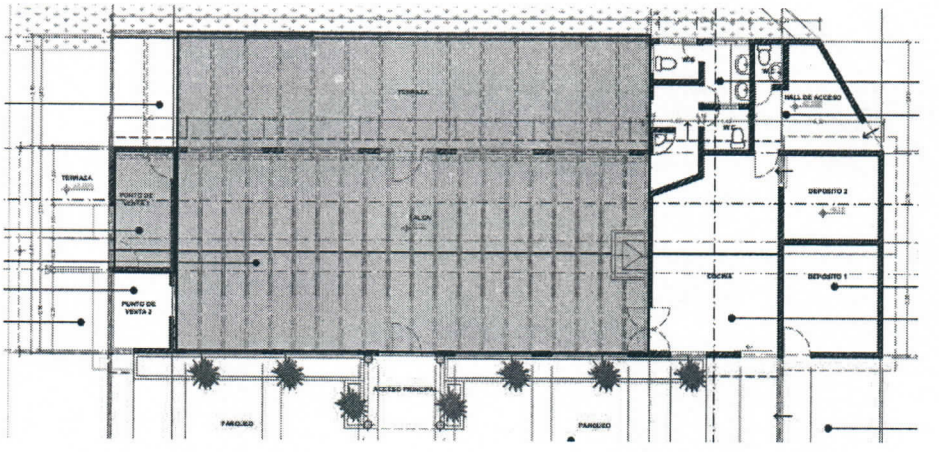

9.2 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO:

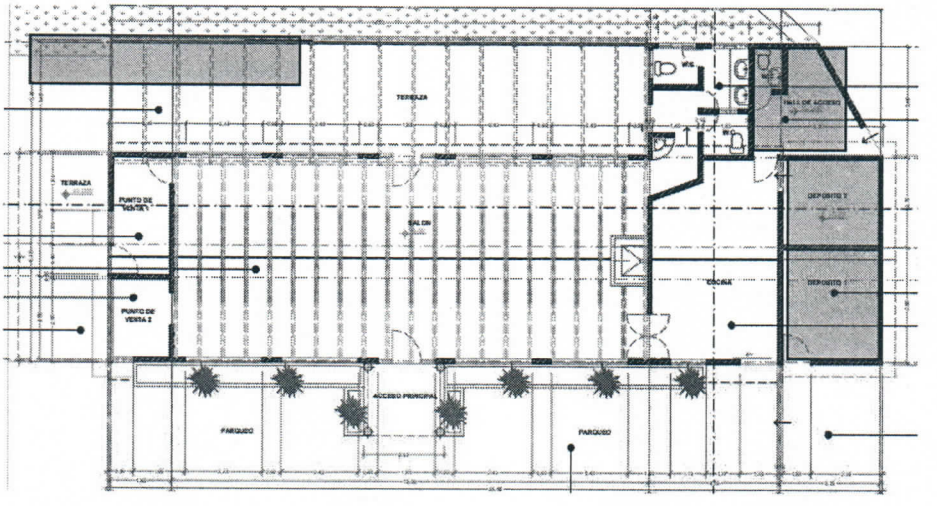

9.3 PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI:

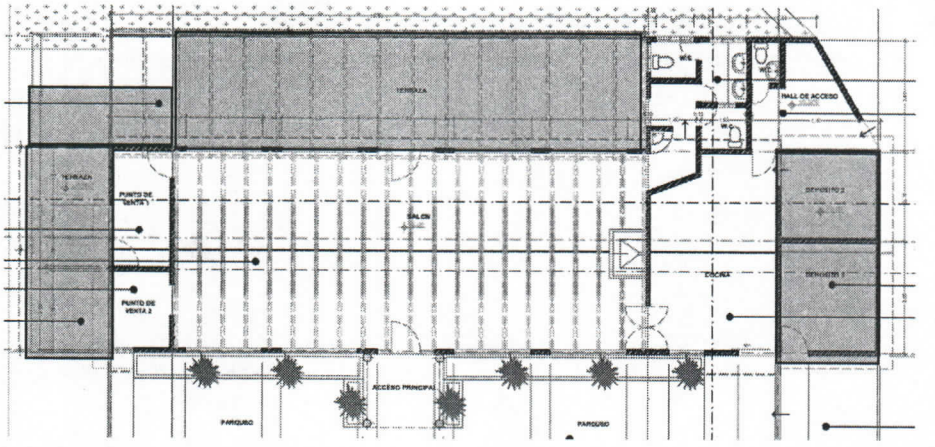

ARQ. JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE PROYECTO

"*SOMOS REGIMEN COMUN
*NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
*Actividad Económica: 4112 Tarifa 6,9x 1000
*Facturación Electrónica"

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764043724975 de 01/02/2023 hasta 01/08/2024
Rango Autorizado del FE93 al FE1000

CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S
NIT 800002820-4

CALLE 117 No 6A-60
TEL 6944390 Bogotá, D.C. - Colombia

SEÑORES:
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA

Tipo documento: NIT
No.: 891800462-5
Dirección: CALLE 19 No. 9-35 PISO 7. TUNJA. - Colombia

Dirección envío:

Pre Factura Electrónica de Venta No.: FE105
Fecha emisión: 04/09/2023
Fecha vencimiento: 04/09/2023
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	00001	ACTA No 1 CONTRATO No 49 DE 2023 CUYO OBJETO ES "MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY	1	1	$34,937,351.13	0	$0.00	$34,937,351.13
2	00003	ADMINISTRACION 25.93%	1	1	$9,059,255.15	0	$0.00	$9,059,255.15
2	00004	IMPREVISTOS 0.50%	1	1	$174,686.76	0	$0.00	$174,686.76
3	00005	UTILIDAD 3%	1	1	$1,048,120.53	0	$199,142.90	$1,048,120.53

4 Items

Observaciones:

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

SUBTOTAL	$45,219,413.57
IVA 19%	$199,142.90
TOTAL	$45,418,556.47

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

Generado por: Documénteme by Mentum Group

Powered by CamScanner

IDEBOY	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG						REGISTRO INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y PAGO	
	PROCESO: APOYO JURIDICO						CODIGO: R-AJ-25	VERSION: 3
							FECHA: 05-04-2021	PAG: 1 DE 1
Dependencia:	Bienes y Archivo	Número de pago:	1	Total de pagos:	N/A	Fecha:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS							
Contrato AG/SP	X	Número:	049 de 2023			Fecha de iniciación:	17/08/2023		
RESOLUCIÓN		Fecha de suscripción:	26/07/2023			Fecha de terminación:	16/11/2023		
FACTURA		N° CDP:	2023-87	Fecha :	6/06/2023	Duración:	3	Meses x	Dias
CONVENIO		N° RP:	2023-95	Fecha :	17/07/2023	Periodo a pagar:	17/08/2023 al 30/08/2023		
		Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:		En tiempo:	
		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga: No.:		En tiempo:	

Objeto:	"MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO9 DE BOYACA- IDEBOY"

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	CONSTRUCTORA A CRUZ SAS. R/L ALFREDO ALFONSO CRUZ MACIAS CC 79141852							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	800.002.820	D.V. 4
Dirección:	EDIFICIO FLOR MORADO EMPRESARIAL CALLE 17 No 6A -60 OFC 409 BOGOTA							
Número de Teléfono:	FAX:			CEL:		3013706500		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	X	Ahorros		Número	449076876	Banco:	BOGOTA

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"				
		Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro	
		Código UNSPSC:		72101507	
		He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato:	$ 204.908.363,00
Adición No.	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 204.908.363,00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00					
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago		Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 45.418.556,47
Saldo:	$ 159.489.806,53

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD						
El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: X	NO:	# de folios: 5
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: X	NO:	
Observaciones del supervisor/interventor a los trabajos ejecutados:	SI:	NO: X	Fecha:

APORTES SEGURIDAD SOCIAL				
Persona Natural:				
Aportes a Salud		Aportes a Pensión		
Valor pagado $	Periodo	Valor pagado $	Periodo	
Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:		
Fecha de pago:		Fecha de pago:		
Aportes ARL		Pensionado:	SI:	NO:
Valor pagado $	Periodo	Certificación:	SI:	NO:
Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal o R/Legal:	SI: X	NO:	

GESTIÓN DEL RIESGO	Certifico que en el periodo que comprende este informe no se materializó ningun riesgo previsible de los tipificados en la matriz de riesgo elaborada en la etapa de planeacion del Contrato"MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO9 DE BOYACA- IDEBOY"- No. 049 de 2023.
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y riesgos conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Contrato de Obra No.049 de 2023 cuyo objeto es ""MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO9 DE BOYACA- IDEBOY""- , los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Observación:

Anexos: Ruta, Copia Factura, certificacion Bancaria, Certificacion de Parafiscales, Informe Contratista, Informe Supervision, Memoria de cantidades ejecutadas, Sabana de cantidades — SI: X NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor: Gladys Z. Caballero Castellanos

Nº. C.C.: 40032895

CARGO: Profesional Universitario Bines y Archivo

CONSTRUCTORA A CRUZ SAS
Nit: 800.002.820 - 4

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE CONSTRUCTORA A CRUZ SAS
NIT. 800.002.820-4

Yo, **MARTHA ADELIA JIMENEZ MATALLANA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.660.092, y con Tarjeta Profesional No. 35473-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de **CONSTRUCTORA A CRUZ SAS** identificada con NIT. 800.002.820-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en BOGOTÁ D.C., a los (4) días del mes de septiembre de 2023.

MARTHA ADELIA JIMENEZ MATALLANA
TP. 35473-T
C.C.: 51.660.092
REVISOR FISCAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79387420	JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	CLL 86 No 103C-49 OF. 4-401	8765182	joseleo64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	06/09/2023	70715324	$411.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	411.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79387420	JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	CLL 86 No 103C-49 OF. 4-401	8765182	joseleo64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	06/09/2023	70715324	$411.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79387420	RODRIGUEZ ORTIZ JOSE LEONEL	57	0				N																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800002820-4	CONSTRUCTORA A. CRUZ SAS	CALLE 117 #6 A 60 OFI 409	6944390	correspondencia@construacruz.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PAIPA	PAIPA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70708984	$503.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.700	0		0		0	0	0	0	21.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	21.700	0		0		0	0	0	0	21.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	21.700	0		0		0	0	0	0	21.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	86.700	0	0	0	0	0	0		86.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	173.400	0	0	0	0	0	0		173.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	113.100				113.100	0	0	113.100			1.131	113.100	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	65.100	0	0	65.100	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	65.100	65.100
Pensión	2	260.100	260.100
Riesgos Laborales	1	113.100	113.100
CCF	1	65.100	65.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	503.400	503.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800002820-4	CONSTRUCTORA A. CRUZ SAS		CALLE 117 #6 A 60 OFI 409	6944390	correspondencia@construacruz.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PAIPA	PAIPA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70708984	$503.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032464040	RODRIGUEZ SALAS CRISTHIAN FELIPE	1	0			S	X																230201	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS005	541.334	21.700	14-11	541.334	5	37.700	CCF21	541.334	21.700	0	0	0	0	0
2	CC	1053612945	ROJAS RIAÑO NASLY ALEXANDRA	1	0			S	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS037	541.334	21.700	14-11	541.334	5	37.700	CCF21	541.334	21.700	0	0	0	0	0
3	CC	80062479	ROJAS SALAS HECTOR WILLIAM	1	0			S	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS041	541.334	21.700	14-11	541.334	5	37.700	CCF21	541.334	21.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14872105856

(415)7707212489984(8020) 000001487210585 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 2 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA A CRUZ SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 117 6 A 60 OF 409

42. Correo electrónico facturaelectronicaacruzsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 4 4 3 9 0	3 0 1 6 9 1 1 7 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 8 6 1 2 0 3	4 1 1 1	1 9 8 6 1 2 0 3	4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 19 / 10 : 46: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CRUZ MACIAS ALFREDO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14872105856

(415)7707212489984(8020) 000001487210585 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 2 0	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	3 1 4 9	
73. Fecha	1 9 8 6 1 2 0 3	2 0 1 8 0 4 2 5
74. Número de notaría	1 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 6 1 2 3 0	2 0 1 8 0 8 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 8 0 2 2 7	0 0 2 8 0 2 2 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 6 1 2 0 3	2 0 1 2 1 2 1 4
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 0	2 0 1 8 0 8 0 6	9 0 0 1 0 9 8 9 0	- 3
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14872105856

(415)7707212489984(8020) **000001487210585 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 2 0	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 1 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 4 1 8 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CRUZ	MACIAS	ALFREDO	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 1 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 2 3 5 9 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	TORRES	MARIA	CONSUELO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 3 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 8 1 0 7 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CRUZ	GONZALEZ	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14872105856

(415)7707212489984(8020) 000001487210585 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 2 0	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 1 2 3 5 9 6 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	TORRES	MARIA	CONSUELO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
165,000,000	5 0	1 9 8 6 1 2 0 3	2 0 1 2 1 2 1 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	2 0 0 2 4 2 3 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CRUZ	GONZALEZ	ANDRES	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
82,500,000	2 5	1 9 9 9 0 2 2 2	2 0 1 2 1 2 1 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	2 2 1 9 1 2 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CRUZ	GONZALEZ	JUAN	DIEGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
82,500,000	2 5	1 9 9 9 0 2 2 2	2 0 1 2 1 2 1 4

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14872105856

(415)7707212489984(8020) 000001487210585 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 2 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 6 0 0 9 2		3 5 4 7 3 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
JIMENEZ	MATALLANA	MARTHA	ADELIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 1 2 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. identificado(a) con NIT 8000028204 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 449076876 desde el 28 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 4 de Septiembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota
