INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 009.
PARA TRÁMITE DE ACTA DE COBRO No. 006.

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4316864	DE 08 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	Consorcio Conexiones Viales Santander	
Nit o C.C. No.	901.669.825-1	
OBJETO:	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN - ONZAGA	

VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($88.323.779.414,00 COP)	
VALOR ADICIONAL:	No Aplica	
VALOR TOTAL:	$88.323.779.414,00	
ANTICIPO INICIAL:	No Aplica	
ANTICIPO ADICIONAL:	No Aplica	
ANTICIPO TOTAL:	No Aplica	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	No Aplica	No Aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	No Aplica	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	7.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	4,54%	
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica	
PLAZO TOTAL:	No Aplica	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC R/L CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.577.958-5**	
SUPERVISOR:	**PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	**08 febrero 2023**	

FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

ACTAS DE REINICIO			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

No.	No aplica	Fecha:	No aplica

FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2028

OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	**$ 1,228,972,438.34**

Periodo de Pago:	**Desde:**	01/11/2023	**Hasta:**	30/11/2023

Tabla 1: Información del contrato de obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA
No. SSEPI	**20220680000060**
No. BPIN	**2022004680068**
Valor total del Proyecto	$88.323.779.414,00
Alcance	SE PLANTEA LA PAVIMENTACIÓN DE 31 KM DE LA VÍA QUE VA A BENEFICIAR A LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES, ONZAGA Y SAN JOAQUÍN

Tabla 2: Información general del proyecto

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.4316864 DE 08 DE FEBRERO DE 2023

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4316864	DE 08 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	Consorcio Conexiones Viales Santander	
Nit o C.C. No.	901.669.825-1	
OBJETO:	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN - ONZAGA	

VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($88.323.779.414,00 COP)	
VALOR ADICIONAL:	No Aplica	
VALOR TOTAL:	$88.323.779.414,00	
ANTICIPO INICIAL:	No Aplica	
ANTICIPO ADICIONAL:	No Aplica	
ANTICIPO TOTAL:	No Aplica	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	No Aplica	No Aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	No Aplica	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	7.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	4,54%	
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica	
PLAZO TOTAL:	No Aplica	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC R/L CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.577.958-5**	
SUPERVISOR:	**PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	**08 febrero 2023**	

FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

ACTAS DE REINICIO			
No.	No aplica	Fecha:	No aplica
No.	No aplica	Fecha:	No aplica

OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**	

FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2028

Tabla 3: Información general del contrato de obra

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	27/02/2023	Se da inicio a las actividades de obra e interventoría.
APROBACIÓN DE POLIZAS	24/02/2023	Se firma el acta de aprobación de pólizas
ACTA PARCIAL No 1	21/09/2023	Se firma el acta parcial No 1
ACTA PARCIAL No 2	28/09/2023	Se firma el acta parcial No 2
ACTA PARCIAL No 3	29/09/2023	Se firma el acta parcial No 3
ACTA PARCIAL No 4	11/10/2023	Se firma el acta parcial No 4
ACTA PARCIAL No 5	21/11/2023	Se firma el acta parcial No 5

Tabla 4: Relación de actos administrativos

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Relación en orden cronológico de las actas de modificación de cantidades y precios no previstos y/o adicionales.

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
ACTA DE MAYORES Y MENORES No 1	29 de septiembre de 2023

Tabla 5: Relación de cambios técnicos y/o modificaciones del contrato

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A (Incluye suministro, transporte e instalación): Se realizó el suministro, transporte e instalación de subbase granular clase A para la via Mogotes-San Joaquín entre las abscisas PR 35+227 al 35+641 con un espesor de 0.20 m como parte de la estructura del pavimento aprobada en los diseños.

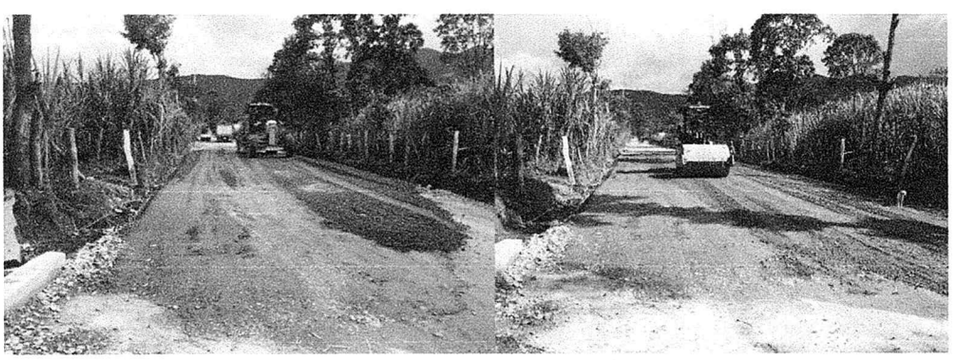


Ilustración 1: Subbase granular clase A

330.1 BASE GRANULAR CLASE A (Incluye suministro, transporte e instalación): Se realizó el suministro, transporte e instalación de base granular clase A para la vía San Gil-Mogotes entre las abscisas PR PR7+024 al PR7+214, PR5+720 al PR5+861, PR2+780 al PR2+903 y PR00+429 al PR00+653 con un espesor de 0.20 m como estructura del pavimento.

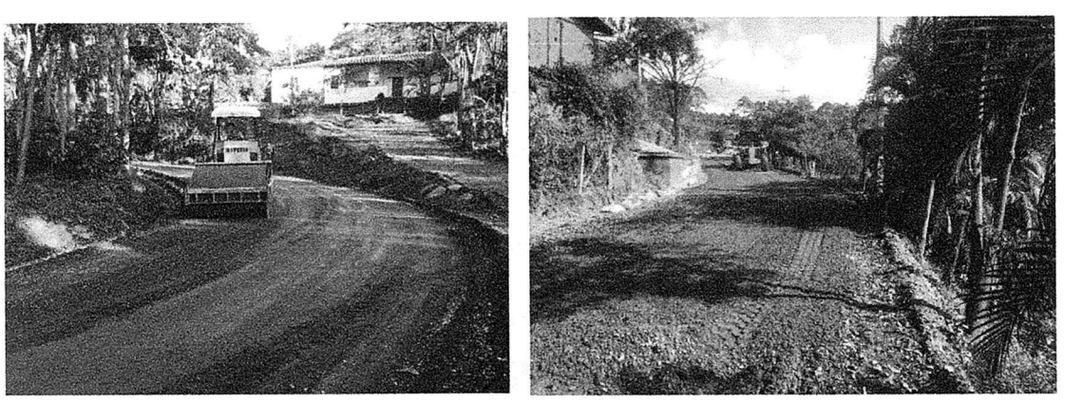


Ilustración 2: Base granular clase A

420.1. REGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-O Durante el presente periodo se realizó el riego de imprimación con emulsión asfáltica con el fin de generar una superficie de transición entre la estructura del pavimento y la capa asfáltica para la vía San Gil-Mogotes entre las abscisas PR PR7+024 al PR7+214, PR5+720 al PR5+861, PR2+780 al PR2+903 y PR00+429 al PR00+653

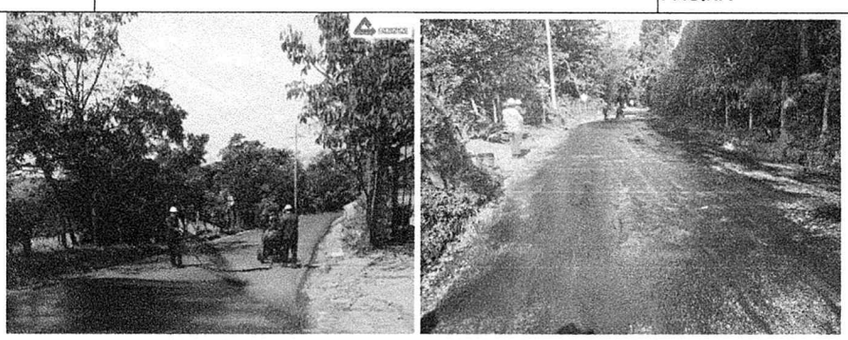


Ilustración 3: Riego de imprimación con emulsión asfáltica

600.1.1.A EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR A MAQUINA: El presente ítem corresponde a las excavaciones para generar la superficie necesaria para la instalación de los filtros en los PR 35+841 al PR 36+040, del PR 35+027 al PR 35+127 y PR 34+364 al PR 34+480 de la vía Mogotes-San Joaquín.

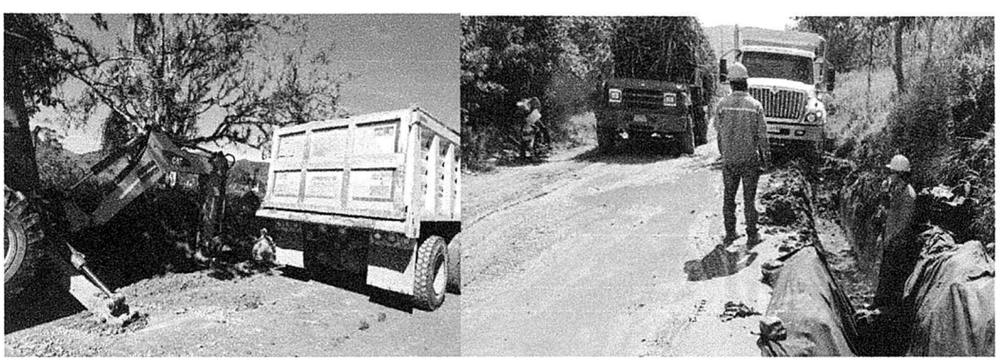


Ilustración 4: Excavaciones sin clasificar a maquina

610.5 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN): El presente ítem corresponde al material granular filtrante instalado en los filtros de los PR 35+841 al PR 36+040, del PR 35+027 al PR 35+127 y PR 34+364 al PR 34+480 de la vía Mogotes-San Joaquín.

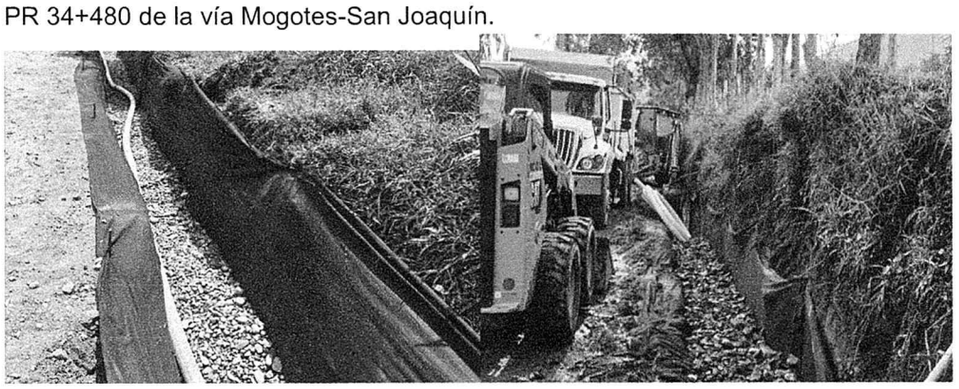


Ilustración 5: Material granular filtrante

673.1.6 GEOTEXTIL TIPO NT-2000 O SIMILAR NO TEJIDO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN): Este ítem corresponde al geotextil suministrado e instalado en los filtros realizados en los PR 35+841 al PR 36+040, del PR 35+027 al PR 35+127 y PR 34+364 al PR 34+480 de la vía Mogotes-San Joaquín.

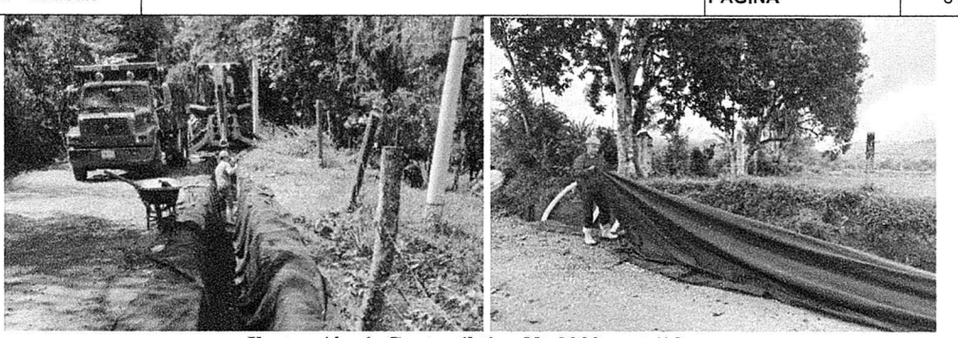


Ilustración 6: Geotextil tipo Nt-2000 no tejido

663.1 TUBERIA PERFORADA 4"(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN): Este ítem corresponde a la tubería perforada suministrada e instalada en los filtros realizados en los PR 35+841 al PR 36+040, del PR 35+027 al PR 35+127 y PR 34+364 al PR 34+480 de la vía Mogotes-San Joaquín.



Ilustración 7: Tubería perforada de 4"

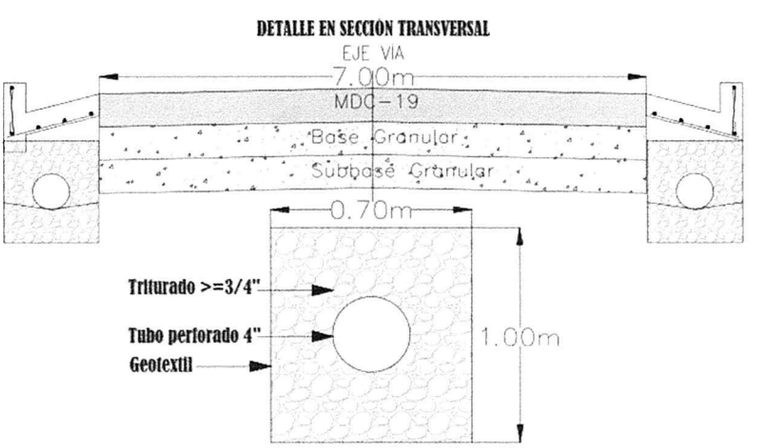


Ilustración 8:Diseño tipo filtro

630.3.7 CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28Mpa: durante el presente periodo se fundió la losa superior del box culvert del PR 38+428, esta actividad se realizó siguiendo con los diseños establecidos y cumpliendo con los parámetros de calidad.

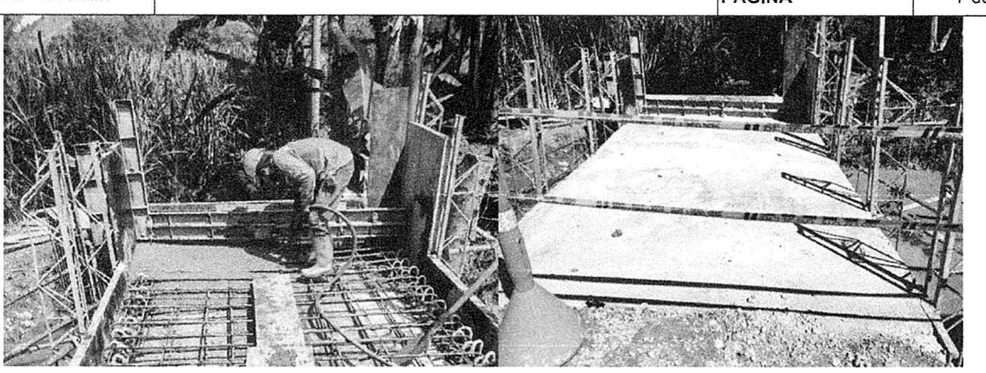


Ilustración 9: Concreto clase C

NP-01 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN): Se realizó el suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 para la vía San Gil-Mogotes entre las abscisas PR PR7+024 al PR7+214, PR5+720 al PR5+861, PR2+780 al PR2+903 y PR00+429 al PR00+653 con un espesor de 0.13 m como capa de rodadura.

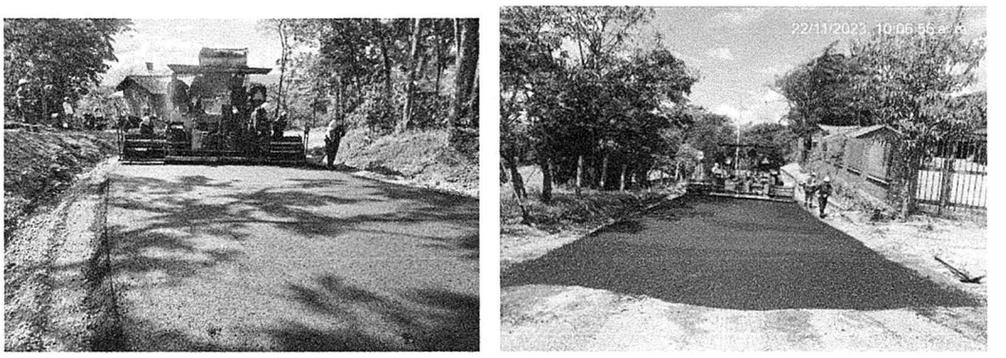


Ilustración 10: Mezcla densa en caliente MDC-19

NP-08 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO: Corresponde a la conformación de terraplenes con material seleccionado para el mejoramiento de la capacidad portante de la subrasante desde el PR 35+500 al 35+820 con un total de 870.07 m3

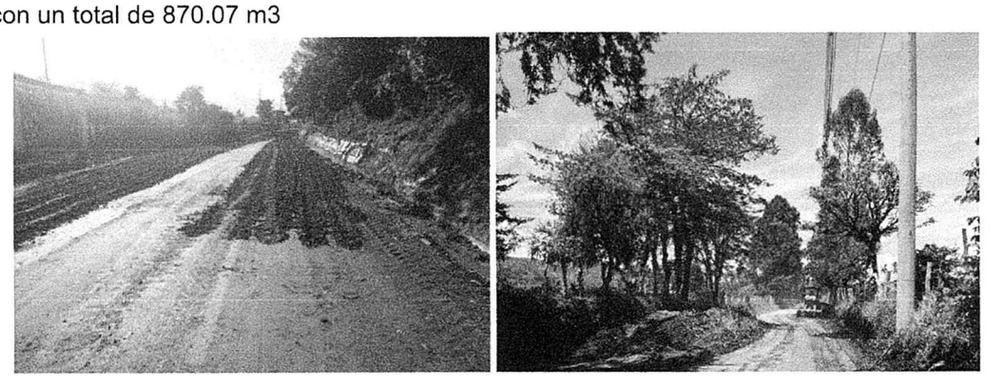



Ilustración 11: Conformación de terraplenes con material seleccionado

ITEM	NORMA ESP TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)	
				CANT	VALOR PARCIAL
PAVIMENTOS					**$ 344,012,399.33**
320.1	320-13	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalación)	M3	538.20	$ 119,057,374.80
330.1	330-13	BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalación)	M3	828.73	$ 205,442,995.73
420.1	420-13	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-O	M2	5217,12	$ 19,512,028.80
ALCANTARILLAS					**26,508,913.20**
600.1.1.A	600-13	Excavaciones sin clasificar a Maquina	M3	421.68	$ 26,508,913.20
CUNETAS Y FILTROS					**$ 141,154,669.2**
610.5	610-13	Material granular filtrante (incluye suministro, transporte e instalación)	M3	421.68	$ 118,553,223.60
673.1.6	673-3	Geotextil Tipo NT-2000 o similar no tejido (incluye suministro, transporte e instalación)	M2	1706.80	$ 22,601,445.60
MUROS K33-57					**$ 3,072,752.44**
630.3.7	630-13	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa	M3	3,31	$ 3,072,752.44
VARIOS					**$ 10,673,159.0**
663.1	663-13	Tubería Perforada 4"(incluye suministro, transporte e instalación)	M	301.00	$ 10,673,159.00
ITEMS NO PREVISTOS					**$ 703,550,545.2**
NP-01		Mezcla densa en caliente MDC-19 (incluye Suministro, Transporte e instalación)	M3	339.11	$ 534,134,534.77
NP-08		CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	869,96	$ 169,416,010.40

Tabla 6: Resumen de actividades realizadas en el periodo

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Se muestra la reprogramación de la obra presentada en la modificatoria No 1 del contrato, esta programación se encuentra en el anexo No 8 del presente informe.

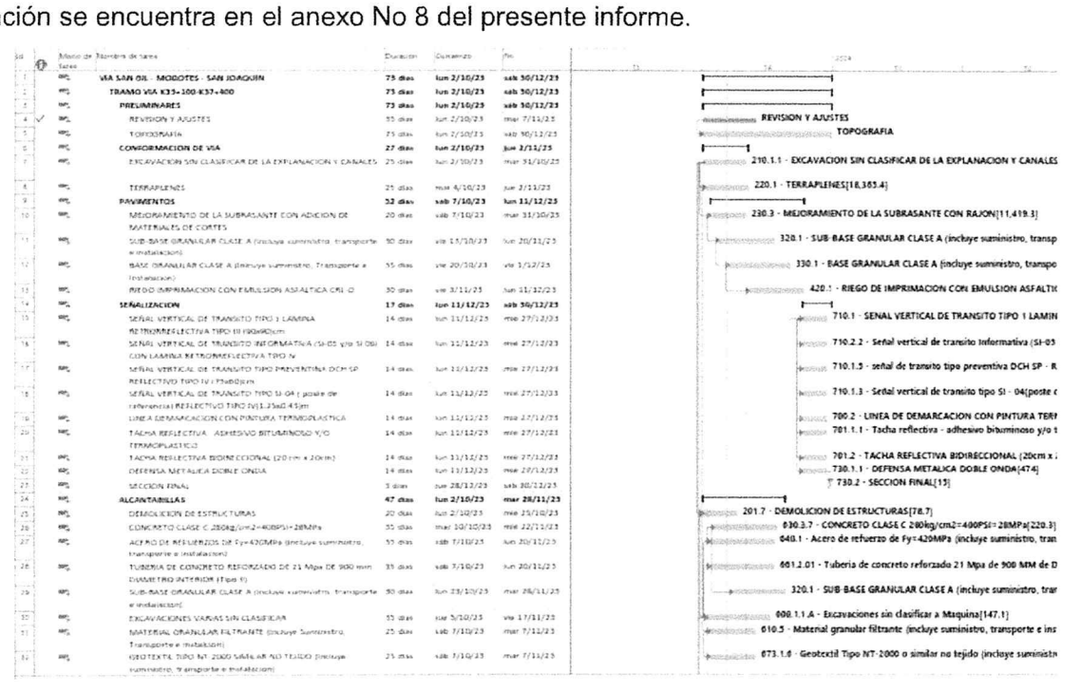

al día 30 de noviembre la obra presenta un avance físico de 7.31 % y una programación de 14.83% por lo que se presenta un atraso de 7.52%

1.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Se anexa el reporte diario de estado general del tiempo:

FECHA	DIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1/11/2023	MIERCOLES	LLUVIAS	Lluvias en la tarde
2/11/2023	JUEVES	LLUVIAS	Lluvias en la tarde
3/11/2023	VIERNES	LLUVIAS	Lluvias en la tarde
4/11/2023	SABADO	LLUVIAS	Lluvias en la noche
5/11/2023	DOMINGO	LLUVIAS	Lluvias en la noche
6/11/2023	LUNES	LLUVIAS	Lluvias en la noche
7/11/2023	MARTES	LLUVIAS	Lluvias en la madrugada
8/11/2023	MIERCOLES	LLUVIAS	Lluvias en la noche
9/11/2023	JUEVES	LLUVIAS	Lluvias en la tarde
10/11/2023	VIERNES	SOLEADO	
11/11/2023	SABADO	SOLEADO	
12/11/2023	DOMINGO	SOLEADO	
13/11/2023	LUNES	SOLEADO	
14/11/2023	MARTES	LLUVIAS	Lluvias en la noche
15/11/2023	MIERCOLES	SOLEADO	
16/11/2023	JUEVES	SOLEADO	
17/11/2023	VIERNES	LLUVIAS	Lluvias en la tarde
18/11/2023	SABADO	SOLEADO	
19/11/2023	DOMINGO	SOLEADO	
20/11/2023	LUNES	SOLEADO	
21/11/2023	MARTES	SOLEADO	
22/11/2023	MIERCOLES	SOLEADO	
23/11/2023	JUEVES	SOLEADO	
24/11/2023	VIERNES	SOLEADO	
25/11/2023	SABADO	SOLEADO	
26/11/2023	DOMINGO	SOLEADO	
27/11/2023	LUNES	SOLEADO	
28/11/2023	MARTES	SOLEADO	
29/11/2023	MIERCOLES	SOLEADO	
30/11/2023	JUEVES	SOLEADO	

Tabla 7: Estado del tiempo

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Entrega de informes SST y ambientales del proyecto	Ver Anexos en el informe
realización de la inducción y reinducción a los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a los trabajadores dependientes, cooperadores, en misión y contratistas.	Ver Anexos en el informe.
Seguimiento a la programación	Ver Anexos en el informe.
Trámite de permisos	Ver Anexos en el informe.
Comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad	Ver Anexos en el informe.
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.	Ver Anexos en el informe.

Se gestiona la disposición del material de excavación del proyecto, para él un punto autorizado y certificado.	Ver Anexos en el informe.
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	Ver Anexos en el informe.

Tabla 8:Actividades ejecutadas por el contratista

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero director de obra	2
Ingeniero Residente de obra	1
Ingeniero auxiliar residente	1
Profesional HSQ	1
Especialista en vías	1
Especialista en estructuras	1
Especialista hidráulico	1
Especialista en geotecnia	1
Especialista ambiental	1
Asesor legal	1
Secretaria	1
topógrafo	1
Auxiliar SST	1
Despachadora-recibidora	1
Profesional social	1
Auxiliar social	1
Auxiliar ambiental	1
Inspectores	1
Operadores de maquinaria amarilla	10
Administrador	1
Ayudante de topografía	1
ayudantes	33
conductores	3
Oficiales	4
Controladores viales	11
Conductores volquetas	31
Servicios generales	1
Técnico de laboratorio	1
Almacenista	1
Auxiliar de despacho	1
Auxiliar de suministro	1
TOTAL	**118**

Tabla 9: Relación del personal de obra

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
GONZALEZ PELAEZ AYINSON JAVIER	17975755	Especialista en estructuras	Independiente	2,300,000	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	2,300,000	7903166261	2,300,000	257,500	368,000	12,100	667,600
VANEGAS BARROS WILLIAM JAVIER	1121333761	Especialista en Hidraulicos	Independiente	3,102,600	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	3,102,600	9459576625	3,102,600	357,900	496,500	216,000	1,100,400
CABALLERO JAVIER	91509767	Especialista en Geotecnia	Independiente	1,160,000	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9459631545	1,160,000	145,000	185,600	12,200	342,800
DOTOR ERIKA	1095911554	Profesional HSQ	Independiente	1,160,000	100%	15/03/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9459529361	1,160,000	145,000	185,600	60,800	411,400
SEPULVEDA LORGIA	63526573	Profesional ambiental	Independiente	1,160,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9459720305	1,160,000	145,000	185,600	60,800	411,400
INCIARTE JESUS	1122510440	Asesor legal	Independiente	1,160,000	100%	15/03/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9459403556	1,160,000	145,000	185,600	60,800	411,400
SARMIENTO JOHN	1095613176	Especialista vias	Independiente	1,160,000	100%	26/04/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9459795686	1,160,000	145,000	185,600	60,800	411,400
AMADO FANNY	1005411207	Controladora vial	Empleado	1,160,000	100%	26/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,321,660	52,900	211,500	92,000	356,400
APARICIO STIVEN	1100220051	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	13/05/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,363,362	55,400	221,400	96,300	373,100
ARGUELLO DORIS	1005411432	Auxiliar administrativo	Empleado	1,160,000	100%	21/04/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,573,404	63,000	251,800	109,600	424,400
AVELLANEDA CECILIA	1100221916	Controladora vial	Empleado	1,160,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,442,596	57,600	230,900	100,500	389,200
BARRERA MARIA	1098622491	Residente de obra	Empleado	2,500,000	100%	12/09/2023	N/A	30	Noviembre	2,500,000	9460146279	2,500,000	100,000	400,000	174,000	674,000
BARRERA NANCY	1005464536	Controladora vial	Empleado	1,160,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,357,447	54,300	217,200	94,500	366,000
BARRIOS WILLIAM	6794575	Operador Maq. Amarilla	Empleado	1,600,000	100%	4/05/2023	N/A	30	Noviembre	1,600,000	9460146279	2,131,277	85,300	341,100	148,400	574,800
BUENO NATHALIA	1102362204	Controladora vial	Empleado	1,160,000	100%	8/05/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,352,511	46,000	54,200	94,200	196,400
CASTILLO HOLMER	1098609925	Operador Motoniveladora	Empleado	2,200,000	100%	30/05/2023	N/A	30	Noviembre	2,200,000	9460146279	2,492,593	99,800	398,900	173,500	672,200
CASTRO LUIS	5090053	Ayudante de Obra	Empleado	1,160,000	100%	21/03/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,458,635	58,400	233,400	101,600	393,400
CELY LUIS	3055620	Director obra	Empleado	4,500,000	100%	4/05/2023	15/11/2023	15	Noviembre	4,500,000	9460146279	2,700,000	105,000	432,000	188,000	725,000
CORDERO MARIA	63494525	Servicios Generales	Empleado		100%	14/06/2023	N/A	30	Noviembre	560,000	9460146279	1,160,000	46,400	185,600	80,800	312,800
CORZO DIANA	1100223169	Despachadora - Recibidora	Empleado	1,160,000	100%	20/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,443,630	57,800	231,100	100,500	389,400
ESTUPIÑAN CESAR	1104164490	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	30/07/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,485,787	59,500	237,800	103,500	400,800
FIGUEROA LIZETH	1019142345	Controladora Vial	Empleado	1,160,000	100%	20/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,436,426	57,500	229,900	100,000	387,400
FLOREZ NORVEY	1005411125	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	22/05/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,331,532	53,300	213,100	92,700	359,100
FRANCO JEIMY	1005237355	Controladora vial	Empleado	1,160,000	100%	8/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,379,660	55,200	220,800	96,100	372,100
GALLO JUAN	1096733730	Oficial de obra	Empleado	1,600,000	100%	22/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,600,000	9460146279	1,925,509	77,100	308,300	134,200	519,600
GOMEZ JORGE	1099363935	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,373,459	55,000	219,800	95,600	370,400
GOMEZ LILIANA	1101260449	Controladora vial	Empleado	1,160,000	100%	17/10/2023	N/A	14	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,315,490	52,700	210,600	78,200	341,500
GOMEZ SALOMON	91111061	Operador Maq. Amarilla	Empleado	1,600,000	100%	13/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,600,000	9460146279	1,864,453	74,700	298,400	127,100	500,200
GOMEZ WILMER	1102349140	Conductor volqueta	Empleado	1,160,000	100%	26/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460146279	1,264,000	50,600	202,300	86,000	340,900
GUARIN JEFFERSON	1102364612	Operador Minicargador	Empleado	1,600,000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1,600,000	9460146279	2,165,106	86,700	346,500	150,700	583,900

GUTIERREZ CAROLINA	37640965	Profesional social	Empleado	3,000,000	100%	7/11/2023	N/A	24	Noviembre	3,000,000	9460145279	2,400,000	96,000	384,000	167,100	647,100
GUTIERREZ CRISTIAN	1005419735	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	20/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,319,191	52,500	211,100	91,900	355,500
GUTIERREZ JOSE	1005411525	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	20/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,362,353	54,500	218,000	94,900	367,400
GUTIERREZ JUAN	1061624351	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	17/10/2023	N/A	14	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,352,126	55,300	221,200	96,200	372,700
JAIMES GERMAN	1096209464	Técnico Laboratorio	Empleado	1,600,000	100%	12/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,600,000	9460145279	1,866,996	66,800	267,200	100,100	434,100
LOPEZ ANDRES	1121332715	Ingeniero Residente	Empleado	4,000,000	100%	14/03/2023	N/A	30	Noviembre	4,000,000	9460145279	4,000,000	160,000	640,000	276,400	1,076,400
LOPEZ PEDRO	1100220821	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	13/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,522,609	61,000	243,700	106,000	410,700
MANRIQUE WILMER	1095669435	Topografo	Empleado	2,600,000	100%	28/11/2023	N/A	3	Noviembre	2,600,000	9460145279	369,362	14,800	59,100	25,800	99,700
MARTINEZ JOHAN	1095856243	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	22/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,441,362	57,700	230,700	100,400	388,800
MEJIA OSCAR	1100893597	Conductor volqueta	Empleado	1,160,000	100%	25/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,529,490	73,200	292,800	122,000	488,000
MENDEZ GERSON	91077216	Operador Retrocargador	Empleado	1,700,000	100%	25/05/2023	N/A	30	Noviembre	1,700,000	9460145279	2,079,757	83,200	332,800	144,800	560,800
MENESES DAILY	1064541712	Auxiliar SST	Empleado	1,600,000	100%	26/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,600,000	9460145279	2,313,191	92,600	370,200	161,000	623,800
MIRANDA KAREN	1005450552	Controladora vial	Empleado	1,160,000	100%	26/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,301,915	52,100	208,400	90,700	351,200
OLARTE WENDY	1007446133	Almacenista	Empleado	1,300,000	100%	16/06/2023	N/A	30	Noviembre	1,300,000	9460145279	1,561,353	62,500	249,900	108,700	421,100
PAREDES LUZ	1095606041	Auxiliar de Suministro	Empleado	1,276,000	100%	4/05/2023	N/A	30	Noviembre	1,276,000	9460145279	1,272,134	51,000	203,600	88,900	343,500
PINTO ANDRES	1100221610	Ayudante Topografia	Empleado	1,160,000	100%	22/05/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,508,000	60,400	241,300	105,000	406,700
PINTO EDWIN	1100223186	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	1/09/2023	N/A	9	Noviembre	1,160,000	9460145279	348,000	14,000	55,700	24,300	94,000
QUIÑONES ELMER	1099373439	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	30/07/2023	N/A	14	Noviembre	1,160,000	9460145279	541,334	21,700	86,700	37,700	146,100
RAVELO EDINSON	1104130837	Operador de cargador	Empleado	1,600,000	100%	17/10/2023	N/A	30	Noviembre	1,600,000	9460145279	2,131,277	85,300	341,100	148,400	574,800
RINCON JHOANNY	91461252	Ayudante de obra	Empleado	1,160,000	100%	1/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,373,459	55,000	219,800	95,600	370,400
RODRIGUEZ ANDRES	1102715702	Conductor volqueta	Empleado	1,160,000	100%	26/09/2023	N/A	30	Noviembre	1,160,000	9460145279	1,983,725	79,400	317,400	138,100	534,900
RUEDA GERMAN	1095665506	Director obra	Empleado	4,500,000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	4,500,000	9460145279	4,500,000	180,000	720,000	313,200	1,213,200

RUGELES WILSON	91227759	Inspector de obra	Empleado	2.500.000	100%	3/11/2023	N/A	26	Noviembre	2.500.000	9460146279	3.246.235	130.000	519.600	226.100	875.900
SALAZAR MILSIADES	5690257	Conductor	Empleado	1.160.000	100%	13/04/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	2.044.295	61.500	327.100	142.300	551.200
SERRANO RUTH	63476716	Controladora vial	Empleado	1.160.000	100%	21/04/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	1.201.065	50.900	203.400	83.100	337.400
TAVERA HELIBERTO	5690311	Conductor	Empleado	1.160.000	100%	3/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	2.049.319	62.000	327.900	142.700	552.600
TORRES CRISTHIAN	1100221609	Ayudante de obra	Empleado	1.160.000	100%	8/05/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	1.727.660	69.200	276.500	120.300	466.000
TORRES DIEGO	1100222600	Conductor volqueta	Empleado	1.160.000	100%	9/09/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	2.116.426	84.500	339.000	147.500	571.300
VALDERRAMA NESTOR	1104154204	Ayudante de obra	Empleado	1.160.000	100%	17/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	1.300.651	52.100	208.200	90.600	350.900
VILLAMIZAR DORIS	1100222503	Controladora vial	Empleado	1.160.000	100%	30/05/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	1.357.319	54.700	216.800	95.200	366.700
ZAMBRANO GIOVANNY	1100221024	Oficial de obra	Empleado	1.600.000	100%	11/05/2023	N/A	30	Noviembre	1.600.000	9460146279	1.625.532	65.100	260.100	113.200	438.400
ZAMBRANO PAULA	1005419690	Auxiliar de despacho	Empleado	1.160.000	100%	17/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	1.422.651	57.000	227.700	99.100	383.800
ZAMBRANO RUTH	1100220020	Auxiliar ambiental	Empleado	1.160.000	100%	17/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	1.252.553	50.200	200.500	87.200	337.900
ZAMBRANO SIRLEY	1007644954	Controladora vial	Empleado	1.160.000	100%	22/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9460146279	1.422.651	57.000	227.700	99.100	383.800
ZUNIGA ADOLFO	1100512112	Oficial de obra	Empleado	1.600.000	100%	1/05/2023	N/A	30	Noviembre	1.600.000	9460146279	1.753.191	70.200	280.600	122.100	472.900
PEDRAZA OVALLE JHON JAIRO	1007363766	Operario retroexcavadora	Independiente	1.559.394	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.559.394	72943756	1.559.394	62.400	294.600	106.600	465.600
ARBOLEDA BELTRAN ENRIQUE	91262062	Operario Retrocargador	Independiente	1.160.000	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.00	72943756	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
FERNANDEZ GOMEZ DIEGO	1102714724	Operador Motoniveladora	Independiente	1.160.000	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9459656001	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
GRANADOS DUARTE EDGAR MAURICIO	1095935764	Operador Vibrocompactador	Independiente	1.160.000	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	9459656001	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
SANDOVAL NEIRA FERNANDO	1104154523	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	16/11/2023	N/A	11	Noviembre	1.160.000	7907774621	425.334	17.100	66.100	4.350	89.550
VELANDIA PIMIENTO LUIS ANTONIO	5690456	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	67563704	1.160.000	46.400	185.600	80.800	262.500
SANDOVAL NEIRA WILSON	1104154967	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	27977305	1.160.000	145.000	185.600	80.800	411.400
PADILLA PALOMINO PABLO EMILIO	91065501	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	4525213699	1.160.000		145.000	80.800	225.800
ROMERO DUARTE FAUSTINO	91157151	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	67549202	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
PINZON FERNANDEZ SERGIO ARTURO	1100220987	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	67443070	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
TAVERA CORZO SERGIO FERNEY	1100220741	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	26442692	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
ARGUELLO ARDILA FERNANDO	5729157	Conductor volqueta	Independiente	1.160.00	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	26442692	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
PINTO ROMERO JULIAN	1005419689	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	7907153252	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
VELANDIA FORERO WILLIAM AUGUSTO	91523291	Conductor volqueta	Independiente	1.400.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.400.000	8627171373	1.400.000	175.000	224.000	60.900	459.900
ARENAS ARGUELLO BERNANDO	91105277	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	1099634234	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
TORRES DUEÑAS DANILO	1100452033	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	7907774621	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
SALAZAR QUINTERO EMILIO	5746561	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	13/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	8627969416	1.160.000	145.000	185.600	80.800	411.400
TAVERA CORREA CAMILO ANDRES	1100222437	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	1098670335	1.160.000	46.400	6.200	80.800	103.100
PERALTA FABRE EVERARDO ANTONIO	1100950975	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	67456907	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
ARDILA BELTRAN ROBERTO	91073929	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	8627670325	1.160.000	145.000	185.600	80.800	351.100
USEDA PEÑUELA JUAN SEBASTIAN	1100594560	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	8627319665	1.160.000	145.000	185.600	80.800	351.100
FERNANDEZ ZAMBRANO RONALD LEANDRO	91060126	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	7899299541	1.160.000	145.000	185.600	80.800	351.100
ARGUELLO ARDILA JORGE HUMBERTO	1100221630	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	3/10/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	1065634911	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
ARGUELLO GALVIS AGUSTIN	5668335	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	1065912769	1.160.000	46.400	80.800		127.200
ARGUELLO BURGOS JOSE AGUSTIN	1100221154	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	1065912769	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
PALOMINO GIL ANDERSON	1100221460	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	8627171311	1.160.000	145.000	185.600	80.800	351.100
PINTO CELIS EULICER	1100220316	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/11/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	26412169	1.160.000	46.400	185.600	26.300	260.300
BENITEZ CARDENAS CARLOS ANRES	1101595545	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	24/11/2023	N/A	6	Noviembre	1.160.000	1099634234	232.000	9.300	37.200	16.200	62.700
ABRIL AYALA CESAR AUGUSTO	5690716	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	26442692	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
BARRETO ARGUELLO DIVAN FELIPE	1100223122	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	7907153252	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
GARCIA BECERRA MARIO ISRAEL	91217340	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	67456765	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
ROMERO BARRAGAN JHONATAN DAVID	1005411456	Conductor volqueta	Independiente	1.160.000	100%	1/06/2023	N/A	30	Noviembre	1.160.000	7907774621	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800

Tabla 10: Relación de pagos de parafiscales

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
400046559	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/02/2023	30/06/2028
400046559	PAGO DE SALARIOS	08/02/2023	31/12/2030
400046559	ESTABILIDAD	31/12/2027	31/12/2032
400046558	RESPONSABILIDA CIVIL EXTRACONTRACTUAL	08/02/2023	31/12/2027

Tabla 11: Control de polizas del contratista

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

A continuación, se relacionan los municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor a partir del valor del acta de **$ 1,228,972,438.34**

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
MOGOTES (38.50%)	RETEICA	0.5%	$ 473,154,388.76
SAN GIL (61.50%)	RETEICA		$755,818,049.58

Tabla 12: Municipios donde se realizaron las actividades

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Trámite de acta de recibo 006	Anexo No, 001 Relacione la Evidencia

Tabla 13:Actividades financieras realizadas por el contratista

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$88.323.779.414,00
VALOR ADICIONAL:	No aplica
VALOR TOTAL:	$88.323.779.414,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	4,54%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
23000804	14/02/2023	$9.500.000.000,00	23001949	15/02/2023	$7.823.779.414,00		
23000805	14/02/2023	$7.500.000.000,00	23001950	15/02/2023	$7.500.000.000,00		

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	No aplica	No aplica	No aplica
PARCIAL No 1	21/09/2023	$ 444.606.614,00	$00.000.00
PARCIAL No 2	28/09/2023	$ 417.326.967,78	$00.000.00
PARCIAL No 3	29/09/2023	$1,490,086,947.98	$00.000.00
PARCIAL No 4	11/10/2023	$1.654.742.254,90	$00.000.00
PARCIAL No 5	21/11/2023	$ 1,217,423,292.95	$00.000.00
PRESENTE ACTA	**14/12/2023**	**$1,228,972,438.34**	$00.000.00
TOTAL		**$ 6,453,158,515.95**	$00.000.00

ANTICIPO ADICIONAL:	No aplica
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	No aplica
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	No aplica
REINTEGROS:	No aplica
FIDUCIARIA:	No aplica
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	No aplica
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	No aplica

Tabla 14: Información financiera del contrato

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
➢ Ajuste del PAGA de conformidad a las recomendaciones solicitadas por la interventoría. ➢ Revisión y ajuste del marco legal y metodología. ➢ Revisión del capítulo de la definición del área de influencia y la línea base. ➢ Revisión cartográfica del área de influencia. ➢ Revisión de las fichas de manejo ambiental y sus indicadores. ➢ Elaboración de informe de cumplimiento ambiental.	Anexos adjuntos al informe.

Tabla 15: Actividades ambientales

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
Se verifica que todos los materiales tengan el certificado de calidad (anexo se presenta).	Anexos adjuntos al informe
Se realiza la toma de muestras de materiales granulares en diversas canteras autorizadas en la región, para posteriormente realizarse los ensayos correspondientes.	Anexos adjuntos al informe
Se hace la revisión e inspección de los equipos, con el fin de cumplir con los buenos usos de los mismos, de que su estado sea el adecuado.	Anexos adjuntos al informe

Tabla 16:Actividades de aseguramiento de la calidad

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos en el laboratorio cuyos resultados se anexan al presente informe:

* Ensayos de control base granular
* Ensayos de control subbase granular
* Densidades de campo para subbase granular, mejoramiento con material seleccionado y base granular
* Cilindros de concreto para estructuras hidráulicas
* Ensayos de control de mezcla asfáltica

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

MAQUINARIA/VEHICULO	PLACA	MARCA	MODELO	LINEA
RETROEXCAVADORA	R11D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M
RETROEXCAVADORA	R12D	DOOSAN	2023	DX225LCA-7M
RETROEXCAVADORA		DOOSAN	2007	SOLAR225LC-V
RETROEXCAVADORA		KOMATSU	2014	PC130-8
RETROEXCAVADORA		CATERPILLAR	2022	313GC
RETROCARCADOR	RC01JC	JCB	2022	3CX
RETROCARGADOR		JOHN DEERE	2006	310G
RETROCARGADOR		CATERPILLAR	2018	416F2
MOTONIVELADORA	MN02C	CATERPILLAR	2022	120GC
MOTONIVELADORA		CATERPILLAR	2019	120M
VIBROCOMPACTADOR	VC02C	CATERPILLAR	2022	CS10GC
VIBROCOMPACTADOR		BITELLI	1995	BORA C80
VIBROCOMPACTADOR		INGERSOLL RAND	2002	
MINICARGADOR		CATERPILLAR	2022	236D3
CARGADOR		VOLVO	2010	L70F
TRITURADORA		RM RUBBLE MASTER	2014	RM 80GO
VOLQUETA	SSY 983	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	SSY 963	INTERNATIONAL	2012	7600 SBA
VOLQUETA	LLQ 030	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 029	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 028	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
VOLQUETA	LLQ 027	INTERNATIONAL	2023	HV607SBA 6X4
CAMIONETA	HVZ-111	MAZDA	2014	
CAMIONETA	SON-239	CHEVROLET	2012	
PAVIMENTADORA ASFALTICA		VOLVO	PF3172	N/317210
COMPACTADOR NEUMATICO		INGERSOLL RAND	PTI401	
VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO		INGERSOLL RAND	DD-90	

Tabla 17:Relación de equipos

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se enviaron las siguientes comunicaciones:

1/11/2023	OFI-CONEX-549	Informe de actividades para retiro de tubería de alcantarillado PR33+440 a PR33+580	Hugo Martinez	ESPAMOGOTES S.A
2/11/2023	OFI-CONEX-550	Ingreso de personal	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
3/11/2023	OFI-CONEX-551	Respuesta INV-VIAS CONEXIÓN AC-647-2023. Diseño Estructural Muro PR 26	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
3/11/2023	OFI-CONEX-552	Ingreso de personal	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
3/11/2023	OFI-CONEX-553	Prórroga – Compromiso mesa de trabajo del 18 de septiembre de 2023 – Definir alcance concepto CAS y Delimitación área de influencia	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC

4/11/2023	OFI-CONEX-554	Atención a comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-688-2023. Asunto: Solicitud informe de estado de los trámites de los permisos de Ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal ante la CAS	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
4/11/2023	OFI-CONEX-555	Respuesta AC-731-2023. Ensayos mezcla asfáltica MDC-19 COINOBRAS. Sector Ventanas.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
8/11/2023	OFI-CONEX-556	Respuesta oficio AC-729-2023. Apremio por Incumplimiento: Tercer Requerimiento de atención a las observaciones del "BALANCE, MODIFICACIÓN Y REPROGRAMACIÓN OBRA".	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
8/11/2023	OFI-CONEX-557	Ingreso de personal	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
8/11/2023	OFI-CONEX-558	Estudio hidráulico PR33 a PR 38. Ajustado	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
8/11/2023	OFI-CONEX-559	Estudio hidráulico PR76 Onzaga.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	OFI-CONEX-560	Informe SST Octubre	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	OFI-CONEX-561	Atención a comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-705-2023 de asunto: Respuesta a comunicado OFI-CONEX-538-2023. Observaciones informes de estado ambiental No.7 de septiembre de 2023.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	OFI-CONEX-562	Informe de cumplimiento ambiental No 8 – octubre 2023 V0	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
10/11/2023	OFI-CONEX-563	Ingreso de vehículo clase camión.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
10/11/2023	OFI-CONEX-564	Instalación valla informativa del contrato.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
14/11/2023	OFI-CONEX-565	Incidente entre camión tipo turbo y volqueta doble troque	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
15/11/2023	OFI-CONEX-566	Respuesta Oficio INV-VIAS CONEXIÓN AC-755-2023 REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA ACTAS PARCIALES, INFORMES Y SOPORTES EN MEDIO FÍSICO.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
15/11/2023	OFI-CONEX-567	Respuesta Derecho de petición señora SOLANGEL GARCÍA PINTO.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	OFI-CONEX-568	Solicitud cambio de director de Obra	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC

16/11/2023	OFI-CONEX-569	Entrega de informe Gestión Social N°7 de octubre de 2023	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	OFI-CONEX-570	Entregas de actas de vecindad para su revisión y respectiva aprobación	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	OFI-CONEX-571	Entrega de cronograma del mes de Noviembre de 2023.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	OFI-CONEX-572	RESPUESTA COMUNICACIONES - AGUA INDUSTRIAL	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
17/11/2023	OFI-CONEX-573	Programación de jornada laboral sábado 18 de noviembre 2023 y domingo 19 de noviembre 2023.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
20/11/2023	OFI-CONEX-574	RESPUESTA COMUNICACIONES - PAGA V6	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
20/11/2023	OFI-CONEX-575	Notificación sobre actividad de toma de densidades.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
20/11/2023	OFI-CONEX-576	Ingreso de director de obra	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
21/11/2023	OFI-CONEX-577	Ingreso de maquinaria para pavimentación	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
21/11/2023	OFI-CONEX-578	Solicitud de acto administrativo de declaratoria de emergencia entre el PR26+0215 y el PR26+0500 – Ruta 6403 y el plan de acción especifico aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.	Diana Patricia Pinto	Secretaria de Planacion - Mogotes
21/11/2023	OFI-CONEX-579	Ingreso de personal para realizar pavimentación	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
21/11/2023	OFI-CONEX-580	Inicio de pavimentación en las ventanas e inicio de extensión de base PR 33+300 – PR 34+368 de acuerdo con acta de reunión celebrada en la gobernación el 20 de noviembre 2023	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
22/11/2023	OFI-CONEX-581	Entrega informe de obra del mes de octubre y acta de cobro No. 5	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
22/11/2023	OFI-CONEX-582	Entrega de informe de resultados de laboratorio de caracterización de materiales de planta	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
24/11/2023	OFI-CONEX-583	Respuesta oficio INV-VIAS CONEXIÓN AC-780-2023 apremio por incumplimiento No 2, Remisión informe- Estudios y diseños aprobados a la fecha.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
24/11/2023	OFI-CONEX-584	Ingreso de vibrocompactador con doble rodillo y operador	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC

25/11/2023	OFI-CONEX-585	Programación de jornadas de trabajo sábado 25 y domingo 26 de noviembre.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
27/11/2023	OFI-CONEX-586	Accidente de trabajo el 25 de noviembre 2023	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
28/11/2023	OFI-CONEX-587	Ingreso de personal	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
28/11/2023	OFI-CONEX-588	Atención a comunicación INV-VIAS CONEXIÓN AC-792-2023	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
28/11/2023	OFI-CONEX-589	Dando respuesta a las solicitudes consignadas en el oficio INV-VIAS CONEXIÓN AC-746 -2023 radicado el día 08 de noviembre del 2023	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/11/2023	OFI-CONEX-590	Respuesta comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-803-202	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
30/11/2023	OFI-CONEX-591	Traslado de postas de templeste	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	
29/11/2023	OFI-CONEX-592	Atención ha comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-802-2023	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
29/11/2023	OFI-CONEX-593	Alcance a comunicación OFI-CONEX-574 de asunto Atención a comunicaciones:	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
30/11/2023	OFI-CONEX-594	Atención ha comunicado INV-VIAS CONEXIÓN-AC-600-2023	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC
30/11/2023	OFI-CONEX-595	Entrega de cronograma del mes de Diciembre de 2023.	Loream Yamid Castilla L.	Consorcio Vias Conexión AC

Durante el presente periodo se recibieron las siguientes comunicaciones:

1/11/2023	1057-AC-713	Respuesta comunicado OFI-CONEX-516 - Aprobación Paquete No. 1 de Ítems No previstos del Contrato de Obra.	Consorcio Vias Conexión AC
1/11/2023	1057-AC-714	Respuesta a su comunicado OFI-CONEX-539. Obtención de permiso ante la Autoridad Ambiental componente sobre sustracción de DRMI de los páramos de Guantiva y La Rusia.	Consorcio Vias Conexión AC
2/11/2023	1057-AC-718	SU OFICIO OFI-CONEX-535 – INFORME ESTADO PUENTE PR3+000 SECTOR SANTA ROSITA. Del 18 de Octubre de 2023.0	Consorcio Vias Conexión AC
2/11/2023	1057-AC-719	SU OFICIO OFI-CONEX-548 – NOTIFICACIÓN ESTADOS DE EJECUCIÓN DE LAS SUBSECTORES. VÍA SAN GIL-MOGOTES Del 27 de Octubre de 2023.	Consorcio Vias Conexión AC
3/11/2023	1057-AC-723	Solicitud atención Corredor Vial entre el tramo PR 42 y PR43 Vía Mogotes- San Joaquín.	Consorcio Vias Conexión AC
3/11/2023	1057-AC-725	Reiteración solicitud entrega de Acta Parcial de Obra No. 5 y el Informe mensual de obra - octubre de 2023.	Consorcio Vias Conexión AC
3/11/2023	1057-AC-727	Segundo Requerimiento de estado de vinculación Profesional Social-contrato de obra CO1.PCCNTR.4316864 de 2022	Consorcio Vias Conexión AC

3/11/2023	1057-AC-729	Apremio por Incumplimiento: Tercer Requerimiento de atención a las observaciones del "BALANCE, MODIFICACIÓN Y REPROGRAMACIÓN OBRA".	Consorcio Vias Conexión AC
3/11/2023	1057-AC-731	Solicitud entrega de Pruebas de Calidad para mezcla asfáltica MDC-19 Subsectores San Gil-Mogotes (ventanas)	Consorcio Vias Conexión AC
7/11/2023	1057-AC-732	Solicitud entrega de Pruebas de Calidad para asfalto de las ventanas	Consorcio Vias Conexión AC
7/11/2023	1057-AC-734	Ingreso de personal-OFI-CONEX 550	Consorcio Vias Conexión AC
7/11/2023	1057-AC-736	Atención Inmediata – sitios Críticos – corredor vial San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.	Consorcio Vias Conexión AC
8/11/2023	1057-AC-737	Apremio por incumplimiento - Atención Inmediata – sitios Críticos – corredor vial (Pr 76+040 San Joaquín-Onzaga).	Consorcio Vias Conexión AC
8/11/2023	1057-AC-738	Atención Inmediata – sitios Críticos – corredor vial (Pr39+950-Mogotes-San Joaquín)	Consorcio Vias Conexión AC
8/11/2023	1057-AC-739	Aprobación - diseño Geotécnico PR 76+040– Obras de Estabilización- Sector San Joaquín-Onzaga	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-746	Apremio por incumplimiento Requerimiento de estado de vinculación Profesional Social-contrato de obra CO1.PCCNTR.4316864 de 2022	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-750	Requerimiento previo- Instalación Mezcla asfáltica -Subsectores Corredor vial San Gil – Mogotes.	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-751	Aprobacion condicionada - diseño hidraulico PR 76+040 - Obras de estabilizacion - Sector San Joaquin - Onzaga	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-752	Atención a comunicación OFI-CONEX-553 del 3/11/2023. Reiteración de presentación de PAGA. (Incumplimiento de obligaciones contractuales)	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-753	Apremio por incumplimiento No 1 - definición de proveedor de agua de uso industrial para obra.	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-754	Respuesta al comunicado OFI-CONEX-554 del 3 de noviembre, solicitud informe de estado de los tramites de los permisos de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal ante la CAS	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-755	Reiteración solicitud entrega Actas parciales, Informes y soportes en medio físico.	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-756	Apremio por Incumplimiento, Remisión Informe - Estudios y Diseños Aprobados a la fecha	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-757	Reiteración Solicitud entrega cronograma de Estudios y Diseños obras definitivas Fase III Pr 61+800 (sector Quebrada La Leona).	Consorcio Vias Conexión AC
9/11/2023	1057-AC-758	Reiteración No 2 - atención observaciones a la propuesta económica Señalización y atención quebrada La Leona.	Consorcio Vias Conexión AC
10/11/2023	1057-AC-759	Reiteración observaciones - especialidad en Pavimentos- Materiales de la Quebrada LA LEONA (Pr 61+800 – Municipio de San Joaquín).	Consorcio Vias Conexión AC
10/11/2023	1057-AC-760	Entrega relación de personal y equipos al frente de la atención de emergencias en el corredor vial.	Consorcio Vias Conexión AC
10/11/2023	1057-AC-761	Incumplimiento compromisos comité de obra No. 25	Consorcio Vias Conexión AC
15/11/2023	1057-AC-764	Reiteración observaciones 2da. revisión Análisis de Precios Unitarios de tuberías para obras hidráulicas.	Consorcio Vias Conexión AC
15/11/2023	1057-AC-765	SU OFICIO - OFI-CONEX-564 OBSERVACIONES INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO	Consorcio Vias Conexión AC
15/11/2023	1057-AC-766	Solicitud Intervención del Corredor Vial para atención de emergencias.	Consorcio Vias Conexión AC

16/11/2023	1057-AC-770	Reiteración mejora en el manejo integral de materiales de construcción, RCD en frentes de obra y residuos sólidos convencionales en la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 4316864	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	1057-AC-771	Ampliación de la declaratoria de Emergencia – Pr 76+040 - Alcaldía de Onzaga	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	1057-AC-772	Respuesta al comunicado OFI-CONEX-508 de 9 de octubre de 2023-Seguimiento a las acciones correctivas campamento predio Las Malvinas.	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	1057-AC-773	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-561 Aprobación condicionada del informe de Estado Ambiental del Proyecto No.7 correspondiente al mes de septiembre de 2023.	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	1057-AC-776	Ingreso de personal - respuesta OFI-CONEX-552 Y OFI-CONEX-557	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	1057-AC-777	Respuesta comunicado OFI-CONEX-568-Aprobación Hoja de Vida - Director de Obra propuesto.	Consorcio Vias Conexión AC
16/11/2023	1057-AC-778	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-563 - Ingreso de maquinaria	Consorcio Vias Conexión AC
17/11/2023	1057-AC-780	Apremio por Incumplimiento No 2, Remisión Informe - Estudios y Diseños Aprobados a la fecha	Consorcio Vias Conexión AC
17/11/2023	1057-AC-781	Respuesta comunicado OFI-CONEX-551 – Aprobación de Estudios y Diseños en Estructuras Pr 26.	Consorcio Vias Conexión AC
23/11/2023	1057-AC-792	Respuesta a comunicado OFI-CONEX-562-2023. Observaciones informes de estado ambiental No.8 de octubre de 2023	Consorcio Vias Conexión AC
30/11/2023	1057-AC-800	Respuesta comunicado OFI-CONEX-524. Aprobación parcial - Programa de Inversión de obra No. 2.	Consorcio Vias Conexión AC
27/11/2023	1057-AC-802	Intervención de condiciones inseguras.	Consorcio Vias Conexión AC
27/11/2023	1057-AC-803	Respuesta comunicación OFI-CONEX-557: radicación Hoja de vida Profesional Social: Carolina Gutiérrez Silva.	Consorcio Vias Conexión AC
28/11/2023	1057-AC-804	Respuesta comunicado OFI-CONEX-581-Observaciones Informe de avances de Obra y Acta Parcial de obra No. 5 (octubre 2023)	Consorcio Vias Conexión AC
28/11/2023	1057-AC-805	Solicitud entrega de Acta Parcial de Obra No. 6 e Informe mensual de obra, correspondiente al mes de noviembre de 2023.	Consorcio Vias Conexión AC
29/11/2023	1057-AC-806	Observaciones Informe final - Estudios y Diseños	Consorcio Vias Conexión AC
30/11/2023	1057-AC-811	Remisión comunicado ANM No. 20233210395201 de la Agencia Nacional de Minería	Consorcio Vias Conexión AC
30/11/2023	1057-AC-815	Respuesta comunicado RESPUESTA OFI-CONEX 576-Ingreso Director de Obra	Consorcio Vias Conexión AC

Tabla 18: Comunicaciones del contratista

3. RECOMENDACIONES

A. Debido a las emergencias presentadas en el corredor sector que han dificultado la ejecución de la obra se ha venido afectado la imagen del proyecto ante la comunidad, por esto, ha disminuido la colaboración de la misma.

B. Se han presentado lluvias constantes en el sector dificultando el desarrollo de la obra por lo que el avance ha sido menor al programado, se esta realizando bajo la supervisión de la interventoría un plan de continencia que permita sortear las difíciles condiciones climáticas y mitigar el atraso.

4. ANEXOS

1. Registro fotográfico.
2. Topografía
3. Parafiscales
4. Actas de reunión y/o comités
5. Resultados de laboratorio
6. Flujo de fondos
7. Seguimiento al programa de inversiones
8. Cronograma
9. Bitacora de obra
10. Certificados de calidad
11. Certificación Banacaria
12. Factura
13. Informe ambiental
14. Informe HSEQ
15. Informe Social
16. Polizas

Ing. German Mauricio Rueda Duran
Director de Obra
Conexiones Viales Santander
