INFORME 004 Y FINAL
DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

CONTRATO N° MC-PS-023-2023

PERIODO DEL INFORME
12 DE DICIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE
2023

DIRECCION: Calle 52 N° 14D-27 B/ La Castellana, Monteria – Cordoba
Telefono 7918859; 3045411988
Correo fundacionsocioempresarial@gmail.com

1. Antecedentes

Entre los suscritos a saber: HELMER FABIAN VITOLA HERRERA, mayor de edad, vecino y domiciliado en el municipio de CAUCASIA, identificado con la C.C. 1.045.426.065, expedida en Tarazá - Antioquia quien actúa en nombre y representación de la REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA (RPG-BC), entidad administrativa de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los municipios que la conforman, identificada con NIT Nro. 901.500.213-6, designado mediante Resolución 001 de julio 2 de 2021 y debidamente posesionado el seis (6) de julio de 2021, quien para efectos del presente contrato se denominará la RPG- BC, O CONTRATANTE, por una parte; y por la otra FUNDACIÓN SOCIO EMPRESARIAL identificado con Nit. 900.778.777-8, representante legal KAREN ELENA MEJIA PIÑEREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.670.187 expedida en Lorica, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, aceptaron los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía Nro. MC-PS-023-2023.

CONTRATO NRO:	MC-PS-023-2023	**FECHA:**	24 de agosto de 2023
CONTRATANTE:	REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.500.213-6		
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN SOCIO EMPRESARIAL identificado con Nit. 900.778.777-8		
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN BAJO CAUCA		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA		
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($7.783.483)		
VALOR EN ADMINISTRACIÓN	QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($570.129.692)		
PLAZO:	CINCO (5) MESES		

2. Presentación

La ejecución del presente contrato se regirá a través de las cláusulas pactadas en la carta de aceptación así:

a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del proyecto de DMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la administración delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto contractual conforme con los planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará los respectivos documentos e información técnica, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.

c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que hacen parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y/o el interventor.

d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.

e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.

f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato a la supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversión, cada vez que se requiera.

g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para la ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.

h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las actividades ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la siguiente información mínima:

- El avance físico y financiero del proyecto
- Contratos realizados en virtud de la administración delegada
- Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas realizadas.
- Programación de obra
- Proyección de la obra
- Actividades más representativas
- Notas, sugerencias.
- Oficios enviados al contratista (si se han enviado)
- Planilla de pagos a la seguridad social
- Acta de pago al contratista.
- Memorias de cálculo de las cantidades de obra.

i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión denominado " REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA”

j. Registrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada la información contable que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, de forma que permita a la entidad contratante y a las entidades que ejercen vigilancia y control a la actividad administrativa y contractual del Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos administrados en este contrato.

k. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con el componente técnico y financiero

3 2.1 Alcance y obligaciones contractuales

RESTAURACION ACTIVA	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES EN SISTEMA TRADICIONAL	Ha	35	9.208.813	322.308.455
AISLAMIENTO DE PLANTACIONES EN SISTEMA TRADICIONAL	KM	5,8	15.469.755	89.879.277
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN SISTEMAS TRADICIONAL	Ha	35	1.852.056	64.821.960
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 477.009.692**
Realizar jornadas de taller en producción de material vegetal	Taller	12	$ 1.940.000	$ 23.280.000
Realizar jornadas de taller en construccion y manejo de viveros	Taller	12	$ 1.940.000	$ 23.280.000
Realizar jornadas de taller en conservación Conservación del suelo y el agua	Taller	12	$ 1.940.000	$ 23.280.000
Realizar jornadas de taller en prevención y control de incendios forestales	Taller	12	$ 1.940.000	$ 23.280.000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 93.120.000**
VALOR EN ADMINISTRACION				**$ 570.129.692**
VALOR DEL CONTRATO				**$ 7.783.483**

DIRECCION: Calle 52 N° 14D-27 B/ La Castellana, Monteria – Cordoba
Telefono 7918859; 3045411988
Correo fundacionsocioempresarial@gmail.com

3. Informe físico y financiero:

3.1 Contrato derivado de la administración delegada

TIPO DE CONTRATO	CONSTRUCCION (OBRA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO
CONTRATANTE:	FUNDACIÓN SOCIO EMPRESARIAL Identificado con Nit. 900.778.777-8
CONTRATISTA:	FUNDACION DE EMPRESARIOS INNOVADORES DE COLOMBIA – FEINNCOL **NIT:** 900.950.667-2
OBJETO:	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CONRECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DEPROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE ELBAGRE ANTIOQUIA
VALOR:	QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MILSEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($570.129.692)
PLAZO:	CINCO (5) MESES

3.1.1 Control del personal profesional y mano de obra no calificada

CARGO	CC	NOMBRE
Director De Proyectos	10.769.352	Eduar Rafael Vega Doria Vega Doria
Ingeniero Residente	1.067.934.318	Angy sugeis julio padilla
Asesor Contable	39.429.346	María Cristina Petro Doria,
Auxiliar Administrativo	1.007.505.202	Yaquelin Dominga Madera Serpa

Tecnico Ambiental	10.767.462	Juan David Novoa Pastrana

ID	Nombres y apellidos Beneficiario	Número de Identificación
1	DAVID JOSÉ CARMONA TORIBIO	1003501864
2	JAVIER MONTE BOLAÑO	1197214323
3	ADOLFO JOSÉ POLO MIELES	1032251158
4	KEVIN ANDRES VENTA RODRÍGUEZ	1001161795
5	SERGIO ALESANDRE PATERNINA	1032260125
6	CELY YULIETH NAVARRO BARRERA	1041254569
7	ALIS MERCEDES PALENCIA VILLEGAS	43699336
8	NIVER ALBERTO ARROYO MIELES	8052322
9	ROSA DEL CARMEN MORALES DIAZ	43889947
10	YONADIS DEL CARMEN HERNANDEZ MIELES	43888771
11	EDUARDO ENRIQUE ACEVEDO RAMOS	92130070
12	ELIECER MANUEL GAIBAO PINEDA	78106048
13	DAISY DEL CARMEN CHANCI GONZALEZ	1001547583
14	YAMILE DE JESUS PALACIN HERRERA	43890714
15	ALCIDES MANUEL VALERIO CALDERA	15306896
16	MANUEL RAFAEL ORTEGA DIAZ	78107039
17	JORGE CUETO CHOVAS	1038479484
18	YASMANI SERRANO VASQUEZ	1038437739
19	JOSE RAMON SEVERICHE BOHORQUEZ	8374294
20	DENIS MAGOLA BENAVIDES CRESPO	43804771
21	CARMEN CECILIA SERRANO VASQUEZ	43891037
22	MANUEL EUSEBIO GAVIDES RIVERA	8370940
23	JOSE PACHECO DIAZ	8052509
24	JAIME DE JESUS VALERIO MARQUEZ	8372028
25	EBERTO JOSE GAMARRA MARTINEZ	8372477
26	ALCIDES FIDEL TATIS TORRES	8370540
27	LUIS HORACIO PEREZ CASTILLO	8374672
28	NELSON ENRIQUE CORREA REZA	8052819
29	YEINSON JOSE CARDENAS TRUJILLO	1038477082
30	GEYLER HOYOS PEREZ	1001550618
31	JAIME ANDRES VALERIO TATIS	1001546907
32	EVER ENRIQUE CASTILLO PEREZ	8371630
33	JORGE FERNANDO ESTRADA DOVAL	71686147
34	MARY ARRIETA ZABALA	43889502
35	ARLEY DEL CARMEN VANEGAS LOPEZ	1038438272

36	MARIO ENRIQUE ECHAVARRIA CORONADO	15672708
37	JORGE IVAN CHAVES VILLADIEGO	1038484060
38	NELSON DE JESUS PACHECO VERGARA	98598672
39	CLAUDIO MANUEL REGINO PEREZ	3444435
40	HORACIO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	8373226
41	GABRIEL ANTONIO REGINO VILLERA	8373511
42	EDILBERTO MEJIA	70050117
43	LUIS MANUEL GARCIA SANTOS	98653950
44	NICOLAS ALCIDES AGAMEZ	8370608
45	HERIBERTO ANTONIO CALDERON MOLINA	8371623
46	MARIA DEL ROSARIO CASTELLAR BLANCO	64891104
47	ANA MARIA LOZANO VALERIO	1104415173
48	JOHN JAIRO SANTERO CORPAS	78112445
49	MANUEL SALVADOR ZURITA PEREZ	8050654
50	LUBIN RODRIGUEZ VEGA	71930118
51	TOMAS MANUEL BARRIOS ROJAS	8371458
52	BORLLYS BARRIOS REGINO	1038439411
53	EIMAR BARRIOS REGINO	1038480557
54	NASER DE JESUS RIVERA PEREZ	8374638
55	CASIANO MANUEL NAVARRO PATERNINA	8990229
56	ALDAIR NAVARRO BARRIOS	1001550448
57	JAICIR MANUEL NAVARRO JIMENEZ	1104376344
58	YANET SIERRA RUIZ	39278247
59	LUIS ANTONIO CASTILLO MESA	8372645
60	JOSE SEBASTIAN CASTILLO MESA	8371763
61	MARCOS FIDEL MESA	8370590
62	NEBER MANUEL CASTILLO MESA	8373761
63	SILFREDO ENRIQUEZ CASTILLO MESA	8373255
64	CANDELARIO MANUEL CASTILLO ORTIZ	8373434
65	ANA YEPES ORTIZ	21646549
66	CLARA MARIA YEPES MENDEZ	39268071
67	SEXTO MANUEL YEPEZ MENDEZ	8372345
68	EVER JULIO ROJAS VEGA	8052835
69	PEDRO PABLO MARTINEZ RUIZ	71935255
70	LUZMILA ROMERO RODRIGUEZ	71935255
71	JADER ROJAS SIERRA	1001548299
72	JORGE LUIS NAVARRO GAIBAO	8052699
73	NURIS ISABEL ORTIZ MESA	43889023
74	ESTHER TEJADA ORTIZ	1001548832

75	MARLENE DE JESUS MEJIA GAMARRA	43889001

3.1.2 Control de seguridad social del personal profesional

A continuación, se relaciona la seguridad social aportada al mes correspondiente en este caso DICIEMBRE, y su control de parafiscales, se anexa seguridad social del mes de DICIEMBRE del personal.

Nombre	Cargo	CC	N° Planilla	IBC	N° días cotizados	Salud	Pensión	CCF	Riesgo	SENA	ICBF	Total	Razón Social
NOVOA PASTRANA JUAN DAVID	TECNICO AMBIENTAL	10767462	73354846	1.160.000	30	145.000	185.600	46.400	6.100	23.200	34.800	**441.100**	FEINNCOL
MADERA SERPA YAQUELIN DOMINGA	AUXILOAR ADMINISTRATIVO	1007505202	73354846	1.160.000	30	145.000	185.600	46.400	6.100	23.200	34.800	**441.100**	FEINNCOL
JULIO PADILLA ANGY SUGEIS	INGENIERO RESIDENTE	1067934318	73354846	1.600.000	30	200.000	256.000	64.000	8.400	32.000	48.000	**608.400**	FEINNCOL
VEGA DORIA EDUAR RAFAEL	DIRECTOR DE PROYECTO	10769352	73354846	1.600.000	30	200.000	256.000	64.000	8.400	32.000	48.000	**608.400**	FEINNCOL
PETRO DORIA MARIA CRISTINA	ASESOR CONTABLE	39429346	73354846	1.200.00	30	150.000	192.000	48.000	6.300	24.000	36.000	**456.300**	FEINNCOL

3.1.3 Control del personal Profesional

CARGO	NOMBRE
Director De Proyectos	Para el periodo comprendido entre el 12 de DICIEMBRE al 18 de DICIEMBRE el director de proyecto; • Coordino la logística para la entrega de insumos y suministros para el correcto desarrollo de las actividades descritas en el Proyecto • Realizar gestión documental de la documentación física y digital que conlleve las actividades del proyecto
Ingeniero Residente	Para el periodo comprendido entre el 12 de NOVIEMBRE al 11 de DICIEMBRE el ingeniero residente;

	• realizo visitas a los predios donde se realizan el establecimiento de las plantaciones • Verifico visualmente la calidad de los materiales que llegan para la ejecución del proyecto • Implemento el Manual de Calidad y procedimiento en las actividades realizadas. • Llevo control de las cantidades de obra ejecutadas y realizar las correspondientes actas de recibo parcial, para revisión y aprobación por parte del director de proyecto.
Asesor Contable	Para el periodo comprendido entre el 12 de DICIEMBRE al 18 de DICIEMBRE el asesor contable se encargó de llevar toda la contabilidad de los insumos y requerimientos económicos necesario para realizar las actividades de ejecución • se realizaron las liquidaciones de las prestaciones y seguridad sociales para este periodo • legalizo cuentas de cobros de la mano de obra no calificada • digitalizo la contabilidad de las compras y facturas de los insumos y materiales utilizados en este periodo
Auxiliar Administrativo	Para el periodo comprendido entre el 12 de DICIEMBRE al 18 de DICIEMBRE el auxiliar administrativo; • se encargó de Mantener actualizado y organizado el archivo y hojas de vidas del proyecto.
Técnico Ambiental	Para el periodo comprendido entre el 12 de DICIEMBRE al 18 de DICIEMBRE el Técnico Ambiental; • participo en la socialización del proyecto con los beneficiarios • se encargo en recibir el material vegetal para posteriormente enviar la cantidad de plantulas necesarias para cada predio • capacito a la mano de obra no calificada en la correcta realización de trazado, plateo y ahoyado.

3.1.4 Relación de talleres realizados:

Para este periodo no se realizaron talleres

3.2 Avance físico periodo 12 de DICIEMBRE al 18 de DICIEMBRE del 2023

En la parte administrativa se presenta informe donde se detallan los por menores del contrato como avance de obra, recursos ejecutados, porcentaje de rendimiento, recurso técnico y humano del contratista. Se cuenta con un Ingeniero residente que se encarga del control de las actividades, equipo y personal empleado en obra.

AVANCE FISICO MES 4							
	ACTIVIVIDAD	META	MEDIDA	SUBACTIVIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD REALIZADA	% EJECUCION
Objetivo 1. Implementar acciones de rehabilitación en los bosques de protección.	VALOR ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO						56,53%
	Realizar establecimiento de plantaciones protectoras	35	Ha	Características de plántulas	19.460	19.460	11,3%
				Limpieza y adecuación de las áreas para rehabilitación	35,0	35,0	11,3%
				Preparación del terreno	35,0	35,0	11,3%
				Ahoyado	19.460	19.460	11,3%
				Distribución y siembra de arboles	19.460	19460	11,3%
	VALOR ACTIVIDAD AISLAMIENTO						15,76%
	Realizar aislamiento de plantaciones	5,8	Km	Trazado	5,80	5,80	3,94%
				Ahoyado	1.931	1.931	3,94%
				Hincado	1.931	1.931	3,94%
				Templado y grapado	18.270	18.270	3,94%
	VALOR ACTIVIDAD MANTENIMIENTO						11,37%

	Realizar mantenimiento de plantaciones	35	Ha	Reposición por pérdidas	1.960	1.960	3%
				Control de plagas	19.460	19.460	3%
				Limpias – control de maleza	19.460	19.460	3%
				Replateo	1.960	1.960	3%
Objetivo 2. Desarrollar una estrategia de educación ambiental informal en las comunidades.		12	jornadas	Realizar Taller en produccion de material vegetal (Educacion Informal)	12	12	**4%**
		12	jornadas	Realizar Taller en conservación del suelo y el agua (Educacion Informal)	12	12	**4%**
		12	jornadas	Realizar Taller en construcción y manejo de viveros (Educacion Informal)	12	12	**4%**
		12	jornadas	Realizar Taller en control de incendios de bosques (Educacion Informal)	12	12	**4%**
TOTALES COSTOS DIRECTOS					**TOTAL EJECUTADO**		**100%**
VALOR TOTAL PROYECTO					**TOTAL EJECUTADO**		**100%**

3.2.1 Actividades ejecutadas

Para el este periodo, comprendido entre el 12 de DICIEMBRE al 18 de DICIEMBRE de 2023, se realizaron las siguientes actividades.

Objetivo 1:

NOMBRE	CC	HA	DESCRIPCION
LOS AGUACATES			
Maria Elena Cordoba Cuesta	51814117	1,3	**Actividad 1 Realizar establecimiento de plantaciones protectoras**

			En este periodo se realizó la Limpieza, adecuación y Preparación de 1,3 Ha de terreno. A continuación, se realizó la actividad de ahoyado en marco de 6x6 m con amplitud de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad para 723 plántulas. Se prosigue a realizar la siembra de 362 especies forestales y 361 especies frutales **Actividad 2 Realizar aislamiento de plantaciones protectoras** Se realizaron Trazado, Ahoyado, e Hincado de 0.2158 km para aislar las plantaciones con el templado y grapado de alambre de púas a tres líneas **Actividad 3 Realizar mantenimiento de plantaciones protectoras** Para este periodo no se realizaron labores en esta actividad
Jose Manuel Atencia Medina	3831820	0,8	**Actividad 1 Realizar establecimiento de plantaciones protectoras** En este periodo se realizó la Limpieza, adecuación y Preparación de 0,8 Ha de terreno.

			A continuación, se realizó la actividad de ahoyado en marco de 6x6 m con amplitud de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad para 445 plántulas. Se prosigue a realizar la siembra de 223 especies forestales y 222 especies frutales **Actividad 2 Realizar aislamiento de plantaciones protectoras** Se realizaron Trazado, Ahoyado, e Hincado de 0,1328 km para aislar las plantaciones con el templado y grapado de alambre de púas a tres líneas **Actividad 3 Realizar mantenimiento de plantaciones protectoras** A los 10 Días posteriores de la siembra de las plántulas debido a las lluvias presentadas en la zona fue necesario hacer limpieza y replantea de las 1,4 Ha establecidas, al igual que la resiembra del 10% de las plántulas sembradas
Claribel Muslaco Martinez	43693336	4	**Actividad 1 Realizar establecimiento de plantaciones protectoras** En este periodo se realizó la Limpieza, adecuación y

			Preparación de 4 Ha de terreno. A continuación, se realizó la actividad de ahoyado en marco de 6x6 m con amplitud de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad para 2.224 Plántulas. Se prosigue a realizar la siembra de 1.112 especies forestales y 1.112 especies frutales **Actividad 2 Realizar aislamiento de plantaciones protectoras** Se realizaron Trazado, Ahoyado, e Hincado de 0,644 km para aislar las plantaciones con el templado y grapado de alambre de púas a tres líneas **Actividad 3 Realizar mantenimiento de plantaciones protectoras** A los 10 Días posteriores de la siembra de las plántulas debido a las lluvias presentadas en la zona fue necesario hacer limpieza y replantea de las 1,4 Ha establecidas, al igual que la resiembra del 10% de las plántulas sembradas

Dairo Manuel Muslasco	1.040.515.167	1,4	**Actividad 1 Realizar establecimiento de plantaciones protectoras** En este periodo se realizó la Limpieza, adecuación y Preparación de 1,4 Ha de terreno. A continuación, se realizó la actividad de ahoyado en marco de 6x6 m con amplitud de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad para 779 plántulas. Se prosigue a realizar la siembra de 390 especies forestales y 389 especies frutales **Actividad 2 Realizar aislamiento de plantaciones protectoras** Se realizaron Trazado, Ahoyado, e Hincado de 0,2324 km para aislar las plantaciones con el templado y grapado de alambre de púas a tres líneas **Actividad 3 Realizar mantenimiento de plantaciones protectoras** A los 10 Días posteriores de la siembra de las plántulas debido a las lluvias presentadas en la zona fue necesario hacer limpieza y replantea de las 1,4 Ha establecidas, al igual que la resiembra del 10% de las plántulas sembradas

Edinson Antonio Muslaco de la rosa	8364749	4	**Actividad 1 Realizar establecimiento de plantaciones protectoras** En este periodo se realizó la Limpieza, adecuación y Preparación de 2 Ha de terreno. A continuación, se realizó la actividad de ahoyado en marco de 6x6 m con amplitud de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad para 2.224 plántulas. Se prosigue a realizar la siembra de 1.112 especies forestales y 1.112 especies frutales **Actividad 2 Realizar aislamiento de plantaciones protectoras** Se realizaron Trazado, Ahoyado, e Hincado de 0,644 km para aislar las plantaciones con el templado y grapado de alambre de púas a tres líneas **Actividad 3 Realizar mantenimiento de plantaciones protectoras** A los 10 Días posteriores de la siembra de las plántulas debido a las lluvias presentadas en la zona fue necesario hacer limpieza y replantea de las 1,4 Ha establecidas, al igual que la resiembra del 10% de las plántulas sembradas
LUIS CANO			

Albeiro de Jesus Rodas Herrera	16352781	23,5	**Actividad 1 Realizar establecimiento de plantaciones protectoras** En este periodo se realizó la Limpieza, adecuación y Preparación de 23,5 Ha de terreno. A continuación, se realizó la actividad de ahoyado en marco de 6x6 m con amplitud de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad para 13.066 plántulas Se prosigue a realizar la siembra de 6.533 especies forestales y 6.533 especies frutales **Actividad 2 Realizar aislamiento de plantaciones protectoras** Se realizaron Trazado, Ahoyado, e Hincado de 3,901 km para aislar las plantaciones con el templado y grapado de alambre de púas a tres líneas **Actividad 3 Realizar mantenimiento de plantaciones protectoras** A los 10 Días posteriores de la siembra de las plántulas debido a las lluvias presentadas en la zona fue necesario hacer limpieza y replantea de las 4 Ha establecidas, al igual que la resiembra del 10% de las plántulas sembradas

3.3 Avance financiero periodo 12 de DICIEMBRE al 18 de DICIEMBRE del 2023

A la fecha de corte del presente informe se avanzó un 100% de ejecución de la obra, teniendo en cuenta que no se presentaron imprevistos a lo largo de la ejecución del contrato, se realiza la resta de estos valores según APUS, lo cual corresponde a un valor total final de quinientos sesenta y seis millones doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y siete mil pesos con sesenta y seis centavos ($ 566.237.967,66) este valor hace referencia a la operación de FEINCCOL, empresa ejecutora según contrato 002- 2023 entre ésta y FSE.

En la siguiente Tabla, se consolida el avance financiero

Consolidado avance físico y financiero								
	ACTIVIVIDAD	**META**	**MEDIDA**	**SUBACTIVIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**	**CANTIDAD REALIZADA**	**% EJECUCION**	**AVANCE FINANCIERO**
Objetivo 1. Implementar acciones de rehabilitación en los bosques de protección.	**VALOR ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO**						**56,53%**	**$ 322.308.455,00**
						IMPREVISTO		2.629.585
	Realizar establecimiento de plantaciones protectoras	35	Ha	Compra de plántulas	19.460	19.460	11,3%	$ 64.461.691,00
				Limpieza y adecuación de las áreas para rehabilitación	35,0	35,0	11,3%	$ 64.461.691,00
				Preparación del terreno	35,0	35,0	11,3%	$ 64.461.691,00
				Ahoyado	19.460	19.460	11,3%	$ 64.461.691,00
				Distribución y siembra de arboles	19.460	19460	11,3%	$ 64.461.691,00
	VALOR ACTIVIDAD AISLAMIENTO						**15,76%**	**$ 89.879.277,00**
						IMPREVISTO		733.289
	Realizar aislamiento de plantaciones	5,8	Km	Trazado	5,80	5,80	3,94%	$ 22.469.819,25
				Ahoyado	1.931	1.931	3,94%	$ 22.469.819,25
				Hincado	1.931	1.931	3,94%	$ 22.469.819,25
				Templado y grapado	18.270	18.270	3,94%	$ 22.469.819,25

	VALOR ACTIVIDAD MANTENIMIENTO						11,37%	$ 64.821.960,00
						IMPREVISTO		528.850
	Realizar mantenimiento de plantaciones	35	Ha	Reposición por pérdidas	1.960	1.960	3%	$ 16.205.490,00
				Control de plagas	19.460	19.460	3%	$ 16.205.490,00
				Limpias – control de maleza	19.460	19.460	3%	$ 16.205.490,00
				Replateo	1.960	1.960	3%	$ 16.205.490,00
Objetivo 2. Desarrollar una estrategia de educación ambiental informal en las comunidades.		12	jornadas	Realizar Taller en produccion de material vegetal (Educacion Informal)	12	12	4%	$ 23.280.000,00
		12	jornadas	Realizar Taller en conservación del suelo y el agua (Educacion Informal)	12	12	4%	$ 23.280.000,00
		12	jornadas	Realizar Taller en construcción y manejo de viveros (Educacion Informal)	12	12	4%	$ 23.280.000,00
		12	jornadas	Realizar Taller en control de incendios de bosques (Educacion Informal)	12	12	4%	$ 23.280.000,00
TOTALES COSTOS DIRECTOS					TOTAL EJECUTADO		100,00%	$ 570.129.692,00
					IMPREVISTO TOTAL			$ 3.891.724,34
VALOR TOTAL PROYECTO					TOTAL EJECUTADO			$ 566.237.967,66

3.4 Consolidado avance físico y financiero

Consolidado avance físico y financiero										
	ACTIVIVIDAD	META	MEDIDA	SUBACTIVIDAD	valor por subactividad	PESO %	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD REALIZADA	% EJECUCION	AVANCE FINANCIERO
Objetivo 1. Implementar acciones de rehabilitación en los bosques de protección.	VALOR ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO				322.308.455	56,5%			56,53%	$ 322.308.455,00
								IMPREVISTO		2.629.585
	Realizar establecimiento de plantaciones protectoras	35	Ha	Compra de plántulas	$ 171.248.000,00	11,3 %	19.460	19.460	11,3%	$ 64.461.691,00
				Limpieza y adecuación de las áreas para rehabilitación	$ 64.461.691,00	11,3 %	35,0	35,0	11,3%	$ 64.461.691,00

				Preparación del terreno	$ 64.461.691,00	11,3 %	35,0	35,0	11,3%	$ 64.461.691,00
				Ahoyado	$ 64.461.691,00	11,3 %	19.460	19.460	11,3%	$ 64.461.691,00
				Distribución y siembra de arboles		11,3 %	19.460	19460	11,3%	$ 64.461.691,00
	VALOR ACTIVIDAD AISLAMIENTO				**89.879.277**	**16%**			**15,76%**	**$ 89.879.277,00**
								IMPREVISTO		733.289
	Realizar aislamiento de plantaciones	5,8	Km	Trazado	$ 22.469.819,25	4%	5,80	5,80	3,94%	$ 22.469.819,25
				Ahoyado	$ 22.469.819,25	4%	1.931	1.931	3,94%	$ 22.469.819,25
				Hincado	$ 22.469.819,25	4%	1.931	1.931	3,94%	$ 22.469.819,25
				Templado y grapado	$ 22.469.819,25	4%	18.270	18.270	3,94%	$ 22.469.819,25
	VALOR ACTIVIDAD MANTENIMIENTO				**64.821.960**	**11%**			**11,37%**	**$ 64.821.960,00**
								IMPREVISTO		528.850
	Realizar mantenimiento de plantaciones	35	Ha	Reposición por pérdidas	$ 16.205.490,00	3%	1.960	1.960	3%	$ 16.205.490,00
				Control de plagas	$ 16.205.490,00	3%	19.460	19.460	3%	$ 16.205.490,00
				Limpias – control de maleza	$ 16.205.490,00	3%	19.460	19.460	3%	$ 16.205.490,00
				Replateo	$ 16.205.490,00	3%	1.960	1.960	3%	$ 16.205.490,00
Objetivo 2. Desarrollar una estrategia de educación ambiental informal en las comunidades.		12	jornadas	Realizar Taller en produccion de material vegetal (Educacion Informal)	23.280.000	**4%**	12	12	**4%**	**$ 23.280.000,00**
		12	jornadas	Realizar Taller en conservación del suelo y el agua (Educacion Informal)	23.280.000	**4%**	12	12	**4%**	**$ 23.280.000,00**
		12	jornadas	Realizar Taller en construcción y manejo de viveros (Educacion Informal)	23.280.000	**4%**	12	12	**4%**	**$ 23.280.000,00**
		12	jornadas	Realizar Taller en control de incendios de bosques (Educacion Informal)	23.280.000	**4%**	12	12	**4%**	**$ 23.280.000,00**
TOTALES COSTOS DIRECTOS					**$ 570.129.692,00**	**100%**	**TOTAL EJECUTADO**		**100,00%**	**$ 570.129.692,00**
								IMPREVISTO TOTAL		**$ 3.891.724,34**
VALOR TOTAL PROYECTO					**570.129.692,00**	**100%**	**TOTAL EJECUTADO**			$ 566.237.967,66

DIRECCION: Calle 52 N° 14D-27 B/ La Castellana, Monteria – Cordoba
Telefono 7918859; 3045411988
Correo fundacionsocioempresarial@gmail.com

3.5 Control de insumos, equipos y herramientas

Para este periodo el contratista de obra utilizó los siguientes equipos y herramientas

DESCRIPCION BIEN Y/O SERVICIO
Insecticidas
Hidroretenedor
Abono Organico

3.6 Cronograma de actividades

Según el avance presentado en el inciso 3.2.1 tenemos:

CRONOGRAMA																
						MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL REALIZADA
Objetivo 1. Implementar acciones de rehabilitación en los bosques de protección.	ACTIVIVIDAD	META	MEDIDA	SUBACTIVIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	CANTIDAD PROGRAMADA		
	ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO															
	Realizar establecimiento de plantaciones protectoras	35	Ha	Características de plántulas	19.460	6.116	-	6672	9.730	6672	9.730				12.788	19.460
				Limpieza y adecuación de las áreas para rehabilitación	35,0	11,0	25,0	12	10	12	-				23	35

				Preparación del terreno	35,0	11,0	25,0	12	10	12	-				23	35
				Ahoyado	19.460	6.116	8.340	6672	11.120	6672	-				12.788	19.460
				Distribución y siembra de arboles	19.460	6.116	-	6672	6394	6672	13.066				12.788	19.460
	VALOR ACTIVIDAD AISLAMIENTO										-				-	-
	Realizar aislamiento de plantaciones	5,8	Km	Trazado	5,80			1,94	2,81	1,94	3	1,94			2	6
				Ahoyado	1.931			644	938	643,8	993	643,8			644	1.931
				Hincado	1.931			644	938	643,8	993	643,8			644	1.931
				Templado y grapado	18.270			6.090	8.874	6090	9.396	6090			6.090	18.270
	VALOR ACTIVIDAD MANTENIMIENTO										-					-
	Realizar mantenimiento de plantaciones	35	Ha	Reposición por pérdidas	1.960					616	1.400	672	560	672		1.960
				Control de plagas	19.460					6.116	13.900	6672	5.560	6672		19.460
				Limpias – control de maleza	19.460					6.116	13.900	6672	5.560	6672		19.460

				Replateo	1.960					616	1.400	672	560	672		**1.960**
Objetivo 2. Desarrollar una estrategia de educación ambiental informal en las comunidades.	Realizar Taller	12	jornadas	Realizar Taller en produccion de material vegetal (Educacion Informal)	12			6		6	12					**12**
	Realizar Taller	12	jornadas	Realizar Taller en conservación del suelo y el agua (Educacion Informal)	12		-			6	12	6				**12**
	Realizar Taller	12	jornadas	Realizar Taller en construcción y manejo de viveros (Educacion Informal)	12					6	12	6				**12**
	Realizar Taller	12	jornadas	Realizar Taller en control de incendios de bosques (Educaci	12		-				12	6		6		**12**


				on Informal)												

Se realizó la adecuación, ahoyado y establecimiento de 35 ha con especies forestales y frutales , y aislamiento de 5,8 km, mantenimiento de 35 Ha, y 48 jornadas de talleres, es decir un avance del 100% de las actividades, culminando de esta forma de manera eficiente todas las actividades contratadas.

3.7 Flujo de fondos

En este periodo se realizó el establecimiento de 35 ha con especies forestales y frutales, aislamiento de 5,8 km y 48 jornadas de talleres; teniendo en cuenta que no se presentaron imprevistos a lo largo de la ejecución del contrato, se realiza la resta de estos valores según APUS, lo cual corresponde a un valor total final de quinientos sesenta y seis millones doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y siete mil pesos con sesenta y seis centavos ($ 566.237.967,66)

AVANCE MESUAL	$ 18.520.560,00	3.248%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO	$ 570.129.692,00	96,752%
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 536.265.020,00	94,06%
DIFERENCIA	$ 33.864.672	5.940%

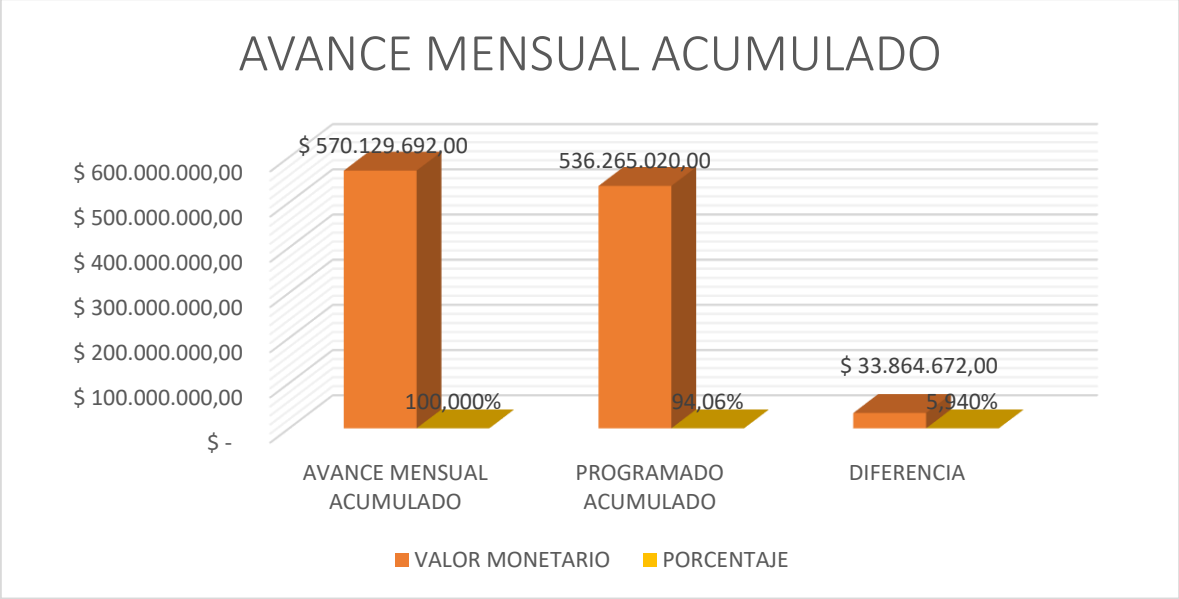

4. Registro fotográfico



Imagen 1: Mantenimiento
Fuente: propia



Imagen 2: Predio sembrado
Fuente: propia



Imagen 3: Mantenimiento
Fuente: propia



Imagen 4: Mantenimiento
Fuente: propia



Imagen 5: Mantenimiento
Fuente: propia



Imagen 6: Siembra
Fuente: propia



Imagen 7: Mantenimiento
Fuente: propia



Imagen 8: Mantenimiento
Fuente: propia



Imagen 9: Resiembra
Fuente: Propia



Imagen 10: Mantenimeinto
Fuente: propia



Imagen 11: Aislamiento
Fuente: propia



Imagen 12: Predio sembrado
Fuente: propia



Imagen 13: Predio sembrado
Fuente: propia



Imagen 14: Predio sembrado
Fuente: propia



Imagen 15: Predio sembrado
Fuente: propia

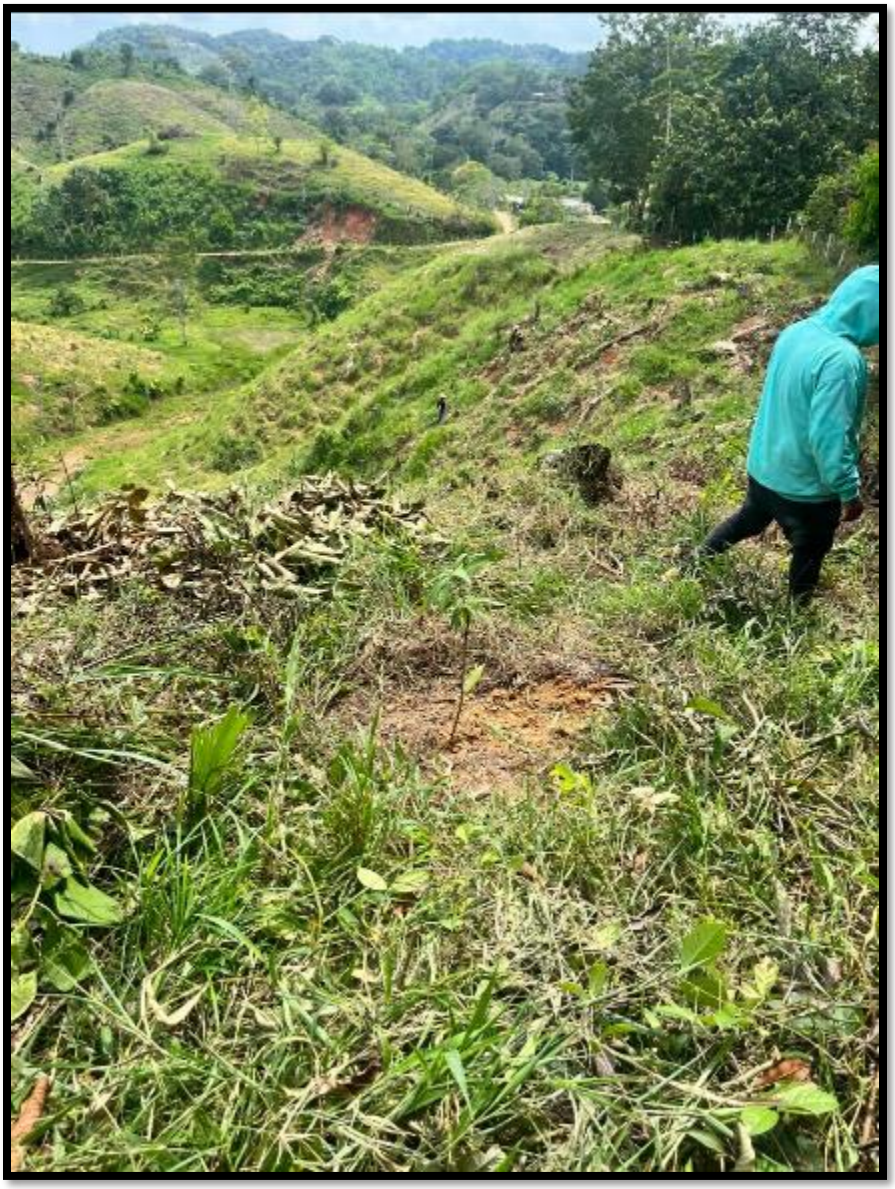


Imagen 16: ´Predio sembrado
Fuente: propia

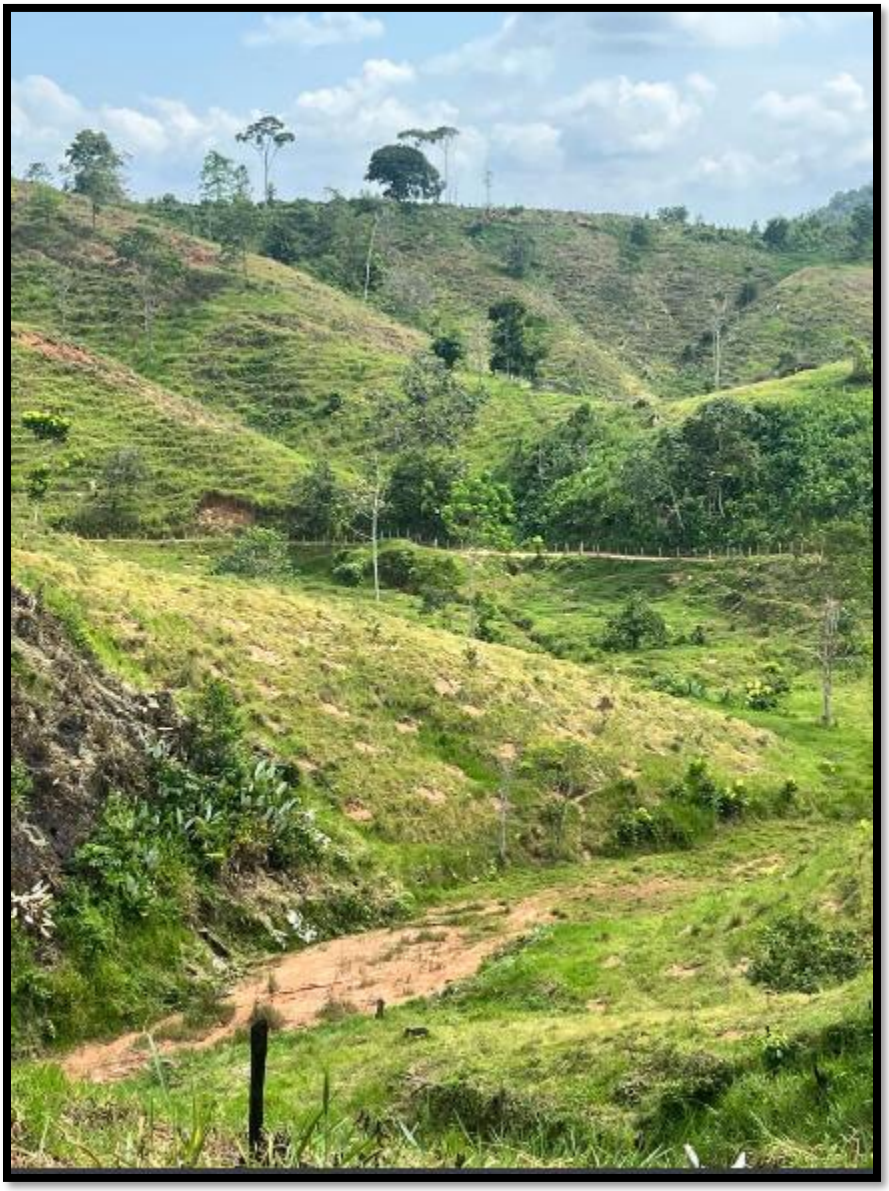


Imagen 18: Predio sembrado
Fuente: propia

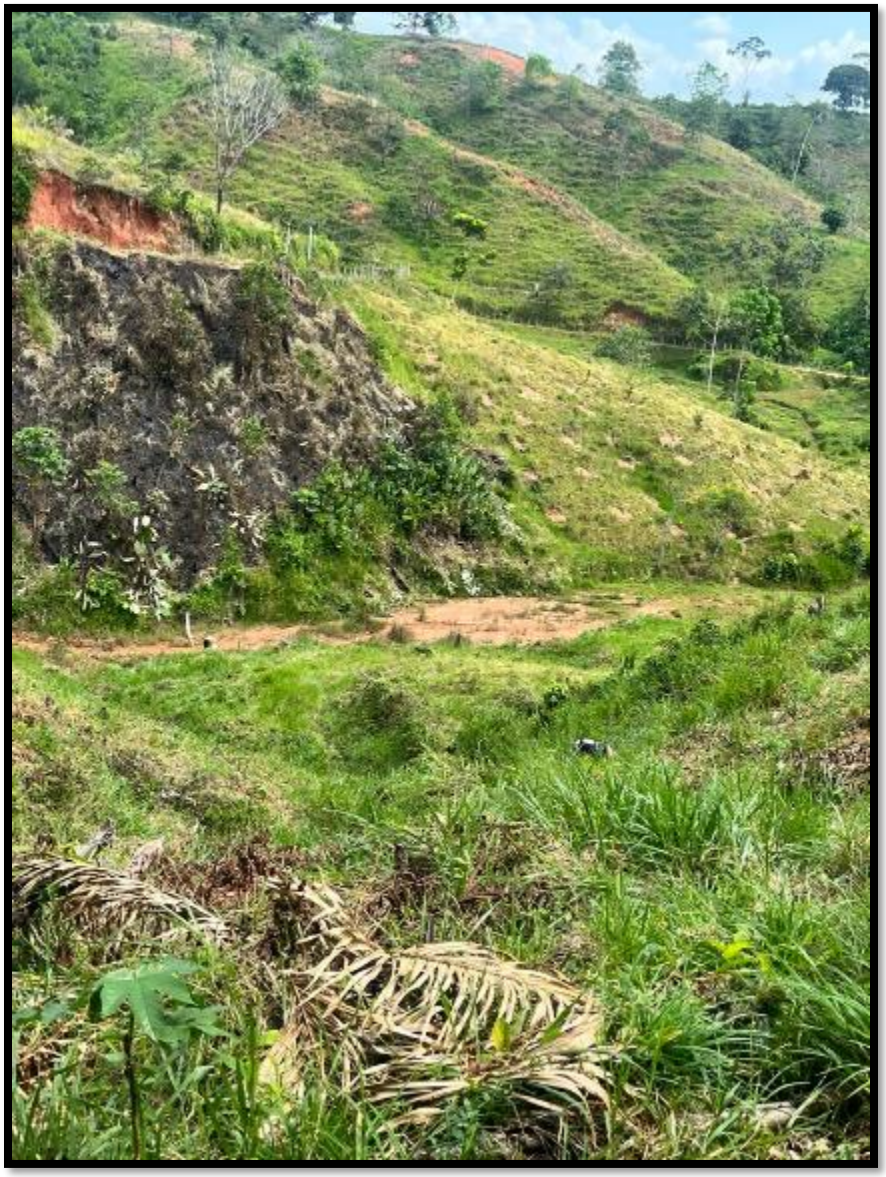


Imagen 18: Predio sembrado
Fuente: propia



Imagen 19: Predio sembrado
Fuente: propia



Imagen 20: predio sembrado
Fuente: propia

5. Conclusiones

Para este periodo se realizó el establecimiento y mantenimiento de 35 ha con especies forestales y frutales, aislamiento de 5,8 km, 12 jornadas de taller en producción de material vegetal, 12 jornadas de taller en construcción y manejo de viveros, 12 jornadas de taller en conservación del suelo y el agua y 12 jornadas de taller en control de incendios forestales, logrando un avance del 100% , a lo largo de la ejecución del contrato, se realiza la resta de estos valores según APUS, lo cual corresponde a un valor total final de quinientos sesenta y seis millones doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y siete mil pesos con sesenta y seis centavos ($ 566.237.967,66)

MARIA JOSE CASTILLOZAPATA
R/L Fundación Socio Empresarial Contratista
Contratante

ANEXOS

1. Seguridad social mano de obra.pdf

2. Nomina mano de obra calificada.pdf

3. Paz y salvo personal profesional.pdf

4.Cuentas de cobro mano de obra no calificada del periodo ejecutado.pdf

5. Paz y Salvo mano de obra no calificada del periodo ejecutado.pdf

6.Certificado de paz y salvo compra de materiales e insumo y herramienta menor.pdf

7.Certificado de paz y salvo compra de plantulas.pdf

8. Autorizacion intervencion de predios.pdf

9. Acta de Establecimiento.pdf

10. Acta aislamiento.pdf

11. Acta mantenimiento.pdf

12. Recibido a satisfaccion beneficiarios.pdf

13. Informe Talleres.pdf

14. Mapa Establecimiento.pdf

16. Certificado cumplido a satisfaccion FSE - FEINNCOL.pdf

17.Informes de obra del periodo ejecutado.pdf
