

“CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA”

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
01	30/11/2023	Versión final

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES 1
1. INTRODUCCION 4
2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 4
2.1 CONTRATO DE OBRA No. 024-2022 ..... **5**
2.2 GENERALIDADES **6**
3 OBJETIVOS 7
4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 8
5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO 9
6 POLIZAS DEL CONTRATO 9
7 CAPITULO FINANCIERO 15
8 VIAS ASIGNADAS 16
9 ACTIVIDADES REALIZADAS 19
10 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 19
11 ACTAS DE COMITE 21
10. CONCLUSIONES 22
11. ANEXOS 23

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion 4
Ilustración 2.Localizacion general 6
Ilustración 3. Localización Cazuca…..…… 6

1. INTRODUCCION

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales de un país y refleja el estado del Progreso de una sociedad; visto así, como un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de individualidad para su desenvolvimiento físico, social, cultural y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que lleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país.

La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, quiénes con su compromiso de gestión de autocuidado en salud y de y con el firme apoyo de la organización actuarán contra los peligros y riesgos laborales en busca de prevención de incidentes, accidentes y de enfermedades de en el ámbito laboral.

El consorcio Gamer Soacha, reconoce el talento humano como su recurso más valioso, entendiendo que la seguridad y la salud en el trabajo es una condición necesaria, para el bienestar de sus trabajadores y la productividad. Por lo tanto realizará acciones para promover preservar y mejorar las condiciones del ambiente laboral la salud de los trabajadores de las personas que intervienen en la ejecución de los procesos productivos

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

2.1 CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.


NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO GAMER SOACHA**
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**3443-2021**
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y

	DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
MODIFICATORIO N° 1 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PRORROGA N° 1 FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUCION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 11 DE OCTUBRE DE 2022 4 MESES 31 ENERO DE 2023 31 MAYO DE 2023
PRORROGA N° 2	31 DE MAYO DE 2023
VALOR ADICION AL CONTRATO	$2.256.276.732.67
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICION	6.759.182.392.67
TIEMPO DE PRORROGA N° 2	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

2.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Casuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

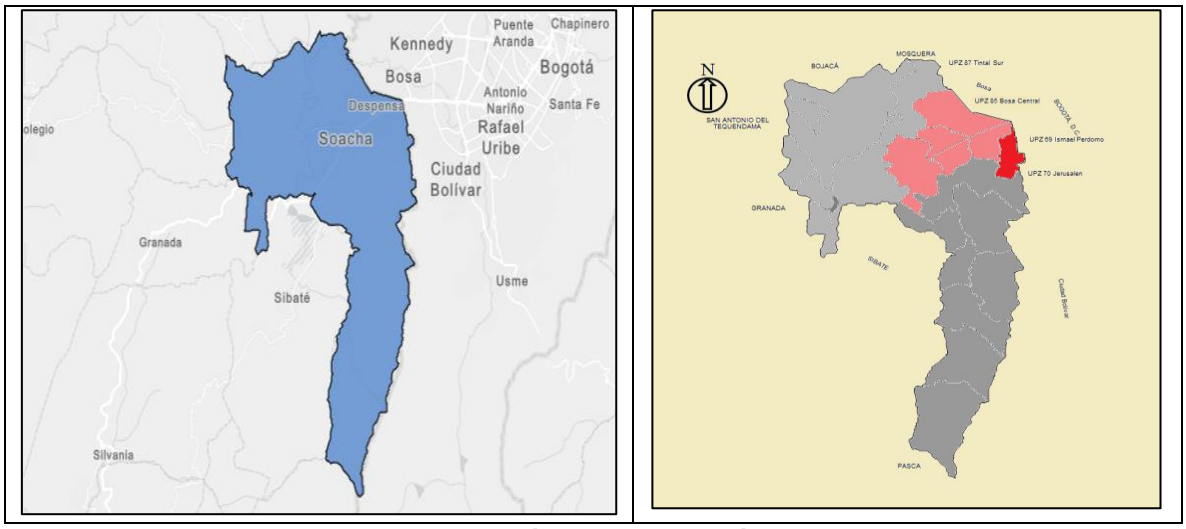

lustración 1.Localización

Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"** donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.

En el presente Informe Técnico No 15, durante al periodo comprendido entre 1 AL 30 SEPTIEMBRE de 2023, se resume la información relevante al avance en el periodo en reporte y a la vez se da alcance como soporte de obra 024-2022, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas por el CONSORCIO GAMER SOACHA, el personal, certificados de calidad de los materiales, consolidación del avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.

3 OBJETIVOS


Informar sobre las diferentes actividades adelantadas por el consorcio Gamer Soacha desarrolló en el período de diciembre a enero relevantes a la ejecución del contrato 024 de 2022 cuyo objeto "Construcción rehabilitación de las vías de obras de urbanismo en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca".


4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto "**CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".** El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).2 Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.

Lustración 2.Localización General

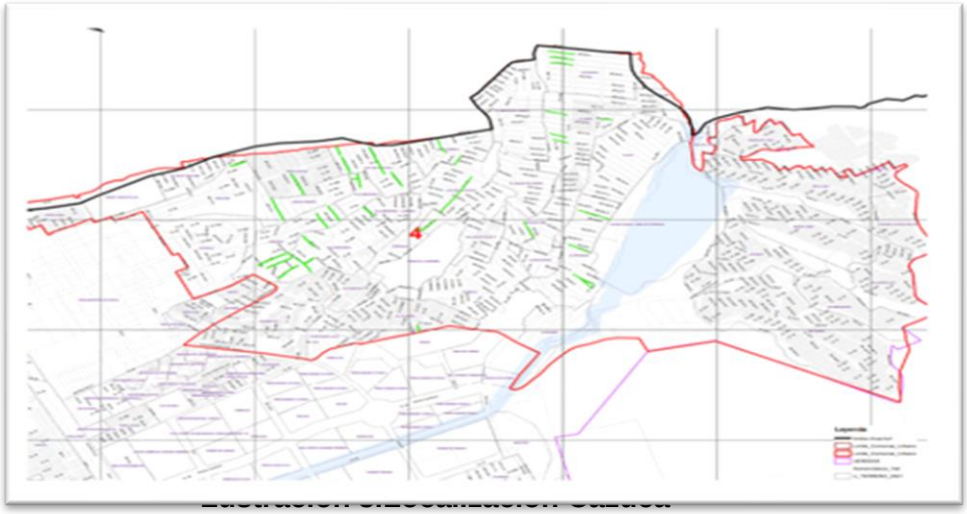

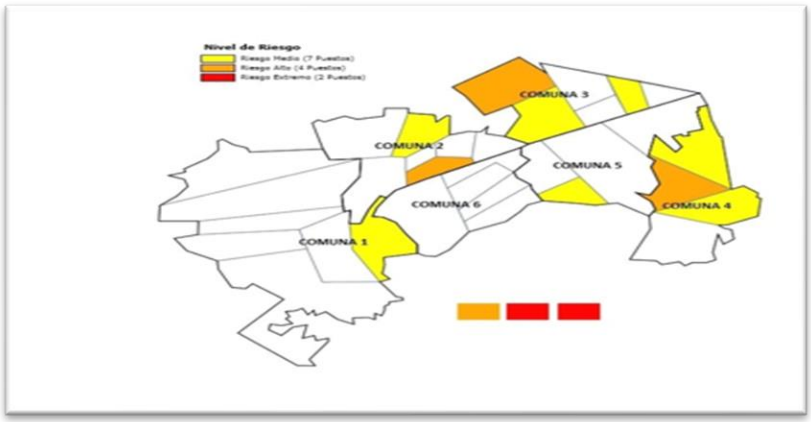

CAZUCA COMUNA 4.

BARRIÓ SANTO DOMINGO Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

4.2. Vías de Acceso a la comuna 4 – Cazuca

84 CARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60

5 COMPONENETE ADMINISTRATIVO

En el presente informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, lo cual se desarrolló a cabalidad para la entidad contratante que es la Epuxua Avanza E.I.C.E la empresa pública del municipio de Soacha.

Dando claridad que el contrato en mención se le dio inicio el 01 de agosto del 2022 y a su vez dando alcance a lo requerido contractualmente para el buen desarrollo y ejecución del contrato, se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.			
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACIÓN**	**CORREO ELECTRÓNICO**
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	DIRECTOR DE OBRA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	INSPECTORA	100 %	consorciogamer024@gmail.com
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	INSPECTOR	100 %	consorciogamer024@gmail.com
DEICY LORENA BELLO RIVERA	PROFESIONAL HSEQ	100 %	consorciogamer024@gmail.com
PAOLA ANDREA OCHIA H.	TOPOGRAFO	100 %	consorciogamer024@gmail.com

6 POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocosering SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Anexo 3 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 4 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/06/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	01/02/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/12/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	01/08/2022	01/06/2026
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	01/02/2023	01/02/2028

Anexo 5 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual) Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/11/2023

Anexo 6 Poliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$4.055.509.435,60	01/06/2023	01/11/2028
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$1.351.836.478,53	01/06/2023	01/06/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$675.918.239,27	01/06/2023	01/12/2026
	Estabilidad de la obra.		$2.027.754.717,80	01/11/2023	01/11/2028

Anexo 8 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/12/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$1.351.836.478,53	01/08/2022	01/12/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha.

7 CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO **.**

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	$ 4.506.567.898,67
Acta No. 1	$ 649.376.068,00
Acta No. 2	$ 727.213.483,00
Acta No. 3	$ 1.003.532.431,00

Acta No. 4	$ 451.030.346
Acta No .5	$ 666.543.025
Acta No .6	$484.672.910
ACTA 7	$ 520.537.357
ACTA 8	$528.9808.355
ACTA 9	$471.851.569
ACTA 10	$ 351.093.317
ACTA 11	$228.362.540
Saldo Actual	$ 6.083201.441
Valor por cobrar	$ 675.980.951.67

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

8 VIAS ASIGNADAS

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura:

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaría de infraestructura previa aprobación y aceptación de los interesados, Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

Tabla 4. Vías en intervención

N_NUEVO	DIRECCION POR CUADRAS
1	CRA 37 ESTE ENTRE CLL44-CLL43J
2	DIAGONAL 44 ENTRE CRA 37- TRANSV 35
3	TRANSVERSAL 35 ENTRE 43J-44A
4	TRANSVERSAL 35 DE DIAG 44A - 44B
5	TRANSVERSAL 34 ENTRE DIAGONAL 44 A - CRA 33A
6	TRANSVERSAL 34 ENTRE DIAGONAL 44A-43J
7	DIAGONAL CRA 44 A CRA 33B -CRA 34
8	DIAGONAL CRA 44 A CRA 33A -CRA 33B
9	CARRERA 32 A ENTRE CALLE 59- CALLE 54
10	CARRERA 32A ENTRE CALLE 54 Y CALLE 53
11	CARRERA 32A ENTRE CALLE 53 Y CALLE 50
12	CARRERA 32A ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48
13	CARRERA 32A ENTRE CALLE 48 Y 44
14	CARRERA 32 ENTRE CALLE 53 Y 54
15	CALLE 54 ENTRE CRA 32 Y CRA 32 A
16	CARRERA 28 ESTE ENTRE CALE 59-CALLE 56A
17	CALLE 50 ENTRE CRA 32A- CRA 31
18	CALLE 48 ENTRE CRA 32 A - CRA 31
19	CALLE 53 ENTRE CRA 29- CRA 30
20	CARRERA 30 ENTRE CALLE 53- CALLE 48
21	CALLE 48 ENTRE CRA 30 - CRA 31
22	CARRERA 30 ENTRE CALLE 48- CALLE 44
23	CARRERA 30 ENTRE CALLE 43C-CALLE 44
24	CALLE 43 F ENTRE CARRERA 30- CARRERA 28
25	CARRERA 28 ENTRE CALLE 43 F - CALLE 43 D
25	CALLE 43F ENTRE CRA 28- CRA 27 F
27	CARERA 27 F NTRE CALLE 44- CLLE 43 F
28	CARRERA 27 F ENTRE CALLE 43 F - CALE 43D
29	CRA 27F ENTRE CALLE 43 D- CALLE 43C
30	CRA 27F ENTRE CALLE 43 C- CALLE 43B
31	CALLE 43 C ENTRE CRA 27D- CRA 27 F

32	CALLE 43 D ENTRE CRA 27D- CRA 27 F
33	CARRERA 27 D ENTRE CALLE 43D- CALLE 43 F
34	CARRERA 27 D ENTRE CALLE 43F- CALLE 44
35	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 F-CRA 27 D
36	CALLE 43 F ENTRE CRA 27 D -CRA 27 B
37	CALLE 56 A ENTRE CRA 27- CRA 26 C
38	CALLE 56 A ENTRE CRA 26C- CRA 26 B
39	CALLE 56 A ENTRE CRA 26B- CRA 26
40	CALLE 55 ENTRE CRA 26C- CRA 26
41	CALLE 55 ENTRE CRA 27 - CRA 26 C
42	CARRERA 26C ENTRE CALLE 56 A - CALLE 53
43	CARRERA 26C ENTRE CALLE 55 - CALLE 53 A
44	CARRERA 26C ENTRE CALLE 53A - CALLE 53
45	CALLE 53 A ENTRE CRA 26C- CRA 26
46	CARRERA 24 B ENTRE CALLE 59- CALLE 61
47	CARRERA 24 B ENTRE CALLE 59- CALLE 57
48	CRA 25 ENTRE CALLE 57 - CALLE 61
49	CARRERA 26 ENTRE CALE 59- CALLE 61
50	CARRERA 26 A ENTRE CALLE 59 - CALLE 61
51	CARRERA 26 A ENTRE CALLE 59 - CALLE 58
52	CARRERA 26 A ENTRE CALLE 58 - CALLE 56B
53	CALLE 56 B ENTRE CRA 26A- CRA 26
54	CARRERA 26 B ENTRE CALLE 59 CALLE 57
55	CARRERA 26 B ENTRE CALLE 57 CALLE 56A
56	CARRERA 24 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61
57	CARRERA 25 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59
58	CARRERA 26 ENTRE CALLE 58 7 CALLE CALLE 59
59	CALLE 58 ENTRE CARRERA 26 A Y CARRERA 26B
60	CALLE 57 ENTRE CARRERA 6 C Y CARRERA 26B
61	CARRERA 26 A ENTRE CALLE 59 CALLE 61
62	CALLE 55 ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 25
63	CARRERA 27 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53
64	CALLE51 ENTRE CARRERA 27
65	CARRERA 27 D ENTRE CALLE 50 Y CALLE 51
66	CARRERA 27 D ENTRE CALLE 44 Y CALLE 50
67	CARRERA 27 C ENTRE CALLE 39A Y 43 F
68	CARRERA 27 C ENTRE CALLE 43F Y CALLE 5 B
69	CARRERA 27 C ENTRE CALLE 5 B Y CALLE 5 A
70	CARRERA 27 C ENTRE CALLE 5 A Y CARRERA 20 B SUR
71	CARRERA 20 B SR ENTRE CALL 5 A Y CARRERA 11 ESTE
72	CALLE 43 D ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 27 A
73	CARRERA 27 ENTRE CALLE 43 D Y CALLE 43 F
74	TRANSVERSAL 28 ESTE ENTRE CRA 42A Y 42
75	CALLE 50 ENTRE TRANSVERSAL17C Y CARRERA 19
76	CALLE 50 ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 21 A
77	CALLE 50 ENTRE CARRERA 21 A Y CARRERA 21 C
78	CALLE 50 ENTRE CARRERA 21 A Y TRANSVERSAL 21 D
79	CARRERA 19 ENTRE CALLE 49 Y CALLLE 50
80	CALLE 49 ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 17
81	CARRERA 17 B ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 61
82	CARRERA 17 A ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 61

83 CARRERA 17 ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 61
84 CARRERA 2 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades :

Cra 2 entre 56-50

- Excavaciones en conglomerado
- Se realiza instalación Sardinel confinamiento
- Instalación de base
- Nivelación y compactacion
- Figurado de acero
- Instalacion concreto placas
- Se realizó en trasporte de material de excavación a la escombrera Magir Y Fundación semilleros de emprendimiento del municipio de Soacha.
- Se hace renivelación con base por fuertes lluvias presentadas durante el mes de septiembre en el frente obra cra 2

10 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS









FUNDIDA CONCRETO PLACAS CRA 2 ZONA INDUSTRIAL

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">AFECTACIONES POR LLUVIAS</td></tr>
<tr><td></td><td>EXCAVACIONES Y RELLENOS
ESCALERA CALLE 43F CON CRA 27</td></tr>
</table>

11 ACTAS DE COMITE

Según la fecha de la presenta acta se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos:

Tabla 7. Comités

COMITÉ N.	FECHA
51	05/10/2023
52	12/10/2023
53	19/10/2023
54	26102023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

10. CONCLUSIONES

.

- Las vías intervenidas son priorizadas por el municipio así mismo se emplean métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.

- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía.

- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, se han presentado reprocesos que han llevado a la ejecución de actividades como re nivelaciones para el mejoramiento de las subrasantes por ende se extiende un informe de las afectaciones climáticas soportando estos ítems de la presente acta.


- Se hace instalación de concreto por parte del contratista ,cabe aclarar que se presentan dificultad por tiempo y por parte de los industriales presentando demoras en esta actividad

..

- El tránsito vehicular de las empresas ha retrasado las actividades en campo en la Cra 2 entre Cll 56 y Cll 60.

11. ANEXOS

Certificado de Aportes del mes en reporte y planillas
Actas de comité técnicos
Certificados de materiales



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

ANEXOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS

CONSORCIO GAMER SOACHA

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADO LABORATORIO
