
INFORME DE AVANCE TECNICO Y FINANCIERO

PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2023

CONVENIO 2943 - 2023 "APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, META"

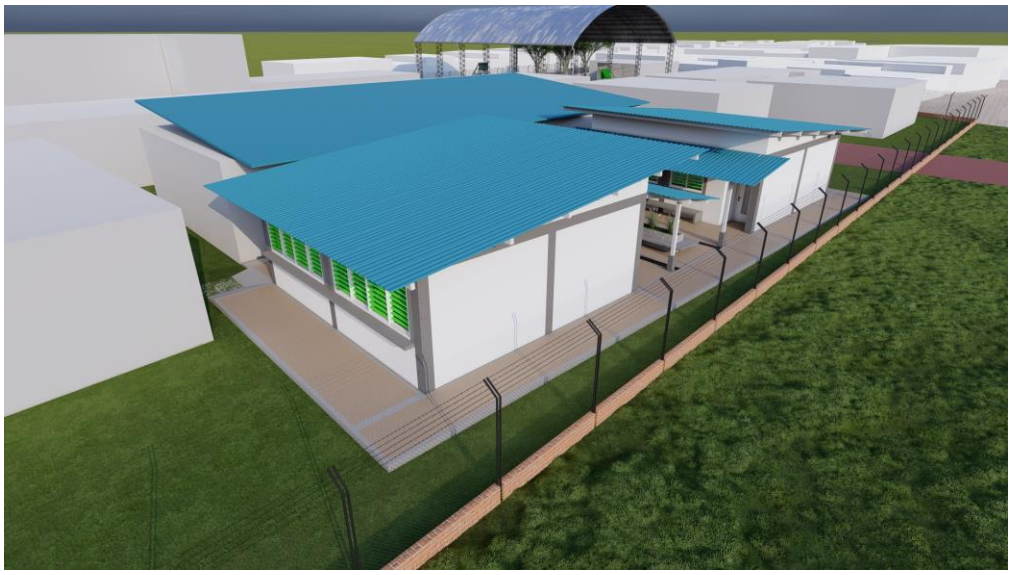

ING. TATIANA ANDREA MEJIA MAHECHA
SUPERVISORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META

ING. DANIEL CAMILO PEDRAZA ORTIZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

05 DE OCTUBRE DE 2023
LEJANIAS – META

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO 3

INFORMACION DEL CONVENIO 4

AVANCE FISICO – FINANCIERO 5

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 5

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS 6

REGISTRO FOTOGRAFICO 7

CONCLUSIONES 8

INTRODUCCION

El Municipio de Lejanías - Meta, cuenta con diversas instituciones educativas dentro su jurisdicción, en las cuales es necesario un espacio donde los estudiantes pueden interactuar entre sí y con el profesor. Esta interacción es fundamental para el intercambio de ideas, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales. Además, la seguridad y comodidad es de vital importancia para generar un buen desarrollo de las habilidades académicas y técnicas es por esta razón que las instituciones escolares bien construidas y mantenidas garantizan los aspectos antes mencionados condición esencial para el bienestar de todos los involucrados en el proceso educativo.


DESCRIPCION DEL PROYECTO

Actualmente, en la sede Principal de la Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio de Lejanías, brinda sus servicios a los niveles de Educación en Preescolar, Primaria, Secundaria, Media en las jornadas de la mañana, tarde, nocturna y fines de semana a 748 estudiantes, según el reporte por el SIMAT en el mes de agosto de los cuales en su mayoría habitan en la vereda Cacayal.

Esta sede educativa cuenta con un área aproximada construida de 2445,1 M2, la cual no es suficiente, para atender el servicio educativo requerido en la cobertura de la totalidad de la demanda actual, la sede cuenta con la distribución de 16 salones, de los cuales la cantidad de estudiantes que lo utilizan está por encima de la cantidad de lo que indica la norma (40 estudiantes por salón). Adicionalmente, algunos grados de primaria ven las clases en el centro deportivo de la institución, ya que no cuentan con suficientes espacios de aulas que les permita recibir sus clases.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios que presta la sede Principal de la I.E Gabriela Mistral, se hace necesario la construcción de dos (2) aulas que permitan brindar un buen aprendizaje a la población estudiantil, una mejor convivencia con sus docentes y demás actores del proceso enseñanza-aprendizaje. Cumpliendo con los estándares de calidad y normativas vigentes como la NTC4595 (Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares), para que así la sede cuente con condiciones óptimas en la atención del servicio educativo, generando un ambiente escolar más protegido.


VEREDA	COORDENADAS UBICACIÓN	Area (Km2)
CACAYAL	3°47'56''N - 73°91'04''O	2,445

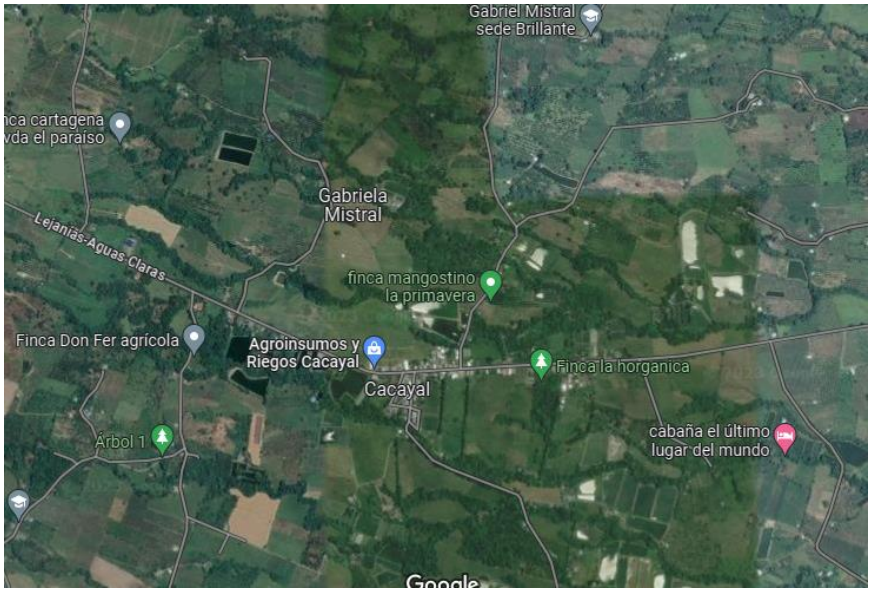

INFORMACION DEL CONVENIO

CONVENIO No.:	2943-2023
OBJETO:	"APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, META"
VALOR:	SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($722.775.195,40)
FECHA:	28 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES, contados a partir del acta de inicio

AVANCE FISICO – FINANCIERO

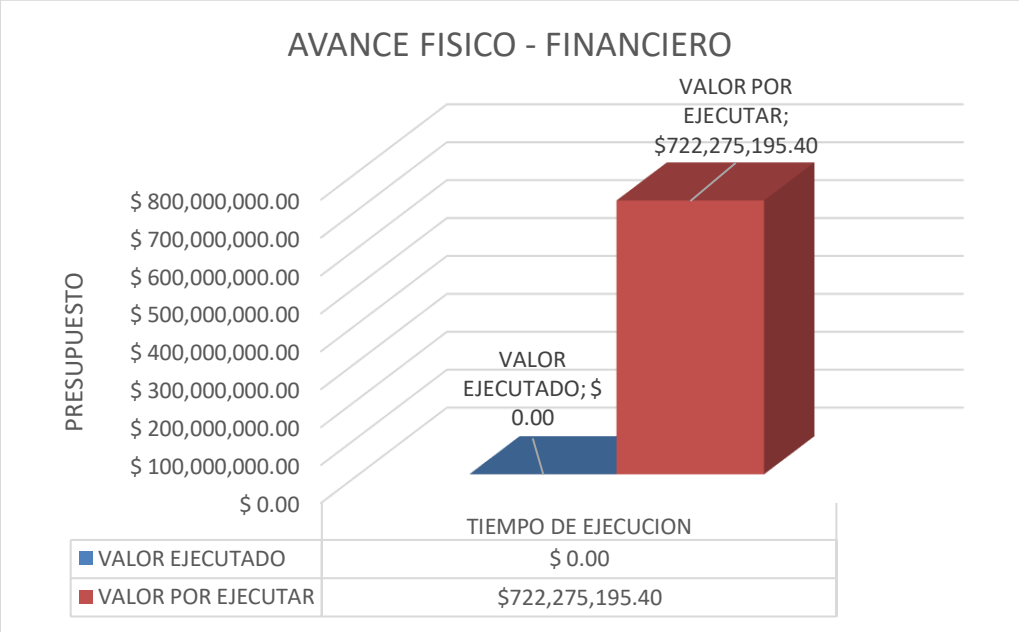

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El convenio se encuentra en el proceso precontractual, donde a la fecha se han realizado observaciones de la proyección del pliego de condiciones, publicación de formatos y demás documentos para dar cierre a la licitación de obra pública No. MLM-LP-001-2023. Una vez allegados los documentos de los posibles oferentes se realizó la respectiva revisión técnica, financiera y jurídica en orden cronológico como se muestra en la siguiente tabla según las publicaciones realizadas en el SECOP

PROCESO	OBJETO	FECHA
1	OBSERVACIONES	12/09/2023
2	RESPUESTA A OBSERVACION	12/09/2023
3	RESOLUCION DE APERTURA	12/09/2023
4	PLIEGO DEFINITIVO	12/09/2023
5	FORMULARIO 1 – FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL CCE-EICP-FM-116	12/09/2023
6	MATRIZ EXPERIENCIA SECTOR EDUCATIVO	12/09/2023

7	FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL – CCE-EICP-FM-108	12/09/2023
8	FORMATO 3 – EXPERIENCIA CCE – EICP – FM 106 – INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12/09/2023
9	ANEXOS FORMATOS Y MATRICES	12/092023
10	LINK AUDIENCIA DE CIERRE	20/09/2023
11	CIERRE	20/09/2023
12	INFORME DE EVALUACION TECNICA. JURIDICA Y FINANCIERA	25/09/2023
13	ADENDA	25/09/2023
14	DOCUMENTOS COSORCIO EDUCATIVO GAMI CARPETA 1	25/09/2023
15	DOCUMENTOS COSORCIO EDUCATIVO GAMI CARPETA 2	25/09/2023
16	DOCUMENTOS CONSORCIO MISTRAL 2023	25/09/2023
17	DOCUMENTOS GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO	25/09/2023
18	OBSERVACIONES	03/10/2023
19	INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DEFINITIVA	03/10/2023
20	INFORME DE EVALUACION JURÍDICA DEFINITIVA	03/10/2023
21	LINK AUDIENCIA VIRTUAL DE ADJUDICACIÓN	03/10/2023
22	INFORME DE EVALUACIÓN CORREGIDO	03/10/2023

Por otra parte, se adelantan los procesos precontractuales para la contratación de la interventoría con numero de proceso MLM-CMA-001-2023, quedando consagrado de la siguiente manera:

PROCESO	OBJETO	FECHA
1	OBSERVACIONES	12/09/2023
2	RESPUESTA A OBSERVACION	12/09/2023
3	RESOLUCION DE APERTURA	12/09/2023

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

El convenio se encuentra en la etapa precontractual de la formulación de los procesos de contratación para la ejecución del objeto contractual del convenio. Por lo cual no se registran memorias de cálculo de cantidades.


REGISTRO FOTOGRAFICO

El convenio se encuentra en la etapa precontractual de la formulación de los procesos de contratación para la ejecución del objeto contractual del convenio. Por lo cual no se registran fotografías del proceso, pero sí de la posible adecuación en render.

IMAGEN RENDER 1	IMAGEN RENDER 2
	

IMAGEN RENDER 3	IMAGEN RENDER 4



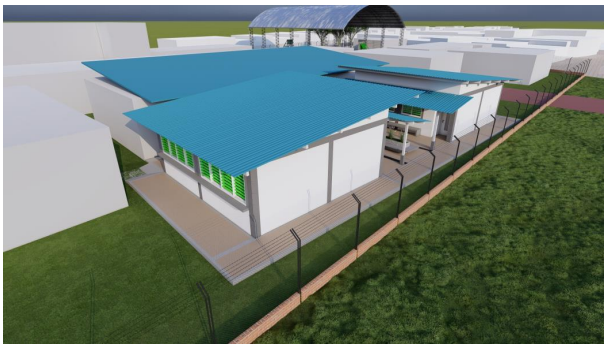

CONCLUSIONES

- Se adelantan actividades de los pliegos de condiciones para la respectiva publicación de la licitación de obra publica No. MLM-LP-001-2023.
- Se da aviso por el SECOP del pliego de condiciones con el respectivo cronograma para que los posibles interesados hagan llegar cada una de sus propuestas al lugar donde lo define la alcaldía del municipio de lejanías – meta.

ING. DANIEL CAMILO PEDRAZA ORTIZ

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
